PREFEITURA DE UIRAMUTÃ

SEMECD UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI - Fls. 01 Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – SEMECD

PMUI/SMECD/MEMO Nº 494/2022.

UIRAMUTÃ – RR, 26 de Setembro de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor
BENÍSIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã – RR.

Assunto: Construção de Escola Municipal Indígena AMOOKO ROSENO –Comunidade BARREIRINHA.

Senhor Prefeito,

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para abertura de processo que terá como objeto a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO –Comunidade BARREIRINHA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR",** conforme especificações constantes no Projeto Básico ANEXO I e seus Anexos.

Respeitosamente,

Vanderlane James Lima

VANDERLANE JAMES LIMA
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto
PORTARIA Nº 459/2022

AUTORIZO A SOLICITAÇÃO ACIMA.

BRS

BENÍSIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal

EM BRANCO

PREFEITURA DE UIRAMUTÃ

SEMECD UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 02
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – SEMECD

Pedido de Aquisição de Material/Serviço – PAMS

Protocolo

PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTÃ/RR

Órgão Emitente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

Função/Programa/Subprograma	Projeto/Subprojeto
12.361.3400.1020.0000	-

Elemento Despesas:	Fonte de Recursos
44905100	1540 - FUNDEB

Item	Especificação	Unid.	Quantidade
1	**"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO –Comunidade BARREIRINHA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR".**	Und	1

APLICACAÇÃO:

Destina-se a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto - SMECD da Prefeitura do Município de Uiramuta – PMU/RR.

DATA: 26/09/2022

Tipo de Empenho:

GLOBAL

VANDERLANE JAMES LIMA
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto
PORTARIA Nº 459/2022

EN BLANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 03
Rúbrica

PROJETO BÁSICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 04
Rúbrica

PROJETO BÁSICO

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO-COMUNIDADE BARREIRINHA

UIRAMUTÃ-RR, SETEMBRO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 05
Rúbrica

SUMÁRIO

1. OBJETO 3.... 3
2. JUSTIFICATIVA.... 3
3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 3
4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO 3
4.1. ADMINISTRAÇÃO 3
4.2. Mobilização e Instalação de Canteiro 4
4.3. PROJETO ESTRUTURAL, HIDRAÚLICO, SANITÁRIO E COMBATE AINCENDIO 4
4.4. PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA E SPDA 4
4.5. Diversos 4
5. LOCAIS DE TRABALHO 13
6. SISTEMA DE TRABALHO 13
7. MEDIÇÃO E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS 13
8. INSTALAÇÕES FÍSICAS 13
9. HORÁRIOS DE TRABALHO 14
10. RECURSOS HUMANOS 14
11. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI.DUAL 14
12. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 15
13. MATERIAIS DE CONSUMO 15
14. FISCALIZAÇÃO 16
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 16
16. PENALIDADES 16
17. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 18
18. PREÇO 22
19. PRAZO DE EXECUÇÃO 22
20. CONSIDERAÇÕES FINAIS 22
21. Aprovação 22

PLANILHAS DE ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 1)
ART e DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (ANEXO 2)
RELÁTÓRIO FOTOGRÁFICO (ANEXO 3)

MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 06
Rúbrica

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno- Comunidade Barreirinha

2. Justificativa

A prefeitura Municipal de Uiramutã-RR, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, que é o órgão municipal é o órgão encarregado de instrumentalizar e ofertar a educação infantil de Uiramutã. A Secretaria promove o desenvolvimento cultural da população e incentiva a recreação e lazer da comunidade. Nela constam os segmentos como: coordenação pedagógica, supervisão escolar, nutricionista, psicólogo, agentes administrativos, motoristas, professores, serventes e merendeiras. A Secretaria tem como objetivo, trabalhar em equipe para que haja um ótimo desempenho das atividades relacionadas à questão educacional do município. As especificações abordadas neste documento têm como objetivo estabelecer diretrizes para orientação de empresas interessadas em participar do certame licitatório para contratação da Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno- Comunidade Barreirinha- Município de Uiramutã, detalhando as atividades, locais, horários e demais aspectos relativos à prestação dos serviços. A Escola tem por objetivo a Educação Infantil, pois atualmente escola Educação Infantil mais próxima encontrasse 15 km desta comunidade. Está nova escola está delimitada pela reserva indígena, distante cerca de 45,00km do centro do município. Atenderá uma demanda de 31 alunos. Justificamos a presente necessidade levando em consideração a prestação do serviço no intuito de justifica-se pela a necessidade de oferecer um prédio escolar adequado, com intuito de oferecer uma educação de qualidade, com conforto e segurança aos alunos, pois o local de funcionamento da escola atualmente cedido pela a comunidade, local e não possui estrutura adequada para o atendimento. Dessa forma trará uma maior acessibilidade e segurança para os usuários da mesma, podendo assim viabilizar as atividades, provendo uma melhor qualidade de serviço.

3. Especificação dos Serviços

O objeto deste Projeto Básico compreende a execução dos seguintes serviços:
As especificações técnicas, bem como a qualidade dos serviços, devem obedecer fielmente às normas descritas no item 4, pois são condições essenciais para a realização dos serviços, devendo ser executado por empresa devidamente regularizada.
Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem o consentimento escrito do Membro e/ou Comissão Fiscalizadora da Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR.

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO
4.1. ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 07 Rúbrica

O trabalho consiste no acompanhamento das diversas etapas da construção, desde a análise de viabilidade do projeto até a conclusão final da obra, tudo dentro do orçamento e dos prazos. Além disso, o serviço de administração e gerenciamento de obra também é responsável por levantar custos, elaborar orçamentos e cronogramas de execução, acompanhar as aprovações do empreendimento junto aos órgãos públicos e realizar a contratação de fornecedores. Assim, é possível assegurar a qualidade da obra, bem como o cumprimento dos prazos e a minimização de custos com a construção civil.

4.2. Mobilização e Instalação de Canteiro

Os serviços de **mobilização** e desmobilização são definidos como o conjunto de operações que o executor deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazê-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.
Canteiro de obras é a área destinada à execução da obra, aos serviços de apoio e a implantação de instalações provisórias indispensáveis para a realização da construção. Também é o local onde se armazenam os materiais que serão utilizados no projeto e se realizam os serviços auxiliares durante a obra.
Será fixada 01 (uma) placa **PADRÃO de obra**, de forma legível e de fácil visualização com os dizeres fornecidos pelo Setor de Engenharia do órgão municipal. Coleta e transporte de resíduos sólidos comerciais com o uso de veículos compactadores ou basculantes 06m³

4.3 PROJETO ESTRUTURAL, HIDRAÚLICO, SANITÁRIO E COMBATE A INCENDIO

4.3.1 Instalações

No canteiro de obra será executado o barracão de obra para alojamento/escritório, espaço destinado à utilização dos responsáveis técnicos e trabalhadores. As paredes serão em compensado 10mm, a cobertura em telha de fibrocimento 4,0mm e esquadrias, incluso instalações provisória de água e luz. Além disso, está prevista a construção de um barracão para deposito, espaço destinado para guarda de ferramentas e materiais pertinentes à obra, em tábua de madeira, cobertura em telha de fibrocimento 4,0mm, incluso piso argamassa traço 1:3. (Cimento e areia), incluso instalações provisória de luz. Em local adequado, será afixado a placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m), obedecendo-se aos padrões definidos pelo Ministério da Saúde.

4.3.2 Fundações

O projeto estrutural da escola foi elaborado com base na NBR 6118/2014, tendo sua infraestrutura de fundações definida para um solo com tensão admissível inferior ou igual a 2Kgf/cm². A estrutura da fundação foi determinada como sapatas com dimensões de 70x70x25cm, conforme consta no projeto estrutural. Está prevista a Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfáltica em duas demãos.

4.3.3 Superestrutura

Os elementos estruturais projetados na edificação são constituídos em vigas baldrame (12cm x 25cm), vigas superiores (12cm x 20cm), pilares de (12cm x 25cm) em concreto armado, conforme projeto. A resistência característica do concreto – Fck utilizada para todos os elementos estruturais, incluindo-se a fundação é de 25Mpa, conforme NBR 6118/2014, e armações descritas em projetos e planilha orçamentaria.

4.3.4 Alvenaria

As alvenarias serão de tijolos de seis furos na horizontal de 9x14x19 cm (e= 9 cm), assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com aditivo plastificante. Os tijolos deverão ser de boa qualidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RORAIMA
Fls. 08
Rúbrica

e resistência. Seu assentamento far-se-á porfiadas perfeitamente alinhadas e niveladas. A camada de argamassa para assentamento deverá ter dois centímetros tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. As vergas para portas serão moldadas em loco em concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) e preparo mecânico com betoneira, e aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. As vergas para janelas serão moldadas em loco em concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira, e aço ca- 50, diâmetro de 6,3 mm. As contra-vergas das janelas serão moldadas em loco em concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira, e aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. O encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9 cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).

4.3.5 Revestimento e Pintura

O Chapisco deverá ser aplicado em todos os ambientes da edificação, tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 cimento e areia grossa, com preparo manual. O reboco, deverá ser aplicado em todos os ambientes da edificação exceto em áreas molhadas que receberão revestimento cerâmico, argamassa traço 1:4 (cimento e areia fina), com aditivo plastificante e impermeabilizante, com espessura 2,0cm e aplicado manualmente. O Emboço para recebimento de cerâmica será com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), com aditivo plastificante e impermeabilizante, aplicado manualmente nas paredes, para ambientes com áreas molhadas como banheiros, sobre pias, com espessura de 2,0 cm com execução de talisca O Revestimento cerâmico terá dimensões de 25x35cm, aplicado em parede em ambientes com áreas molhas como banheiros, DML e área das pias. As paredes internas e externas que foram rebocadas receberão 01 demão de selador látex PVA. As paredes internas receberam aplicação e lixamento de massa látex - PVA em
duas demãos.

As paredes externas receberam aplicação e lixamento de massa em duas demãos. As paredes internas e externas receberam aplicação manual de pintura com tinta látex PVA semi brilho em duas demãos, com cores definidas em projeto.

4.3.6 Cobertura

A cobertura proposta para edificação foi elaborada tendo como diretrizes o conforto térmico da edificação, a economia, a durabilidade e resistência às intempéries. É um sistema construtivo convencional e versátil que permite ao executor agilidade e rapidez na montagem da estrutura do telhamento com Telha de PVC colonial de com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior de 10°, com duas águas. A forma da cobertura busca além da proteção mecânica da edificação, um conforto térmico adequado ao atendimento à saúde e a permanência das equipes médicas e dos pacientes além uma identidade visual da edificação. O telhado é composto de duas águas com a estrutura em madeira e telha ondulada de fibrocimento. As águas estão dispostas no sentido longitudinal da edificação e sofrem um prolongamento nas fachadas laterais os quais conferem à edificação uma maior proteção em relação à insolação das empenas nestas fachadas e consequentemente uma melhora do conforto térmico dos ambientes da edificação. O madeiramento do telhado foi proposto com bitolas convencionais disponíveis
no mercado local da construção civil a fim de facilitar a aquisição do material, e está previsto a imunização utilizando cupinicida incolor. O forro escolhido foi de PVC branco de 200 mm x 6,0m com estrutura de sustenteção em metalon.

4.3.6 Piso, Soleira e Rodapé

O contrapiso será executado sobre o terreno já perfeitamente apiloado, nivelado e compactado, com espessura de 5 cm, regularizado com camada de 3,0cm de argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa), com preparo mecânico. O revestimento de piso proposto foi tipo Cerâmio PEI IV com dimensões de 30x30

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 09
Rúbrica

cm, na cor branca, em todos os ambientes da edificação. O rodapé com espessura de 7 cm, utilizando o mesmo tipo cerâmico do piso. As soleiras propostas são de granito na cor cinza, com largura de 15 cm e espessura de 3 cm, assentas sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia). A calçada de proteção ao redor da edificação tem 80 cm de largura.

4.3.7 Esquadrias

As esquadrias propostas são: Portas de madeira de abrir (0,80 x 2,10), pois são soluções completas, práticas de instalar e apresentam durabilidade superior. Além disso, não possuem problema com pragas e cupins, não empenam, não estufam e não apodrecem, fácil de instalar e limpar, são completas e prontas para instalação (com acessórios e pintura de acabamento). Janelas de aço e vidro de abrir com pintura a pó na cor branca (1,50 x 1,00) e janelas de aço tipo maxim-ar (0,60 x ,40), pois são soluções completas, práticas de instalar e apresentam durabilidade superior. Além disso, trata-se de um metal que permite produzir esquadrias robustas e seguras por possuir maior resistência a impactos, além de elevada resistência á corrosão atmosférica.

4.3.8 Louças e Metais

O banheiro proposto é adaptado para Pessoas com deficiência, e apresenta quatro (4) barras de apoio em inox polido, L=90 cm e D= 38,1 mm, um (1) banco articulado PCD em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45 cm conforme NBR 9050, um (1) vaso sanitário PCD sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo e assento plástico PCD, um (1) lavatório louça branca suspenso, com dimensões de 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular, previsto a instalação, um (1) chuveiro plástico branco simples e um (1) Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, com 5 peças incluso fixação. A copa pias em aço inox nos tamanhos 0,60x1,50m e 0,60x1,40m com 01 cuba deslocada a esquerda ou direita, conforme projeto, com sifão cromado, válvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7 cm. No depósito de materiais de limpeza (DML) está previsto um tanque de mármore sintético suspenso, com capacidade de 22 litros ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular,
Previsto instalação.

4.3.9 Diversos

Placa de inauguração metálica com dimensões de 0,40 x 0,60 m, prevendo a Instalação. Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, com bordas polida e dimensões de 25 x 8 cm, e espessura de 6 mm, prevendo a instalação. Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital, com dimensões de 1,50 x 2,00 m, inclusive estrutura de metolon de 20x20 cm e escoramento instalada. Para melhor conforto dos usuários, foi previsto tela nylon anti-inseto, cor branca, com proteção UV, fios de 0,25mm, para instalação nas janelas da edificação para proteção contra insetos, inclusive molduras de madeira.

4.3.10 Instalação hidráulica

Para o abastecimento de água potável da edificação, foi considerado um sistema direto, ou seja, a água proveniente do sistema de abastecimento de água da comunidade não segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em um reservatório elevado de água em polietileno com capacidade de 2000 litros, apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Que têm por finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do abastecimento da comunidade e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede predial.

O Sistema de abastecimento de água da comunidade abastecerá diretamente o reservatório superior, seguindo pela coluna de distribuição predial diretamente aos pontos, como consta nos desenhos do projeto.

O projeto de instalações de água fria foi dimensionado de forma a garantir o fornecimento de água de forma continua, em quantidade suficiente, com pressões e velocidades adequadas para o sistema de tubulações e

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 10
Rúbrica

peças de utilização, preservar rigorosamente a qualidade da água do sistema de abastecimento. Garantir o máximo de conforto aos usuários, incluindo a redução dos níveis de ruído nas tubulações. A determinação da capacidade de reservação foi dimensionada levando-se em consideração a demanda diária de um estabelecimento de saúde, para atendimento de20 (vinte) pessoas em edifícios públicos e/ou comerciais cujo consumo estimativo é de 50 litros/dia/pessoa. Assim, levando-se em consideração as reservas estabelecidas na NBR 5626, e levando em conta de se tratar de um estabelecimento de saúde que está localizado em aldeia indígena, onde o fornecimento de água quando suspenso há demora no reestabelecimento, a capacidade do reservatório foi dimensionada em 2000 litros.

O projeto foi elaborado utilizando-se uma demanda de 23 (vinte) alunos em atendimento na sala de aula. As caixas de inspeções ou passagem serão em alvenaria, com tampa de concreto, revestidas internamente com barra lisa, com dimensões de 40x40x50 cm e deverão ser localizadas na área externa da edificação, conforme descrito neste projeto referencial. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC seria normal.Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade constante, abaixo:

• 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 50mm;
• 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e verificação do caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento mínimo de 20 cm. Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 10cm de concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala recoberta com solo normal.

Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários

Como a unidade está localizada em aldeia indígena, que não existe rede pública de coleta de esgotos, estão previstas neste Projeto solução individual de destinação dos esgotos. Essa solução consiste num conjunto de tanque séptico e sumidouro. O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma população de projeto de até 20 (pessoas), e as diretrizes das ABNT NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 – Tanques sépticos

- Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos -

Projeto, construção e operação.

A Fossa séptica será construída em alvenaria de meia vez, com tijolo cerâmico, dimensões externas de 1,80 x 2,30 x 1,50 metros, piso de concreto com espessura de 8 cm, revestida internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 10 cm. O Sumidouro será construído em alvenaria de uma vez, com tijolo cerâmico, diâmetro 2,00 m e altura de 2,50 m, revestida internamente com chapisco, com lastro de concreto com espessura de 5 cm e fundo de brita de 2 cm, com tampa de concreto armado com espessura de 10 cm.

Indicações do sistema

O uso do sistema de tanques sépticos somente é indicado para:

a) Área desprovida de rede pública coletora de esgoto;

b) Alternativa de tratamento de esgoto em áreas desprovidas de rede coletora local;

c) Retenção prévia dos sólidos sedimentáveis, quando da utilização de rede coletora com diâmetro e/ou declividades reduzidos para transporte de efluente livre de sólidos sedimentáveis.

Distancias mínimas

Os tanques sépticos devem observar as seguintes distâncias horizontais mínimas:

a) 1,50 metros de construções, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal predial de água;

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 11
Rúbrica

b) 3,00 metros de árvores e de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água;
c) 15 metros de poços freáticos e de corpos de água de qualquer natureza.
Nota: As distâncias mínimas são computadas da face externa mais próxima aos elementos considerados.
Está previsto 2 (dois) extintores de incêndio tipo abc de 6 kg, incluso suporte de fixação e placa indicativa. Além disso, placa de saída de emergência e iluminação de emergência, conforme projetos.

4.4.0 PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA E SPDA

4.4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial tem finalidade de descrever e especificar as instalações elétricas destinadas à entrada de energia, medições e distribuição, quadros de distribuição (QD's), circuitos internos, SPDA e telefonia, referentes à escola

4.4.1.1 OBJETIVO

A Discriminação Técnica tem por objetivo definir as condições para a execução das obras escola

4.4.4.2 RELAÇÃO DE PRANCHAS

4.4.2.1 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

IE 01/04, 02/04, 03/04 e 04/04 Instalação elétrica, diagramas, quadros e detalhes.

4.4.3 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA E LÓGICA E SPDA

4.4.3.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todas as instalações deverão ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com as seguintes normas:
NBR 5410 da ABNT;
NBR 5419 da ABNT;
NBR 5413 da ABNT;
RDC 50 da Anvisa;
NR 10, Portaria nº06, de 28 de março de 2002
NEC - National Electrical Code;

4.4.3.1.1 Componentes da Instalação Elétrica de Baixa Tensão

Entrada de Energia:

A energia será fornecida em baixa tensão pela Eletrobrás Distribuição Roraima no sistema Monofásico com Retorno por Terra - MRT na tensão 230/115V. A entrada de energia da edificação será por meio de Padrão de Entrada de Energia Bifásico instalado em mureta de alvenaria localizada no limite do terreno definido para a edificação, conforme projeto.

A medição de energia será em mureta com entrada aérea com cabo multiplexado tipo triplex e saída subterrânea. Os principais componentes são:

- Poste de concreto armado tipo duplo T com comprimento de 7,0m com resistência de 150 daN;
- Caixa de medição polifásica em policarbonato, padrão Eletrobrás;
- Disjuntor geral bipolar DIN de 63A 3,0kA curva C;
- Cabos de cobre flexíveis na bitola de 16,0mm² isolados em PVC na tensão nominal de 0,6/1kV para as fases, neutro e terra;
- Eletrodutos rígidos de PVC roscável com bitola de 1 1/4" e conexões;
- Armação secundária com um estribo e isolador de porcelana tipo roldana;
- Caixa de passagem 40x40x50cm com tampa reforçada;
- Aterramento com três hastes de aterramento tipo copperweld de 5/8" x 3,0m dispostas em triângulo e conectadas com cabo de cobre nu 50,0mm²;
- Mureta de medição em alvenaria com pilaretes em concreto armado nas extremidades, chapiscada e rebocada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 12
Rúbrica

Na mureta de medição está prevista a instalação de um quadro geral de baixa tensão (QD1) destinado à instalação de disjuntor geral, disjuntores parciais dos alimentadores dos quadros de distribuição da escola e do abrigo de resíduos de saúde. Além disso, está prevista a instalação de DPS classe I/II 175V 12,5/60kAinstalados entre as duas fases e o cabo de proteção (terra), conforme projeto;

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA ESCOLA:

A edificação é de pequeno porte, portanto possuirá apenas um quadro de distribuição (QD2) que atenderá os circuitos de iluminação, tomadas de uso geral, tomadas de uso específico e centrais de ar tipo split. O quadro deverá ser de embutir, confeccionado em chapa de aço com pintura epóxi (IP50), possuir trinco com fechadura e dobradiças embutidas, equipado com barramentos internos em cobre eletrolítico bifásico, neutro e terra com corrente nominal de no mínimo 80A e adequado à tensão nominal de 230/115V. Deve possuir local destinado à instalação de um disjuntor geral bipolar DIN de 63A, 32 disjuntores parciais DIN e deve possuir resistência mecânica aos esforços de curto-circuito.

Deverá ser confeccionado de acordo com indicação contida em projeto e cada circuito deve ser identificado com etiquetas de identificação personalizadas e possuir porta projeto. Os cabos serão interligados aos disjuntores com o uso de conectores pré-isolados tipo pino e aos barramentos neutro e terra com o uso de conectores pré isolados tipo olhal.

Disjuntores

Os disjuntores de baixa tensão deverão ser do tipo termomagnético, padrão
DIN, curva C, adequados para a fixação em trilhos DIN 35mm, tensão nominal adequada ao uso em 230/115V, frequência nominal de 60Hz, conforme especificação em projeto e planilha.

Cabos Alimentadores do Quadro de Distribuição:

Os cabos do alimentador da edificação, serão em cobre flexível na bitola de
16,0mm² com isolação em PVC 70°C, na tensão nominal de 0,6/1kV, com características de não propagação e auto-extinção de fogo.

Os cabos deverão ter as cores recomendadas pela Norma Brasileira e definidas em projeto:
Neutro: Azul Claro
Condutor de Proteção: Verde
Fases: Preto e Vermelho

Cabos de Rede Comum:

Os cabos do alimentador da edificação, serão em cobre flexível nas bitolas indicadas em projeto, com isolação em PVC 70°C, na tensão nominal de 450/750V, com características de não propagação e auto-extinção de fogo.

Os cabos deverão ter as cores recomendadas pela Norma Brasileira e definidas em projeto:
Neutro: Azul Claro
Condutor de Proteção: Verde
Retorno: Branco
Fases: Preto e Vermelho

Os cabos deverão ser identificados nas caixas de passagens principais da edificação, onde os circuitos deverão estar separados e identificados para facilitar a manutenção futura.

Disjuntores

Os disjuntores de baixa tensão deverão ser do tipo termomagnético, padrão DIN, curva C, adequados para a fixação em trilhos DIN 35mm, tensão nominal adequada ao uso em 230/115V, frequência nominal de 60Hz, conforme especificação em projeto e planilha.

Cabos Alimentadores do Quadro de Distribuição:

Os cabos do alimentador da edificação, serão em cobre flexível na bitola de4,0mm² com isolação em PVC 70°C, na tensão nominal de 0,6/1kV, com características de não propagação e auto extinção de fogo.

Os cabos deverão ter as cores recomendadas pela Norma Brasileira e definidas em projeto:
Neutro: Azul Claro

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 13
Rúbrica

Condutor de Proteção: Verde
Fases: Preto

Cabos de Rede Comum:

Os cabos do alimentador da edificação, serão em cobre flexível nas bitolas indicadas em projeto, com isolação em PVC 70°C, na tensão nominal de 450/750V, com características de não propagação e auto-extinção de fogo.

Os cabos deverão ter as cores recomendadas pela Norma Brasileira e definidas
em projeto:
Neutro: Azul Claro
Condutor de Proteção: Verde
Retorno: Branco
Fases: Preto

Os cabos deverão ser identificados nas caixas de passagens principais da edificação, onde os circuitos deverão estar separados e identificados para facilitar a manutenção futura.

Conexões dos Cabos:

Emendas de cabos: Todas as emendas deverão ser realizadas conforme norma, ou seja, não é permitida a existência de emendas no interior de eletrodutos ou local inacessível e devem possuir boa conexão elétrica e resistência mecânica. Isolamento de emendas: Todas as emendas deverão ser isoladas com fita isolante de autofusão e finalizadas com fitas isolantes adesivas.

Identificação: Todos os cabos deverão ser agrupados em circuitos e identificados com etiqueta vinilicas dentro dos quadros e caixas de passagem.

Aterramento:

O esquema de aterramento da edificação será TN-S, com o neutro conecta dono aterramento apenas na mureta de medição. O aterramento será composto por três hastes de aterramento tipo copperweldde 5/8" x 3,0m com alta camada de cobre. As hastes serão dispostas em triângulo, espaçadas igualmente com distância mínima de 3,0m e conectadas com cabo de cobre nu 50,0mm² de 7 fios de 3,0mm. A conexão entre as hastes e o cabo de cobre nu será feita com solda exotérmica, visando evitar processos de oxidação comuns no uso de conectores, no intuito de possuir uma maior durabilidade das instalações.

Todas as partes metálicas normalmente não energizadas deverão sera terradas com cabos de cobre flexíveis com bitola mínima de 6,0mm² com isolação na cor verde.

4.4.3.1.2 Quadro a ser Implantado na escola:

QD2

O Quadro de Distribuição (QD2) será do tipo embutir, conforme projeto, será instalado no corredor de circulação da edificação, a uma altura de 1,50 m. O seu alimentador será proveniente do quadro de medição através de cabos 16mm² 0,6/1kVpara as fases, 16mm² 0,6/1kV para o neutro e 16mm² 0,6/1kV para a proteção (terra), isolação em PVC 70°C, e instalados em eletroduto de PVC rígido com bitola de 1¼", conforme projeto. Este quadro deverá obedecer ao solicitado no diagrama unifilar, multifilar e no esquemático interno contido no projeto.

No interior do QD2, serão instalados os seguintes componentes:

- Disjuntores conforme NBR 5410, padrão Europeu fixados em trilho DIN 35mm, curva C, capacidade de interrupção mínima de 3,0kA, monopolares e bipolares, de acordo com a norma NBR 60898;
- Dispositivos de Proteção Contra Surtos (DPS) entre fase e o terra e, entre neutro e terra:
- Classe II;
- Tensão Nominal 175V;
- Corrente nominal de 40kA para a onda 8/20 μs;
- Dispositivos diferenciais residuais tipo interruptor bipolar com corrente nominal 25ª e corrente diferencial residual de 30,0mA.

4.4.3.1.3 Tubulações e Rotas das Instalações Elétricas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RORAIMA
Fls. 14
Rúbrica

Rotas acima do forro:

Eletrodutos

- Os lances de eletrodutos devem ser menores que 15m e evitar trechos com mais de 2 curvas de 90°;
- Os eletrodutos deverão ser fixados acima do forro através de abraçadeiras tipo D com cunha ou tirantes rígidos;
- Eletrodutos serão rígidos de PVC roscável e terão bitola mínima de Ø3/4";
- Eletrodutos com Ø3/4": o raio interno das curvas deve ser maior que 150mm;
- Eletrodutos com Ø1": o raio interno das curvas deve ser maior que 320mm;
- As conexões dos Eletrodutos nas caixas de passagem e quadros deverão ser feitas com buchas e arruelas de alumínio.

Caixas de saída e passagem

Caixas de saída e passagem para dutos, serão em PVC ou aço pintado a pó, conforme projeto.

4.4.3.1.4 Rede de Iluminação

A rede de iluminação da escola tipo I foi projetada conforme as normas existentes, em especial a NBR 8995-1 2013 e RDC 50/2002.

Conforme definido em norma foram projetadas para o interior da escola as seguintes quantidades de lux, para cada ambiente:

Salas 300 lux
Circulação 200 lux
Direção 200 lux
Copa 300 lux

Luminárias

Iluminação de Emergência

Deve ser instalada iluminação de emergência de LED bivolt 20W nos locais previstos em projeto para prover iluminação adequada em caso de falta de energia, no intuito de evitar pânico e indicar a rota de fuga até a parte externa da edificação.

A luminária de emergência será instalada fixada diretamente no forro e alimentada por ponto de tomada 2P+T 20A localizado no forro.

Com as principais características:

- Alimentação por tomada no circuito exclusivo no quadro de distribuição;
- Acendimento automático;
- Sistema carregador automático;
- Circuito limitador de descarga de bateria;
- Baterias do tipo: "livre de manutenção" incorporadas internamente ao seugabinete;
- Recarga automática;
- Autonomia mínima de 1 hora com acionamento total da iluminação.

A Iluminação em Geral da edificação:

A iluminação da edificação é feita utilizando luminária tipo plafon na cor branca com soquete E-27 em porcelana 4A/250V e lâmpada LED tipo pera com potência de20W, cor 6500K e iluminância mínima de 1000 lumens;

A Iluminação em externa - arandelas:

A iluminação externa da edificação é feita utilizando luminária arandela tipo tartaruga, com vidro leitoso e corpo em metal com pintura a pó na cor branca com soquete E-27 em porcelana 4A/250V e lâmpada LED tipo pera com potência de 20W, cor branca 6500K e iluminância mínima de 500 lumens;

Interruptores: Deverão ser fornecidos completos, de embutir, conforme indicado em projeto, com placa, base monopolar, 10A/250V, cor branca.

4.4.3.1.5 Rede Comum

Tomadas:

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 45
Rúbrica

As tomadas de rede comum do piso deverão ser do tipo 2P+T em caixa de alumínio 4x4", com espelho, conforme indicado em projeto. As tomadas de rede comum das paredes deverão ser do tipo 2P+T em caixa de PVC 4x2" com espelho, para uma tomada, conforme projeto.

Deverão ser utilizadas tomadas, 2P+T 20A - 250V em ambientes externos, bancadas, abrigo do compressor e nos equipamentos específicos. Nos demais locais utilizar tomadas 2P+T 10A - 250V, todas deverão ser de cor branca.

Identificação:

Será executado identificação externa por meio de etiquetas contendo o Circuito, a tensão 127V ou 220V e a capacidade de corrente 10 ou 20A na parte externa da tampa e deverá existir identificação conforme indicado a seguir:

4.4.3.1.6 Ar Condicionado

O sistema de refrigeração da edificação será baseado no uso de Ar

Condicionado tipo Split com a potência de 12000BTU's na tensão 230V instaladas nos ambientes definidos em projeto.

4.4.3.2 REDE DE LÒGICA E TELEFÔNICA

A edificação não possuirá sistema de telefonia ou rede lógica, tendo em vista que na localidade não há concessionária de telefonia. Caso a edificação seja contemplada com internet via satélite, os equipamentos serão instalados na sala de comunicação já com rack adequado e serão alimentados pelas tomadas existentes com o uso de nobreak adequado. Nesse caso, não há a necessidade de cabeamento, pois são instalados sistemas wifi.

4.4.3.3 SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Realizou-se o cálculo do gerenciamento da análise de risco, conformeNBR5419/2015 parte 2, não sendo necessária a implantação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas para a proteção da edificação, uma vez que o valor isco calculado ficou abaixo do valor máximo normativo. Para tanto, deve ser instaladas apenas Medidas de Proteção contra Surtos – MPS baseados no uso de dispositivos de proteção contra surtos - DPS coordenados. Conforme será apresentado posteriormente.

Os DPS deverão ser instalados em dois pontos das instalações elétricas:

Entrada de energia:

Serão instalados de entrada de energia, em quadro de distribuição geral de baixa tensão instalado na face interna da mureta de medição, dois DPS classe I/II com tensão de 175V e capacidade de corrente de 12,5kA para onda 10/350μs e 60kA de capacidade de corrente para a onda 8/20μs. Os DPS serão instalados entre as duas fases e o barramento de proteção (terra). Nesse ponto, devido ao sistema TN-S, não há a necessidade de DPS para o neutro.

Quadro de distribuição da escola (QD2):

Serão instalados três DPS classe II com tensão de 175V e capacidade de corrente de 40kA para a onda 8/20μs. Os DPS serão instalados entre as duas fases e o barramento de terra e entre o neutro e o barramento de terra. O aterramento será o mesmo da entrada de energia, conforme descrito anteriormente.

O cálculo do gerenciamento da análise de risco foi feito utilizando o Software TUPAN 2018 em planilha Excel, desenvolvido e fornecido pela IEE/USP. A seguir é apresentado o resumo dos resultados obtidos.

Projeto:

Escola Municipal Indigena

Dimensões da estrutura

Zona: externa

Área de exposição equivalente AD [m2] 1193

Influências ambientais

Localização (cD): Estrutura isolada

Frequência de descarga para terra NG [1/km2/ano]: 3,8

Tipo de solo: Mármore, Cerâmico

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 16
Rúbrica

Tipo de estrutura:
Locais onde falhas de sistemas internos não causam perdas devidas humanas
Risco de incêndio (rf): Nenhum
Perigo especial (hz):
Dificuldade de evacuação (ex.:presença de pessoas imobilizadas-hospitais)
Número de pessoas na zona: 10
Serviços conectados:
Largura da blindagem ou distância entre as descidas w1 [m] 8,3333
Largura da blindagem ou distância entre as descidas w2 [m] 8,3333
Medidas de proteção
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA): sem SPDA
Meios para restringir as consequências de incêndio (rp):
Extintores manuais, alarmes manuais, hidrantes, rotas de fuga protegidas ou compartimentos à prova de fogo
Contra tensão de toque ou passo na estrutura (PTA):
Nenhuma medida de proteção
Contra tensão de toque ou passo na linha (PTA):
Nenhuma medida de proteção
Atributos da linha conectada:
Linha de energia
Fator ambiental da linha: Rural
Fiação interna:
Não blindado precaução para evitar grandes laços
Tensão suportável de impulso atmosférico no sistema [kV] 2,5kV
Dispositivo de proteção contra Surto DPS (PSPD): I
Modo de instalação da linha (CI): Enterrado
Linha de telecomunicação
Fator ambiental da linha:
Nenhuma linha externa
Fiação interna:
Nenhuma linha externa
Tensão suportável de impulso atmosférico no sistema [kV]
Nenhuma linha externa
Dispositivo de proteção contra Surto DPS (PSPD):
Nenhuma linha externa
Modo de instalação da linha (CI):
Nenhuma linha externa
Resultado

4.4.4. FINAL DE OBRA

Ao final da obra todas as instalações deverão ser testadas e estarem em perfeito funcionamento, não apresentando qualquer avaria que impossibilite seu uso pleno em acordo com as normas técnicas brasileiras.
A instalação elétrica deverá possuir niveis adequados de tensão, conforme projeto.
As luminárias deverão ser entregues limpas e em funcionamento adequado.
O interior dos quadros, caixas de passagem e demais componentes elétricos deverá ser entregue limpo, livre de poeira e não deverá apresentar contatos vivos exposto são operador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 17
Rúbrica

Os eletrodutos provenientes de caixas de passagens externas deverão ser entregues limpos e tampados com massa de calafetar para inibir a entrada de água, animais e insetos.

4.5 - Diversos

A placa de inauguração metálica, *40* cm x *60* cm e a placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, borda polida, de *25 x 8*, as cores serão definidas pela secretaria de educação municipal.

5. LOCAIS DE TRABALHO

Os trabalhos serão realizados na Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi _ Comunidade São Mateus_Uiramutã /RR

6. SISTEMA DE TRABALHO

As atividades serão executadas por equipes de operários da Contratada, comandadas por seus encarregados. As equipes de trabalho deverão estar permanentemente uniformizadas e munidas de ferramentas, equipamentos proteção individual – EPI's, equipamentos de proteção coletiva – EPC's e materiais de consumo necessários à execução completa das tarefas. Caberá a Fiscalização elaborar a programação de serviços, supervisionar e fiscalizar a sua execução.

Os trabalhos serão executados de acordo com programação prévia, através de **Ordens de Serviço** indicando o tipo de trabalho a ser realizado, o efetivo de operários a ser utilizado, os locais de trabalho, os prazos de execução e o quantitativo do serviço.

Será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Uiramutã-RR o fornecimento de caminhões para o recolhimento da produção dos serviços.

A programação de serviços será repassada previamente à Contratada, por meio de **Ordens de Serviço** devidamente assinada pelo Executivo Municipal, ou seu preposto, onde deverão necessariamente constar as seguintes informações:

a) Tipo de serviço a ser executado;
b) Local de execução do serviço;
c) Horários de execução;
d) Prazo de execução;
e) Quantitativo físico do serviço (quando for viável a sua mensuração);

7. MEDIÇÃO E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS

O pagamento pela execução dos serviços será feito mensalmente, poderão ser antecipados desde que sejam comprovadas as proativas do cronograma físico, com o aprova da fiscalização de acordo com os quantitativos de serviços executados e medidos.

A medição dos serviços, para efeito de faturamento e cobrança, será feita em períodos mensais, segundo calendário oficial.

8. INSTALAÇÕES FÍSICAS

A Contratada deverá dispor de instalações físicas compatíveis com o tamanho do efetivo que utilizará na prestação dos serviços, devendo atender as Normas de Saúde e Segurança do Trabalho, em especial a **NR 9**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 18
Rúbrica

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. Tais locais deverão ser dotados de vestiários e sanitários para ambos os sexos, refeitórios e almoxarifado.

Recomenda-se que a Contratada disponha de postos de serviço, de forma a minimizar tempos de deslocamento, custos de transporte para as frentes e serviço e despesas com prestação de serviços em horários extraordinários, uma vez que deverão ser cumpridos os horários de execução das atividades determinados pelo FISCALIZAÇÃO.

Nos postos de trabalho cuja prestação de serviços seja de forma rotineira, como é o caso dos operários alocados nas atividades de limpeza externa e carregamento de descarregamento manual de caminhões, caberá ao Fiscalização, ou ao órgão de prestação dos serviços, dispor das instalações necessárias para uso destes operários.

9. HORÁRIOS DE TRABALHO

Em geral os serviços se darão dentro das jornadas definidas, a seguir:

Turnos e horários normais de trabalho

Horários: 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h

Turno: Segundas a Sábados

Os serviços cuja medição será feita por produtividade deverão ser iniciados, diariamente, no máximo 15 minutos após os horários de início dos turnos de trabalho definidos acima.

10. RECURSOS HUMANOS

Para a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico a Contratada deverá disponibilizar um número mínimo de operários, devidamente capacitados para as atividades nas quais serão alocados.

A alocação de número de operários igual ou superior ao exigido pelo Fiscalização, em determinada atividade, não o obriga ao pagamento pela total execução dos serviços programados, se estes não tiverem sido concluídos.

Além do número mínimo de operários exigido acima, a Contratada deverá possuir, **no mínimo**, os seguintes profissionais:

01 (um) Mestre de obras com dedicação exclusiva aos serviços prestados ao Município munido de telefone celular e com autonomia para tomar decisões imediatas e resolver problemas de cunho operacional e o engenheiro civil, responsável com contato de prontidão para dirimir dúvidas da equipe de trabalho e a fiscalização.

A Contratada deverá cumprir e fazer cumprir todas as determinações que, em matéria de saúde e segurança do trabalho, os diferentes estatutos legais determinam ou venham a determinar como de observância obrigatória pelas empresas que possuem empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, independentemente do tipo de contrato de trabalho firmado com seus trabalhadores. Este compromisso deverá contemplar as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n.º 3214 do Ministério do Trabalho, na sua redação atual e também nas alterações que esta eventualmente possa vir a sofrer durante o período de vigência do contrato.

Deverão ser oferecidas condições mínimas de saúde, através do desenvolvimento de ações em saúde e do provimento de materiais e equipamentos, que assegurem a segurança dos trabalhadores em relação à saúde e integridade dos mesmos especialmente dentro do ambiente de trabalho.

Todo pessoal envolvido na execução dos serviços, como operários, operadores de máquinas, encarregados, supervisores, gerente operacional e técnicos de segurança do trabalho, deverão ser do quadro funcional da Contratada, sendo vedada a subcontratação.

11. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

A empresa contratada deverá fornecer gratuitamente aos seus operários, no mínimo, os seguintes uniformes e EPI's:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 19
Rúbrica

Camisetas em malha de algodão – 6 unidades por ano;
Calças – 4 unidades por ano;
Bonés – 2 unidades por ano;
Botinas de segurança – 2 pares por ano;
Botas de borracha/pvc – 1 par
Luvas de proteção – 12 unidades por ano (para todos os operários e com especificações de acordo com a atividade realizada);
Capas de chuva – 1 unidade por ano;
Coletes reflexivos – 1 unidade por ano;
Óculos de proteção – 2 unidades por ano (para operadores de roçadeira e sopradores, e demais integrantes da equipe de roçada);
Protetores auriculares – 2 unidades por ano (para operadores de roçadeira e sopradores, e demais integrantes da equipe de roçada);
Perneira de couro – 1 unidade por ano (para operadores de roçadeira); □□Protetor facial – 1 unidade a cada 2 anos (para os operários que portam a rede de proteção);
Protetor solar – para todos os operários e encarregados que executarem atividades expostas a raios solares.
Observação: Os operadores de motosserra deverão portar equipamentos de proteção individuais específicos para esta atividade.
As quantidades indicadas acima são mínimas. As peças deverão ser repostas gratuitamente sempre que se apresentarem desgastadas, destruídas ou impróprias para a sua finalidade. A Fiscalização poderá determinar a substituição dos equipamentos.
A responsabilidade pela manutenção, reposição e higienização destes materiais será de exclusividade da Contratada.
A critério dos Técnicos de Segurança do Trabalho da Contratada, poderão ser utilizados outros equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, além dos exigidos neste projeto básico.
Em nenhuma hipótese será permitido, parte dos trabalhadores da Contratada, o desenvolvimento dos serviços especificados neste projeto básico, sem a devida utilização dos uniformes e EPI's listados anteriormente.
Os equipamentos de proteção coletiva, listados anteriormente, deverão obedecer às seguintes especificações:
Rede de proteção: deverão ser confeccionadas em tela de aço, com malha de abertura com dimensões inferiores a 2mm (dois milímetros), altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) e largura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros). O modelo de rede a ser utilizado pela Contratada deve ser aprovado pela Fiscalização.
Cones de sinalização viária: deverão atender o que recomenda a NBR 15.071.
A critério dos Técnicos de Segurança do Trabalho da Contratada, poderão ser utilizados outros equipamentos de proteção coletiva, além dos exigidos neste projeto básico.

12. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

As ferramentas e equipamentos necessários a execução dos serviços deverão ser fornecidas pela Contratada, devendo estar permanentemente disponíveis para uso nos serviços contratados.
Deverão ser disponibilizados para uso, quantidades mínimas de ferramentas e equipamentos.
A indisponibilidade de ferramentas para execução das atividades nas unidades de serviço, além das sanções contratuais cabíveis, implicará no não pagamento das horas de trabalho dos operários designados para as tarefas.
As ferramentas e equipamentos deverão obedecer às seguintes especificações:
Vassouras: As vassouras utilizadas no serviço de varrição manual deverão ter cerdas medianamente rígidas, cujo comprimento não poderá ser inferior à 12 (doze) centímetros, e com cabo de comprimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 20
Rúbrica

ergonomicamente compatível com a estatura do varredor, de modo a não exigir a curvatura da coluna vertebral durante a execução do serviço. A cepa e o cabo deverão ser confeccionados em material leve e resistente.

13. MATERIAIS DE CONSUMO

Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todo material necessário à operação dos sopradores, roçadeiras e motosserras, tais como: combustíveis, óleos, graxas e acessórios de corte, sendo também de sua responsabilidade a manutenção das mesmas.

Os **sacos de lixo** necessários ao acondicionamento dos resíduos resultantes dos serviços de varrição, roçada e limpezas diversas deverão ser fornecidos pela

Contratada, de acordo com as seguintes especificações:

- Capacidade em volume não inferior a 100 litros;
- Espessura do filme não inferior a 0,03 mm;
- Largura de 75 cm, com variação admissível de 2 cm;
- Comprimento de 105 cm, com variação admissível de 2,5 cm;
- Resistência longitudinal a tração do filme não inferior a 2 N/cm;
- Resistência transversal a tração do filme não inferior a 2 N/cm.

14. FISCALIZAÇÃO

Caberá à Fiscalização designada o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais. A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver havendo atendimento às cláusulas contratuais.

A Fiscalização terá direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da Contratada, alocado na prestação de serviços, cuja produtividade não estiver sendo satisfatória. Também terá poderes para solicitar a substituição de funcionários que apresentarem comportamento desrespeitoso para com a população, estiverem drogados ou alcoolizados ou que estiverem solicitando propina.

15. OBRIGAÇÕES DA(S) CONTRATADA(S)

Além das disposições contidas neste projeto básico, a Empresa Contratada estará sujeita às seguintes obrigações:

15.1. Disponibilizar o número mínimo de operários, indicados neste Projeto Básico;

15.2. Quando houver necessidade de alteração no quantitativo do efetivo a serviço da Prefeitura, promover esta alteração no prazo máximo de 07 (sete) dias a contar da data da solicitação;

15.3. Manter seus funcionários sempre identificados e uniformizados durante a execução dos serviços;

15.4. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionários em serviço, causados a terceiros ou a Prefeitura, mesmo quando utilizando equipamentos da Prefeitura;

15.5. Capacitar seus funcionários ao uso dos equipamentos e ferramentas postos a sua disposição para a execução das tarefas;

15.6. Executar o serviço de forma silenciosa, ordeira e com urbanidade para com a população;

15.7. Substituir qualquer componente da equipe que apresentar comportamento inadequado ou indecoroso ou não demonstrar qualificação para os serviços, objeto deste Projeto Básico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

15.8. Não permitir que componentes das equipes de trabalho, enquanto estiverem a serviço da Prefeitura, executem serviço para terceiros;

15.9. Manter as equipes de trabalho com todas as ferramentas, equipamentos e insumos exigidos no Projeto Básico em perfeitas condições de uso;

COPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 21
Rúbrica

15.10. Não permitir que seus funcionários solicitem à população gratificações ou contribuições materiais de qualquer espécie, mesmo quando da ocorrência de datas festivas;
15.11. Manter nas frentes de serviço pessoa autorizada a atender e fazer cumprir as determinações da Fiscalização;
15.12. Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela Fiscalização na execução dos serviços;
15.13. Manter a Fiscalização atualizado quanto à frota utilizada para transporte
dos operários e ferramentas/equipamentos ocupados na execução dos serviços, informando placas e prefixos de cada veículo;
15.14. Fornecer, ao supervisor, telefone celular, que deverá permanecer ligado enquanto houver serviços em execução;
15.15. Cumprir todas as disposições legais pertinentes à saúde e segurança do trabalho as quais estão sujeitos contratos de trabalho regidos pela CLT, independente do seu quadro de pessoal enquadrar-se nesta situação;
15.16. Acatar, em todos os seus termos, as determinações de segurança que venham a ser implantadas através de Ordens de Serviço expedidas;
15.17. Atender a todas as solicitações feitas pela Fiscalização para o fornecimento de informações e dados sobre os serviços, indicadores de acidentes de trabalho ou outros referentes à gestão de medicina e segurança do trabalho, dentro dos prazos estipulados;
15.18. Promover a vacinação de todos funcionários contra gripe, hepatite B e tétano, devido à exposição, durante o processo de trabalho, a intempéries e agentes biológicos potencialmente infectantes;
15.19. Desenvolver programa de capacitação contínua para prevenção de acidentes, com a realização de capacitação admissional e reciclagem, com frequência trimestral ou inferior;
15.20. Prover treinamento básico em primeiros socorros, bem como materiais de primeiros socorros que fiquem próximos e de fácil acesso aos funcionários, quando no exercício das tarefas de trabalho – Caixa de Primeiros Socorros;
15.21. Fornecer água fresca e potável, armazenada em recipientes adequados, para todos os trabalhadores, conforme especificação da Norma Regulamentadora n.°24 da portaria n.°3.214 do Ministério do Trabalho.
15.22. Disponibilizar banheiros equipados com vasos sanitários e lavatórios para os trabalhadores das equipes que prestam serviços externos, conforme especificação da Norma Regulamentadora n.°24 da portaria n.°3.2 14 do Ministério do Trabalho.
15.23. Obter, se necessário, alvarás e licenciamentos para suas atividades e instalações físicas, tanto próprias, como locadas, ou cedidas por meio de termo de cessão de uso.
15.24. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do contrato;

16. PENALIDADES

O não cumprimento das obrigações dispostas neste projeto básico sujeitará a Contratada, inicialmente, a aplicação da pena de advertência por escrito. Na hipótese de reincidência de qualquer tipo de transgressão, serão aplicadas as seguintes penalidades pecuniárias:
16.1. Por não dispor das ferramentas e/ou equipamentos nas quantidades, especificações e estado de conservação determinados neste projeto básico. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.2. Por executar serviços em vias públicas com trânsito de veículos sem sinalização, ou com sinalização inadequada. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.3. Por executar serviços de roçada com roçadeiras mecânicas sem a utilização de redes de proteção. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.

EMBARGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 22
Rúbrica

16.4. Por danificar o caule de árvores com a utilização de roçadeiras mecânicas.
Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.5. Por utilizar materiais de consumo (sacos de lixo ou tinta para pintura de meio-fio) em desacordo com as especificações deste projeto básico. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.6. Por não dispor da quantidade mínima de operários definidos neste projeto básico, por local, por turno de trabalho e por atividade. Multa de 1 a 10 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por operário, por dia.
16.7. Por não dispor de encarregados e supervisores nas equipes de trabalho. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por encarregado/supervisor, por dia.
16.8. Por permitir que operários executem as atividades sem o uso dos uniformes e equipamentos de proteção individual exigidos neste projeto básico. Multa de 1 a 10 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por operário, por dia.
16.9. Por transportar operários e/ou encarregados em veículos não adequados ao transporte de pessoal. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.10. Por não atendimento as **Ordens de Serviço** expedidas pela Prefeitura, por causas que se caracterizem como de responsabilidade da Contratada, tanto por ação, como por omissão. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.11. Por não cumprir a programação mensal de varrição, por causas que se caracterizem como de responsabilidade da Contratada, tanto por ação, quanto por omissão. Multa de 0,1 a 1 vez o valor unitário da varrição, por quilômetro de meio-fio não varrido.
16.12. Pela descarga ou colocação de produção dos serviços em locais não pela Fiscalização. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.13. Por não cumprir os horários de início e fim das jornadas de trabalho, ressalvadas as tolerâncias de tempo para deslocamento, previstas neste projeto básico. Multa de 0,1 a 1 vez o valor unitário do serviço de varrição contratado, por operário, por dia. Sem prejuízo do desconto na medição do serviço.
16.14. Por não manter a frota de veículos utilizados para a adequada prestação dos serviços nas condições exigidas neste projeto básico. Multa de 1 a 10 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por veículo, por dia.
16.15. Por não atender a solicitação de informações da Fiscalização, dentro dos prazos estipulados. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.16. Por não sanar, no prazo estipulado, irregularidades identificadas pela fiscalização. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.17. Por comportamento desrespeitoso de funcionários com a população durante a execução dos serviços. Multa de 2 a 20 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.18. Por promover, para comercialização ou quaisquer fins, a triagem dos resíduos coletados. Multa de 1 a 10 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.19. Por solicitação de contribuições ou gratificações aos munícipes. Multa de
2 a 20 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.20. Por não atender, dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, pedido de substituição de funcionário. Multa de 1 a 10 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por funcionário, por dia.
16.21. Por não manter, durante os horários de prestação de serviços, seus supervisores munidos de telefone celular em funcionamento. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.22. Por executar, durante os horários de prestação dos serviços, com os equipamentos e/ou as equipes de pessoal, outros serviços que não sejam objeto do contrato com a Prefeitura. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.

Bill Division

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 23
Rúbrica

16.23. Por atrasar o início da prestação dos serviços, conforme data aprazada na "Ordem de Início dos Serviços" a ser expedida pela Prefeitura após a assinatura do contrato. Multa de 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por dia de atraso.
16.24. Por não atender às demais obrigações contratuais. Multa de 10 a 100 vezes o preço unitário do contrato, por irregularidade.
16.25. Para graduação das penalidades pecuniárias, serão adotadas as seguintes escalas:

- Na segunda e na terceira ocorrência de mesma natureza, valor mínimo previsto;
- Na quarta e na quinta ocorrência de mesma natureza, 5 (cinco) vezes o valor mínimo previsto;
- A partir da sexta ocorrência de mesma natureza, para cada ocorrência, o valor máximo previsto.

Além dos motivos previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93 para rescisão do contrato, A Prefeitura poderá rescindi-lo, também, unilateralmente, na ocorrência dos seguintes fatos:

- A paralisação total ou parcial do serviço;
- A subcontratação parcial ou total do serviço;
- O cometimento reiterado de faltas, com aplicação de penalidades também reiteradas.

17. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

As despesas decorrentes da execução do Contrato a ser firmado correrão, no Exercício de 2021, à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho: 12.365.3400.1020.0000
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00
Tipo de Empenho: Do Valor Global
Fontes: RECURSOS DO FUNDEB 30%

Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos com desoneração é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal, pois apresenta a planilha orçamentária de menor valor no comparativo dos valores das planilhas orçamentárias com preços onerados e desonerados, adotou se a NÃO desonerado e será usada no processo.
Conforme Art. 14 e 38 da Lei 8.666/93 c/c art.16, II da LRF, aprovada e assinada pela autoridade competente e fara face às despesas da pretendida Contratação
Serão emitidas Notas de Empenho global à conta da dotação orçamentária especificada neste item, para atender às despesas inerentes à execução do Contrato.

18. PREÇO

O valor anual estimado do presente orçamento é de R$ 494.948,16 **(quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos).**

19. PRAZO DE EXECUÇÃO

O presente contrato deverá ser executado em **60 (Sessenta) dias**, de forma contínua e ininterrupta.

20. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a assinatura do contrato, a Empresa Contratada terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para providenciar o pessoal, ferramentas, equipamentos e instalações necessários à execução dos serviços, conforme definido neste projeto básico.
No final deste prazo, o Prefeito Municipal, acompanhado de seu corpo técnico, procederá visita de vistoria à Empresa, para constatar "in loco" o atendimento integral às condições do contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 24
Rúbrica

21. A APROVAÇÃO

O presente Projeto Básico será submetido à apreciação e aprovação do Senhor Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, nos termos do art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

Uiramutã-RR, 13 de setembro de 2022.

AUTOR DO PROJETO:

Engº Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 0905404068
Autor / Responsável Técnico

APROVO:

Vanderlane James Lima
Secretária de Educação Municipal
de Uiramutã
Portaria: nº 459/2022

Vanderlane James Lima
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Port. 459/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 25
Rúbrica

PLANILHAS DE ORÇAMENTÁRIA (ANEXO 1 DISPONIBILIZADO EM MÍDIA)

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 26
Rúbrica

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha_ Município de Uiramutã/ RR

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Roraima
ORSE - 07/2022 - Sergipe

B.D.I.
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.819,22	4,41 %
2	ALIMENTAÇÃO CANTEIRO	20.673,18	4,18 %
3	DIVERSOS	14.924,32	3,02 %
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	45.418,89	9,18 %
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	22.718,58	4,59 %
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	24.532,96	4,96 %
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	30.051,78	6,07 %
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	21.246,57	4,29 %
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	35.019,46	7,08 %
10	REVESTIMENTO	41.475,24	8,38 %
11	PINTURA	16.190,39	3,27 %
12	ABRIGO DO GÁS DE COZINHA	2.896,19	0,59 %
13	COBERTURA	42.002,35	8,49 %
14	PAVIMENTAÇÃO	42.873,37	8,66 %
15	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	4.705,55	0,95 %
16	CALÇADA DE PROTEÇÃO	18.594,36	3,76 %
17	ESQUADRIAS	20.005,04	4,04 %
18	LOUÇAS E METAIS	8.620,67	1,74 %
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	12.244,54	2,47 %
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	19.461,49	3,93 %
21	COMBATE A INCÊNDIO	641,21	0,13 %
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	28.832,80	5,83 %

Tipo de Licitação Convite
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório Processo Administrativo nº

Total sem BDI 396.229,78
Total do BDI 98.718,38
Total Geral 494.948,16

Engº Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 0905404068

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 27
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Obra
Construção da Escola Municipal Indigena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha_ Municipio de Uiramutã/ RR

Bancos **B.D.I.**
SINAPI 07/22 RR **24,96%**
ORSE 07/2022
SE

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		21.819,22	5.454,81	5.454,81	5.454,81	5.454,81
2	ALIMENTAÇÃO CANTEIRO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		20.673,18	5.168,30	5.168,30	5.168,30	5.168,30
3	DIVERSOS	100,00%	100,00%			
		14.924,32	14.924,32			
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	100,00%	100,00%			
		45.418,89	45.418,89			
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	100,00%	100,00%			
		22.718,58	22.718,58			
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	100,00%		100,00%		
		24.532,96		24.532,96		
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	100,00%		25,00%	75,00%	
		30.051,78		7.512,95	22.538,84	
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	100,00%			60,00%	40,00%
		21.246,57			12.747,94	8.498,63
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	100,00%				100,00%
		35.019,46				35.019,46
10	REVESTIMENTO	100,00%				100,00%
		41.475,24				41.475,24
11	PINTURA	100,00%			20,00%	80,00%
		16.190,39			3.238,08	12.952,31
12	ABRIGO DO GÁS DE COZINHA	100,00%			75,00%	25,00%
		2.896,19			2.172,14	724,05
13	COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%		
		42.002,35	21.001,18	21.001,18		
14	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		25,00%	75,00%	
		42.873,37		10.718,34	32.155,03	
15	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	100,00%			100,00%	
		4.705,55			4.705,55	
16	CALÇADA DE PROTEÇÃO	100,00%		50,00%	50,00%	
		18.594,36		9.297,18	9.297,18	
17	ESQUADRIAS	100,00%			100,00%	
		20.005,04			20.005,04	
18	LOUÇAS E METAIS	100,00%			50,00%	50,00%
		8.620,67			4.310,34	4.310,34
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%		15,00%	45,00%	40,00%
		12.244,54		1.836,68	5.510,04	4.897,82
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%		15,00%	45,00%	40,00%
		19.461,49		2.919,22	8.757,67	7.784,60
21	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%				100,00%
		641,21				641,21
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%		15,00%	45,00%	40,00%
		28.832,80		4.324,92	12.974,76	11.533,12
Porcentagem			**23,17%**	**18,74%**	**30,11%**	**27,97%**
Custo			**114.686,07**	**92.766,53**	**149.035,70**	**138.459,86**
Porcentagem Acumulado			**23,17%**	**41,91%**	**72,03%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**114.686,06**	**207.452,59**	**356.488,29**	**494.948,16**

Engº Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 0905404068

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 28
Rúbrica

OBJETO:
Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha_ Município de Uiramutã/ RR

Banco
SINAPI 07/22 RR
ORSE 07/22 SE

Encargos Sociais (Não Desonerado):
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

LOCAL: MUNÍCIPIO UIRAMUTA / RR **B.D.I. 24,96%**

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A -	**ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	20,00%	20,00%
A2	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1,50%	1,50%
A3	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	1,00%	1,00%
A4	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA	0,20%	0,20%
A5	SERVIÇO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8,00%	8,00%
A9	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO - SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ÍTEM "A"	**36,80%**	**36,80%**
B -	**ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DE "A"**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,07%	Não incide
B2	FERIADOS	5,08%	Não incide
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13° SALÁRIO	10,91%	8,33%
B5	LICENÇA À PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,49%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,50%	6,49%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
	TOTAL DO ÍTEM "B"	**45,90%**	**16,25%**
C -	**ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,14%	3,93%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3	5,20%	3,97%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,84%	2,94%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43%	0,33%
	TOTAL DO ÍTEM "C"	**14,73%**	**11,26%**
D -	**TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REICIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE GRUPO "B"	16,89%	5,98%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
	TOTAL DO ÍTEM "D"	**17,35%**	**6,33%**
	PERCENTUAL TOTAL	**114,78%**	**70,64%**

*OBS: * Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto*

FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVAS - INMET

Eng. Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA RN nº 0905404068

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 29
Rúbrica

COMPOSIÇÕES DO BDI NÃO DESONERADO

Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha_ Município de Uiramutã/ RR

LOCAL DA OBRA

	ITENS PASSÍVEIS DE ACEITAÇÃO NO BDI	Índices			ÍNDICE
		mínimo	médio	máximo	ADOTADO
X	Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
	Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
	Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,10%
	Total				**4,90%**
Y	Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%
	Total				**1,23%**
Z	Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,50%
	Total				**7,50%**
I	**Tributos**				
	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
	ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	CPRB	0,00%	4,50%	4,50%	0,00%
	Total				**8,65%**
	% DE BDI A SER UTILIZADO =				**24,96%**

LEGENDA	
X =	Despesas indiretas (exceto tributos e despesas financeiras)
Y =	Despesas financeiras
Z =	Lucro
I =	Taxa representativa da incidência de impostos

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1+0{,}04900) \times (1+0{,}01230) \times (1+0{,}07500)}{(1-0{,}08650)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1{,}04900) \times (1{,}01230) \times (1{,}07500)}{(0{,}91350)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1{,}14155)}{(0{,}91350)} - 1$$

$$BDI = 1{,}24964 - 1$$

BDI= 24,96%

A FÓRMULA ADOTADA PARA CÁLCULO DO BDI, SEGUE RECOMENDAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013- TCU.

1. Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
2. Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Eng. Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA RN nº 0905404068

Rua Cici Mota, s/n – Centro – Uiramutã - RR
CNPJ: 01.612.681.0001.01

EMBRAER

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 30
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Arthur Nabuco de Araújo- Comunidade Maracanã I_ Município de Uiramutã/ RR

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Roraima
ORSE - 07/2022 - Sergipe

B.D.I.
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**21.819,22**	**4,26 %**
1.1	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64	107,36	134,15	8.585,60	1,68 %
1.2	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	5.295,15	6.616,81	13.233,62	2,58 %
2		**ALIMENTAÇÃO CANTEIRO**					**20.673,18**	**4,04 %**
2.1	3126 ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	1182	14,00	17,49	20.673,18	4,04 %
3		**DIVERSOS**					**14.924,32**	**2,91 %**
3.1	00010848 SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	UN	1	1.341,68	1.676,56	1.676,56	0,33 %
3.2	00010851 SINAPI	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	UN	6	70,83	88,50	531,00	0,10 %
3.3	11397 ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	un	1	750,00	937,20	937,20	0,18 %
3.4	00010527 SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	90,45	13,20	16,49	1.491,52	0,29 %
3.5	2412 ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	un	8	783,38	978,88	7.831,04	1,53 %
3.6	2450 ORSE	Limpeza geral (final da obra)	m²	900	2,19	2,73	2.457,00	0,48 %
4		**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**					**62.798,89**	**12,26 %**
4.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	3,6	550,87	688,38	2.478,09	0,48 %
4.2	6096 ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	613,28	766,35	766,35	0,15 %
4.3	11125 ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10.1 kw - Rev 01	un	1	2.205,77	2.756,33	2.756,33	0,54 %
4.4	82 ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e	un	1	14.992,56	18.734,70	18.734,70	3,66 %
4.5	99059 SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	35	42,57	53,19	1.861,65	0,36 %
4.6	98524 SINAPI	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	m²	900	2,60	3,24	2.916,00	0,57 %
4.7	9203 ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	32729,81	0,50	0,62	20.292,48	3,96 %
4.8	100948 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11397,63	0,92	1,14	12.993,29	2,54 %
5		**INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES**					**22.718,58**	**4,43 %**
5.1	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	7,8	68,75	85,91	670,09	0,13 %
5.2	96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	2	41,68	52,08	104,16	0,02 %
5.3	92263 SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	26,2	147,28	184,04	4.821,84	0,94 %
5.4	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	26,2	119,45	149,26	3.910,61	0,76 %
5.5	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	14,8	37,80	47,23	699,00	0,14 %
5.6	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,8	726,75	908,14	4.359,07	0,85 %
5.7	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,8	191,34	239,09	1.147,63	0,22 %
5.8	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	39,76	21,73	27,15	1.079,48	0,21 %
5.9	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	273,12	17,37	21,70	5.926,70	1,16 %
6		**INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME**					**24.532,96**	**4,79 %**
6.1	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	1,66	68,75	85,91	142,61	0,03 %
6.2	96539 SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	36,78	111,41	139,21	5.120,14	1,00 %
6.3	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	13,4	37,80	47,23	632,88	0,12 %
6.4	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,87	726,75	908,14	4.422,64	0,86 %
6.5	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,87	191,34	239,09	1.164,36	0,23 %
6.6	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	62,97	21,73	27,15	1.709,63	0,33 %
6.7	92777 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	148,7	19,41	24,25	3.605,97	0,70 %

BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 31
Rúbrica

6.8	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	25,93	160,45	200,49	5.198,70	1,01 %
6.9	98557 SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	m²	53,65	37,83	47,27	2.536,03	0,50 %
7		**SUPERESTRUTURA - PILARES**					**30.051,78**	**5,87 %**
7.1	92263 SINAPI	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44	147,28	184,04	11.307,41	2,21 %
7.2	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44	119,45	149,26	9.170,53	1,79 %
7.3	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	3,34	726,75	908,14	3.033,18	0,59 %
7.4	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,34	191,34	239,09	798,56	0,16 %
7.5	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	65,63	21,73	27,15	1.781,86	0,35 %
7.6	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10.0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	182,5	17,37	21,70	3.960,25	0,77 %
8		**SUPERESTRUTURA - VIGAS**					**21.246,57**	**4,15 %**
8.1	92265 SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	38,88	117,63	146,99	5.714,97	1,12 %
8.2	92455 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de maceira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	38,88	128,86	161,02	6.260,45	1,22 %
8.3	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	3,74	726,75	908,14	3.396,44	0,66 %
8.4	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m²	3,74	191,34	239,09	894,19	0,17 %
8.5	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	KG	65,43	21,73	27,15	1.776,42	0,35 %
8.6	92776 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	124,19	20,65	25,80	3.204,10	0,63 %
9		**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**					**35.019,46**	**6,84 %**
9.1	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	203,04	118,45	145,51	29.544,35	5,77 %
9.2	93201 SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e	M	55,83	6,24	7,79	434,91	0,08 %
9.3	93186 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	23	66,32	82,87	1.906,01	0,37 %
9.4	93188 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	22	57,57	71,93	1.582,46	0,31 %
9.5	93196 SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	19	65,36	81,67	1.551,73	0,30 %
10		**REVESTIMENTO**					**41.475,24**	**8,10 %**
10.1	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	406,08	7,65	9,55	3.878,06	0,76 %
10.2	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	406,08	36,80	45,98	18.671,55	3,64 %
10.3	87528 SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	m²	111,36	43,62	54,50	6.069,12	1,18 %
10.4	87274 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	111,36	92,39	115,45	12.856,51	2,51 %
11		**PINTURA**					**16.190,39**	**3,16 %**
11.1	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	406,08	2,30	2,87	1.165,44	0,23 %
11.2	88497 SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	m²	203,04	14,27	17,83	3.620,20	0,71 %
11.3	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrilica em paredes, duas demãos	m²	203,04	17,44	21,79	4.424,24	0,86 %
11.4	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta acetinada em paredes, duas demãos.	m²	406,08	13,76	17,19	6.980,51	1,36 %
12		**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**					**2.896,19**	**0,57 %**
12.1	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	1,2	116,45	145,51	174,61	0,03 %
12.2	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	2,6	7,65	9,55	24,83	0,00 %
12.3	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	2,6	36,80	45,98	119,54	0,02 %
12.4	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	3,98	2,30	2,87	11,42	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 32
Rúbrica

12.5	8824 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	3,98	17,44	21,79	86,72	0,02 %
12.6	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	3,98	13,76	17,19	68,41	0,01 %
12.7	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	1,46	726,75	908,14	1.325,88	0,26 %
12.8	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,46	191,34	239,09	349,07	0,07 %
12.9	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1	588,76	735,71	735,71	0,14 %
13		**COBERTURA**					**42.002,35**	**8,20 %**
13.1	283 ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	185,13	61,23	76,51	14.164,29	2,76 %
13.2	92540 SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	185,13	54,03	67,51	12.498,12	2,44 %
13.3	94223 SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	M	32,24	111,49	139,31	4.491,35	0,88 %
13.4	55960 SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	185,13	6,03	7,53	1.394,02	0,27 %
13.5	4449 ORSE	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro	m²	130,57	57,95	72,41	9.454,57	1,85 %
14		**PAVIMENTAÇÃO**					**42.873,37**	**8,37 %**
14.1	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	19,57	41,68	52,08	1.019,20	0,20 %
14.2	87890 SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	130,57	58,26	72,80	9.505,49	1,86 %
14.3	87630 SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	130,57	46,39	57,98	7.567,83	1,48 %
14.4	87255 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	130,57	137,82	172,21	22.485,45	4,39 %
14.5	88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	92	19,97	24,95	2.295,40	0,45 %
15		**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**					**4.705,55**	**0,92 %**
15.1	98689 SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF_06/2018	M	4,5	112,21	140,21	630,94	0,12 %
15.2	88648 SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	M	96,06	8,95	11,18	1.073,95	0,21 %
15.3	101965 SINAPI	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	M	18,8	127,73	159,61	3.000,66	0,59 %
16		**CALÇADA DE PROTEÇÃO**					**18.594,36**	**3,63 %**
16.1	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	3,97	68,75	85,91	341,06	0,07 %
16.2	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	2,78	41,68	52,08	144,78	0,03 %
16.3	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	19,9	160,45	200,49	3.989,75	0,78 %
16.4	94994 SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	72,77	139,44	174,24	12.679,44	2,47 %
16.5	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	25,92	7,65	9,55	247,53	0,05 %
16.6	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	25,92	36,80	45,98	1.191,80	0,23 %
17		**ESQUADRIAS**					**20.005,04**	**3,90 %**
17.1	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	310,43	387,91	1.939,55	0,38 %
17.2	94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18	781,55	976,62	17.579,16	3,43 %
17.3	94559 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,48	810,82	1.013,20	486,33	0,09 %
18		**LOUÇAS E METAIS**					**8.620,67**	**1,68 %**
18.1	2390 ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	un	2	188,30	235,29	470,58	0,09 %
18.2	8974 ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	un	2	1.065,16	1.331,02	2.662,04	0,52 %
18.3	95548 SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	UN	2	141,78	177,14	354,28	0,07 %
18.4	86931 SINAPI	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2	452,91	565,96	1.131,90	0,22 %
18.5	00000377 SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	UN	2	35,25	44,04	88,08	0,02 %
18.6	86943 SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	3	209,09	261,27	783,81	0,15 %
18.7	2050 ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	un	2	25,21	31,50	63,00	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 33
Rúbrica

18.8	2103 ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodapia 7cm, concretada e assentada	un	1	823,50	1.029,04	1.029,04	0,20 %
18.9	2093 ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	un	1	1.630,88	2.037,94	2.037,94	0,40 %
19		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**12.244,54**	**2,39 %**
19.1	93243 SINAPI	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saida, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	UN	1	6.872,09	8.587,36	8.587,36	1,68 %
19.2	89446 SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	M	28,9	5,76	7,19	207,79	0,04 %
19.3	89448 SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	M	30,1	17,32	21,64	651,36	0,13 %
19.4	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	19,75	12,41	15,50	306,12	0,06 %
19.5	89362 SINAPI	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	UN	8	8,20	10,24	81,92	0,02 %
19.6	89364 SINAPI	Curva 90° soldável 25 mm água fria	UN	2	11,16	13,94	27,88	0,01 %
19.7	90373 SINAPI	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	11	14,02	17,51	192,61	0,04 %
19.8	1144 ORSE	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	un	6	13,26	16,58	99,36	0,02 %
19.9	89497 SINAPI	Joelho 90° soldável 40mm água fria	UN	3	12,29	15,35	46,05	0,01 %
19.10	1466 ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	3	102,73	128,37	385,11	0,08 %
19.11	88383 SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	UN	14	5,81	7,26	101,64	0,02 %
19.12	1470 ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	1	80,52	100,61	100,61	0,02 %
19.13	89395 SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	6	11,40	14,24	85,44	0,02 %
19.14	89420 SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	1	9,31	11,63	11,63	0,00 %
19.15	89623 SINAPI	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	UN	5	19,33	24,15	120,75	0,02 %
19.16	3147 ORSE	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	1	19,02	23,76	23,76	0,00 %
19.17	94491 SINAPI	Registro de esfera soldável 40mm	UN	1	43,62	54,50	54,50	0,01 %
19.18	94489 SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	UN	1	21,79	27,22	27,22	0,01 %
19.19	74166/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	752,69	940,56	940,56	0,18 %
19.20	2082 ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3	51,45	64,29	192,87	0,04 %
20		**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**19.461,49**	**3,80 %**
20.1	89711 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	M	9,1	18,38	22,98	208,93	0,04 %
20.2	89712 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	12,4	26,93	33,65	417,26	0,08 %
20.3	89714 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	28	51,65	64,54	1.807,12	0,35 %
20.4	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	8,4	12,41	15,50	130,20	0,03 %
20.5	89796 SINAPI	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	3	37,24	46,53	139,59	0,03 %
20.6	1588 ORSE	Tê sanitário em PVC rigido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	un	1	48,25	60,29	60,29	0,01 %
20.7	89785 SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	1	19,93	24,90	24,90	0,00 %
20.8	1603 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	un	10	11,22	14,02	140,20	0,03 %
20.9	1554 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	un	10	10,84	13,54	135,40	0,03 %
20.10	89744 SINAPI	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	UN	4	22,56	28,19	112,76	0,02 %
20.11	89732 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	UN	1	10,64	13,29	13,29	0,00 %
20.12	89726 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	UN	2	6,51	8,13	16,26	0,00 %
20.13	89750 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	2	59,30	74,10	148,20	0,03 %
20.14	89735 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	2	18,05	22,56	45,10	0,01 %
20.15	89709 SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	3	9,98	12,47	37,41	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 34
Rúbrica

20.16	89707 SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no mínimo 3 entradas e greiha tipo abre e fecha	UN	3	27,35	34,17	102,51	0,02 %
20.17	1536 ORSE	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	2	18,57	23,20	46,40	0,01 %
20.18	98078 SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	1	4.377,10	5.469,62	5.469,62	1,07 %
20.19	98082 SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	1	4.060,16	5.073,57	5.073,57	0,99 %
20.20	2796 ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforcada, revestida internamente com barra lisa e fundo em	un	8	533,42	666,56	5.332,48	1,04 %
21		**COMBATE A INCÊNDIO**					**641,21**	**0,13 %**
21.1	101909 SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	2	215,71	269,55	539,10	0,11 %
21.2	10363 ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	2	24,97	31,20	62,40	0,01 %
21.3	11852 ORSE	Placa de sinalização padrão para saida de emergência 400x120mm	Un	1	31,78	39,71	39,71	0,01 %
22		**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**28.832,80**	**5,63 %**
22.1	91940 SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	46	14,35	17,93	824,78	0,16 %
22.2	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	62,6	2,81	3,51	219,72	0,04 %
22.3	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	76,6	2,81	3,51	268,86	0,05 %
22.4	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	52,6	2,81	3,51	184,62	0,04 %
22.5	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	142,2	2,81	3,51	499,12	0,10 %
22.6	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	142,2	4,13	5,16	733,75	0,14 %
22.7	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	82,6	4,13	5,16	426,21	0,08 %
22.8	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	188,3	4,13	5,16	971,62	0,19 %
22.9	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	153,9	4,13	5,16	794,12	0,16 %
22.10	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem	M	40	25,10	31,36	1.254,40	0,24 %
22.11	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem	M	40	25,10	31,36	1.254,40	0,24 %
22.12	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem	M	40	25,10	31,36	1.254,40	0,24 %
22.13	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem	M	40	25,10	31,36	1.254,40	0,24 %
22.14	2794 ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	un	3	274,28	342,74	1.028,22	0,20 %
22.15	91993 SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	UN	14	38,99	48,72	682,08	0,13 %
22.16	91973 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	81,59	101,95	203,90	0,04 %
22.17	91957 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	43,47	54,32	108,64	0,02 %
22.18	91969 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	68,66	85,79	171,58	0,03 %
22.19	91953 SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	2	23,95	29,92	59,84	0,01 %
22.20	91959 SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	1	37,84	47,28	47,28	0,01 %
22.21	12241 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	275,71	344,52	344,52	0,07 %
22.22	10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo	un	2	122,14	152,62	305,24	0,06 %
22.23	93862 SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo	UN	6	55,41	69,24	415,44	0,08 %
22.24	93855 SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	UN	8	12,28	15,34	122,72	0,02 %
22.25	91863 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	M	75	11,60	14,49	1.086,75	0,21 %
22.26	91864 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	M	9,4	15,35	19,18	180,29	0,04 %
22.27	91871 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	M	50,3	12,29	15,35	772,10	0,15 %
22.28	91872 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	M	6	16,03	20,03	120,18	0,02 %
22.29	91873 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	M	36	19,71	24,62	886,32	0,17 %
22.30	90447 SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmetro menor ou igual a 40mm	M	57,8	6,19	7,73	446,79	0,09 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 35
Rúbrica

22.31	8324 ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma	un	29	9,67	12,08	350,32	0,07 %
22.32	97607 SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W	UN	5	137,10	171,32	856,60	0,17 %
22.33	11857 ORSE	Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt	un	31	27,49	34,35	1.064,85	0,21 %
22.34	97599 SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	UN	3	26,61	33,25	99,75	0,02 %
22.35	96985 SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por	UN	3	81,94	102,39	307,17	0,06 %
22.36	96977 SINAPI	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR	M	10	59,24	74,02	740,20	0,14 %
22.37	4192 ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	un	2	11,95	14,93	29,86	0,01 %
22.38	4014 ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20	Un	3	8,78	10,97	32,91	0,01 %
22.39	4015 ORSE	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação.	Un	3	12,60	15,74	47,22	0,01 %
22.40	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	4,5	68,75	85,91	386,59	0,08 %
22.41	96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	3,5	41,68	52,08	182,28	0,04 %
22.42	101502 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.728,29	2.159,67	2.159,67	0,42 %
22.43	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	585,13	731,17	1.462,34	0,29 %
22.44	12628 ORSE	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1	3.353,68	4.190,75	4.190,75	0,82 %

Tipo de Licitação Convite
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório Processo Administrativo n

Total sem BDI	**410.249,78**
Total do BDI	**102.078,38**
Total Geral	**512.328,16**

Engª Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR N° 0605404068

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 36
Rúbrica

Obra
Construção da Escola Municipal Indigena Arthur Nabuco de Araújo- Comunidade Maracanã I_ Município de Uiramutã/ RR

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**			
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,0	= (8h/semana) - 32 mes x2 = 64
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,0	= (8h/semana) - 2 meses
2	**ALIMENTAÇÃO CANTEIRO**			
2.1	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	1.182,0	= Eng - 1 dia por semana - 3 meses - 1 pessoa - 12 / encarregado - 7 dias por semana - 3 meses - 1 pessoa - 90 / Pedreiro - 7 dias por semana - 3 meses - 4 pessoas - 360 / Carpinteiro - 7 dias por semana - 3 meses - 1 pessoa - 90 / Servente - 7 dias por semana - 3 meses - 6 pessoas - 540 / Cozinheiro - 7 dias por semana - 2 meses - 1 pessoa - 90
3	**DIVERSOS**			
3.1	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	UN	1,0	= 1 unidade
3.2	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	UN	6,0	= 6 unidade
3.3	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	un	1,0	= 1 unidade
3.4	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	90,45	= 1 lateral - largura*altura = 10,05*3,0*3 (durante 3 meses)
3.5	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	un	8,0	= unidade
3.6	Limpeza geral (final da obra)	m²	900,0	=
4	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**			
4.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	3,6	= 1 unidade de 1,5*2,4
4.2	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,0	= 1 unidade
4.3	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10.1 kw - Rev 01	un	1,0	= 1 unidade
4.4	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e	un	1,0	= 1 unidade
4.5	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	35,0	= Perimetro da obra = 35
4.6	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	m²	900,0	= terreno livre de 30x30m
4.7	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	14.391,75	= peso dos materiais em tonelada x distancia em km (20 Km BR401+ RR Comunidade)
4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.492,52	= peso dos materiais em tonelada x distancia em km (20 km Piçarra)
5	**INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES**			
5.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	7,8	= 20 sapatas 0,7x0,7 por 1,0m de profundidade
5.2	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	2,0	= volume de escavaçao 2,0 - volume de concreto 2,0
5.3	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	26,2	= 20*2*(0,16+0,29)*0,9
5.4	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	26,2	= 20*2*(0,16+0,29)*0,9
5.5	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m³	14,8	= 20*0,7*0,7
5.6	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,8	= vol. arranques = 0,84 + vol. Sapatas = 1,96 (arranque de 0,90m total e sapata de 20cm (25 menos 5 do lastro))
5.7	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,8	= volume de concreto
5.8	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	39,76	= 300 unidades de estribo 20x7 - 186m - 0,16kg/m = 39,76
5.9	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	273,12	= 156m para arranque e 118,8m para sapata ferro de 10mm = 274,8m - 0,63kg/m = 273,12
6	**INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME**			
6.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	1,66	= 62,66 metros de escavação com 15cm de largura e 7cm de profundidade
6.2	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	36,78	= medido do projeto = 36,78
6.3	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m³	13,4	= medido do projeto = 9,4

ELABORADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 33
Rúbrica

6.4	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,87 = medido do projeto = 4,87
6.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,87 = medido do projeto = 4,87
6.6	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	62,97 = 534 unidades de estribo 20x7 - 331,08m - 0,16kg/m = 62,97
6.7	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	148,7 = 296,76 metros de ferro 8,0mm - 0,4kg/m
6.8	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	25,93 = Alvenaria de embasamento = 25,93
6.9	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	m²	53,65 = área de forma + área superior das sapatas = 34,78 + 20*0,7*0,7-0,16*0,29)
7	**SUPERESTRUTURA - PILARES**		
7.1	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44 = medido do projeto = 61,44
7.2	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44 = medido do projeto = 61,44
7.3	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	3,34 = medido do projeto = 3,34
7.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,34 = medido do projeto = 3,34
7.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	KG	65,63 = 534 unidades de estribo 20x7 - 285,2m - 0,16kg/m
7.6	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	182,5 = 242,00 metros de ferro 10,0mm - 0,63kg/m
8	**SUPERESTRUTURA - VIGAS**		
8.1	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	38,88 = medido do projeto = 38,88
8.2	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	38,88 = medido do projeto = 38,88
8.3	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	3,74 = medido do projeto - 3,74
8.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,74 = medido do projeto - 3,74
8.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	65,43 = 534 unidades de estribo 15x7 - 277,68m - 0,16kg/m
8.6	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	124,19 = 296,76 metros de ferro 6,3mm - 0,25kg/m
9	**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**		
9.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	203,04 = medido do projeto - 180,04
9.2	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (esoessura 9cm) com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e	M	55,83 = medido do projeto - 55,83
9.3	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	23,0 = medido do projeto - 23
9.4	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	22,0 = medido do projeto -22
9.5	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	19,0 = medido do projeto - 19
10	**REVESTIMENTO**		
10.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	406,08 = medido do projeto - 360,08
10.2	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	406,08 = medido do projeto
10.3	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	m²	111,36 = medido do projeto - com h= 3m
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	111,36 = medido do projeto - com h= 3m
11	**PINTURA**		
11.1	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	406,08 = medido do projeto
11.2	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	m²	203,04 = medido do projeto

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 38
Rúbrica

11.3	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	203,04	= medido do projeto
11.4	Aplicação manual de pintura com tinta acetinada em paredes, duas demãos.	m²	406,08	= medido do projeto - nas portas, janelas e grades
12	**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**			
12.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	1,2	= 2*0,6*1,0
12.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	2,6	= 2*1,20+0,1*1*2
12.3	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	2,6	= 2*1,20+0,1*1*2
12.4	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	3,98	= 2*1,20+0,1*1*2 + 0,6*1* + 0,6*1,3
12.5	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	3,98	= 2*1,20+0,1*1*2 + 0,6*1* + 0,6*1,3
12.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos	m²	3,98	= 2*1,20+0,1*1*2 + 0,6*1* + 0,6*1,3
12.7	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	1,46	= 0,65*1,3
12.8	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,46	= 0,65*1,3
12.9	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m²	1,0	= unidade de porta 1,0x1,0
	COBERTURA			
13.1	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2.30x 0.88 x 0.028 m	m²	185,13	= 2*11,45*4,6
13.2	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	185,13	= 2*11,45*4,6
13.3	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	M	32,24	= medido do projeto - 32,24
13.4	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	185,13	= 2*11,45*4,6
13.5	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro	m²	130,57	= medido do projeto -130,57
14	**PAVIMENTAÇÃO**			
14.1	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	19,57	= medido do projeto - 19,57
14.2	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	130,57	= medido do projeto - 130,57
14.3	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	130,57	= medido do projeto - 130,57
14.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	m²	130,57	= medido do projeto - 130,57
14.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014	M	92,0	= metros lineares
15	**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**			
15.1	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	M	4,5	= 6*0,8=6,41
15.2	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm	M	96,06	= medido do projeto - 96,06
15.3	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	M	18,8	= medido do projeto - 18,8
16	**CALÇADA DE PROTEÇÃO**			
16.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	3,97	= 2*(8,65+11,25)*0,15 (cava de 15cm)
16.2	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	2,78	= 16,95m²*0,4 (40cm somente a parte interna da alv.)
16.3	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	19,9	= 2*(8,65+11,25)*0,50 (40cm + 10cm da cava)
16.4	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	72,77	= medido do projeto - 62,84 (área da calçada)
16.5	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	25,92	= 0,4*2*(8,65+22,25)
16.6	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	25,92	= 0,4*2*(8,65+22,25)
17	**ESQUADRIAS**			
17.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	5,0	= unidades de 0,80x2,10

Bibliotheca Alexandrina

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 39
Rúbrica

17.2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18,0 = 6 unidades de 1,50x1,00
17.3	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,48 = 2 unidades de 0,60x0,40m
18	**LOUÇAS E METAIS**		
18.1	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	un	2,0 = unidades
18.2	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	un	2,0 = unidades
18.3	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	UN	2,0 = unidades
18.4	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2,0 = unidades
18.5	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	UN	2,0 = unidades
18.6	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	UN	3,0 = unidades
18.7	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	un	2,0 = unidades
18.8	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	un	1,0 = unidades
18.9	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	un	1,0 = unidades
19	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
19.1	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saída, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'Agua em polietileno	UN	1,0 = unidades
19.2	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	M	28,9 = extraido do projeto
19.3	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	M	30,1 = extraido do projeto
19.4	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	19.75 = extraido do projeto
19.5	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	UN	8,0 = unidades
19.6	Curva 90° soldável 25 mm água fria	UN	2,0 = unidades
19.7	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	11,0 = unidades
19.8	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	un	6,0 = unidades
19.9	Joelho 90° soldável 40mm água fria	UN	3,0 = unidades
19.10	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	3,0 = unidades
19.11	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	UN	14,0 = unidades
19.12	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	1,0 = unidades
19.13	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	6,0 = unidades
19.14	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	1,0 = unidades
19.15	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	UN	5,0 = unidades
19.16	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	1,0 = unidades
19.17	Registro de esfera soldável 40mm	UN	1,0 = unidades
19.18	Registro de esfera soldável 25mm	UN	1,0 = unidades
19.19	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0 = unidades
19.20	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,0 = unidades
20	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**		
20.1	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	M	9,1 = extraido do projeto
20.2	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	12,4 = extraido do projeto
20.3	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	28,0 = extraido do projeto
20.4	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	8,4 = extraido do projeto

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RORAIMA
Fls. 40
Rúbrica

20.5	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	3,0 = unidades
20.6	Tê sanitário em PVC rigido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	un	1,0 = unidades
20.7	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	1,0 = unidades
20.8	Joelho 90º de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	un	10,0 = unidades
20.9	Joelho 90º de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	un	10,0 = unidades
20.10	Joelho 90º de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	UN	4,0 = unidades
20.11	Joelho 45º de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	UN	1,0 = unidades
20.12	Joelho 45º de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	UN	2,0 = unidades
20.13	Curva 90º longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	2,0 = unidades
20.14	Curva 90º longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	2,0 = unidades
20.15	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	3,0 = unidades
20.16	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no minimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	UN	3,0 = unidades
20.17	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	2,0 = unidades
20.18	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	1,0 = unidades
20.19	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	1,0 = unidades
20.20	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforcada revestida internamente com barra lisa e fundo em	un	8,0 = unidades
21	**COMBATE A INCÊNDIO**		
21.1	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	2,0 = unidades
21.2	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	2,0 = unidades
21.3	Placa de sinalização padrão para saida de emergência 400x120mm	Un	1,0 = unidades
22	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
22.1	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	46,0 = unidades
22.2	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	62,6 = extraido do projeto
22.3	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	76,6 = extraido do projeto
22.4	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	52,6 = extraido do projeto
22.5	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	142,2 = extraido do projeto
22.6	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	142,2 = extraido do projeto
22.7	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	82,6 = extraido do projeto
22.8	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	188,3 = extraido do projeto
22.9	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	153,9 = extraido do projeto
22.10	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	40,0 = extraido do projeto
22.11	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	40,0 = extraido do projeto
22.12	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	40,0 = extraido do projeto
22.13	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	40,0 = extraido do projeto

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 41
Rubrica

22.14	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	un	3,0	= extraido do projeto
22.15	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	UN	14,0	= extraido do projeto
22.16	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,0	= extraido do projeto
22.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,0	= extraido do projeto
22.18	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,0	= extraido do projeto
22.19	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	2,0	= extraido do projeto
22.20	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	1,0	= extraido do projeto
22.21	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,0	= extraido do projeto
22.22	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade minima de interruocão de 3kA. tensão nominal de 127/220V. curva de disoaro tipo	un	2,0	= extraido do projeto
22.23	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade minima de interruocão de 3kA. tensão nominal de 127/220V. curva de disoaro tipo	UN	6,0	= extraido do projeto
22.24	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade minima de interruocão de 3kA. tensão nominal de 127/220V. curva de	UN	8,0	= extraido do projeto
22.25	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	M	75,0	= extraido do projeto
22.26	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	M	9,4	= extraido do projeto
22.27	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	M	50,3	= extraido do projeto
22.28	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	M	6,0	= extraido do projeto
22.29	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	M	36,0	= extraido do projeto
22.30	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	M	57,8	= extraido do projeto
22.31	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade minima de 4A/250V, para uma	un	29,0	= unidades
22.32	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade minima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W	UN	5,0	= unidades
22.33	Lâmpada tubolar led T8, 18w, bivolt	un	31,0	=
22.34	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	UN	3,0	= unidades
22.35	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por	UN	3,0	= unidades
22.36	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR	M	10,0	= extraido do projeto
22.37	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	un	2,0	= unidades
22.38	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20	Un	3,0	= unidades
22.39	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação, cor	Un	3,0	= unidades
22.40	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	4,5	= extraido do projeto
22.41	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	3,5	= extraido do projeto
22.42	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,0	= unidades
22.43	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,0	= unidades
22.44	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,0	= unidades

Engº Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 0905404068

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 42
Rúbrica

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Arthur Nabuco de Araújo- Comunidade Maracanã 1_ Município de Uiramutã/ RR

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRANSPORTE

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		
					Operativa	Coeficiente	Peso (kg)
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	19.264,52	1,00	19.264,52
1358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m²	242,27	10,20	2.471,15
7194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	310,81	18,00	5.594,66
4914	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	15,12	18,33	277,15
7267	SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	11.789,47	2,30	27.115,77
4114	SINAPI	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M - CURVA COM 0.45 M, COM FUROS PARA FIOS	Material	UN	76,60	45,00	3.447,00
7356	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	334,62	1,51	505,28
34	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	470,00	1,00	470,00
11587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO - SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	m²	50,75	1,50	76,12
3992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	308,32	9,75	3.006,10
867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	83,41	0,44	36,70
11197	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120 X 150 X L)	Material	UN	4,00	30,00	119,94
1350	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	Material	UN	54,10	14,52	785,56
995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	210,21	0,18	37,84
4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	18,45	1.700,00	31.371,16
39025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	4,06	20,00	81,22
43059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	293,94	1,00	293,94
626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	192,11	1,00	192,11
4433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	257,59	7,31	1.883,01
1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3.674,44	1,00	3.674,44
36225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	74,96	1,50	112,44
1287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	85,15	20,80	1.771,05
346	SINAPI	ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	Material	KG	94,79	1,00	94,79
536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	87,00	20,80	1.809,64
4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	11,61	1.700,00	19.737,62
33	SINAPI	ACO CA-50, 8.0 MM, VERGALHAO	Material	KG	176,05	1,00	176,05
7156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	45,43	0,50	22,72
1014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	820,53	0,03	24,62
370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	61,24	2.000,00	#########
4425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	149,12	9,36	1.395,80
32	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	154,76	1,00	154,76
11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	4,02	75,00	301,50
6189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	143,51	9,75	1.399,18
7258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	2.875,32	2,10	6.038,17
13395	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	Material	UN	2,00	4,00	8,00
4491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	558,61	7,31	4.083,42
39427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	263,41	0,40	105,36
4430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	259,70	3,90	1.012,81
4517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.540,51	2,44	3.758,84
36888	SINAPI	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	Material	M	154,41	0,25	38,60
11160	SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM	Material	UN	7,39	20,00	147,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 43
Rúbrica

		VIDROS)					
34747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	14,86	12,51	185,92
11986	ORSE	Dosador de pastilhas de cloro composto por câmara de dissolução de pastilhas d=150mm e altura de 450mm com disposição interna de modo a otimizar o contato entre o líquido e as pastilhas, modelo DP-75, Hemfibra ou similar	Material	un	1,00	1,00	1,00
3799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	8,20	0,70	5,74
34640	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,00	33,00	33,00
4302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	357,12	0,03	10,71
12041	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	Material	UN	1,00	5,00	5,00
34566	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	Material	UN	287,14	9,50	2.727,82
4777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	81,57	1,00	81,57
34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,11	2.400,00	2.653,20
1381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	785,58	1,00	785,58
4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	Material	m²	3,60	6,40	23,04
5068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	43,51	1,00	43,51
36215	SINAPI	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	Material	UN	1,00	5,50	5,50
4056	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	Material	GL	34,10	6,50	221,68
36206	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	4,00	2,20	8,80
34557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	194,36	0,50	97,18
1013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	490,88	0,02	9,82
7219	SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	16,41	7,50	123,09
10848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	Material	UN	1,00	1,54	1,54
20232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	11,45	12,51	143,24
142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	20,38	0,31	6,32
9836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	50,98	0,39	19,88
10932	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	6,55	0,50	3,27
6013	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	Material	UN	8,00	0,60	4,80
559	SINAPI	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M	Material	M	17,85	2,53	45,16
4351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	58,73	0,05	2,94
1743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	Material	UN	4,00	1,10	4,40
34547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	96,20	0,50	48,10
1346	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	Material	m²	12,74	6,00	76,43
21138	SINAPI	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	Material	M	81,63	10,20	832,65
43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	24,00	1,00	24,00
37589	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM	Material	UN	1,98	10,00	19,80
2674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	134,51	0,24	32,28
1345	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	Material	m²	7,60	10,80	82,08
10851	SINAPI	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	Material	UN	9,00	0,16	1,44
36520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO	Material	UN	1,00	15,00	15,00
37411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	19,06	0,50	9,53
10892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	2,00	19,50	39,00
4047	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	Material	GL	44,44	5,70	253,28
4408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	433,74	0,98	425,06
11235	SINAPI	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM	Material	UN	2,00	5,90	11,80
34381	SINAPI	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM	Material	UN	2,00	20,00	40,00

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 44
Rúbrica

	GUARNICAO ALIZAR						
6193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	53,34	6,50	346,69
9413	SBC	POSTE CONCRETO DUPLO "T" 7,0m 100kg	Material	UN	1,00	300,00	300,00
38194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	21,00	0,08	1,68
10567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	126,74	7,48	947,99
3421	SINAPI	JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS	Material	m²	0,58	30,00	17,35
7334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	29,51	1,11	32,76
10425	SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	Material	UN	5,42	15,94	86,46
38775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	5,00	0,25	1,25
43130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	15,13	1,00	15,13
34360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	7,92	1,00	7,92
39445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Material	UN	3,00	0,17	0,51
1021	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	69,10	0,05	3,66
34616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	8,00	0,17	1,36
9874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	28,03	0,43	12,05
40863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	3,00	0,00	0,00
7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	13,09	1,00	13,09
10997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	20,05	1,00	20,05
2685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	48,77	0,39	19,02
2684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	Material	M	36,61	0,54	19,77
6085	SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	54,96	1,44	79,14
9868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	82,03	0,20	16,41
34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	46,43	1,00	46,43
863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,00	0,32	2,88
123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	38,89	1,11	43,17
39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1.243,92	0,00	4,98
1764	SBC	DISJUNTOR - PROTETOR DPS 275V 12,5/60KA VCL SLIM 5137 CLAMPER	Material	UN	2,00	0,09	0,18
20083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	5,07	1,00	5,07
37591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	9,68	9,80	94,85
37559	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Material	UN	8,00	0,12	0,96
10555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,76	35,00	61,71
10886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	1,07	14,80	15,78
39467	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Material	UN	3,00	0,08	0,24
38101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	38,03	0,02	0,76
10891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,07	6,80	7,25
13415	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	Material	UN	5,42	0,35	1,90
6157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Material	UN	4,00	0,10	0,40
6743	ORSE	Lona com impressão digital	Material	m²	2,98	0,19	0,57
122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	3,41	0,85	2,90
3743	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	4,00	2.500,00	10.000,00
20247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	9,59	1,00	9,59
1524	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,24	2.400,00	571,80
10422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	Material	UN	0,70	15,00	10,51
586	SINAPI	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3/16 "	Material	M	8,70	0,59	5,13
37395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	4,64	0,50	2,32
3379	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	3,70	3,72	13,77
4417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	56,73	2,44	138,42
34628	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	Material	UN	3,00	0,17	0,51
4448	SINAPI	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	23,10	12,48	288,29
13416	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	Material	UN	4,84	0,45	2,18

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 45
Rúbrica

2673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	50,89	0,20	10,18
392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	93,23	0,02	1,86
5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	8,67	1,00	8,67
38774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	6,00	0,13	0,78
11690	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM	Material	UN	1,00	13,00	13,00
39809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,00	0,89	0,89
4400	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	14,40	6,24	89,86
40568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	6,88	1,00	6,88
38773	SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	21,00	0,31	6,51
541	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	Material	UN	0,84	12,20	10,24
12001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	21,00	0,10	2,10
39027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	6,55	1,00	6,55
7348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	11,14	1,51	16,83
9838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	13,51	0,39	5,27
44842	SBC	TUBO EM METALON QUADRADO 20x20cm	Material	M	8,70	0,64	5,57
34653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	15,00	0,09	1,35
38094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	47,91	0,08	3,83
981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	25,63	0,05	1,36
36887	SINAPI	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	Material	m²	7,56	0,10	0,76
6148	SINAPI	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	13,24	0,10	1,32
37552	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	Material	KG	28,69	1,00	28,69
39772	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	Material	UN	1,00	1,90	1,90
1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	43,00	0,04	1,72
1879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	37,16	0,03	1,19
2705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	143,01	0,00	0,00
4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	3,34	1,00	3,34
38102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	12,00	0,02	0,24
7266	SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	MIL	0,14	2.300,00	312,09
12010	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	9,41	0,08	0,75
2432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	4,84	0,40	1,94
1891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	78,31	0,02	1,17
37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,67	1,00	0,67
39175	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	107,00	0,01	0,54
11881	SINAPI	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	Material	UN	0,72	40,00	28,94
11882	SINAPI	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)	Material	UN	1,00	31,18	31,18
11697	SINAPI	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	Material	UN	0,16	7,00	1,10
11891	SINAPI	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	Material	M	17,69	0,06	1,06
40304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	3,66	1,00	3,66
7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	135,92	0,01	1,36
2386	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	Material	UN	5,33	0,09	0,48
38112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	15,54	0,02	0,31
10490	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	0,76	7,50	5,69
11831	SINAPI	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	Material	UN	2,98	0,25	0,75
367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	2,59	2.000,00	5.180,89
20117	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X	Material	UN	13,00	0,04	0,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 46
Rubrica

	1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL					
43131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	2,91	1,00	2,91
8475 SBC	BORRACHA DE VEDACAO PARA ALUMINIO, PORTAS/JANELAS GUA256	Material	M	26,42	0,05	1,32
4720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,35	1.700,00	596,94
3378 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAINHA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,00	3,72	3,72
5075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	3,84	1,00	3,84
3777 SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	45,66	0,08	3,42
12266 SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	0,69	0,40	0,28
30542 SBC	CAMINHAO GUINDAUTO MERCEDES L1620 8tn 200CV	Material	H	1,00	0,00	0,00
1607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	364,18	0,02	5,46
9835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	13,64	0,23	3,14
13393 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	0,12	3,00	0,35
40552 SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"(6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	2,28	0,50	1,14
7421 ORSE	Canto pwll sl	Material	un	28,80	0,01	0,29
1091 SBC	FITA 3M DUPLA FACE ESPUMA VHB 4972 25mmx20m PARA ESTRUTURAL GLAZING	Material	RL	0,36	0,25	0,09
43777 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material	UN	0,40	30,00	12,09
3080 SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,38	0,64	0,89
7091 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	4,23	0,38	1,61
4513 SINAPI	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	31,36	3,25	101,92
6024 SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	Material	UN	1,00	0,60	0,60
650 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	25,83	9,80	253,18
38099 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	47,91	0,08	3,83
1571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	40,00	0,01	0,20
979 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	3,60	0,16	0,58
39398 SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Material	UN	1,00	1,01	1,01
37556 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	2,00	0,10	0,20
1562 SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	Material	UN	3,00	0,05	0,15
12295 SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	21,69	0,08	1,74
3535 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	10,00	0,03	0,30
11676 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	2,00	0,40	0,80
37595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	14,77	1,00	14,77
39795 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,11	1,00	1,11
4384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	3,40	0,20	0,68
11674 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	4,00	0,25	1,00
39209 SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	107,00	0,00	0,32
21127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	13,05	0,25	3,26
3517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	13,48	0,03	0,40
7141 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	5,00	0,06	0,30
1970 SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	0,44	0,44
38383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	21,78	0,01	0,22
38193 SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	5,00	0,05	0,25
1368 SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	0,63	0,40	0,25
1460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA,	Material	M	10,12	3,25	32,89

Elsevier

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 47
Rúbrica

	ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA					
34623 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	Material	UN	1,00	0,17	0,17
1902 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	16,00	0,04	0,64
7604 SINAPI	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	Material	UN	3,00	0,40	1,20
3524 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	5,57	0,04	0,22
3097 SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE	Material	CJ	0,70	0,64	0,45
11864 SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	1,00	0,10	0,10
9813 SINAPI	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	Material	M	6,00	0,30	1,80
1892 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	21,00	0,03	0,63
6141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	Material	UN	9,42	0,20	1,88
40547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	1,90	0,50	0,95
1871 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	7,78	0,09	0,70
3993 SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	m²	3,96	4,88	19,32
404 SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	Material	M	25,00	0,05	1,25
71889 SBC	CARTUCHO EM PO PARA SOLDA EXOTERMICA 90/115/150/250	Material	UN	5,00	0,10	0,50
10553 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	0,23	30,00	6,93
301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	10,28	0,04	0,41
377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,00	1,03	1,03
1884 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	7,00	0,04	0,28
5073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	1,44	1,00	1,44
10952 SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	Material	KG	10,00	1,00	10,00
4358 SINAPI	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	Material	UN	22,00	0,01	0,22
39961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,20	0,28	0,34
21112 SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material	UN	0,16	0,50	0,08
6016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material	UN	1,00	0,50	0,50
7345 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material	L	1,31	1,51	1,98
31134 SBC	CAIXA ALUMINIO DUPLA 4"x4" 3/4" PARA PISO TRAMONTINA	Material	UN	1,00	0,15	0,15
33225 SBC	MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA GTB 16Y2	Material	UN	0,20	0,50	0,10
3526 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	10,27	0,05	0,51
12016 SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	2,23	0,10	0,22
6153 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	8,40	0,05	0,42
4221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L		0,00	0,00
5103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	2,23	0,30	0,67
834 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	6,00	0,04	0,21
11948 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	Material	UN	53,55	0,08	4,28
39443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	149,92	0,00	0,45
1573 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 8 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	12,00	0,00	0,04
1968 SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,00	0,13	0,26
1094 SINAPI	ARAMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRAPINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 5/16", COM 1 [illegible]	Material	UN	1,00	0,80	0,80
7139 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	15,96	0,03	0,48
65 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	22,63	0,03	0,68
38191 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,15	0,10	0,11
11741 SINAPI	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	3,63	0,32	1,16
4346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,00	0,40	1,20
1874 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	4,00	0,10	0,40
11830 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,00	0,28	0,28
1575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	8,00	0,01	0,08
12298 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO	Material	UN	1,52	0,10	0,15
1200 SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,00	0,08	0,16
39177 SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	12,00	0,02	0,28
1966 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,82	0,25	0,20
39176 SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	18,00	0,01	0,13

BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 48
Rúbrica

11455 SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	1,22	0,25	0,30
3529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	21,58	0,02	0,52
3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	32,15	0,01	0,32
39211 SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1 4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	12,00	0,02	0,24
20078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,64	0,40	0,26
87547 SBC	ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA	Material	UN	0,17	0,50	0,08
1870 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	5,36	0,03	0,16
2690 SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material	UN	1,98	0,03	0,06
11655 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	0,23	0,23
296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	8,28	0,03	0,25
11753 SINAPI	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400)	Material	UN	0,63	0,50	0,31
2697 SBC	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material	M	2,18	0,23	0,50
2692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	1,85	1,00	1,85
9892 SINAPI	UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,00	0,04	0,08
39210 SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	18,00	0,00	0,07
1414 SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Material	UN	1,00	0,15	0,15
20080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,62	0,18	0,11
6155 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	Material	UN	0,84	0,04	0,03
96 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,00	0,85	0,85
34643 SINAPI	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	Material	UN	1,00	0,85	0,85
3571 SBC	PLACA CEGA PARA CAIXA 4"x4" QUADRADA IRIEL	Material	UN	1,00	0,05	0,05
7128 SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	0,04	0,04
1574 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	5,33	0,01	0,05
11950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	47,61	0,01	0,24
55 SINAPI	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	Material	UN	2,00	0,15	0,30
11904 SINAPI	CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	Material	M	3,89	0,09	0,35
3662 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	0,20	0,20
12147 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	Material	UN	0,73	0,08	0,06
4415 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,60	1,63	5,87
6036 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	Material	UN	1,00	0,08	0,08
11002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,50	1,00	0,50
3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	2,57	0,01	0,03
11712 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	Material	UN	0,31	0,31	0,10
14618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,01	4,90	0,03
9856 SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	1,00	0,10	0,10
163358 SBC	PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA	Material	UN	5,16	0,01	0,05
6142 SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,00	0,65	0,65
3143 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	1,00	0,02	0,02
3670 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,31	0,30	0,09
3671 SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	7,72	0,05	0,39
1956 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	2,00	0,03	0,05
39276 SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,00	0,04	0,04
12128 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	Material	UN	0,76	0,05	0,04
11443 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS	Material	UN	1,14	0,40	0,46
3855 SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	Material	UN	1,00	0,03	0,03
3398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	1,00	0,40	0,40
11680 SINAPI	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	Material	UN	1,00	0,10	0,10
12296 SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,52	0,08	0,12
5085 SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	Material	UN	0,19	0,25	0,05
38780 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	0,23	0,12	0,03

Em branco

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 49
Rúbrica

20254 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	Material	UN	0,12	0,25	0,03
7608 SINAPI	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	Material	UN	1,00	0,10	0,10
3869 SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	0,03	0,03
7097 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,50	0,10	0,05
14153 SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,06	0,60	0,04
1570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,00	0,00	0,00
7098 SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	0,02	0,02
3518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	0,05	0,05
6138 SINAPI	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	Material	UN	1,70	0,33	0,56
4222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	0,49	0,85	0,42
11467 SINAPI	FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES	Material	UN	0,19	0,64	0,12
4377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	23,42	0,01	0,23
7583 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,00	0,01	0,03
11056 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")	Material	UN	42,24	0,01	0,42
3659 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,16	0,25	0,04
3516 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,35	0,03	0,07
4375 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	22,00	0,01	0,11
2689 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,01	0,05	0,05
38100 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,00	0,10	0,10
11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	2,00	0,01	0,01
2370 SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	Material	UN	0,19	0,09	0,02
4509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,22	3,25	3,97
4350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	4,00	0,01	0,04
11055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	31,97	0,01	0,32
3889 SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 800gr	Material	UN	0,03	0,80	0,02
5088 SINAPI	PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"	Material	UN	0,19	0,30	0,06
3906 SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,63	0,03	0,02
39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	0,17	0,25	0,04
4895 SINAPI	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00	0,01	0,01
5067 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,02	1,00	0,02
3389 SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,03	0,08	0,00
3487 SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,02	0,03	0,00
39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,00	0,02	0,03
20085 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,23	0,03	0,01
3148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,03	0,05	0,00
1901 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,31	0,01	0,00
37731 SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,00	0,00	0,00
43617 SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,01	1,00	0,01
40864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	3,00	0,00	0,00
			Total em peso (kg)		**29477,06kg**	

Antonio Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 090540408

EM DIV.400

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 59
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Arthur Nabuco de Araújo- Comunidade Maracanã I_ Município de Uiramutã/ RR

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Roraima
ORSE - 07/2022 - Sergipe

B.D.I.
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Planilha Orçamentária Analitica

1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					21.819,22
1.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	107,36	107,36
Composição Auxiliar	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	1,25	1,25
Insumo	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,00	104,62	104,62
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00	0,66	0,66
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00	0,81	0,81
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00	0,01	0,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00	0,01	0,01
			MO sem LS => 49,29	LS =>	56,58	MO com LS =>	105,87
			Valor do BDI => 26,79			Valor com BDI =>	134,15
				Quant. =>	64,00	Preço Total =>	8.585,60
1.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00	5.295,15	5.295,15
Composição Auxiliar	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00	63,63	63,63
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,00	4.857,64	4.857,64
Insumo	00043499 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00	202,94	202,94
Insumo	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00	18,58	18,58
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,00	152,35	152,35
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,00	0,01	0,01
			MO sem LS => 2.291,31	LS =>	2.629,96	MO com LS =>	4.921,27
			Valor do BDI => 1.321,66			Valor com BDI =>	6.616,81
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	13.233,62
2		ALIMENTAÇÃO CANTEIRO					20.673,18
2.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	3126 ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	Alimentação	un	1,00	14,00	14,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	1,00	14,00	14,00
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 3,49			Valor com BDI =>	17,49
				Quant. =>	1.182,00	Preço Total =>	20.673,18
3		DIVERSOS					14.924,32
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00010848 SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	Material	UN	1,00	1.341,68	1.341,68
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 334,88			Valor com BDI =>	1.676,56
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.676,56
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00010851 SINAPI	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	Material	UN	1,00	70,83	70,83
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 17,67			Valor com BDI =>	88,50
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>	531,00
3.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	11397 ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,00	750,00	750,00
Insumo	12325 ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	Material	un	1,00	750,00	750,00
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 187,20			Valor com BDI =>	937,20
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	937,20
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00010527 SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	Equipamento	MXMES	1,00	13,20	13,20
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 3,29			Valor com BDI =>	16,49
				Quant. =>	90,45	Preço Total =>	1.491,52
3.5	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	2412 ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	Mobiliário	un	1,00	783,36	783,36
Insumo	2509 ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm, natural (sem verniz) un	0	un	1,00	783,36	783,36
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 195,52			Valor com BDI =>	978,88
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>	7.831,04
3.6	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	2450 ORSE	Limpeza geral (final da obra)	Limpeza	m²	1,00	2,19	2,19
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,10	3,74	0,37
Insumo	1997 ORSE	Sabão em pó kg	0	kg	0,01	9,45	0,04
Insumo	2414 ORSE	Vassoura piaçava un	0	un	0,05	11,80	0,59
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,10	11,96	1,19

Copyright

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 51
Rúbrica

				MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,64	MO com LS => 1,19
				Valor do BDI =>	0,54			Valor com BDI => 2,73
						Quant. =>	900,00	Preço Total => 2.457,00
4			MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					43.557,47
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit / Total
Composição	51	ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização		m²	1,00	550,87 / 550,87
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	2,00	3,74 / 7,48
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	1,00	3,63 / 3,63
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material		m	4,00	10,99 / 43,96
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material		m	1,00	3,89 / 3,89
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	1,00	19,81 / 19,81
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material		m²	1,00	445,00 / 445,00
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,15	21,22 / 3,18
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	2,00	11,96 / 23,92
				MO sem LS =>	20,36	LS =>	23,37	MO com LS => 43,73
				Valor do BDI =>	137,49			Valor com BDI => 688,36
						Quant. =>	3,60	Preço Total => 2.478,09
4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit / Total
Composição	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	Conversão InfoWOrca		UN	1,00	613,28 / 613,28
Composição Auxiliar	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	Demolições / Remoções		m³	0,02	15,79 / 0,32
Composição Auxiliar	76	ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	Aterros / Reaterros / Compactações		m³	1,33	15,70 / 20,81
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana		m³	1,35	47,10 / 63,44
Composição Auxiliar	6083	ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	Conversão InfoWOrca		un	1,00	260,64 / 260,64
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,00	3,74 / 3,74
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	1,00	3,65 / 3,65
Insumo	980	ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	Material		m	20,00	0,22 / 4,40
Insumo	2260	ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Torneira plastica p/jardim d= 1/2" (herc - ref. 1128 ou similar)	Material		un	1,00	2,13 / 2,13
Insumo	2360	ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	Material		un	2,00	8,06 / 16,12
Insumo	5161	ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	Material		un	2,00	5,00 / 10,00
Insumo	5240	ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saida roscável de = 60mm x 1/2"	Material		un	1,00	12,29 / 12,29
Insumo	6313	ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	Material		UN	1,00	0,83 / 0,83
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	1,00	19,81 / 19,81
Insumo	00004895	SINAPI	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,00	0,69 / 0,69
Insumo	00006036	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	Material		UN	1,00	11,49 / 11,49
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	1,00	11,96 / 11,96
Insumo	00007098	SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,00	3,90 / 3,90
Insumo	00009813	SINAPI	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	Material		M	6,00	5,71 / 34,26
Insumo	00009856	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material		M	1,00	8,95 / 8,95
Insumo	00012773	SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2"	Material		UN	1,00	123,85 / 123,85
				MO sem LS =>	65,27	LS =>	74,92	MO com LS => 140,19
				Valor do BDI =>	153,07			Valor com BDI => 766,35
						Quant. =>	1,00	Preço Total => 766,35
4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit / Total
Composição	11125	ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10 1 kw - Rev 01	Entrada em Baixa Tensão		un	1,00	2.205,77 / 2.205,77
Composição Auxiliar	338	ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em nori	Entrada em Baixa Tensão		un	1,00	491,52 / 491,52
Composição Auxiliar	353	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões		m	1,50	12,71 / 19,06
Composição Auxiliar	354	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões		m	6,00	16,25 / 97,50
Composição Auxiliar	363	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões		un	2,00	9,66 / 19,32
Composição Auxiliar	372	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões		un	4,00	3,77 / 15,08
Composição Auxiliar	681	ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	Pontos de Suprimento de Telefone		un	1,00	6,16 / 6,16
Composição Auxiliar	2892	ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e		un	1,00	5,01 / 5,01
Composição Auxiliar	4005	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm². 0,6/1kv / 90º C	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais		M	20,00	12,50 / 250,00
Composição Auxiliar	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos		un	1,00	160,63 / 160,63
Composição Auxiliar	7925	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos		un	4,00	2,30 / 9,20
Composição Auxiliar	7995	ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves		un	1,00	71,54 / 71,54
Composição Auxiliar	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado c=3" e h=5,0m, completo	Conversão infoWOrca		un	1,00	998,49 / 998,49
Composição Auxiliar	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	Conversão infoWOrca		un	1,00	41,31 / 41,31
Composição Auxiliar	12370	ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	Pára-raios		kg	0,18	113,86 / 20,95
				MO sem LS =>	206,83	LS =>	237,40	MO com LS => 444,23
				Valor do BDI =>	550,56			Valor com BDI => 2.756,33
						Quant. =>	1,00	Preço Total => 2.756,33
4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit / Total
Composição	62	ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, inclusive instalações elétricas, hidráulicas e	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização		un	1,00	14.992,56 / 14.992,56

EN BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 52
Rúbrica

Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,30		926,38
Composição Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	2,80	1.085,87	3.040,43
Composição Auxiliar	199 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento	m²	52,92	56,35	2.982,04
Composição Auxiliar	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	52,92	36,33	1.922,58
Composição Auxiliar	641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	2,00	223,87	447,74
Composição Auxiliar	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	2,00	20,34	40,68
Composição Auxiliar	3297 ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	1,00	264,06	264,06
Composição Auxiliar	3644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	56,00	15,63	875,28
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	16,00	3,74	59,84
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	16,00	3,63	58,08
Insumo	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	2,00	25,40	50,80
Insumo	629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	77,00	36,36	2.799,72
Insumo	848 ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	4,00	3,60	14,40
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	87,00	10,99	956,13
Insumo	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	2,00	8,00	16,00
Insumo	1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,20	25,07	30,08
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	16,00	19,81	316,96
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	16,00	11,96	191,36
			MO sem LS => 1.452,41		LS => 1.667,07	MO com LS =>	3.119,48
			Valor do BDI => 3.742,14			Valor com BDI =>	18.734,70
					Quant. => 1,00	Preço Total =>	18.734,70

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059 SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,00	42,57	42,57
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00	28,29	0,11
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,02	27,33	0,45
Composição Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,00	576,22	2,65
Composição Auxiliar	99062 SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,50	2,28	3,42
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36	18,28	6,51
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,71	25,21	17,96
Insumo	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,41	11,40	4,70
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,11	21,22	2,35
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,74	3,17	2,36
Insumo	00010567 SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,55	3,10	1,70
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,03	14,45	0,36
			MO sem LS => 10,36		LS => 11,89	MO com LS =>	22,25
			Valor do BDI => 10,62			Valor com BDI =>	53,19
					Quant. => 35,00	Preço Total =>	1.861,65

4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524 SINAPI	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,00	2,60	2,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,38	1,24
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	19,01	1,36
			MO sem LS => 0,86		LS => 0,99	MO com LS =>	1,85
			Valor do BDI => 0,64			Valor com BDI =>	3,24
					Quant. => 900,00	Preço Total =>	2.916,00

4.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9203 ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Conversão InfoWOrca	tkm	1,00	0,50	0,50
Insumo	9483 ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Equipamento	tkm	1,00	0,50	0,50
			MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,12			Valor com BDI =>	0,62
					Quant. => 14.391,75	Preço Total =>	8.922,89

4.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100948 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,00	0,92	0,92
Composição Auxiliar	5824 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00	232,08	0,85
Composição Auxiliar	5826 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00	47,25	0,07
			MO sem LS => 0,04		LS => 0,04	MO com LS =>	0,08
			Valor do BDI => 0,22			Valor com BDI =>	1,14
					Quant. => 4.492,52	Preço Total =>	5.121,47

5		INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES					22.718,58
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	68,75	68,75

EN BLANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 53
Rúbrica

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,96	17,38	68,75
				MO sem LS =>	22,40	LS =>	25,70	MO com LS =>	48,10
				Valor do BDI =>	17,16			Valor com BDI =>	85,91
						Quant. =>	7,80	Preço Total =>	670,09
5.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,00	41,68	41,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,40	17,38	41,68
				MO sem LS =>	13,58	LS =>	15,58	MO com LS =>	29,16
				Valor do BDI =>	10,40			Valor com BDI =>	52,08
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	104,16
5.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92263	SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compensanada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	147,28	147,28
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,06	28,29	1,78
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,26	27,33	6,96
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	18,28	4,57
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,18	25,21	29,74
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material		m²	1,34	63,36	84,64
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,31	2,74	6,32
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,21	21,22	4,41
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	9,24	0,96	8,86
				MO sem LS =>	15,89	LS =>	18,24	MO com LS =>	34,13
				Valor do BDI =>	36,76			Valor com BDI =>	184,04
						Quant. =>	26,20	Preço Total =>	4.821,84
5.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92415	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	110,45	110,45
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	0,53	147,28	77,32
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,21	18,28	3,76
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,13	25,21	28,36
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,01	7,10	0,07
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento		MES	0,20	8,58	1,68
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento		MES	0,79	3,30	2,59
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento		MES	0,39	13,20	5,18
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,02	26,19	0,49
				MO sem LS =>	20,06	LS =>	23,02	MO com LS =>	43,08
				Valor do BDI =>	29,81			Valor com BDI =>	149,26
						Quant. =>	26,20	Preço Total =>	3.910,61
5.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	37,80	37,80
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,06	523,95	29,60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,27	25,49	6,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,38	1,26
				MO sem LS =>	4,21	LS =>	4,83	MO com LS =>	9,04
				Valor do BDI =>	9,43			Valor com BDI =>	47,23
						Quant. =>	14,80	Preço Total =>	699,00
5.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,75	1,67	1,25
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,72	52,14	37,69
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,66	1,36	493,21
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,59	208,90	123,96
				MO sem LS =>	24,22	LS =>	27,80	MO com LS =>	52,02
				Valor do BDI =>	161,39			Valor com BDI =>	908,14
						Quant. =>	4,80	Preço Total =>	4.359,07
5.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,17	0,56	0,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 54
Rúbrica

Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,21	46,63
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,49	47,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,54	17,38	96,25
			MO sem LS =>	65,85	LS =>	75,58	MO com LS =>	141,43
			Valor do BDI =>	47,75			Valor com BDI =>	239,09
					Quant. =>	4,80	Preço Total =>	1.147,63

5.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	21,73	21,73
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	14,49	14,49
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,17	0,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	25,33	5,68
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,22	0,26
			MO sem LS =>	3,05	LS =>	3,51	MO com LS =>	6,56
			Valor do BDI =>	5,42			Valor com BDI =>	27,15
					Quant. =>	39,76	Preço Total =>	1.079,48

5.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	17,37	17,37
Composição Auxiliar	92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	13,91	13,91
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,17	0,26
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	25,33	2,42
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,54	0,22	0,11
			MO sem LS =>	1,09	LS =>	1,26	MO com LS =>	2,35
			Valor do BDI =>	4,33			Valor com BDI =>	21,70
					Quant. =>	273,12	Preço Total =>	5.926,70
6		INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME						24.532,96

6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	68,75	68,75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	17,38	68,75
			MO sem LS =>	22,40	LS =>	26,70	MO com LS =>	48,10
			Valor do BDI =>	17,16			Valor com BDI =>	85,91
					Quant. =>	1,66	Preço Total =>	142,61

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96539 SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas balcrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	111,41	111,41
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,03	28,29	0,73
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,06	27,33	1,50
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,76	18,28	13,94
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,94	25,21	48,85
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m²	0,59	63,36	37,57
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	7,10	0,07
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,29	2,74	6,28
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,01	26,19	0,26
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,01	23,49	0,16
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,04	21,63	0,75
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,36	0,96	1,30
			MO sem LS =>	23,54	LS =>	27,01	MO com LS =>	50,55
			Valor do BDI =>	27,80			Valor com BDI =>	139,21
					Quant. =>	36,78	Preço Total =>	5.120,14

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	37,80	37,80
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,06	523,95	29,60
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27	25,49	6,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,38	1,28
			MO sem LS =>	4,21	LS =>	4,83	MO com LS =>	9,04
			Valor do BDI =>	9,43			Valor com BDI =>	47,23
					Quant. =>	13,40	Preço Total =>	632,88

6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,42	0,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 55
Rúbrica

Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75			1,25
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,48	20,62		30,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	17,38		40,17
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	52,14		37,69
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,36		493,21
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	208,90		123,96
			MO sem LS => 24,22	LS =>	27,80	MO com LS =>		52,02
			Valor do BDI => 181,39			Valor com BDI =>		908,14
				Quant. =>	4,87	Preço Total =>		4.422,64

6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,21	46,63
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,49	47,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	17,38	96,25
			MO sem LS => 65,85	LS =>	75,58	MO com LS =>		141,43
			Valor do BDI => 47,75			Valor com BDI =>		239,09
				Quant. =>	4,87	Preço Total =>		1.164,36

6.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	21,73	21,73
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	14,49	14,49
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,17	0,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	25,33	5,68
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,22	0,26
			MO sem LS => 3,05	LS =>	3,51	MO com LS =>		6,56
			Valor do BDI => 5,42			Valor com BDI =>		27,15
				Quant. =>	62,97	Preço Total =>		1.709,63

6.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92777 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	19,41	19,41
Composição Auxiliar	92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	15,00	15,00
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,17	0,35
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	25,33	3,23
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,74	0,22	0,16
			MO sem LS => 1,52	LS =>	1,74	MO com LS =>		3,26
			Valor do BDI => 4,84			Valor com BDI =>		24,25
				Quant. =>	148,70	Preço Total =>		3.605,97

6.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00	160,45	160,45
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	669,88	9,04
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,00	25,49	76,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	17,38	26,06
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	55,85	0,68	37,97
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,04	40,33	1,46
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	1,51	6,31	9,52
			MO sem LS => 37,45	LS =>	42,99	MO com LS =>		80,44
			Valor do BDI => 40,04			Valor com BDI =>		200,49
				Quant. =>	25,93	Preço Total =>		5.198,70

6.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557 SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,00	37,83	37,83
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	18,49	1,57
Composição Auxiliar	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42	25,73	10,85
Insumo	00000626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	1,50	16,94	25,41
			MO sem LS => 4,53	LS =>	5,19	MO com LS =>		9,72
			Valor do BDI => 9,44			Valor com BDI =>		47,27
				Quant. =>	53,65	Preço Total =>		2.536,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 56
Rúbrica

7			SUPERESTRUTURA - PILARES					30.051,78
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263	SINAPI	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	147,28	147,28
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,06	28,29	1,78
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,26	27,33	6,96
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	18,28	4,57
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,18	25,21	29,74
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m²	1,34	63,36	84,64
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,31	2,74	6,32
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,21	21,22	4,41
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,24	0,96	8,86
				MO sem LS => 15,89	LS => 18,24		MO com LS =>	34,13
				Valor do BDI => 36,76			Valor com BDI =>	184,04
					Quant. =>	61,44	Preço Total =>	11.307,41
7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92415	SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	119,45	119,45
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,53	147,28	77,32
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	18,28	3,78
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,13	25,21	28,36
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	7,10	0,07
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,20	8,58	1,68
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,79	3,30	2,59
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,39	13,20	5,18
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,02	26,19	0,49
				MO sem LS => 20,06	LS => 23,02		MO com LS =>	43,08
				Valor do BDI => 29,81			Valor com BDI =>	148,28
					Quant. =>	61,44	Preço Total =>	9.170,53
7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,67	1,25
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	52,14	37,69
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,36	493,21
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	208,90	123,96
				MO sem LS => 24,22	LS => 27,80		MO com LS =>	52,02
				Valor do BDI => 151,39			Valor com BDI =>	908,14
					Quant. =>	3,34	Preço Total =>	3.033,18
7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,21	46,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,49	47,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	17,38	96,25
				MO sem LS => 65,85	LS => 75,58		MO com LS =>	141,43
				Valor do BDI => 47,75			Valor com BDI =>	239,09
					Quant. =>	3,34	Preço Total =>	798,56
7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perca kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	21,73	21,73
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	14,49	14,49
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,17	0,63
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	25,33	5,68
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,22	0,26

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls.
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 53
Fls.
Rúbrica

			MO sem LS =>	3,05	LS =>	3,51	MO com LS =>	6,56
			Valor do BDI =>	5,42			Valor com BDI =>	27,15
					Quant. =>	65,63	Preço Total =>	1.781,85

7.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	17,37	17,37
Composição Auxiliar	92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	13,91	13,91
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,17	0,26
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	25,33	2,42
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,54	0,22	0,11
			MO sem LS =>	1,09	LS =>	1,26	MO com LS =>	2,35
			Valor do BDI =>	4,33			Valor com BDI =>	21,70
					Quant. =>	182,50	Preço Total =>	3.960,25
8		SUPERESTRUTURA - VIGAS						21.246,57
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92265 SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	117,63	117,63
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,05	28,29	1,41
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,24	27,33	6,47
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	18,28	3,69
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,91	25,21	22,96
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m²	1,15	63,36	72,61
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,17	2,74	0,45
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,16	21,22	3,37
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,95	0,96	6,67
			MO sem LS =>	12,77	LS =>	14,65	MO com LS =>	27,42
			Valor do BDI =>	29,36			Valor com BDI =>	146,99
					Quant. =>	38,88	Preço Total =>	5.714,97
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92455 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	128,86	128,86
Composição Auxiliar	92265 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,41	117,63	48,69
Composição Auxiliar	92272 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,73	26,94	46,57
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	18,28	3,47
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,04	25,21	26,09
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	7,10	0,07
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,05	26,19	1,28
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,33	8,23	2,69
			MO sem LS =>	19,75	LS =>	22,67	MO com LS =>	42,42
			Valor do BDI =>	32,16			Valor com BDI =>	161,02
					Quant. =>	38,88	Preço Total =>	6.260,45
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,67	1,25
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	52,14	37,69
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,36	493,21
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	208,90	123,96
			MO sem LS =>	24,22	LS =>	27,80	MO com LS =>	52,02
			Valor do BDI =>	181,39			Valor com BDI =>	908,14
					Quant. =>	3,74	Preço Total =>	3.396,44
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,21	46,63
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,49	47,06
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	17,38	96,25
			MO sem LS =>	65,85	LS =>	75,58	MO com LS =>	141,43
			Valor do BDI =>	47,75			Valor com BDI =>	239,09
					Quant. =>	3,74	Preço Total =>	894,19

EIS-120

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - RORAIMA
Fls. 58
Rúbrica

8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	21,73	21,73
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	14,49	14,49
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,17	0,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	25,33	5,68
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,22	0,26
			MO sem LS => 3,05	LS =>	3,51	MO com LS =>	6,56
			Valor do BDI => 5,42			Valor com BDI =>	27,15
				Quant. =>	65,43	Preço Total =>	1.776,42

8.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92776 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	20,65	20,65
Composição Auxiliar	92792 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	14,96	14,96
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	17,17	0,48
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	25,33	4,33
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,97	0,22	0,21
			MO sem LS => 2,16	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,64
			Valor do BDI => 5,15			Valor com BDI =>	25,80
				Quant. =>	124,19	Preço Total =>	3.204,10

9		ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO					35.019,46
9.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00	116,45	116,45
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	581,25	6,16
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,33	25,49	59,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,17	17,38	20,28
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,74	0,68	25,66
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,01	40,33	0,52
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	1,09	3,99	4,34
			MO sem LS => 28,86	LS =>	33,13	MO com LS =>	61,99
			Valor do BDI => 29,06			Valor com BDI =>	145,51
				Quant. =>	203,04	Preço Total =>	29.544,35

9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93201 SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	6,24	6,24
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	543,88	1,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	25,49	3,82
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	17,38	0,52
			MO sem LS => 1,69	LS =>	1,93	MO com LS =>	3,62
			Valor do BDI => 1,55			Valor com BDI =>	7,79
				Quant. =>	55,93	Preço Total =>	434,91

9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93186 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	66,32	66,32
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,49	14,66	7,18
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,02	671,35	12,08
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,35	91,15	31,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	25,49	9,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	17,38	3,26
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	7,10	0,04
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,22	1,32
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,35	2,74	0,96
			MO sem LS => 9,12	LS =>	10,46	MO com LS =>	19,58
			Valor do BDI => 16,55			Valor com BDI =>	82,87
				Quant. =>	23,00	Preço Total =>	1.906,01

9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93188 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	57,57	57,57
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,31	14,00	4,31
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,01	671,35	8,05
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,30	91,15	27,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 59
Rúbrica

Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,39	25,49	9,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,19	17,38	3,35
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,01	7,10	0,03
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	6,00	0,22	1,32
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,22	2,74	3,34
			MO sem LS =>	8,57	LS =>	9,84	MO com LS =>	18,41
			Valor do BDI =>	14,36			Valor com BDI =>	71,93
					Quant. =>	22,00	Preço Total =>	1.582,46

9.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93196 SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		M	1,00	65,36	65,36
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	0,49	14,66	7,18
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,02	671,35	12,08
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	0,35	91,15	31,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,38	25,49	9,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,19	17,38	3,26
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,01	7,10	0,04
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	6,00	0,22	1,32
			MO sem LS =>	9,12	LS =>	10,46	MO com LS =>	19,58
			Valor do BDI =>	16,31			Valor com BDI =>	81,67
					Quant. =>	19,00	Preço Total =>	1.551,73
10		REVESTIMENTO						41.475,24

10.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,00	7,65	7,65
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,00	815,94	3,42
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,12	25,49	3,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,06	17,38	1,07
			MO sem LS =>	1,77	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,80
			Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI =>	9,55
					Quant. =>	406,08	Preço Total =>	3.878,06

10.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,00	36,80	36,80
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,04	581,25	21,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,47	25,49	11,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	17,38	2,97
			MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,64	MO com LS =>	14,30
			Valor do BDI =>	9,18			Valor com BDI =>	45,98
					Quant. =>	406,08	Preço Total =>	18.671,55

10.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87528 SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de taliscа	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,00	43,62	43,62
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,04	669,88	25,18
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,58	25,49	14,78
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,21	17,38	3,66
			MO sem LS =>	8,99	LS =>	10,32	MO com LS =>	19,31
			Valor do BDI =>	10,88			Valor com BDI =>	54,50
					Quant. =>	111,36	Preço Total =>	6.069,12

10.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87274 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,00	92,39	92,39
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,02	29,15	29,73
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,50	17,38	8,69
Insumo	00001361 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	6,14	1,25	7,67
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,22	7,34	1,61
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material		m²	1,09	41,00	44,69
			MO sem LS =>	14,14	LS =>	16,22	MO com LS =>	30,36
			Valor do BDI =>	23,06			Valor com BDI =>	115,45
					Quant. =>	111,36	Preço Total =>	12.856,51
11		PINTURA						16.190,39

11.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	PINT - PINTURAS		m²	1,00	2,30	2,30
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,04	26,53	1,03

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 60
Rúbrica

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,01	17,38	0,24
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material		L	0,16	6,49	1,03
			MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
			Valor do BDI =>	0,57			Valor com BDI =>	2,87
					Quant. =>	406,08	Preço Total =>	1.165,44
11.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88497 SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS		m²	1,00	14,27	14,27
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,31	26,53	8,27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,11	17,38	1,98
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material		UN	0,10	0,86	0,08
Insumo	00043626 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material		KG	1,56	2,54	3,94
			MO sem LS =>	3,55	LS =>	4,08	MO com LS =>	7,63
			Valor do BDI =>	3,56			Valor com BDI =>	17,83
					Quant. =>	203,04	Preço Total =>	3.620,20
11.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	Latex PVA		m²	1,00	17,44	17,44
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,25	3,74	0,93
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios		h	0,35	3,81	1,33
Insumo	1602 ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material		l	0,72	6,72	4,83
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material		UN	0,50	0,86	0,43
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra		H	0,35	19,81	6,93
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,25	11,96	2,99
			MO sem LS =>	4,62	LS =>	5,30	MO com LS =>	9,92
			Valor do BDI =>	4,35			Valor com BDI =>	21,79
					Quant. =>	203,04	Preço Total =>	4.424,24
11.4	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta acetinada em paredes, duas demãos.	PINT - PINTURAS		m²	1,00	13,76	13,76
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	26,53	3,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,05	17,38	0,83
Insumo	00007345 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material		L	0,33	28,76	9,49
			MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,70	MO com LS =>	3,18
			Valor do BDI =>	3,43			Valor com BDI =>	17,19
					Quant. =>	406,08	Preço Total =>	6.980,51
12		**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**						**2.896,19**
12.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,00	116,45	116,45
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,01	581,25	6,16
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,33	25,49	59,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,17	17,38	20,28
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	37,74	0,68	25,66
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,01	40,33	0,52
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	Material		M	1,09	3,99	4,34
			MO sem LS =>	28,86	LS =>	33,13	MO com LS =>	61,99
			Valor do BDI =>	29,06			Valor com BDI =>	145,51
					Quant. =>	1,20	Preço Total =>	174,61
12.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,00	7,65	7,65
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,00	815,94	3,42
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,12	25,49	3,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,06	17,38	1,07
			MO sem LS =>	1,77	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,80
			Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI =>	9,55
					Quant. =>	2,60	Preço Total =>	24,83
12.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,00	36,80	36,80
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,04	581,25	21,66
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,47	25,49	11,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	17,38	2,97
			MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,64	MO com LS =>	14,30
			Valor do BDI =>	9,18			Valor com BDI =>	45,98
					Quant. =>	2,60	Preço Total =>	119,54
12.4	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 61 Rubrica

Composição	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	PINT - PINTURAS	m²	1,00	2,30	2,30
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	26,53	1,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01	17,38	0,24
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	0,16	6,49	1,03
			MO sem LS => 0,44	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
			Valor do BDI => 0,57			Valor com BDI =>	2,87
				Quant. =>	3,98	Preço Total =>	11,42

12.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	Latex PVA	m²	1,00	17,44	17,44
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,25	3,74	0,93
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,35	3,81	1,33
Insumo	1602 ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material	l	0,72	6,72	4,83
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,50	0,86	0,43
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,35	19,81	6,93
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,25	11,96	2,99
			MO sem LS => 4,62	LS =>	5,30	MO com LS =>	9,92
			Valor do BDI => 4,35			Valor com BDI =>	21,79
				Quant. =>	3,98	Preço Total =>	86,72

12.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS	m²	1,00	13,76	13,76
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	26,53	3,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	17,38	0,83
Insumo	00007345 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material	L	0,33	28,76	9,49
			MO sem LS => 1,48	LS =>	1,70	MO com LS =>	3,18
			Valor do BDI => 3,43			Valor com BDI =>	17,19
				Quant. =>	3,98	Preço Total =>	68,41

12.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,67	1,25
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	52,14	37,69
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,36	493,21
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	208,90	123,96
			MO sem LS => 24,22	LS =>	27,80	MO com LS =>	52,02
			Valor do BDI => 181,39			Valor com BDI =>	908,14
				Quant. =>	1,46	Preço Total =>	1.325,88

12.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,21	46,53
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,49	47,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	17,38	96,25
			MO sem LS => 65,85	LS =>	75,58	MO com LS =>	141,43
			Valor do BDI => 47,75			Valor com BDI =>	239,09
				Quant. =>	1,46	Preço Total =>	349,07

12.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO	m²	1,00	588,76	588,76
Composição Auxiliar	88627 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	742,05	8,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	25,49	11,64
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23	17,38	3,98
Insumo	00004930 SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	m²	1,00	564,24	564,24
			MO sem LS => 6,17	LS =>	7,09	MO com LS =>	13,26
			Valor do BDI => 146,95			Valor com BDI =>	735,71
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	735,71

13		COBERTURA					42.002,35

13.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	283 ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com composito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	Telhamento	m²	1,00	61,23	61,23
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,22	3,74	0,82
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,22	3,63	0,79
Insumo	667 ORSE	Kit de fixação (prego/anilha) para telhas onduline (20 pregos e 20 anilhas)	Material	un	0,50	8,69	4,34

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 62
Rúbrica

Insumo	2191 ORSE	Telha ecológica onduline 2,00 x 0,95 x 0,028 m	Material		un	0,65	73,90	48,30
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	0,22	19,81	4,35
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,22	11,96	2,63
			MO sem LS =>	3,25	LS =>	3,73	MO com LS =>	6,98
			Valor do BDI =>	15,28			Valor com BDI =>	76,51
					Quant. =>	185,13	Preço Total =>	14.164,29

13.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92540 SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	COBE - COBERTURA		m²	1,00	54,03	54,03
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,06	22,30	1,34
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,04	23,11	1,00
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,46	18,28	8,84
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,64	25,21	16,15
Insumo	00004430 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,98	5,83	11,52
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,07	23,49	1,64
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material		KG	0,05	21,20	1,06
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material		KG	0,03	21,38	0,64
Insumo	00004408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,31	1,11	3,67
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,66	12,33	8,17
			MO sem LS =>	9,75	LS =>	11,20	MO com LS =>	20,95
			Valor do BDI =>	13,48			Valor com BDI =>	67,51
					Quant. =>	185,13	Preço Total =>	12.498,12

13.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94223 SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial, feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	COBE - COBERTURA		M	1,00	111,49	111,49
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,00	23,11	0,04
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,00	22,30	0,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,38	1,26
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,06	24,97	1,49
Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material		CJ	4,20	0,24	1,00
Insumo	00007219 SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material		UN	1,03	89,72	92,32
Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material		UN	4,20	3,65	15,33
			MO sem LS =>	0,99	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,13
			Valor do BDI =>	27,82			Valor com BDI =>	139,31
					Quant. =>	32,24	Preço Total =>	4.491,35

13.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	55960 SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	COBE - COBERTURA		m²	1,00	6,03	6,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,20	17,38	3,47
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material		L	0,10	25,61	2,56
			MO sem LS =>	1,13	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,43
			Valor do BDI =>	1,50			Valor com BDI =>	7,53
					Quant. =>	185,13	Preço Total =>	1.394,02

13.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4449 ORSE	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro	Forros		m²	1,00	57,95	57,95
Insumo	1019 ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref.Araforros ou similar	Material		m²	1,00	57,95	57,95
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	14,46			Valor com BDI =>	72,41
					Quant. =>	130,57	Preço Total =>	9.454,57

14		PAVIMENTAÇÃO						42.873,37
14.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,00	41,68	41,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,40	17,38	41,68
			MO sem LS =>	13,58	LS =>	15,58	MO com LS =>	29,16
			Valor do BDI =>	10,40			Valor com BDI =>	52,08
					Quant. =>	19,57	Preço Total =>	1.019,20

14.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87690 SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	PISO - PISOS		m²	1,00	58,26	58,26
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,06	799,74	48,54
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,29	25,49	7,26
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,14	17,38	2,46
			MO sem LS =>	5,71	LS =>	6,55	MO com LS =>	12,26
			Valor do BDI =>	14,54			Valor com BDI =>	72,80
					Quant. =>	130,57	Preço Total =>	9.505,49

14.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - Fls. 63 - Rúbrica

Composição	87630	SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	PISO - PISOS	m²	1,00	46,39	46,39
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	799,74	34,46
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	25,49	6,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	17,38	2,13
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,21	13,72	2,88
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,50	1,36	0,68
				MO sem LS => 4,58	LS =>	5,25	MO com LS =>	9,83
				Valor do BDI => 11,57			Valor com BDI =>	57,96
					Quant. =>	130,57	Preço Total =>	7.567,83
14.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1,00	137,82	137,82
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,93	29,15	27,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,34	17,38	5,90
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	8,62	1,25	10,77
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,12	83,07	93,03
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,14	7,34	1,02
				MO sem LS => 12,23	LS =>	14,04	MO com LS =>	26,27
				Valor do BDI => 34,39			Valor com BDI =>	172,21
					Quant. =>	130,57	Preço Total =>	22.485,45
14.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	PISO - PISOS	M	1,00	19,97	19,97
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	29,15	2,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	17,38	0,53
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,60	1,25	0,75
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	0,19	83,07	15,61
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,08	7,34	0,61
				MO sem LS => 1,11	LS =>	1,28	MO com LS =>	2,39
				Valor do BDI => 4,98			Valor com BDI =>	24,95
					Quant. =>	92,00	Preço Total =>	2.295,40
15			**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**					**4.705,55**
15.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98689	SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	PISO - PISOS	M	1,00	112,21	112,21
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,55	26,63	14,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27	17,38	4,74
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,29	3,84	4,95
Insumo	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM E= "2,0" CM	Material	M	1,00	87,96	87,96
				MO sem LS => 6,96	LS =>	7,99	MO com LS =>	14,95
				Valor do BDI => 26,00			Valor com BDI =>	140,21
					Quant. =>	4,50	Preço Total =>	630,94
15.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88648	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	PISO - PISOS	M	1,00	8,95	8,95
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	29,15	2,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	17,38	0,53
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,60	1,25	0,75
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	0,12	40,75	5,01
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,09	7,34	0,62
				MO sem LS => 0,95	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,03
				Valor do BDI => 2,23			Valor com BDI =>	11,18
					Quant. =>	96,06	Preço Total =>	1.073,95
15.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101965	SINAPI	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,00	127,73	127,73
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,02	28,29	0,59
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,40	27,33	10,87
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	544,86	3,26
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42	26,63	11,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	17,38	3,63
Insumo	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0" CM. COM PINGADEIRA	Material	M	1,04	94,46	98,23
				MO sem LS => 10,01	LS =>	11,49	MO com LS =>	21,50
				Valor do BDI => 31,88			Valor com BDI =>	159,61
					Quant. =>	18,80	Preço Total =>	3.000,66
16			**CALÇADA DE PROTEÇÃO**					**18.594,36**
16.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	68,75	68,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RORAIMA
Fls. 64
Rúbrica

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	17,38	68,75
			MO sem LS => 22,40	LS =>	25,70	MO com LS =>	48,10
			Valor do BDI => 17,16			Valor com BDI =>	85,91
				Quant. =>	3,97	Preço Total =>	341,06

16.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	41,68	41,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	17,38	41,68
			MO sem LS => 13,58	LS =>	15,58	MO com LS =>	29,16
			Valor do BDI => 10,40			Valor com BDI =>	52,08
				Quant. =>	2,78	Preço Total =>	144,78

16.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00	160,45	160,45
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	669,88	9,04
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,00	25,49	76,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	17,38	26,05
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	55,85	0,68	37,97
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,04	40,33	1,46
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	1,51	6,31	9,52
			MO sem LS => 37,45	LS =>	42,99	MO com LS =>	80,44
			Valor do BDI => 40,04			Valor com BDI =>	200,49
				Quant. =>	19,90	Preço Total =>	3.989,75

16.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94994 SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1:4,8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	PISO - PISOS	m²	1,00	139,44	139,44
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	680,09	65,96
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	25,21	4,55
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,28	25,49	7,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	17,38	7,94
Insumo	00003777 SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1,13	1,90	2,14
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,20	0,96	0,19
Insumo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,25	4,11	1,02
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,12	45,08	50,59
			MO sem LS => 9,42	LS =>	10,82	MO com LS =>	20,24
			Valor do BDI => 34,80			Valor com BDI =>	174,24
				Quant. =>	72,77	Preço Total =>	12.679,44

16.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	7,65	7,65
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	815,94	3,42
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	25,49	3,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	17,38	1,07
			MO sem LS => 1,77	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,80
			Valor do BDI => 1,90			Valor com BDI =>	9,55
				Quant. =>	25,92	Preço Total =>	247,53

16.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2.0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	36,80	36,80
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	581,25	21,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47	25,49	11,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	17,38	2,97
			MO sem LS => 6,66	LS =>	7,64	MO com LS =>	14,30
			Valor do BDI => 9,18			Valor com BDI =>	45,98
				Quant. =>	25,92	Preço Total =>	1.191,80

17		ESQUADRIAS					20.005,04

17.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,00	310,43	310,43
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,68	24,08	40,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,84	17,38	14,58
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,00	16,06	48,18

EN BLANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 65
Rúbrica

Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material		UN	19,80	0,07	1,38
Insumo	00010556 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material		UN	1,00	205,89	205,89
			MO sem LS =>	19,48	LS =>	22,36	MO com LS =>	41,84
			Valor do BDI =>	77,48			Valor com BDI =>	387,91
					Quant. =>	5,00	Preço Total =>	1.939,55

17.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS. ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	1,00	781,55	781,55
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,01	861,54	6,89
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,10	25,49	53,50
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,05	17,38	18,23
Insumo	00011199 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ., PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Material		UN	0,56	1.264,72	702,93
			MO sem LS =>	26,01	LS =>	29,86	MO com LS =>	55,87
			Valor do BDI =>	195,07			Valor com BDI =>	976,62
					Quant. =>	18,00	Preço Total =>	17.579,16

17.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94569 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	1,00	810,82	810,82
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,02	861,54	18,09
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,58	25,49	116,76
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,29	17,38	39,81
Insumo	00011190 SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material		UN	2,78	229,00	636,16
			MO sem LS =>	56,96	LS =>	65,37	MO com LS =>	122,33
			Valor do BDI =>	202,38			Valor com BDI =>	1.013,20
					Quant. =>	0,48	Preço Total =>	486,33

18		LOUÇAS E METAIS						9.620,67
18.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	2390 ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	Alambrados e Gradis		un	1,00	188,30	188,30
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,30	3,60	1,08
Insumo	2063 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2" - Jackwal ou similar	Material		un	1,00	181,28	181,28
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,30	19,81	5,94
			MO sem LS =>	2,77	LS =>	3,17	MO com LS =>	5,94
			Valor do BDI =>	46,99			Valor com BDI =>	235,29
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	470,58
18.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	8974 ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	Louças e Metais Sanitários		un	1,00	1.065,16	1.065,16
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,03	734,10	22,02
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,30	3,60	1,08
Insumo	9262 ORSE	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) - em placa sólida de fórmica, sistema de travamento na vertical e ferragens em latão	Material		un	1,00	1.036,12	1.036,12
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,30	19,81	5,94
			MO sem LS =>	3,43	LS =>	3,94	MO com LS =>	7,37
			Valor do BDI =>	265,86			Valor com BDI =>	1.331,02
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	2.662,04
18.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95546 SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	141,76	141,76
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,90	24,86	47,15
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,60	17,38	10,38
Insumo	00039398 SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Material		UN	1,00	84,23	84,23
			MO sem LS =>	21,12	LS =>	24,25	MO com LS =>	45,37
			Valor do BDI =>	35,38			Valor com BDI =>	177,14
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	354,28
18.4	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86931 SINAPI	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS		UN	1,00	452,91	452,91
Composição Auxiliar	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	442,00	442,00
Composição Auxiliar	86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	10,91	10,91
			MO sem LS =>	11,46	LS =>	13,16	MO com LS =>	24,62
			Valor do BDI =>	113,04			Valor com BDI =>	565,95
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.131,90
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00000377 SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	Material		UN	1,00	35,25	35,25
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	8,79			Valor com BDI =>	44,04
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	88,08

18.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total


BLANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 66
Rúbrica

Composição	86943 SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	209,09	209,09
Composição Auxiliar	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	10,64	10,64
Composição Auxiliar	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	134,17	134,17
Composição Auxiliar	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	49,32	49,32
Composição Auxiliar	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	6,69	6,69
Composição Auxiliar	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	8,27	8,27
			MO sem LS =>	9,74	LS =>	11,19	MO com LS =>	20,93
			Valor do BDI =>	52,18			Valor com BDI =>	261,27
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	783,81

18.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2050 ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	Louças e Metais Sanitários		un	1,00	25,21	25,21
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,40	3,65	1,46
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,40	19,81	7,92
Insumo	00007608 SINAPI	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	Material		UN	1,00	6,49	6,49
Insumo	00011680 SINAPI	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	Material		UN	1,00	9,34	9,34
			MO sem LS =>	3,69	LS =>	4,23	MO com LS =>	7,92
			Valor do BDI =>	6,29			Valor com BDI =>	31,50
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	63,00

18.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2103 ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	Louças e Metais Sanitários		un	1,00	823,50	823,50
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples		m³	0,04	762,70	27,45
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	2,88	14,07	40,52
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	2,00	3,74	7,48
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	2,00	3,60	7,20
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	2,00	3,65	7,30
Insumo	245 ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	Material		un	1,00	188,88	188,88
Insumo	2016 ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	Material		un	1,00	178,60	178,60
Insumo	9964 ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0.484kg/m)	Material		m	1,20	19,61	23,53
Insumo	14004 ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar) un	0		un	1,00	186,45	186,45
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	2,00	19,81	39,62
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	2,00	19,81	39,62
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	2,00	11,96	23,92
Insumo	00006157 SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1 1/2 "	Material		UN	1,00	52,93	52,93
			MO sem LS =>	52,82	LS =>	60,62	MO com LS =>	113,44
			Valor do BDI =>	205,54			Valor com BDI =>	1.029,04
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.029,04

18.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2093 ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	Louças e Metais Sanitários		un	1,00	1.630,88	1.630,88
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples		m³	0,06	762,70	45,76
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	4,80	14,07	67,53
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	4,00	3,74	14,96
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	4,00	3,60	14,40
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	4,00	3,65	14,60
Insumo	246 ORSE	Pia de cozinha em aço inox 2,00x0,60m c/ 2 cubas, sem valvula (padrão comercial) un	0		un	1,00	407,82	407,82
Insumo	2016 ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	Material		un	2,00	178,60	357,20
Insumo	9964 ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0.484kg/m)	Material		m	1,20	19,61	23,53
Insumo	14004 ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar) un	0		un	2,00	186,45	372,90
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	4,00	19,81	79,24
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	4,00	19,81	79,24
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	4,00	11,96	47,84
Insumo	00006157 SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1 1/2 "	Material		UN	2,00	52,93	105,86
			MO sem LS =>	104,04	LS =>	119,41	MO com LS =>	223,45
			Valor do BDI =>	407,06			Valor com BDI =>	2.037,94
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.037,94

19		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						12.244,54
19.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93243 SINAPI	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saída, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		UN	1,00	6.872,09	6.872,09
Composição Auxiliar	98462 SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		UN	1,00	5.470,89	5.470,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 63
Rúbrica

Composição Auxiliar	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,00	7,50	22,50
Composição Auxiliar	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	20,00	10,57	211,40
Composição Auxiliar	94688 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,00	9,99	19,98
Composição Auxiliar	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	21,17	21,17
Composição Auxiliar	89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	42,72	42,72
Composição Auxiliar	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	34,02	34,02
Insumo	00034640 SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,00	1.049,41	1.049,41
			MO sem LS => 196,64	LS => 225,70		MO com LS =>	422,34
			Valor do BDI => 1.715,27			Valor com BDI =>	8.587,36
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	8.587,36

19.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89446 SINAPI	Tubo de PVC rígido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	5,76	5,76
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,86	0,34
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	24,86	0,48
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,00	2,30	0,01
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,05	4,70	4,93
			MO sem LS => 0,30	LS => 0,34		MO com LS =>	0,64
			Valor do BDI => 1,43			Valor com BDI =>	7,19
				Quant. =>	28,90	Preço Total =>	207,79

19.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89448 SINAPI	Tubo de PVC rígido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	17,32	17,32
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	17,86	0,50
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	24,86	0,70
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01	2,30	0,01
Insumo	00009874 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,05	15,36	16,11
			MO sem LS => 0,43	LS => 0,49		MO com LS =>	0,92
			Valor do BDI => 4,32			Valor com BDI =>	21,64
				Quant. =>	30,10	Preço Total =>	651,36

19.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	12,41	12,41
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,86	1,25
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,45	24,86	11,16
			MO sem LS => 4,62	LS => 5,31		MO com LS =>	9,93
			Valor do BDI => 3,09			Valor com BDI =>	15,50
				Quant. =>	19,75	Preço Total =>	306,12

19.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362 SINAPI	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	8,20	8,20
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	17,86	2,71
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	24,86	3,77
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08	0,32
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	0,93	0,93
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03	2,30	0,07
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	51,08	0,40
			MO sem LS => 2,34	LS => 2,69		MO com LS =>	5,03
			Valor do BDI => 2,04			Valor com BDI =>	10,24
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>	81,92

19.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89364 SINAPI	Curva 90° soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	11,16	11,16
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	17,86	2,71
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	24,86	3,77
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08	0,32
Insumo	00001956 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00	3,89	3,89
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03	2,30	0,07
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	51,08	0,40
			MO sem LS => 2,34	LS => 2,69		MO com LS =>	5,03
			Valor do BDI => 2,78			Valor com BDI =>	13,94
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	27,88

19.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373 SINAPI	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	14,02	14,02
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	17,86	2,34
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	24,86	3,26
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08	0,26
Insumo	00020147 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	7,74	7,74

BM Bk.30

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 68
Rubrica

Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,03	2,30	0,07
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,35
			MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,32	MO com LS =>	4,34
			Valor do BDI =>	3,49			Valor com BDI =>	17,51
					Quant. =>	11,00	Preço Total =>	192,61

19.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1144 ORSE	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável		un	1,00	13,26	13,26
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,18	3,74	0,67
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,18	3,65	0,65
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,01	81,38	0,48
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,01	78,37	0,78
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,18	19,81	3,56
Insumo	00003538 SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,00	4,97	4,97
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,18	11,96	2,15
			MO sem LS =>	2,66	LS =>	3,05	MO com LS =>	5,71
			Valor do BDI =>	3,30			Valor com BDI =>	16,56
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	99,36

19.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89497 SINAPI	Joelho 90° soldável 40mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	12,29	12,29
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	17,86	1,86
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	24,86	2,60
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,53
Insumo	00003535 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,00	6,56	6,56
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,02	2,30	0,03
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,71
			MO sem LS =>	1,62	LS =>	1,85	MO com LS =>	3,47
			Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	15,35
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	46,05

19.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1466 ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	Registros e Válvulas		un	1,00	102,73	102,73
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,61	3,74	2,28
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,61	3,65	2,22
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	1,20	0,22	0,26
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,61	19,81	12,08
Insumo	00006013 SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	Material		UN	1,00	78,60	78,60
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,61	11,96	7,29
			MO sem LS =>	9,02	LS =>	10,35	MO com LS =>	19,37
			Valor do BDI =>	25,64			Valor com BDI =>	128,37
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	385,11

19.11	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383 SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	5,81	5,81
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,09	17,86	1,68
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,09	24,86	2,34
Insumo	00000065 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material		UN	1,00	1,11	1,11
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,26
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,03	2,30	0,07
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,35
			MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,67	MO com LS =>	3,12
			Valor do BDI =>	1,45			Valor com BDI =>	7,26
					Quant. =>	14,00	Preço Total =>	101,64

19.12	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1470 ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	Registros e Válvulas		un	1,00	80,52	80,52
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,61	3,74	2,28
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,61	3,65	2,22
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,94	0,22	0,20
Insumo	1966 ORSE	Registro pressão 3/4" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	Material		un	1,00	56,45	56,45
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,61	19,81	12,08
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,61	11,96	7,29
			MO sem LS =>	9,02	LS =>	10,35	MO com LS =>	19,37
			Valor do BDI =>	20,09			Valor com BDI =>	100,61
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	100,61

19.13	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395 SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	11,40	11,40
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,20	17,86	3,61

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 69
Rubrica

Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,20	24,86	5,03
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,47
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,05	2,30	0,11
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,61
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,00	1,57	1,57
			MO sem LS =>	3,13	LS =>	3,59	MO com LS =>	6,72
			Valor do BDI =>	2,84			Valor com BDI =>	14,24
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	85,44

19.14	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89420 SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	9,31	9,31
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,05	17,86	0,92
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,05	24,86	1,29
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,27
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,03	2,30	0,05
Insumo	00003855 SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	Material		UN	1,00	6,48	6,48
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,30
			MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,92	MO com LS =>	1,72
			Valor do BDI =>	2,32			Valor com BDI =>	11,63
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	11,63

19.15	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89623 SINAPI	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	19,33	19,33
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,14	17,86	2,50
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,14	24,86	3,48
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,02	45,08	0,79
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,02	2,30	0,05
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,02	51,08	1,07
Insumo	00007141 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,00	11,44	11,44
			MO sem LS =>	2,16	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,64
			Valor do BDI =>	4,82			Valor com BDI =>	24,15
					Quant. =>	5,00	Preço Total =>	120,75

19.16	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3147 ORSE	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	Conversão InfoWOrca		un	1,00	19,02	19,02
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,30	3,74	1,12
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,30	3,65	1,09
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,01	81,38	1,13
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,02	78,37	1,56
Insumo	2572 ORSE	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm	Material		un	1,00	4,60	4,60
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,30	19,81	5,94
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,30	11,96	3,58
			MO sem LS =>	4,43	LS =>	5,09	MO com LS =>	9,52
			Valor do BDI =>	4,74			Valor com BDI =>	23,76
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	23,76

19.17	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94491 SINAPI	Registro de esfera soldável 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	43,62	43,62
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,11	17,86	2,02
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,11	24,86	2,81
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material		UN	0,07	14,71	1,05
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,01	2,30	0,02
Insumo	00011676 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material		UN	1,00	36,81	36,81
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,02	51,08	0,91
			MO sem LS =>	1,75	LS =>	2,00	MO com LS =>	3,75
			Valor do BDI =>	10,88			Valor com BDI =>	54,50
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	54,50

19.18	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94489 SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	21,79	21,79
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,08	17,86	1,41
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,08	24,86	1,97
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material		UN	0,04	14,71	0,58
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,01	2,30	0,01
Insumo	00011674 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material		UN	1,00	17,34	17,34
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,48
			MO sem LS =>	1,22	LS =>	1,41	MO com LS =>	2,63

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RORAIMA
Fls. 70
Rúbrica

				Valor do BDI =>	5,43		Valor com BDI =>	27,22
						Quant. => 1,00	Preço Total =>	27,22
19.19	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	752,69	752,69
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,00	17,86	17,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,00	24,86	24,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,50	25,49	38,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,50	17,38	26,07
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,00	52,14	0,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	2,00	1,36	2,72
Insumo	00003279	SINAPI	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60" CM H= 60" CM	Material		UN	2,92	220,42	642,85
				MO sem LS =>	38,01	LS =>	43,63	MO com LS =>	81,64
				Valor do BDI =>	187,87			Valor com BDI =>	940,56
						Quant. => 1,00		Preço Total =>	940,56
19.20	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários		un	1,00	51,45	51,45
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,34	3,74	1,27
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,34	3,65	1,24
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,30	0,22	0,06
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,34	19,81	6,73
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,34	11,96	4,06
Insumo	00011762	SINAPI	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)	Material		UN	1,00	38,09	38,09
				MO sem LS =>	5,02	LS =>	5,77	MO com LS =>	10,79
				Valor do BDI =>	12,84			Valor com BDI =>	64,29
						Quant. => 3,00		Preço Total =>	192,87
20			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**						**19.461,49**
20.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89711	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	18,38	18,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,30	17,86	5,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,30	24,86	7,45
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,10	2,30	0,23
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,05	5,10	5,35
				MO sem LS =>	4,63	LS =>	5,31	MO com LS =>	9,94
				Valor do BDI =>	4,56			Valor com BDI =>	22,96
						Quant. => 9,10		Preço Total =>	208,93
20.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89712	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	26,93	26,93
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,38	17,86	6,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,38	24,86	9,44
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,48
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,13	2,30	0,29
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,02	51,08	0,83
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,05	8,68	9,11
				MO sem LS =>	5,87	LS =>	6,73	MO com LS =>	12,60
				Valor do BDI =>	6,72			Valor com BDI =>	33,65
						Quant. => 12,40		Preço Total =>	417,26
20.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89714	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	51,65	51,65
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,74	17,86	13,21
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,74	24,86	18,39
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,04	45,08	1,63
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,25	2,30	0,56
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,06	51,08	3,02
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,05	14,14	14,84
				MO sem LS =>	11,43	LS =>	13,11	MO com LS =>	24,54
				Valor do BDI =>	12,89			Valor com BDI =>	64,54
						Quant. => 28,00		Preço Total =>	1.807,12
20.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90443	SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	12,41	12,41
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,86	1,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,45	24,86	11,18
				MO sem LS =>	4,62	LS =>	5,31	MO com LS =>	9,93
				Valor do BDI =>	3,09			Valor com BDI =>	15,50
						Quant. => 8,40		Preço Total =>	130,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 71
Rubrica

20.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89796	SINAPI	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	37,24	37,24
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,33	17,86	5,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,33	24,86	8,20
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,00	3,00	6,00
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,09	18,61	1,71
Insumo	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	15,44	15,44
				MO sem LS =>	5,09	LS =>	5,84	MO com LS =>	10,93
				Valor do BDI =>	9,29			Valor com BDI =>	46,53
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	139,59

20.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1588	ORSE	Tê sanitário em PVC rígido soldável para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		un	1,00	48,25	48,25
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,46	3,74	1,72
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,46	3,65	1,67
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,08	81,38	6,10
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,12	78,37	9,40
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,46	19,81	9,11
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,46	11,96	5,50
Insumo	00011655	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	14,75	14,75
				MO sem LS =>	6,80	LS =>	7,81	MO com LS =>	14,61
				Valor do BDI =>	12,04			Valor com BDI =>	60,29
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	60,29

20.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89785	SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	19,93	19,93
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	17,86	3,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	24,86	4,22
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,00	1,69	3,38
Insumo	00003662	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	8,56	8,56
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,04	18,61	0,74
				MO sem LS =>	2,62	LS =>	3,01	MO com LS =>	5,63
				Valor do BDI =>	4,97			Valor com BDI =>	24,90
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	24,90

20.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1603	ORSE	Joelho 90* de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		un	1,00	11,22	11,22
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,12	3,74	0,44
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,12	3,65	0,43
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,02	81,38	1,30
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,02	78,37	1,72
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,12	19,81	2,37
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	3,53	3,53
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,12	11,96	1,43
				MO sem LS =>	1,77	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,80
				Valor do BDI =>	2,80			Valor com BDI =>	14,02
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>	140,20

20.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1554	ORSE	Joelho 90* de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		un	1,00	10,84	10,84
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,14	3,74	0,52
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,14	3,65	0,51
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,02	81,38	1,22
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,02	78,37	1,72
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,14	19,81	2,77
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	2,43	2,43
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,14	11,96	1,67
				MO sem LS =>	2,07	LS =>	2,37	MO com LS =>	4,44
				Valor do BDI =>	2,70			Valor com BDI =>	13,54
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>	135,40

20.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744	SINAPI	Joelho 90* de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	22,56	22,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	17,86	4,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	24,86	6,21
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,00	3,00	3,00
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	8,04	8,04
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,05	18,61	0,85
				MO sem LS =>	3,86	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,29
				Valor do BDI =>	5,63			Valor com BDI =>	28,19

Bibliotek

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 72
Rúbrica

					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	112,76
20.11	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89732 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	10,64	10,64
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	17,86	2,32
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	24,86	3,23
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,00	1,69	1,69
Insumo	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	3,03	3,03
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,02	18,61	0,37
			MO sem LS =>	2,01	LS =>	2,30	MO com LS =>	4,31
			Valor do BDI =>	2,65			Valor com BDI =>	13,29
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**13,29**
20.12	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89726 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	6,51	6,51
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	17,86	1,78
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	24,86	2,48
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,44
Insumo	00003516 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	1,01	1,01
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,02	2,30	0,04
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,02	51,08	0,76
			MO sem LS =>	1,54	LS =>	1,76	MO com LS =>	3,30
			Valor do BDI =>	1,62			Valor com BDI =>	8,13
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**16,26**
20.13	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89730 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	59,30	59,30
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	17,86	4,46
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	24,86	6,21
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,00	3,00	3,00
Insumo	00001970 SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	44,78	44,78
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,05	18,61	0,85
			MO sem LS =>	3,86	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,29
			Valor do BDI =>	14,80			Valor com BDI =>	74,10
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**148,20**
20.14	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89735 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	18,05	18,05
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	17,86	2,32
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	24,86	3,23
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,00	1,69	1,69
Insumo	00001968 SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	10,44	10,44
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,02	18,61	0,37
			MO sem LS =>	2,01	LS =>	2,30	MO com LS =>	4,31
			Valor do BDI =>	4,50			Valor com BDI =>	22,55
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**45,10**
20.15	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89709 SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	9,98	9,98
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,86	1,25
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	24,86	1,74
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,00	45,08	0,22
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,02	2,30	0,03
Insumo	00011741 SINAPI	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material		UN	1,00	6,36	6,36
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,38
			MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,31
			Valor do BDI =>	2,49			Valor com BDI =>	12,47
					Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**37,41**
20.16	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89707 SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no mínimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	27,35	27,35
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	17,86	4,46
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	24,86	6,21
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,00	1,69	1,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 73
Rubrica

Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08	0,66
Insumo	00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,00	12,68	12,68
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,06	2,30	0,14
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE "400" G)	Material	UN	0,02	18,61	0,37
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02	51,08	1,14
			MO sem LS => 3,86	LS => 4,43		MO com LS =>	8,29
			Valor do BDI => 6,82			Valor com BDI =>	34,17
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	102,51

20.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1536 ORSE	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,00	18,57	18,57
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,12	3,74	0,44
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,12	3,65	0,43
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,03	81,38	2,03
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,04	78,37	3,13
Insumo	00001200 SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	8,74	8,74
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,12	19,81	2,37
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,12	11,96	1,43
			MO sem LS => 1,77	LS => 2,03		MO com LS =>	3,80
			Valor do BDI => 4,63			Valor com BDI =>	23,20
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	46,40

20.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98078 SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e= 10cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	4.377,10	4.377,10
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,24	54,71	13,30
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,12	151,78	18,12
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	1.285,17	133,65
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,21	14,01	44,94
Composição Auxiliar	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,04	54,19	56,35
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,13	2.675,67	337,13
Composição Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,03	3.113,31	78,45
Composição Auxiliar	101625 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,19	108,44	20,27
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,02	940,90	959,81
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,15	25,49	793,90
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,47	17,38	425,31
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,37	241,18	89,14
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	2.198,02	0,64	1.406,73
			MO sem LS => 571,22	LS => 655,64		MO com LS =>	1.226,86
			Valor do BDI => 1.092,52			Valor com BDI =>	5.469,62
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	5.469,62

20.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98082 SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	4.060,16	4.060,16
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,14	54,71	7,66
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,07	151,78	10,70
Composição Auxiliar	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	1.317,88	137,85
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	1.285,17	134,42
Composição Auxiliar	89996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,46	14,48	50,03
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,75	671,35	506,13
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,20	14,01	58,78
Composição Auxiliar	92787 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	20,01	19,23	384,83
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,24	2.675,67	629,31

EMBARGO

Composição Auxiliar	101624 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,30	330,55	98,83
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,09	620,01	54,68
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,47	786,66	373,38
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,99	25,49	560,63
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	17,28	17,38	300,34
Insumo	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	106,89	5,71	610,36
Insumo	00000660 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	35,70	3,54	126,37
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,02	7,10	0,13
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,42	2,74	1,15
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,04	21,63	0,96
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,50	0,96	0,48
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,57	8,23	12,94
			MO sem LS => 527,69	LS =>	605,68	MO com LS =>	1.133,37
			Valor do BDI => 1.013,41			Valor com BDI =>	5.073,57
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	5.073,57

20.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2798 ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforcada, revestida internamente com barra lisa e fundo em	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos	un	1,00	533,42	533,42
Composição Auxiliar	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,78	87,37	68,14
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,11	762,70	83,13
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	3,20	15,06	48,19
Composição Auxiliar	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singelo), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	2,24	101,14	226,55
Composição Auxiliar	1908 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1,92	34,25	65,76
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,58	47,10	27,12
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,92	7,57	14,53
			MO sem LS => 100,32	LS =>	115,14	MO com LS =>	215,46
			Valor do BDI => 133,14			Valor com BDI =>	666,56
				Quant. =>	9,00	Preço Total =>	5.332,48

21		COMBATE A INCÊNDIO					841,21
21.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101909 SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00	215,71	215,71
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	17,86	8,16
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	24,86	11,37
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,00	0,59	1,18
Insumo	00010692 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,00	195,00	195,00
			MO sem LS => 7,06	LS =>	8,10	MO com LS =>	15,16
			Valor do BDI => 53,84			Valor com BDI =>	269,55
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	539,10

21.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10363 ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	Sinalização Vertical	un	1,00	24,97	24,97
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,25	3,63	0,90
Insumo	2682 ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	Material	un	4,00	0,14	0,56
Insumo	11143 ORSE	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	Material	un	1,00	18,56	18,56
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,25	19,81	4,95
			MO sem LS => 2,30	LS =>	2,65	MO com LS =>	4,95
			Valor do BDI => 6,23			Valor com BDI =>	31,20
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	62,40

21.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	11852 ORSE	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Sinalização Vertical	Un	1,00	31,78	31,78
Insumo	00037559 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Material	UN	1,00	31,78	31,78
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 7,93			Valor com BDI =>	39,71
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	39,71

22		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					28.832,80
22.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91940 SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	14,35	14,35
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	861,54	0,77
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	18,65	4,60

ภาคผนวก

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 75
Rubrica

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	25,76	6,36
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1,00	2,62	2,62
				MO sem LS =>	3,91	LS =>	4,49	MO com LS =>	8,40
				Valor do BDI =>	3,58			Valor com BDI =>	17,93
						Quant. =>	46,00	Preço Total =>	824,78

22.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	2,81	2,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	18,65	0,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	25,76	0,61
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,19	1,47	1,74
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,79
				Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,51
						Quant. =>	62,60	Preço Total =>	219,72

22.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	2,81	2,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	18,65	0,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	25,76	0,61
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,19	1,47	1,74
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,79
				Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,51
						Quant. =>	76,60	Preço Total =>	268,86

22.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	2,81	2,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	18,65	0,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	25,76	0,61
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,19	1,47	1,74
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,79
				Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,51
						Quant. =>	52,60	Preço Total =>	184,62

22.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	2,81	2,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	18,65	0,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	25,76	0,61
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,19	1,47	1,74
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,79
				Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,51
						Quant. =>	142,20	Preço Total =>	499,12

22.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	4,13	4,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,65	0,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	25,76	0,77
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,19	2,35	2,79
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
				MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>	5,16
						Quant. =>	142,20	Preço Total =>	733,75

22.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	4,13	4,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,65	0,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	25,76	0,77
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,19	2,35	2,79
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
				MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>	5,16
						Quant. =>	82,60	Preço Total =>	426,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 76
Rubrica

22.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	4,13	4,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,65	0,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	25,76	0,77
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,19	2,35	2,79
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS => 0,47	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,00
			Valor do BDI => 1,03			Valor com BDI =>	5,16
				Quant. =>	188,30	Preço Total =>	971,62

22.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	4,13	4,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,65	0,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	25,76	0,77
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,19	2,35	2,79
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS => 0,47	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,00
			Valor do BDI => 1,03			Valor com BDI =>	5,16
				Quant. =>	153,90	Preço Total =>	794,12

22.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	25,10	25,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,65	2,14
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	25,76	2,96
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	16,79	19,98
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS => 1,80	LS =>	2,06	MO com LS =>	3,86
			Valor do BDI => 6,26			Valor com BDI =>	31,36
				Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.254,40

22.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	25,10	25,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,65	2,14
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	25,76	2,96
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	16,79	19,98
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS => 1,80	LS =>	2,06	MO com LS =>	3,86
			Valor do BDI => 6,26			Valor com BDI =>	31,36
				Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.254,40

22.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	25,10	25,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,65	2,14
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	25,76	2,96
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	16,79	19,98
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS => 1,80	LS =>	2,06	MO com LS =>	3,86
			Valor do BDI => 6,26			Valor com BDI =>	31,36
				Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.254,40

22.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	25,10	25,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,65	2,14
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	25,76	2,96
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	16,79	19,98
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS => 1,80	LS =>	2,06	MO com LS =>	3,86
			Valor do BDI => 6,26			Valor com BDI =>	31,36
				Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.254,40

22.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2794 ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,00	274,28	274,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RORAIMA
Fls. 736
Rubrica

Composição Auxiliar	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,44	87,37	38,79
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,06	762,70	43,93
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,29	14,07	18,20
Composição Auxiliar	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,20	101,14	121,36
Composição Auxiliar	1908 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	0,96	34,25	32,88
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,25	47,10	11,86
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,96	7,57	7,26
			MO sem LS => 51,86	LS => 59,52		MO com LS =>	111,38
			Valor do BDI => 68,46			Valor com BDI =>	342,74
				Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**1.028,22**

22.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993 SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	38,99	38,99
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	7,41	7,41
Composição Auxiliar	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	31,58	31,58
			MO sem LS => 8,95	LS => 10,27		MO com LS =>	19,22
			Valor do BDI => 9,73			Valor com BDI =>	48,72
				Quant. =>	**14,00**	**Preço Total =>**	**682,08**

22.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91973 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	81,59	81,59
Composição Auxiliar	91950 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	11,77	11,77
Composição Auxiliar	91972 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	69,82	69,82
			MO sem LS => 15,37	LS => 17,64		MO com LS =>	33,01
			Valor do BDI => 20,36			Valor com BDI =>	101,95
				Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**203,90**

22.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91957 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	43,47	43,47
Composição Auxiliar	91956 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	36,06	36,06
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	7,41	7,41
			MO sem LS => 8,57	LS => 9,84		MO com LS =>	18,41
			Valor do BDI => 10,85			Valor com BDI =>	54,32
				Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**108,64**

22.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91969 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	68,66	68,66
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	7,41	7,41
Composição Auxiliar	91968 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	61,25	61,25
			MO sem LS => 13,75	LS => 15,78		MO com LS =>	29,53
			Valor do BDI => 17,13			Valor com BDI =>	85,79
				Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**171,58**

22.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953 SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	23,95	23,95
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	7,41	7,41
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	16,54	16,54
			MO sem LS => 4,70	LS => 5,40		MO com LS =>	10,10
			Valor do BDI => 5,97			Valor com BDI =>	29,92
				Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**59,84**

22.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959 SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	37,84	37,84
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	7,41	7,41
Composição Auxiliar	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	30,43	30,43
			MO sem LS => 7,29	LS => 8,36		MO com LS =>	15,65
			Valor do BDI => 9,44			Valor com BDI =>	47,26
				Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**47,26**

22.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12241 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplastica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	1,00	275,71	275,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 78
Rubrica

Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	4,80	3,59	17,23
Insumo	558 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	Material		un	1,00	163,40	163,40
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	4,80	19,81	95,08
			MO sem LS =>	44,27	LS =>	50,81	MO com LS =>	95,08
			Valor do BDI =>	68,81			Valor com BDI =>	344,52
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	344,52

22.22	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo	Fusíveis, Disjuntores e Chaves		un	1,00	122,14	122,14
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,60	3,74	2,24
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	0,60	3,59	2,15
Insumo	3692 ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5kA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material		un	1,00	98,70	98,70
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,60	19,81	11,88
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,60	11,96	7,17
			MO sem LS =>	8,87	LS =>	10,18	MO com LS =>	19,05
			Valor do BDI =>	30,48			Valor com BDI =>	152,62
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	305,24

22.23	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93662 SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,00	55,41	55,41
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	18,65	2,47
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	25,76	3,41
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,00	47,35	47,35
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	2,00	1,09	2,18
			MO sem LS =>	2,08	LS =>	2,38	MO com LS =>	4,46
			Valor do BDI =>	13,83			Valor com BDI =>	69,24
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	415,44

22.24	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93655 SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,00	12,28	12,28
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	18,65	1,23
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	25,76	1,70
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,00	8,26	8,26
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	1,00	1,09	1,09
			MO sem LS =>	1,04	LS =>	1,19	MO com LS =>	2,23
			Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	15,34
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>	122,72

22.25	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91863 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	11,60	11,60
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	3,22	3,22
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,08	18,65	1,52
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,08	25,76	2,11
Insumo	00002674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material		M	1,02	4,68	4,75
			MO sem LS =>	1,98	LS =>	2,28	MO com LS =>	4,26
			Valor do BDI =>	2,89			Valor com BDI =>	14,49
					Quant. =>	75,00	Preço Total =>	1.086,75

22.26	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91864 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	15,35	15,35
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	3,22	3,22
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,11	18,65	1,97
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,11	25,76	2,73
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material		M	1,02	7,31	7,43
			MO sem LS =>	2,36	LS =>	2,71	MO com LS =>	5,07
			Valor do BDI =>	3,83			Valor com BDI =>	19,18
					Quant. =>	9,40	Preço Total =>	180,29

22.27	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91871 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	12,29	12,29
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	18,65	3,17
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	25,76	4,37
Insumo	00002674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material		M	1,02	4,68	4,75
			MO sem LS =>	2,66	LS =>	3,05	MO com LS =>	5,71
			Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	15,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 79
Rubrica

					Quant. =>	50,30	Preço Total =>	772,10

22.28	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872 SINAPI	Eletroduto rigido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	16,03	16,03
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,19	18,65	3,61
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,19	25,76	4,99
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material		M	1,02	7,31	7,43
			MO sem LS =>	3,04	LS =>	3,48	MO com LS =>	6,52
			Valor do BDI =>	4,00			Valor com BDI =>	20,03
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	120,18

22.29	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91873 SINAPI	Eletroduto rigido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	19,71	19,71
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,22	18,65	4,12
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,22	25,76	5,69
Insumo	00002684 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	Material		M	1,02	9,74	9,90
			MO sem LS =>	3,46	LS =>	3,97	MO com LS =>	7,43
			Valor do BDI =>	4,91			Valor com BDI =>	24,62
					Quant. =>	36,00	Preço Total =>	886,32

22.30	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447 SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		M	1,00	6,19	6,19
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,65	0,63
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,22	25,76	5,56
			MO sem LS =>	2,26	LS =>	2,59	MO com LS =>	4,85
			Valor do BDI =>	1,54			Valor com BDI =>	7,73
					Quant. =>	57,80	Preço Total =>	446,79

22.31	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8324 ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma	Luminárias Internas		un	1,00	9,67	9,67
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	0,20	3,59	0,71
Insumo	8518 ORSE	Plafon plastico branco com soquete E-27	Material		un	1,00	5,00	5,00
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,20	19,81	3,96
			MO sem LS =>	1,84	LS =>	2,12	MO com LS =>	3,96
			Valor do BDI =>	2,41			Valor com BDI =>	12,08
					Quant. =>	28,00	Preço Total =>	350,32

22.32	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97607 SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	137,10	137,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,23	18,65	4,28
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,55	25,76	14,21
Insumo	00038193 SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material		UN	1,00	7,12	7,12
Insumo	00038775 SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material		UN	1,00	111,49	111,49
			MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,64	MO com LS =>	14,30
			Valor do BDI =>	34,22			Valor com BDI =>	171,32
					Quant. =>	5,00	Preço Total =>	856,60

22.33	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11857 ORSE	Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt	Luminárias Internas		un	1,00	27,49	27,49
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	0,15	3,59	0,53
Insumo	12689 ORSE	Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt un	0		un	1,00	23,99	23,99
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,15	19,81	2,97
			MO sem LS =>	1,38	LS =>	1,59	MO com LS =>	2,97
			Valor do BDI =>	6,86			Valor com BDI =>	34,35
					Quant. =>	31,00	Preço Total =>	1.064,85

22.34	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97599 SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	26,61	26,61
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	18,65	1,39
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,18	25,76	4,62
Insumo	00038774 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material		UN	1,00	20,60	20,60
			MO sem LS =>	2,17	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,65
			Valor do BDI =>	6,64			Valor com BDI =>	33,25
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	99,75

22.35	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985 SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,00	81,94	81,94
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	18,65	4,72
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	25,76	6,51
Insumo	00003379 SINAPI	HEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material		UN	1,00	70,71	70,71
			MO sem LS =>	3,97	LS =>	4,55	MO com LS =>	8,52

Elhuyar

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - Fls. 80 - Rubrica

			Valor do BDI =>	20,45		Valor com BDI =>	102,39
					Quant. => 3,00	Preço Total =>	307,17

22.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96977	SINAPI	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,00	59,24	59,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,65	0,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	25,76	0,86
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,10	52,51	57,76
				MO sem LS => 0,52	LS => 0,60	MO com LS =>		1,12
				Valor do BDI => 14,78		Valor com BDI =>		74,02
					Quant. => 10,00	Preço Total =>		740,20

22.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4192	ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	Subestação Transformadora em Poste	un	1,00	11,95	11,95
Insumo	00011862	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	Material	UN	1,00	11,95	11,95
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI => 2,98		Valor com BDI =>		14,93
					Quant. => 2,00	Preço Total =>		29,86

22.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4014	ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	Un	1,00	8,78	8,78
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	1,00	8,78	8,78
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI => 2,19		Valor com BDI =>		10,97
					Quant. => 3,00	Preço Total =>		32,91

22.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4015	ORSE	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão à base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação, cor	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	Un	1,00	12,60	12,60
Insumo	2643	ORSE	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	Material	un	1,00	12,60	12,60
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI => 3,14		Valor com BDI =>		15,74
					Quant. => 3,00	Preço Total =>		47,22

22.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	68,75	68,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	17,38	68,75
				MO sem LS => 22,40	LS => 25,70	MO com LS =>		46,10
				Valor do BDI => 17,16		Valor com BDI =>		85,91
					Quant. => 4,50	Preço Total =>		386,59

22.41	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	Reaterro manual aplicado com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	41,68	41,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	17,38	41,68
				MO sem LS => 13,58	LS => 15,58	MO com LS =>		29,16
				Valor do BDI => 10,40		Valor com BDI =>		52,08
					Quant. => 3,50	Preço Total =>		182,28

22.42	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101502	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	1.728,29	1.728,29
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,05	16,03	96,98
Composição Auxiliar	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	9,91	9,91
Composição Auxiliar	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	16,72	16,72
Composição Auxiliar	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	18,93	18,93
Composição Auxiliar	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	16,65	25,10	417,91
Composição Auxiliar	93686	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	66,74	66,74
Composição Auxiliar	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	488,96	488,96
Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,95	59,24	115,51
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	122,17	122,17
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,02	717,74	11,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,32	18,65	6,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,91	25,76	74,96
Insumo	00001094	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,00	27,21	27,21
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5 MM	Material	UN	2,00	1,11	2,22
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	Material	UN	1,00	23,07	23,07
Insumo	00039609	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,00	164,11	164,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 81
Rubrica

Insumo	00011864 SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material		UN	1,00	26,97	26,97
Insumo	00014153 SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material		UN	0,06	55,49	3,32
Insumo	00003398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material		UN	1,00	5,01	5,01
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material		UN	3,00	9,42	28,26
Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material		UN	2,00	0,28	0,56
Insumo	00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material		M	0,17	5,07	0,84
			MO sem LS =>	149,98	LS =>	172,14	MO com LS =>	322,12
			Valor do BDI =>	431,38			Valor com BDI =>	2.159,67
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.159,67

22.43	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	585,13	585,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,06	18,65	19,73
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,44	25,76	88,53
Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material		M	2,00	37,70	75,40
Insumo	00011975 SINAPI	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	Material		UN	4,00	21,83	87,32
Insumo	00012388 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = "2,5" M	Material		UN	1,00	314,15	314,15
			MO sem LS =>	39,19	LS =>	44,98	MO com LS =>	84,17
			Valor do BDI =>	146,04			Valor com BDI =>	731,17
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.462,34

22.44	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12628 ORSE	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças		un	1,00	3.353,68	3.353,68
Composição Auxiliar	50 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações		m²	3,70	101,99	377,36
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana		m³	0,70	47,10	32,97
Composição Auxiliar	10603 ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios		h	1,00	4,20	4,20
Composição Auxiliar	102487 SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL. INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,51	733,13	1.107,02
Insumo	8904 ORSE	Máquina de solda elétrica	Equipamento		h	0,85	3,86	3,28
Insumo	13424 ORSE	Roldana de aço, com rolamento, Ø =30mm	Material		un	3,00	50,99	152,97
Insumo	00006160 SINAPI	SOLDADOR	Mão de Obra		H	1,00	21,65	21,65
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material		KG	0,85	22,08	18,76
Insumo	00021012 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	Material		M	6,60	68,64	453,02
Insumo	00021013 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, "4,40" KG/M (NBR 5580)	Material		M	13,20	89,58	1.182,45
			MO sem LS =>	212,40	LS =>	243,80	MO com LS =>	456,20
			Valor do BDI =>	837,07			Valor com BDI =>	4.190,75
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	4.190,75

Tipo de Licitação Convite
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório Processo Administrativo nº

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Engº Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 0905404068

Em Branco

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 82
Rubrica

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Arthur Nabuco de Araújo- Comunidade Maracanã I_ Município de Uiramutã/ RR

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Roraima
ORSE - 07/2022 - Sergipe

B.D.I.
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	204,24	145,51	29.718,96	6,03	6,03
87255 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	130,57	172,21	22.485,45	4,56	10,59
3125 ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	Alimentação	un	1.182,0	17,49	20.673,18	4,19	14,78
87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	434,6	45,98	19.982,90	4,05	18,83
62 ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0	18.734,70	18.734,70	3,80	22,63
94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	18,0	976,62	17.579,16	3,57	26,20
94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	18,21	908,14	16.537,22	3,35	29,55
92263 SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	87,64	184,04	16.129,26	3,27	32,82
283 ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	Telhamento	m²	185,13	76,51	14.164,29	2,87	35,69
93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	2,0	6.616,81	13.233,62	2,68	38,38
92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	87,64	149,25	13.081,14	2,65	41,03
87274 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	111,36	115,45	12.856,51	2,61	43,64
94994 SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	PISO - PISOS	m²	72,77	174,24	12.679,44	2,57	46,21
92540 SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	COBE - COBERTURA	m²	185,13	67,51	12.498,12	2,53	48,74
92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	455,62	21,70	9.886,95	2,01	50,75
87690 SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	PISO - PISOS	m²	130,57	72,80	9.505,49	1,93	52,68
4449 ORSE	Forro em de PVC 100mm - inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro	Forros	m²	130,57	72,41	9.454,57	1,92	54,60
87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	45,83	200,49	9.188,45	1,86	56,46
9203 ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Conversão InfoWOrca	tkm	14.391,75	0,62	8.922,88	1,81	58,27
93243 SINAPI	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saida, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,0	8.587,36	8.587,36	1,74	60,01
90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	64,0	134,15	8.585,60	1,74	61,75
2412 ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	Mobiliário	un	8,0	978,88	7.831,04	1,59	63,34
87630 SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	PISO - PISOS	m²	130,57	57,96	7.567,83	1,53	64,87
88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta acetinada em paredes, duas demãos.	PINT - PINTURAS	m²	410,06	17,19	7.048,93	1,43	66,30
92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	233,79	27,15	6.347,39	1,29	67,59
92455 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	38,88	161,02	6.260,45	1,27	68,86
87528 SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de taliscа	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	111,36	54,50	6.069,12	1,23	70,09
92266 SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	38,88	146,99	5.714,97	1,16	71,26
98078 SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	5.469,62	5.469,62	1,11	72,36
2798 ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforcada, revestida internamente com barra lisa e fundo em	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos	un	8,0	666,56	5.332,48	1,08	73,44
100948 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	4.492,52	1,14	5.121,47	1,04	74,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 83
Rúbrica

96539 SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	36,78	139,21	5.120,14	1,04	75,52
98082 SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	5.073,57	5.073,57	1,03	76,55
91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	160,0	31,36	5.017,60	1,02	77,56
8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	Latex PVA	m²	207,02	21,79	4.510,96	0,91	78,48
94223 SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial, feitas com composto de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	COBE - COBERTURA	M	32,24	139,31	4.491,35	0,91	79,39
92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	18,21	239,09	4.353,82	0,88	80,27
12628 ORSE	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	4.190,75	4.190,75	0,85	81,12
87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	434,6	9,65	4.150,43	0,84	81,96
88497 SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS	m²	203,04	17,83	3.620,20	0,73	82,70
92777 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	148,7	24,25	3.605,97	0,73	83,43
92776 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	124,19	25,80	3.204,10	0,65	84,08
101965 SINAPI	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	18,8	159,61	3.000,66	0,61	84,69
91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	567,0	5,16	2.925,72	0,59	85,28
98524 SINAPI	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	900,0	3,24	2.916,00	0,59	85,87
11125 ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10.1 kw - Rev 01	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0	2.756,33	2.756,33	0,56	86,43
8974 ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	Louças e Metais Sanitários	un	2,0	1.331,02	2.662,04	0,54	86,97
98557 SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	53,65	47,27	2.536,03	0,51	87,49
51 ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	3,6	688,36	2.478,09	0,50	87,99
2450 ORSE	Limpeza geral (final da obra)	Limpeza	m²	900,0	2,73	2.457,00	0,50	88,49
88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	PISO - PISOS	M	92,0	24,95	2.295,40	0,47	88,95
101502 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	2.159,67	2.159,67	0,44	89,39
2093 ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	2.037,94	2.037,94	0,41	89,80
90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	5,0	387,91	1.939,55	0,39	90,20
93186 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	23,0	82,87	1.906,01	0,39	90,58
99059 SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	35,0	53,19	1.861,65	0,38	90,96
89714 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	28,0	64,54	1.807,12	0,37	91,33
00010848 SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	Material	UN	1,0	1.676,56	1.676,56	0,34	91,67
93188 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	22,0	71,93	1.582,46	0,32	91,99
93196 SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	19,0	81,67	1.551,73	0,31	92,30
93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	17,93	85,91	1.540,36	0,31	92,62
00010527 SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	Equipamento	MXMES	90,45	16,49	1.491,52	0,30	92,92
100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2.5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	731,17	1.462,34	0,30	93,22
96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	27,85	52,08	1.450,42	0,29	93,51
55960 SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	COBE - COBERTURA	m²	185,13	7,53	1.394,02	0,28	93,79
95241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	28,2	47,23	1.331,88	0,27	94,06
88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	PINT - PINTURAS	m²	410,06	2,87	1.176,87	0,24	94,30
91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	334,0	3,51	1.172,34	0,24	94,54
86931 SINAPI	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	565,95	1.131,90	0,23	94,77
91863 SINAPI	Eletroduto rigido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	75,0	14,49	1.086,75	0,22	94,99
88648 SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grés de dimensões 35x35cm	PISO - PISOS	M	96,06	11,18	1.073,95	0,22	95,21
11857 ORSE	Lâmpada tubular led T8, 16w, bivolt	Luminárias internas	un	31,0	34,35	1.064,85	0,22	95,42
2103 ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	1.029,04	1.029,04	0,21	95,63
2794 ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	3,0	342,74	1.028,22	0,21	95,84
74166/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	940,56	940,56	0,19	96,03

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 94
Rúbrica

11397 ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metalon de 20x20cm, fornecida e instalada	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0	937,20	937,20	0,19	96,22
91873 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	36,0	24,62	886,32	0,18	96,40
97607 SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acrílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,0	171,32	856,60	0,17	96,57
91940 SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	46,0	17,93	824,78	0,17	96,74
86943 SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	261,27	783,81	0,16	96,90
91871 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	50,3	15,35	772,10	0,16	97,06
6096 ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	Conversão InfoWOrca	UN	1,0	766,35	766,35	0,16	97,21
96977 SINAPI	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	10,0	74,02	740,20	0,15	97,36
100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0	735,71	735,71	0,15	97,51
91993 SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	14,0	48,72	682,08	0,14	97,65
89448 SINAPI	Tubo de PVC rígido soldável marrom para água fria Ø 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	30,1	21,84	651,36	0,13	97,78
98689 SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	PISO - PISOS	M	4,5	140,21	630,94	0,13	97,91
101909 SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	2,0	269,55	539,10	0,11	98,02
00010651 SINAPI	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm: fornecimento e instalação	Material	UN	6,0	88,50	531,00	0,11	98,13
94559 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,48	1.013,20	486,33	0,10	98,23
2390 ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	Alambrados e Gradis	un	2,0	235,29	470,58	0,10	98,32
90447 SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	57,8	7,73	446,79	0,09	98,41
90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	28,15	15,50	436,32	0,09	98,50
93201 SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	55,83	7,79	434,91	0,09	98,59
89712 SINAPI	Tubo de PVC, série normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	12,4	33,65	417,26	0,08	98,67
93662 SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	6,0	69,24	415,44	0,08	98,76
1466 ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	Registros e Válvulas	un	3,0	128,37	385,11	0,08	98,84
95546 SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	177,14	354,28	0,07	98,91
8324 ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma	Luminárias Internas	un	29,0	12,08	350,32	0,07	98,98
12241 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	1,0	344,52	344,52	0,07	99,05
96985 SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura cor	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	3,0	102,39	307,17	0,06	99,11
10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	2,0	152,62	305,24	0,06	99,17
89711 SINAPI	Tubo de PVC, série normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	9,1	22,96	208,93	0,04	99,21
89446 SINAPI	Tubo de PVC rígido soldável marrom para água fria Ø 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	28,9	7,19	207,79	0,04	99,26
91973 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	101,95	203,90	0,04	99,30
2082 ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	3,0	64,29	192,87	0,04	99,34
90373 SINAPI	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	11,0	17,51	192,61	0,04	99,38
91864 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	9,4	19,18	180,29	0,04	99,41
91969 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	85,79	171,58	0,03	99,45
89750 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	74,10	148,20	0,03	99,48
1603 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	10,0	14,02	140,20	0,03	99,51
89796 SINAPI	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	46,53	139,59	0,03	99,53
1554 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	10,0	13,54	135,40	0,03	99,56
93655 SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	8,0	15,34	122,72	0,02	99,59
89623 SINAPI	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	24,15	120,75	0,02	99,61
91872 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,0	20,03	120,18	0,02	99,64
89744 SINAPI	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	28,19	112,76	0,02	99,66
91997 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	54,32	108,64	0,02	99,68
89707 SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no mínimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	34,17	102,51	0,02	99,70

Document Image

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 85
Rubrica

89353 SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN		7,26	101,64	0,02	99,72
1470 ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	Registros e Válvulas	un	1,0	100,61	100,61	0,02	99,74
97599 SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	33,25	99,75	0,02	99,76
1144 ORSE	Joelho de redução 90º soldável 40 x 25mm água fria	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	16,56	99,36	0,02	99,78
00000377 SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	Material	UN	2,0	44,04	88,08	0,02	99,80
89395 SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	14,24	85,44	0,02	99,82
89362 SINAPI	Joelho 90º soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	10,24	81,92	0,02	99,83
2050 ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	Louças e Metais Sanitários	un	2,0	31,50	63,00	0,01	99,85
10363 ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	Sinalização Vertical	un	2,0	31,20	62,40	0,01	99,86
1588 ORSE	Tê sanitário em PVC rígido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0	60,29	60,29	0,01	99,87
91953 SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	29,92	59,84	0,01	99,88
94491 SINAPI	Registro de esfera soldável 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	54,50	54,50	0,01	99,90
91959 SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	47,28	47,28	0,01	99,90
4015 ORSE	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removivel para a aplicação, cor	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	Un	3,0	15,74	47,22	0,01	99,91
1536 ORSE	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	2,0	23,20	46,40	0,01	99,92
89497 SINAPI	Joelho 90º soldável 40mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	15,35	46,05	0,01	99,93
89735 SINAPI	Curva 90º longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	22,55	45,10	0,01	99,94
11852 ORSE	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Sinalização Vertical	Un	1,0	39,71	39,71	0,01	99,95
89709 SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	12,47	37,41	0,01	99,96
4014 ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	Un	3,0	10,97	32,91	0,01	99,96
4192 ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	Subestação Transformadora em Poste	un	2,0	14,93	29,86	0,01	99,97
89364 SINAPI	Curva 90º soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	13,94	27,88	0,01	99,98
94489 SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	27,22	27,22	0,01	99,98
89785 SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	24,90	24,90	0,01	99,99
3147 ORSE	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	Conversão InfoWOrca	un	1,0	23,76	23,76	0,00	99,99
89726 SINAPI	Joelho 45º de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	8,13	16,26	0,00	99,99
89732 SINAPI	Joelho 45º de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	13,29	13,29	0,00	100,00
89420 SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	11,63	11,63	0,00	100,00

Engª Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 0905404068

Library

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 86
Rubrica

PLANILHAS COM

BDI

DESONERADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 87
Rúbrica

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Arthur Nabuco de Araújo- Comunidade Maracanã I_ Município de Uiramutã/ RR

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Roraima
ORSE - 07/2022 - Sergipe

B.D.I.
32,2%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,74%
Mensalista: 48,18%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					20.073,06	3,84 %
1.1	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64	92,88	122,78	7.857,92	1,50 %
1.2	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	4.619,95	6.107,57	12.215,14	2,34 %
2		ALIMENTAÇÃO CANTEIRO					21.867,00	4,19 %
2.1	3126 ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	1182	14,00	18,50	21.867,00	4,19 %
3		DIVERSOS					15.602,13	2,99 %
3.1	00010848 SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	UN	1	1.341,68	1.773,70	1.773,70	0,34 %
3.2	00010851 SINAPI	Placa de acrilico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	UN	8	70,83	93,63	561,78	0,11 %
3.3	11397 ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metalon de 20x20cm, fornecida e instalada	un	1	750,00	991,50	991,50	0,19 %
3.4	00010527 SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	90,45	13,20	17,45	1.578,35	0,30 %
3.5	2412 ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	un	8	783,36	1.035,60	8.284,80	1,59 %
3.6	2450 ORSE	Limpeza geral (final da obra)	m²	900	2,03	2,68	2.412,00	0,46 %
4		MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					65.365,88	12,52 %
4.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	3,6	544,68	720,33	2.593,18	0,50 %
4.2	6096 ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	594,09	785,38	785,38	0,15 %
4.3	11125 ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10.1 kw - Rev 01	un	1	2.145,05	2.835,75	2.835,75	0,54 %
4.4	62 ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitorio, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e	un	1	14.565,36	19.255,40	19.255,40	3,69 %
4.5	99059 SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	35	39,50	52,21	1.827,35	0,35 %
4.6	98524 SINAPI	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	m²	900	2,35	3,10	2.790,00	0,53 %
4.7	9203 ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	32729,81	0,50	0,66	21.601,67	4,14 %
4.8	100948 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11397,63	0,91	1,20	13.677,15	2,62 %
5		INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES					23.236,38	4,45 %
5.1	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	7,8	62,14	82,14	640,69	0,12 %
5.2	96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	2	37,68	49,81	99,62	0,02 %
5.3	92263 SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	26,2	142,61	188,53	4.939,48	0,95 %
5.4	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	26,2	113,56	150,12	3.933,14	0,75 %
5.5	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	14,8	36,56	48,33	715,28	0,14 %
5.6	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,8	719,62	951,33	4.566,38	0,87 %
5.7	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,8	171,95	227,31	1.091,08	0,21 %
5.8	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	KG	39,76	20,83	27,53	1.094,59	0,21 %
5.9	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	273,12	17,05	22,54	6.156,12	1,18 %
6		INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME					24.774,91	4,74 %
6.1	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	1,66	62,14	82,14	136,35	0,03 %
6.2	96539 SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	38,78	104,51	138,16	5.081,52	0,97 %
6.3	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	13,4	36,56	48,33	647,62	0,12 %
6.4	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,87	719,62	951,33	4.632,97	0,89 %
6.5	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,87	171,95	227,31	1.106,99	0,21 %
6.6	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	KG	62,97	20,83	27,53	1.733,58	0,33 %
6.7	92777 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	148,7	18,96	25,06	3.726,42	0,71 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 88
Rubrica

6.8	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentrido em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	25,93	149,42	197,53	5.121,95	0,98 %
6.9	98557 SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfáltica, duas demãos	m²	53,65	36,49	46,23	2.587,53	0,50 %
7		**SUPERESTRUTURA - PILARES**					**30.663,64**	**5,87 %**
7.1	92263 SINAPI	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44	142,61	188,53	11.583,28	2,22 %
7.2	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44	113,56	150,12	9.223,37	1,77 %
7.3	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	3,34	719,62	951,33	3.177,44	0,61 %
7.4	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,34	171,95	227,31	759,21	0,15 %
7.5	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	65,63	20,83	27,53	1.806,79	0,35 %
7.6	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	182,5	17,05	22,54	4.113,55	0,79 %
8		**SUPERESTRUTURA - VIGAS**					**21.671,02**	**4,15 %**
8.1	92265 SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	38,88	113,88	150,54	5.852,99	1,12 %
8.2	92455 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	38,88	123,04	162,65	6.323,83	1,21 %
8.3	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	3,74	719,62	951,33	3.557,97	0,68 %
8.4	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,74	171,95	227,31	850,13	0,16 %
8.5	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	65,43	20,83	27,53	1.801,28	0,34 %
8.6	92776 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	124,19	20,01	26,45	3.284,82	0,63 %
9		**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**					**34.506,42**	**6,61 %**
9.1	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	203,04	107,95	142,70	28.973,80	5,55 %
9.2	93201 SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e	M	55,83	5,74	7,58	423,19	0,08 %
9.3	93186 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	23	63,63	84,11	1.934,53	0,37 %
9.4	93188 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	22	55,05	72,77	1.600,94	0,31 %
9.5	93196 SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	19	62,67	82,84	1.573,96	0,30 %
10		**REVESTIMENTO**					**41.536,30**	**7,95 %**
10.1	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	406,08	7,12	9,41	3.821,21	0,73 %
10.2	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	406,08	34,83	46,04	18.695,92	3,58 %
10.3	87528 SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	m²	111,36	40,98	54,17	6.032,37	1,16 %
10.4	87274 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	111,36	88,22	116,62	12.986,80	2,49 %
11		**PINTURA**					**16.178,20**	**3,10 %**
11.1	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	406,08	2,16	2,85	1.157,32	0,22 %
11.2	88497 SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	m²	203,04	13,23	17,49	3.551,16	0,68 %
11.3	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	203,04	16,06	21,25	4.314,60	0,83 %
11.4	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta acetinada em paredes, duas demãos.	m²	406,08	13,33	17,62	7.155,12	1,37 %
12		**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**					**2.978,16**	**0,57 %**
12.1	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	1,2	107,95	142,70	171,24	0,03 %
12.2	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	2,8	7,12	9,41	24,46	0,00 %
12.3	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	2,8	34,83	46,04	119,70	0,02 %
12.4	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	3,96	2,16	2,85	11,34	0,00 %

Em Branco

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 89
Rubrica

12.5	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	3,98	16,08	21,25	84,57	0,02 %
12.6	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	3,98	13,33	17,62	70,12	0,01 %
12.7	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	1,46	719,62	951,33	1.388,94	0,27 %
12.8	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,46	171,95	227,31	331,87	0,06 %
12.9	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1	586,93	775,92	775,92	0,15 %
13		**COBERTURA**					**43.408,30**	**8,31 %**
13.1	283 ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	185,13	60,28	79,69	14.753,00	2,82 %
13.2	92540 SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	185,13	51,16	67,63	12.520,34	2,40 %
13.3	94223 SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	M	32,24	111,20	147,00	4.739,28	0,91 %
13.4	55960 SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupincida incolor	m²	185,13	5,70	7,53	1.394,02	0,27 %
13.5	4449 ORSE	Forro em de PVC 100mm - inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro	m²	130,57	57,95	76,60	10.001,66	1,92 %
14		**PAVIMENTAÇÃO**					**44.074,43**	**8,44 %**
14.1	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	19,57	37,68	49,81	974,78	0,19 %
14.2	87690 SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	130,57	56,58	74,79	9.765,33	1,87 %
14.3	87630 SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	130,57	45,05	59,55	7.775,44	1,49 %
14.4	87265 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	130,57	134,23	177,45	23.169,64	4,44 %
14.5	88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	92	19,65	25,97	2.389,24	0,46 %
15		**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**					**4.857,51**	**0,93 %**
15.1	98689 SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF_06/2018	M	4,5	110,15	145,61	655,24	0,13 %
15.2	88648 SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de cimensões 35x35cm.	M	96,08	8,67	11,46	1.100,84	0,21 %
15.3	101965 SINAPI	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	M	18,8	124,79	164,97	3.101,43	0,59 %
16		**CALÇADA DE PROTEÇÃO**					**18.979,27**	**3,63 %**
16.1	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	3,97	62,14	82,14	326,09	0,06 %
16.2	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	2,78	37,68	49,81	138,47	0,03 %
16.3	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	19,9	149,42	197,53	3.930,84	0,75 %
16.4	94994 SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1.4.8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	72,77	136,66	180,66	13.146,62	2,52 %
16.5	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	25,92	7,12	9,41	243,90	0,05 %
16.6	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	25,92	34,83	46,04	1.193,35	0,23 %
17		**ESQUADRIAS**					**20.933,00**	**4,01 %**
17.1	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	304,70	402,81	2.014,05	0,39 %
17.2	94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18	773,88	1.023,06	18.415,08	3,53 %
17.3	94559 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,48	794,06	1.049,74	503,87	0,10 %
18		**LOUÇAS E METAIS**					**9.014,75**	**1,73 %**
18.1	2390 ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	un	2	187,49	247,86	495,72	0,09 %
18.2	8974 ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	un	2	1.064,15	1.406,80	2.813,60	0,54 %
18.3	95546 SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	UN	2	135,55	179,19	358,38	0,07 %
18.4	86931 SINAPI	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2	449,54	594,29	1.188,58	0,23 %
18.5	00000377 SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	UN	2	35,25	46,60	93,20	0,02 %
18.6	86943 SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	3	206,20	272,59	817,77	0,16 %
18.7	2050 ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	un	2	24,13	31,89	63,78	0,01 %

Exhibit 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 90
Rúbrica

18.8	2103 ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, válvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	un	1	807,97	1.068,13	1.068,13	0,20 %
18.9	2093 ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	un	1	1.600,30	2.115,59	2.115,59	0,41 %
19		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**12.750,64**	**2,44 %**
19.1	93243 SINAPI	Execução de reservatorio elevado de agua (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saida, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	UN	1	6.814,43	9.008,67	9.008,67	1,72 %
19.2	89446 SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	M	28,9	5,68	7,50	216,75	0,04 %
19.3	89448 SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	M	30,1	17,19	22,72	683,87	0,13 %
19.4	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	19,75	11,04	14,59	288,15	0,06 %
19.5	89362 SINAPI	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	UN	8	7,52	9,94	79,52	0,02 %
19.6	89364 SINAPI	Curva 90° soldável 25 mm água fria	UN	2	10,48	13,85	27,70	0,01 %
19.7	90373 SINAPI	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	11	13,42	17,74	195,14	0,04 %
19.8	1144 ORSE	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	un	6	12,47	16,48	98,88	0,02 %
19.9	89497 SINAPI	Joelho 90° soldável 40mm água fria	UN	3	11,82	15,62	46,86	0,01 %
19.10	1466 ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	3	100,08	132,30	396,90	0,08 %
19.11	89383 SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	UN	14	5,38	7,11	99,54	0,02 %
19.12	1470 ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	1	77,87	102,94	102,94	0,02 %
19.13	89395 SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	6	10,48	13,85	83,10	0,02 %
19.14	89420 SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	1	9,07	11,99	11,99	0,00 %
19.15	89623 SINAPI	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	UN	5	18,68	24,69	123,45	0,02 %
19.16	3147 ORSE	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	1	17,72	23,42	23,42	0,00 %
19.17	94491 SINAPI	Registro de esfera soldável 40mm	UN	1	43,11	56,99	56,99	0,01 %
19.18	94489 SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	UN	1	21,43	28,33	28,33	0,01 %
19.19	74166/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	741,50	980,26	980,26	0,19 %
19.20	2082 ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3	49,97	66,06	198,18	0,04 %
20		**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**19.620,32**	**3,76 %**
20.1	89711 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	M	9,1	17,03	22,51	204,84	0,04 %
20.2	89712 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	12,4	25,21	33,32	413,16	0,08 %
20.3	89714 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	28	48,30	63,85	1.787,80	0,34 %
20.4	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	8,4	11,04	14,59	122,55	0,02 %
20.5	89798 SINAPI	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	3	35,74	47,24	141,72	0,03 %
20.6	1588 ORSE	Tê sanitário em PVC rigido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	un	1	46,24	61,12	61,12	0,01 %
20.7	89785 SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	1	19,16	25,32	25,32	0,00 %
20.8	1603 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	un	10	10,70	14,14	141,40	0,03 %
20.9	1554 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	un	10	10,23	13,52	135,20	0,03 %
20.10	89744 SINAPI	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	UN	4	21,42	28,31	113,24	0,02 %
20.11	89732 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	UN	1	10,04	13,27	13,27	0,00 %
20.12	89726 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	UN	2	6,06	8,01	16,02	0,00 %
20.13	89750 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	2	58,16	76,88	153,76	0,03 %
20.14	89735 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	2	17,45	23,06	46,12	0,01 %
20.15	89709 SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	3	9,85	12,75	38,25	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 091
Rubrica

20.16	89707 SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no minimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	UN	3	26,21	34,64	103,92	0,02 %
20.17	1536 ORSE	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	2	18,05	23,86	47,72	0,01 %
20.18	98078 SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	1	4.208,90	5.564,16	5.564,16	1,07 %
20.19	98082 SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	1	3.904,35	5.161,55	5.161,55	0,99 %
20.20	2798 ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforcada, revestida internamente com barra lisa e fundo em	un	8	503,90	666,15	5.329,20	1,02 %
21		**COMBATE A INCÊNDIO**					**671,09**	**0,13 %**
21.1	101909 SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	2	213,64	282,43	564,86	0,11 %
21.2	10383 ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	2	24,29	32,11	64,22	0,01 %
21.3	11852 ORSE	Placa de sinalização padrão para saida de emergência 400x120mm	Un	1	31,78	42,01	42,01	0,01 %
22		**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**29.480,84**	**5,65 %**
22.1	91940 SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	46	13,20	17,45	802,70	0,15 %
22.2	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	62,6	2,71	3,58	224,10	0,04 %
22.3	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	76,6	2,71	3,58	274,22	0,05 %
22.4	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	52,6	2,71	3,58	188,30	0,04 %
22.5	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	142,2	2,71	3,58	509,07	0,10 %
22.6	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	142,2	3,99	5,27	749,39	0,14 %
22.7	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	82,6	3,99	5,27	435,30	0,08 %
22.8	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	188,3	3,99	5,27	992,34	0,19 %
22.9	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	153,9	3,99	5,27	811,05	0,16 %
22.10	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem	M	40	24,57	32,48	1.299,20	0,25 %
22.11	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem	M	40	24,57	32,48	1.299,20	0,25 %
22.12	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem	M	40	24,57	32,48	1.299,20	0,25 %
22.13	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem	M	40	24,57	32,48	1.299,20	0,25 %
22.14	2794 ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	un	3	259,02	342,42	1.027,26	0,20 %
22.15	91983 SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	UN	14	36,35	48,05	672,70	0,13 %
22.16	91973 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	77,07	101,88	203,76	0,04 %
22.17	91957 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	40,95	54,13	108,26	0,02 %
22.18	91969 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	64,62	85,42	170,84	0,03 %
22.19	91953 SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	2	22,56	29,82	59,64	0,01 %
22.20	91959 SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	1	35,69	47,18	47,18	0,01 %
22.21	12241 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	262,71	347,30	347,30	0,07 %
22.22	10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade minima de interruocão de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo	un	2	119,54	158,03	316,06	0,06 %
22.23	93662 SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade minima de interruocão de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo	UN	6	54,79	72,43	434,58	0,08 %
22.24	93655 SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade minima de interruocão de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	UN	8	11,98	15,83	126,64	0,02 %
22.25	91863 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	M	75	11,03	14,58	1.093,50	0,21 %
22.26	91864 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	M	9,4	14,66	19,38	182,17	0,03 %
22.27	91871 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	M	50,3	11,51	15,21	765,06	0,15 %
22.28	91872 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	M	6	15,14	20,01	120,06	0,02 %
22.29	91873 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	M	36	18,66	24,69	888,84	0,17 %
22.30	90447 SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	M	57,8	5,53	7,31	422,51	0,08 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 97
Rubrica

22.31	8324 ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma	un	29	9,13	12,06	349,74	0,07 %
22.32	97607 SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W	UN	5	135,14	178,65	893,25	0,17 %
22.33	11857 ORSE	Lâmpada tubular led T8, 16w, bivolt	un	31	27,08	35,79	1.109,49	0,21 %
22.34	97599 SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	UN	3	25,97	34,33	102,99	0,02 %
22.35	96985 SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por	UN	3	80,77	106,77	320,31	0,06 %
22.36	96977 SINAPI	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR	M	10	59,09	78,11	781,10	0,15 %
22.37	4192 ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	un	2	11,95	15,79	31,58	0,01 %
22.38	4014 ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20	Un	3	8,78	11,60	34,80	0,01 %
22.39	4015 ORSE	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação	Un	3	12,60	16,65	49,95	0,01 %
22.40	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	4,5	62,14	82,14	369,63	0,07 %
22.41	96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	3,5	37,68	49,81	174,33	0,03 %
22.42	101502 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.684,23	2.226,55	2.226,55	0,43 %
22.43	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	573,61	758,31	1.516,62	0,29 %
22.44	12628 ORSE	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1	3.291,13	4.350,87	4.350,87	0,83 %

Tipo de Licitação Convite
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório Processo Administrativo nº

Total sem BDI 395.130,02
Total do BDI 127.113,23
Total Geral 522.243,25

Engº Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 0905404068

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 93
Rúbrica

OBJETO:
Construção da Escola Municipal Indígena Arthur Nabuco de Araújo- Comunidade Maracanã I_ Município de Uiramutã/ RR

LOCAL: MUNÍCIPIO UIRAMUTA / RR

Banco
SINAPI 07/22 RR
ORSE 07/22 SE

B.D.I. 32,20%

Encargos Sociais (Desonerado):
Horista: 86,74%
Mensalista: 48,18%

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A -	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00%	0,00%
A2	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1,50%	1,50%
A3	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	1,00%	1,00%
A4	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA	0,20%	0,20%
A5	SERVIÇO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8,00%	8,00%
A9	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO - SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ÍTEM "A"	16,80%	16,80%
B -	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DE "A"	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,06%	Não incide
B2	FERIADOS	4,77%	Não incide
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13° SALÁRIO	10,97%	8,33%
B5	LICENÇA À PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,68%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,51%	7,23%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
	TOTAL DO ÍTEM "B"	46,86%	16,98%
C -	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,54%	4,21%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,32%	0,24%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3	3,73%	2,84%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,65%	3,53%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,35%
	TOTAL DO ÍTEM "C"	14,71%	11,17%
D -	TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REICIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE GRUPO "B"	7,87%	2,85%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,50%	0,38%
	TOTAL DO ÍTEM "D"	8,37%	3,23%
	PERCENTUAL TOTAL	86,74%	48,18%

*OBS.: * Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto.*
FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVAS - INMET

Eng. Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA RN nº 0905404068

ภาคผนวก

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 94
Rúbrica

COMPOSIÇÕES DO BDI DESONERADO

Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha_ Município de Uiramutã/ RR

LOCAL DA OBRA

ITENS PASSÍVEIS DE ACEITAÇÃO NO BDI		Índices			ÍNDICE ADOTADO
		mínimo	médio	máximo	
X	Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
	Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
	Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,10%
	Total				**4,90%**
Y	Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%
	Total				**1,23%**
Z	Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,50%
	Total				**7,50%**
I	**Tributos**				
	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
	ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	CPRB	0,00%	4,50%	4,50%	5,00%
	Total				**13,65%**
				% DE BDI A SER UTILIZADO =	**32,20%**

LEGENDA	
X =	Despesas indiretas (exceto tributos e despesas financeiras)
Y =	Despesas financeiras
Z =	Lucro
I =	Taxa representativa da incidência de impostos

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1+X) \quad x \quad (1+Y) \quad x \quad (1+Z)}{(1-I)} \quad -1$$

$$BDI = \frac{(1 + 0{,}04900) \times (1 + 0{,}01230) \times (1 + 0{,}07500)}{(1 - 0{,}13650)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1{,}04900) \times (1{,}01230) \times (1{,}07500)}{(0{,}86350)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1{,}14155)}{(0{,}86350)} - 1$$

$$BDI = 1{,}32200 - 1$$

BDI= 32,20%

A FÓRMULA ADOTADA PARA CÁLCULO DO BDI, SEGUE RECOMENDAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013- TCU.

1. Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

2. Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Eng. Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA RN nº 0905404068

MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 95
Rúbrica

ART, DECLARAÇÃO ORÇAMENÁRIA E MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

(ANEXO 2 DISPONIBILIZADO EM MÍDIA)

EN BLANCO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RR20220093632

INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - Fls. 16 - Rúbrica

1. Responsável Técnico

MARCOS DOMINGOS DA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **0905404068**
Registro: **0905404068RR**

Empresa contratada: **VK CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-EPP**
Registro : **0001148192-RR**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Uiramutã - RR**
CPF/CNPJ: **01.612.681/0001-01**
RUA CICI MOTA, S/N
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **UIRAMUTÃ**
UF: **RR**
CEP: **69358970**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em: **01/12/2021**
Valor: **R$ 410.000,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Nenhum**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CICI MOTA, S/N
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **UIRAMUTÃ**
UF: **RR**
CEP: **69358970**
Data de Início: **01/12/2021**
Previsão de término: **01/12/2023**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Uiramutã - RR**
CPF/CNPJ: **01.612.681/0001-01**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	175,13	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE AUTORIA OBRA: OBJETO: Construção da Escola Municipal Indígena com duas salas mais refeitório - Comunidade Ticoça_Uiramutã/RR

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RR, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro para os devidos fins que não possuo nenhuma ART de execução registrada, em andamento em outro regional. Sendo assim, declaro ainda estar ciente da impossibilidade de registrar ARTs de execução junto a outro regional, enquanto durar os contratos no Estado de Roraima, sob pena de sanções previstas na legislação vigente junto ao sistema CONFEA/CREA.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RORAIMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCOS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 008.885.727-19

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Prefeitura Municipal de Uiramutã - RR - CNPJ: 01.612.681/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **19/09/2022** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8207571273**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 97
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Uiramutã/RR, 16 de setembro de 2022.

Ao Exmª. Sra,

Vanderlane James Lima
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Prefeitura de Uiramutã/RR

Prezado Secretário,

Cumprimentando Vossa Excelência, declaro para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto "Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno- Comunidade Barreirinha- Município de Uiramutã /RR", foi adotado percentual de BDI de 24,96 % com encargos com não desonerado em conformidade com o estabelecido no SINAPI.
O regime de execução do objeto é por preço global.

Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos com desoneração é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal, pois apresenta a planilha orçamentária de menor valor.

Respeitosamente,

Engº Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA-RR nº 0905404068
Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR
Portaria nº230, 01/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 98
Rúbrica

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A Empresa _____, inscrita no CNPJ Nº _____, sediada_____, por intermédio do seu representante legal_____, portador da carteira de identidade nº_____e do CPF nº _____, DECLARA, que vistoriou o local para prestação dos serviços constantes da Tomada de Preço nº_e tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletou informações de dados e elementos necessários á perfeita elaboração de proposta comercial.

Boa Vista – RR, de 2022.

Nome do representante legal da empresa CPF nº

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

BL 52400

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 99
Rúbrica

PROJETOS EXECUTIVOS
(ANEXO 3 DISPONIBILIZADO EM MÍDIA)

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PIAUÍ
Fls. 1014

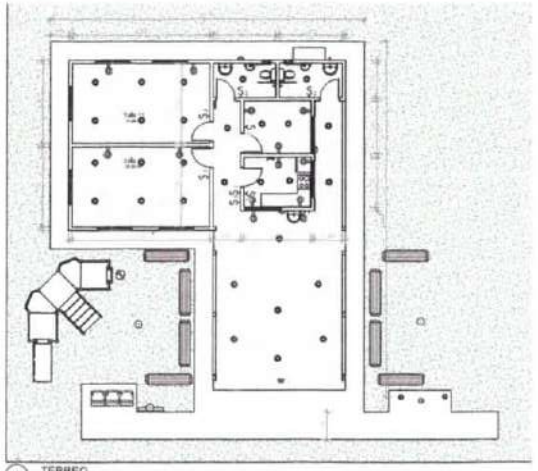

1 TÉRREO

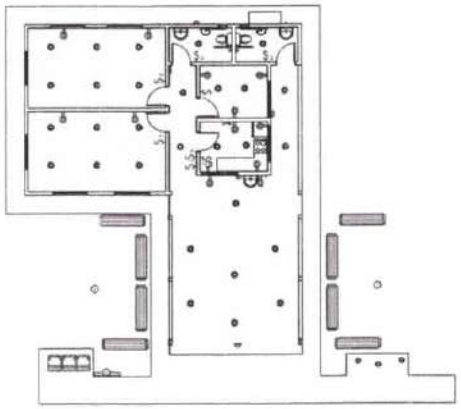

2 Layout Eletrico E Hidraulico



LEGENDAS | HIDRAULICO

LEGENDA - HIDRÁULICO

QTO - ESQUADRIAS TOTAIS

Unidade	Quant.	Largura	Altura	Peitoril	Qtd.	Area	Tipo
UN	1	0,80	2,10	0,00	1	1,68	PORTA DE ALUMINIO DE CORRER COM VIDRO

EM BRANCO

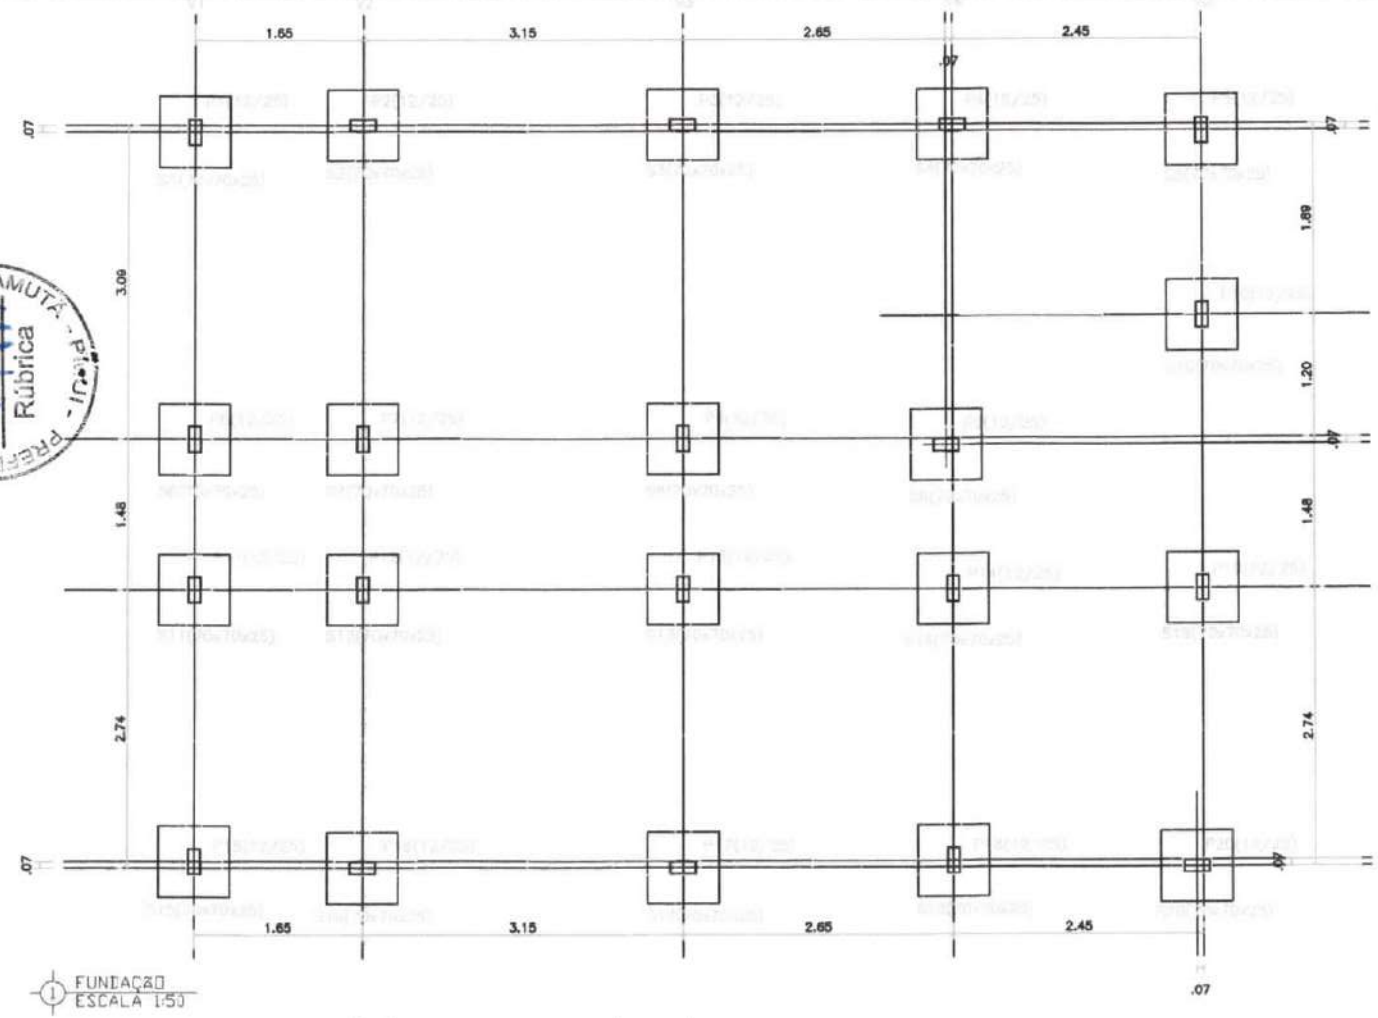

① FUNDAÇÃO
ESCALA 1:50

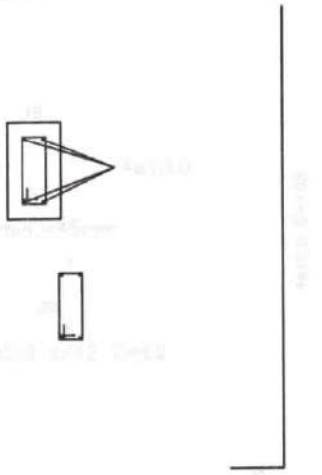

③ FUNDAÇÃO - ARRANQUE
S/ ESCALA

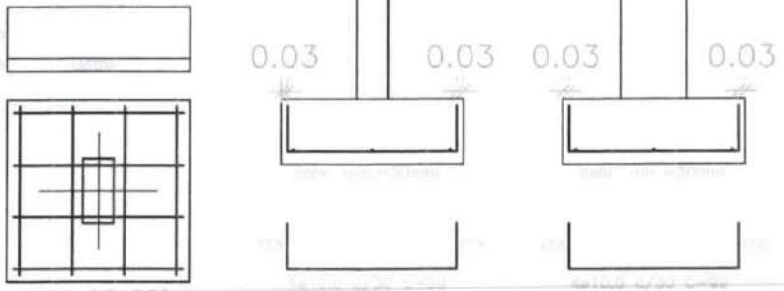

② FUNDAÇÃO - SAPATAS
S/ ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls.
Rubrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI			
LOCAL: COMUNIDADES INDÍGENAS UIRAMUTÃ			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ			
RESPONSAVEL/AUTOR: Engª Civil. Marcos Domin[illegible]a Silva CREA-RR nº 09054[illegible]	PRANCHA: FUNDAÇÃO	AREA: 175,13m	FOLHA: 1/7
	DATA:	ESCALA: INDICADA	

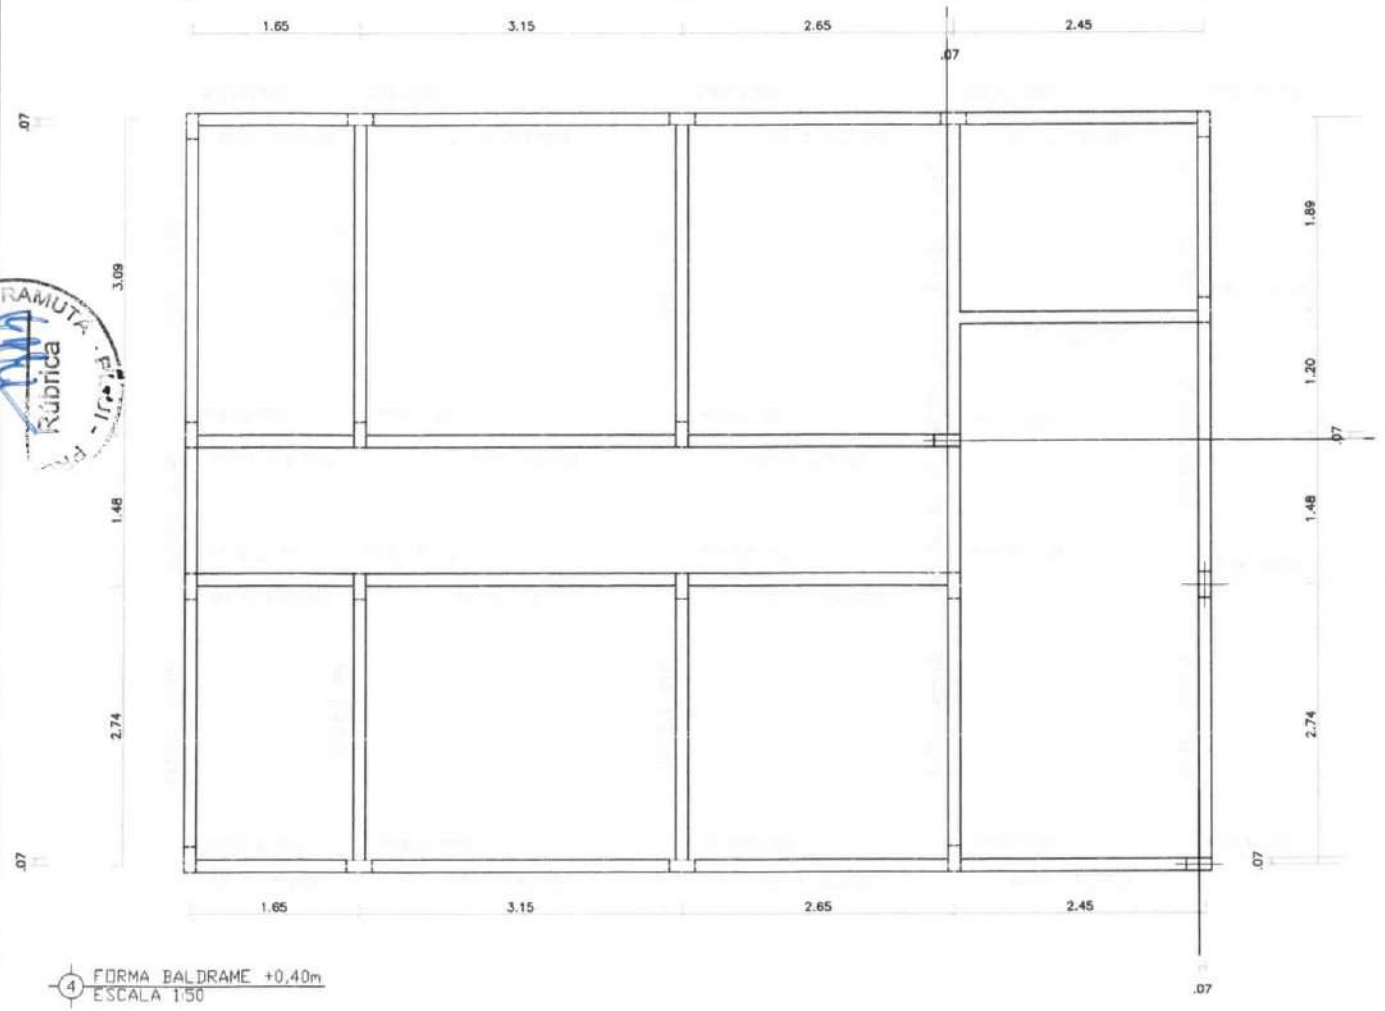

④ FORMA BALDRAME +0,40m
ESCALA 1:50



⑤ VIGA BALDRAME - ESTRIBO
S/ ESCALA

MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 102
Rubrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI			
LOCAL: COMUNIDADES INDIGENAS UIRAMUTÃ			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ			
RESPONSÁVEL/AUTOR: Engº Civil. Marcos Domingos da Silva CREA-RR nº [illegible]104068	PRANCHA: FORMA BALDRAME +0,40m	AREA: 175,13m	FOLHA: 2/7
	DATA:	ESCALA: INDICADA	

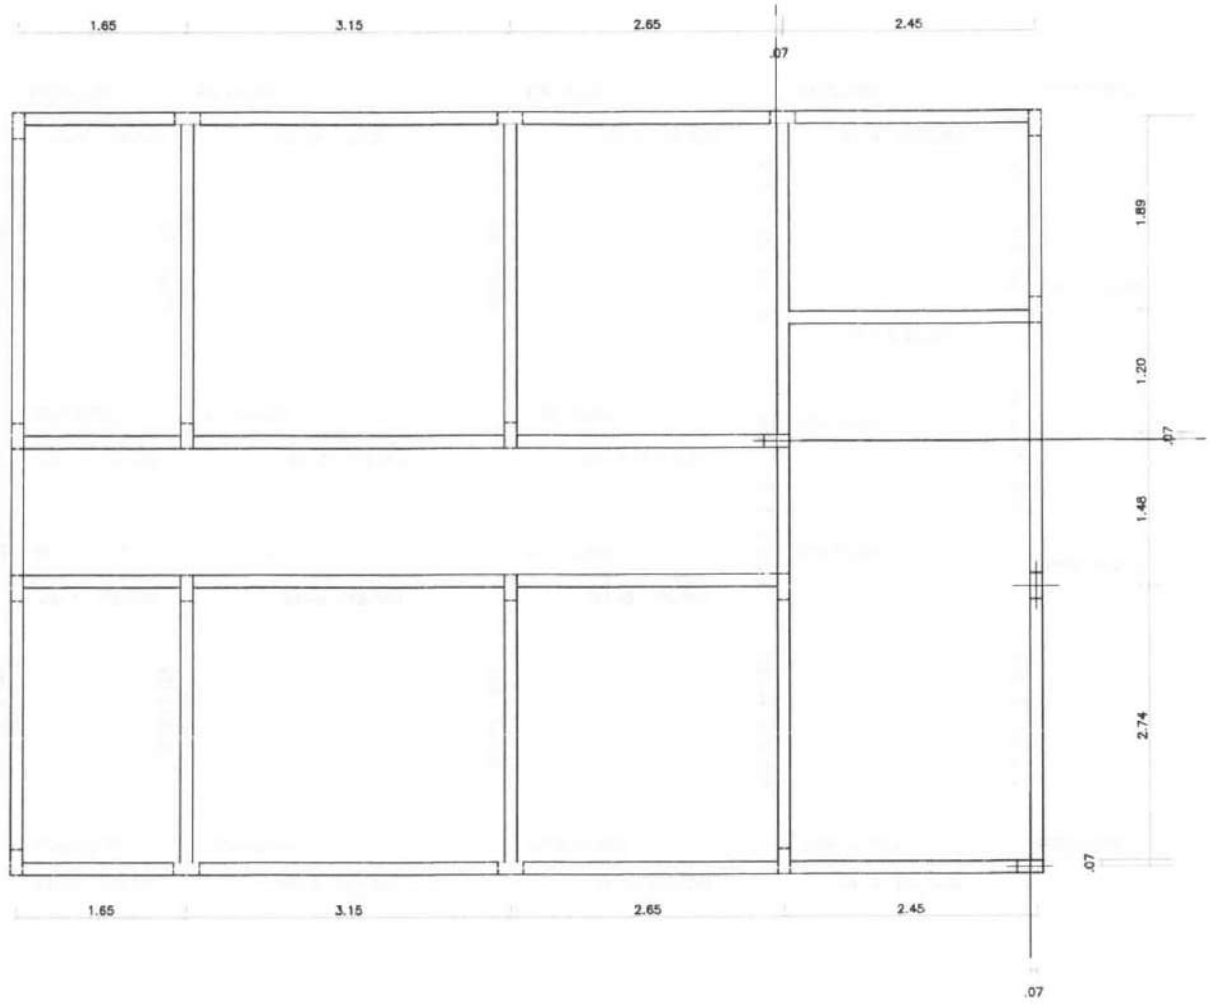

8 FORMA SUPERIOR +3,40m
ESCALA 1:50



6 PILARES - ESTRIBO
S/ ESCALA



7 VIGA SUPERIOR - ESTRIBO
S/ ESCALA

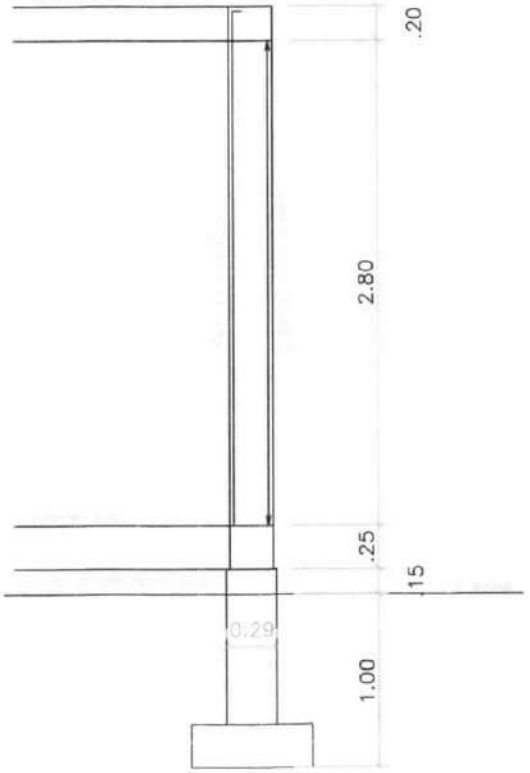

9 PILARES
ESCALA 1:50

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI
LOCAL: COMUNIDADES INDÍGENAS UIRAMUTÃ
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
RESPONSÁVEL/AUTOR: Engº Civil. Marcos Domingos da Silva CREA-RR nº [illegible]04068
PRANCHA: FORMA SUPERIOR +3,40m | ÁREA: 175,13m
DATA:
ESCALA: INDICADA
FOLHA: 3/7

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 104
Rubrica

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 104
Rubrica

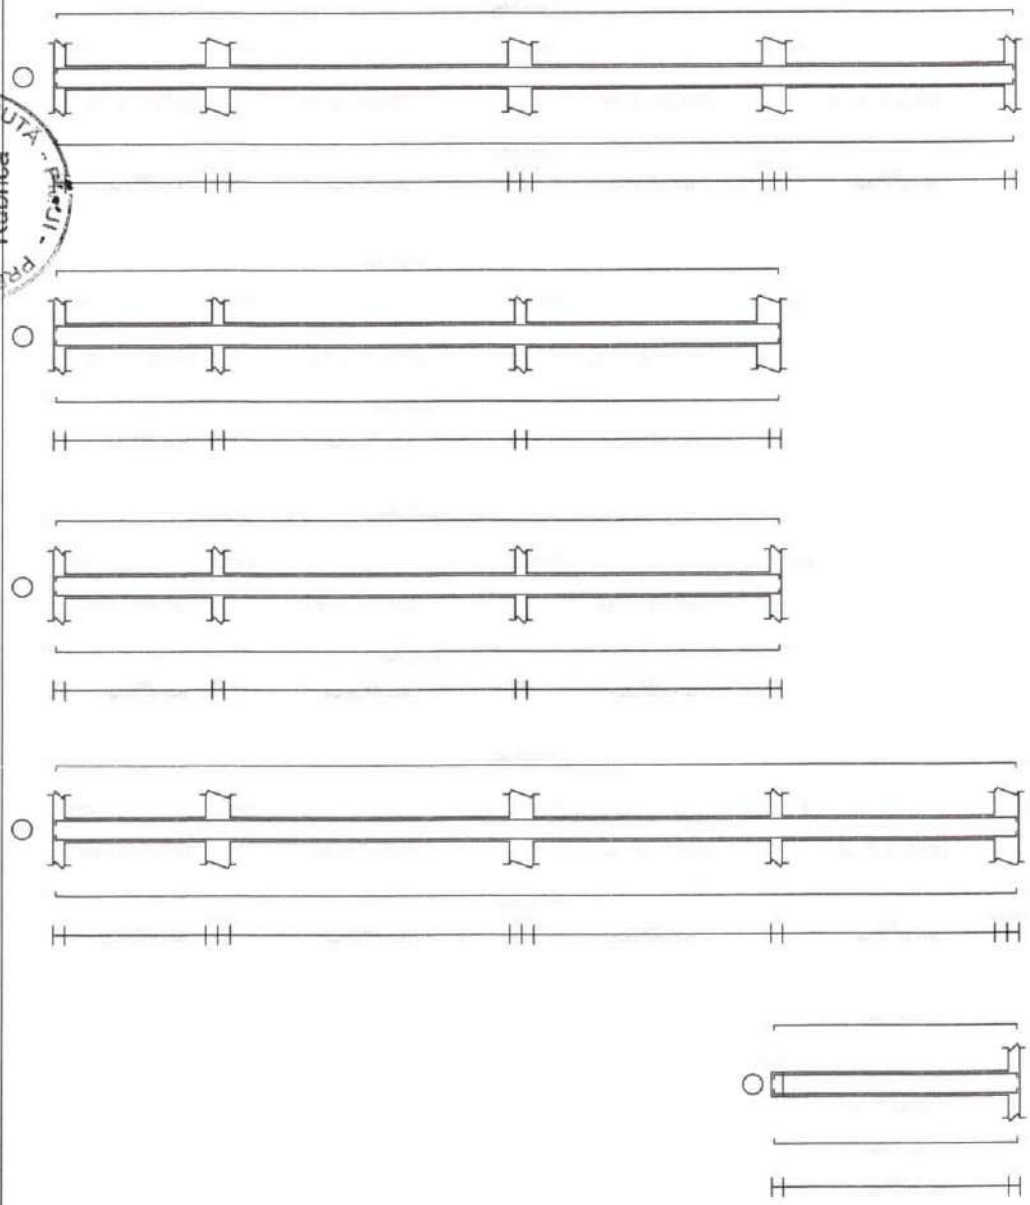

10 VIGAS BALDRAME
S/ ESCALA

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI			
LOCAL: COMUNIDADES INDIGENAS UIRAMUTÃ			
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ			
RESPONSÁVEL/AUTOR: Engº Civil. Marcos Domingos da Silva CREA-RR nº 090540468	PRANCHA: VIGAS BALDRAME	AREA: 175,13m	FOLHA: 4/7
	DATA:	ESCALA: INDICADA	

EM BRANCO

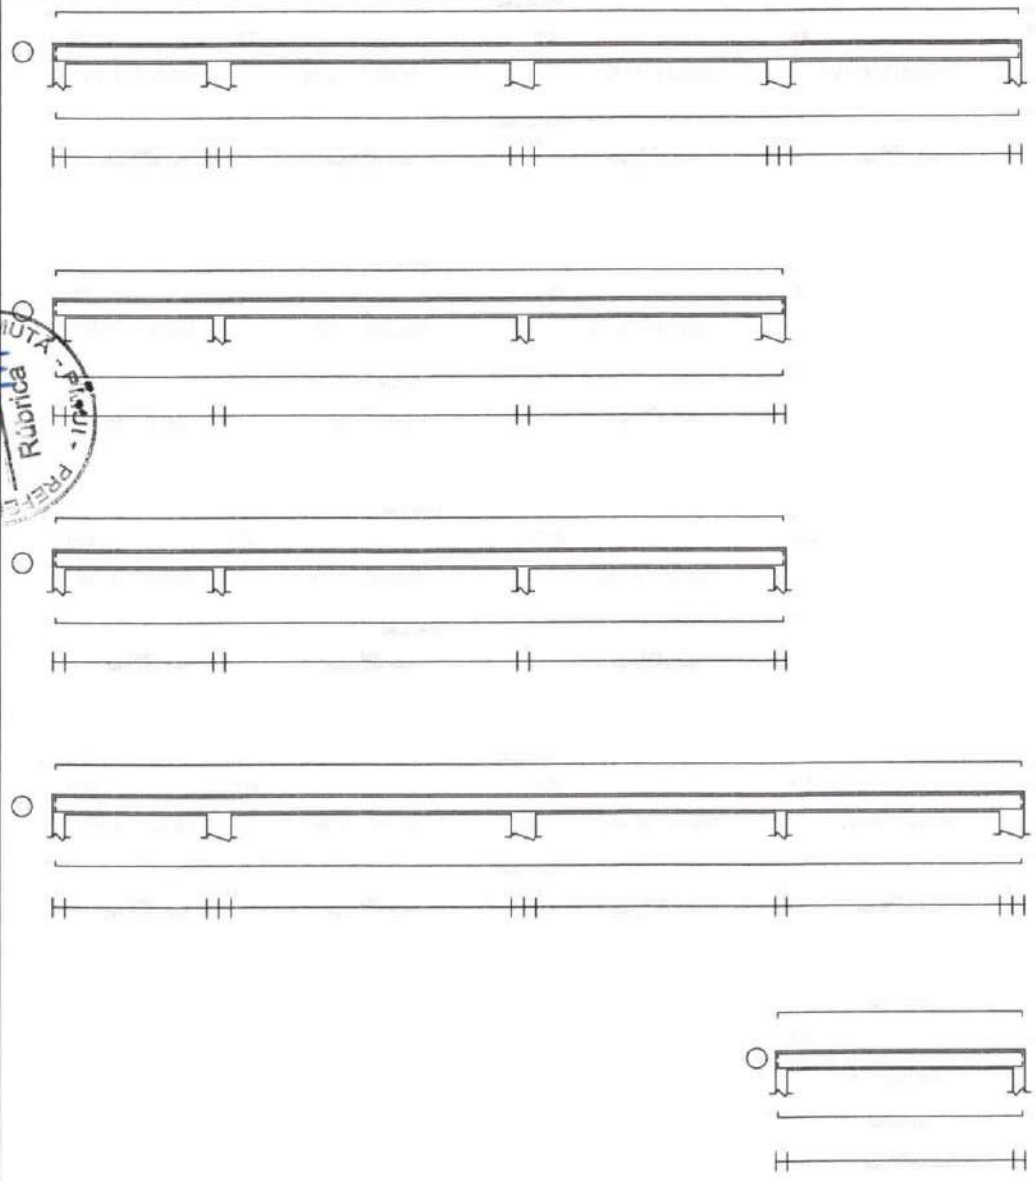

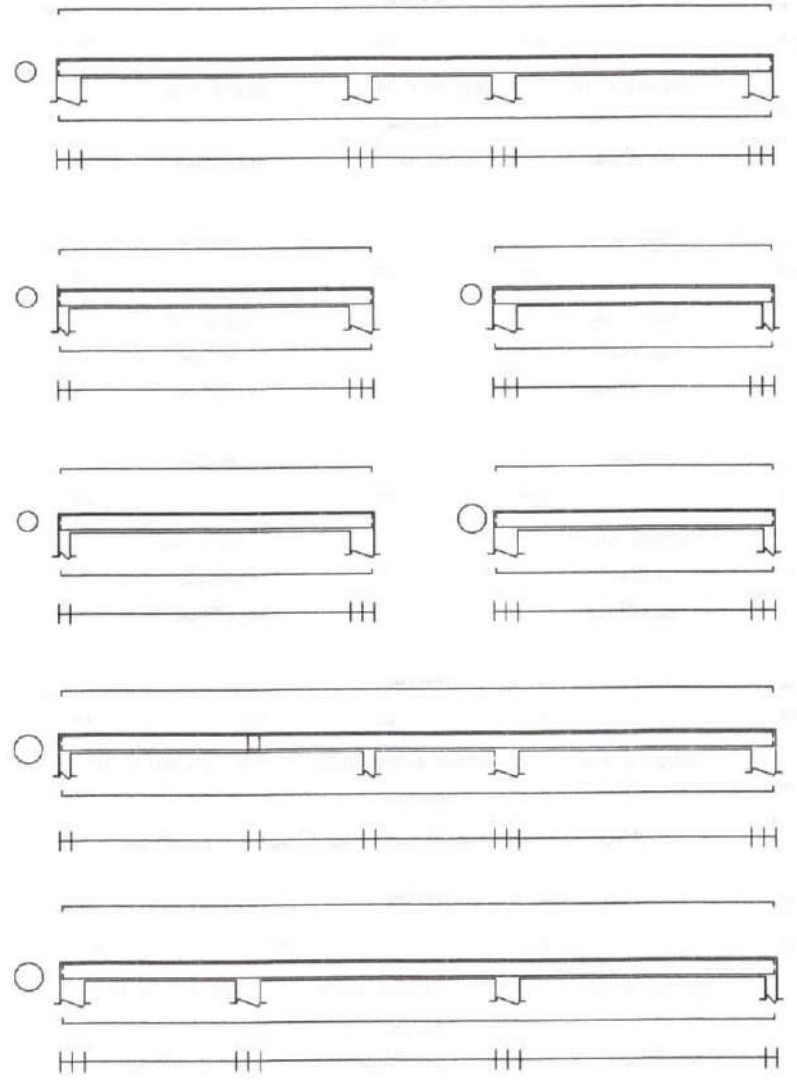

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - Estado de Roraima
Fls. 108
Rubrica

(11) VIGAS SUPERIORES
S/ ESCALA

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI			
LOCAL: COMUNIDADES INDÍGENAS UIRAMUTÃ			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ			
RESPONSAVEL/AUTOR: Engº Civil. Marcos Domingos da Silva CREA-RR nº 090[illegible]8	PRANCHA: VIGAS SUPERIORES	AREA: 175,13m	FOLHA: 5/7
	DATA:	ESCALA: INDICADA	

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 106
Rubrica

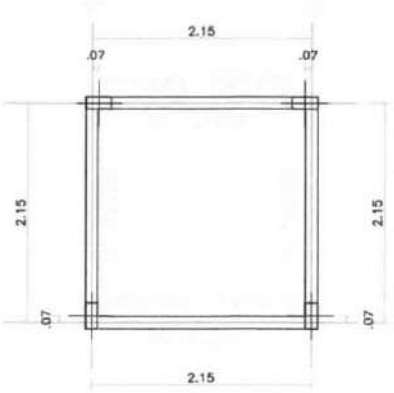

④ FORMA BALDRAME +0,40m
ESCALA 1:50

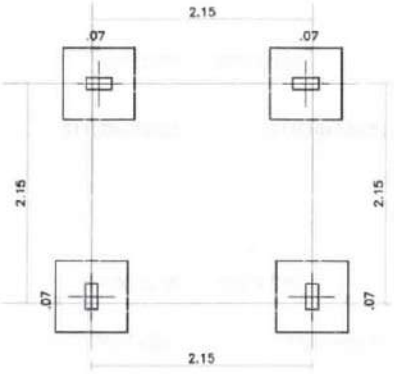

① FUNDAÇÃO
ESCALA 1:50



③ FUNDAÇÃO - ARRANQUE
S/ ESCALA



⑦ VIGA SUPERIOR - ESTRIBO
S/ ESCALA



⑥ PILARES - ESTRIBO
S/ ESCALA



⑤ VIGA BALDRAME - ESTRIBO
S/ ESCALA

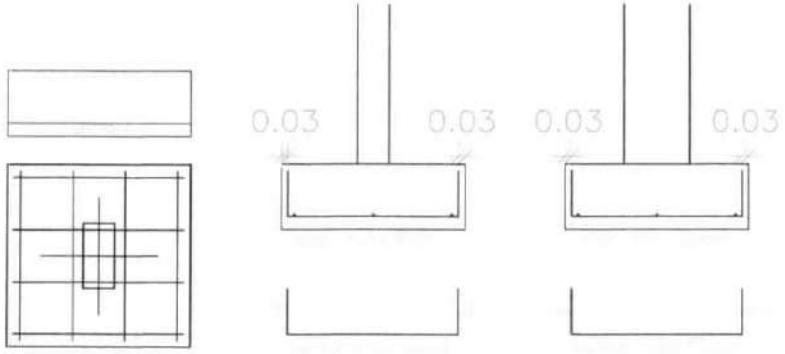

② FUNDAÇÃO - SAPATAS
S/ ESCALA

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI			
LOCAL: COMUNIDADES INDÍGENAS UIRAMUTÃ			
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ			
RESPONSÁVEL/AUTOR: Engº Civil. Marcos Domingos da Silva CREA-RR nº 090540406B	PRANCHA: ABRIGO DE RES.	AREA: 175,13M²	FOLHA 6/7
	DATA:	ESCALA: INDICADA	

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 102
Rubrica

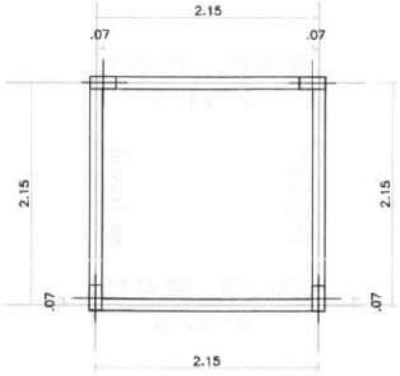

⑧ FORMA SUPERIOR +3,40m
ESCALA 1:50

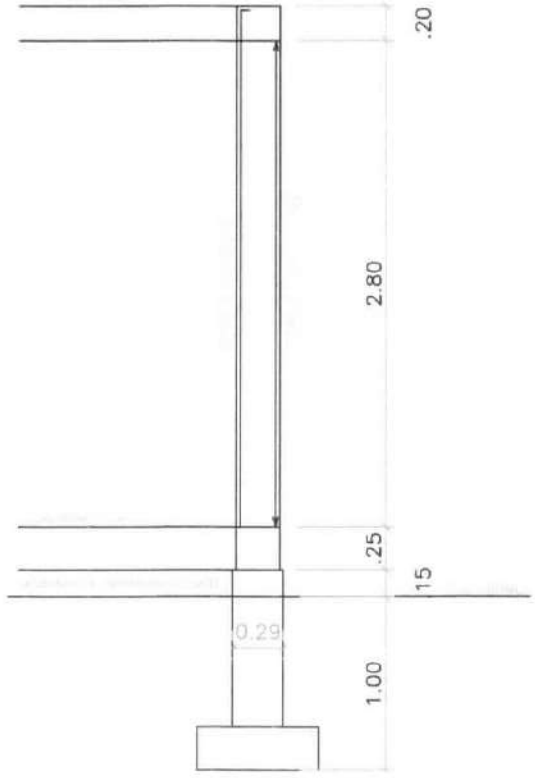

⑨ PILARES
ESCALA 1:50

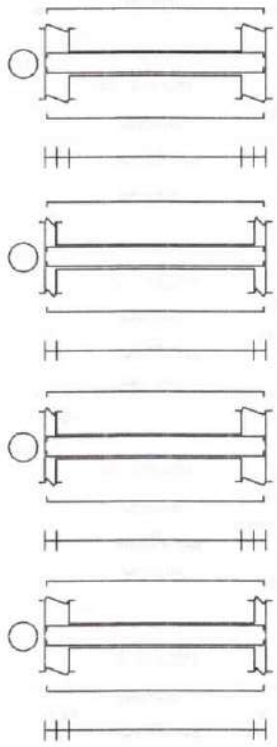

⑩ VIGAS BALDRAME
S/ ESCALA

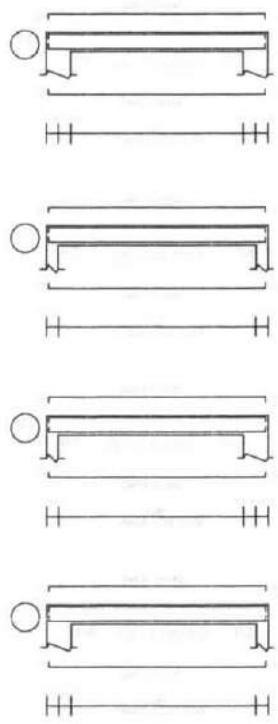

⑪ VIGAS SUPERIORES
S/ ESCALA

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI			
LOCAL: COMUNIDADES INDIGENAS UIRAMUTÃ			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ			
RESPONSÁVEL/AUTOR: Engº Civil. Marcos Domingos da Silva CREA-RR nº 0905404068	PRANCHA: ESTRUT DE RES.	ÁREA: 175,13m²	FOLHA: 7/7
	DATA:	ESCALA: INDICADA	

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 1083
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls.
Rúbrica

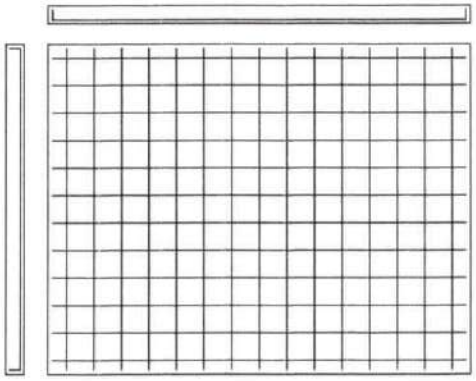

TAMPA DO TANQUE SÉPTICO

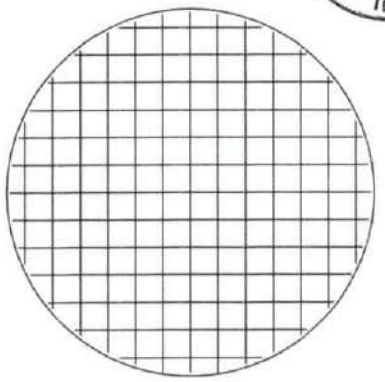

TAMPA DO SUMIDOURO

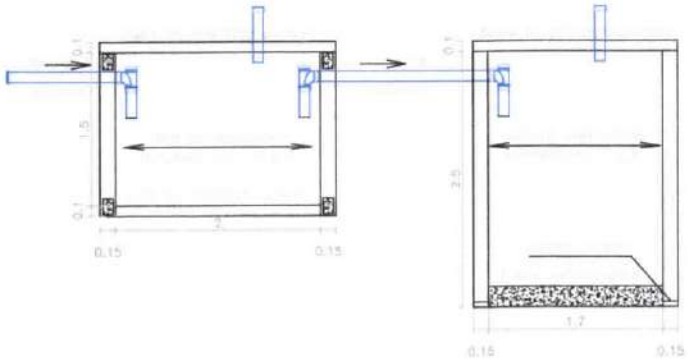

② TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO
ESCALA 1:50





VIGAS E PILARES

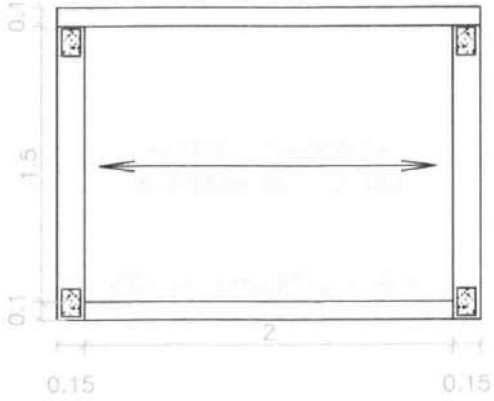

③ ESTRUTURAL TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO
S/ ESCALA

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI			
LOCAL: COMUNIDADES INDIGENAS UIRAMUTÃ			
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ			
RESPONSÁVEL/AUTOR: Engº Civil. Marcos Domingos da Silva CREA-RR nº 090[illegible]068	PRANCHA: ESQ. DETALHES	AREA: 175,13m²	FOLHA: 1/1
	DATA:	ESCALA: INDICADA	

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 109
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls.
Rubrica

ABRIGO DE RESÍDUOS DE SAÚDE

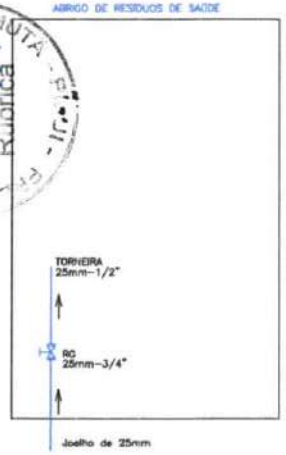

DETALHE BANHEIRO

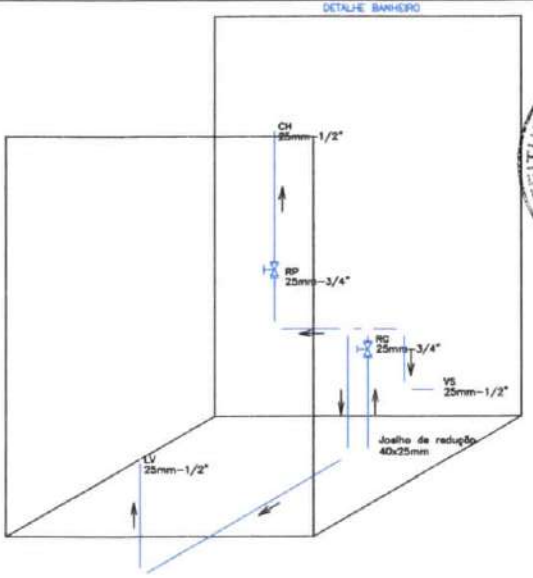

DETALHE SALA DE ODONTOLOGIA

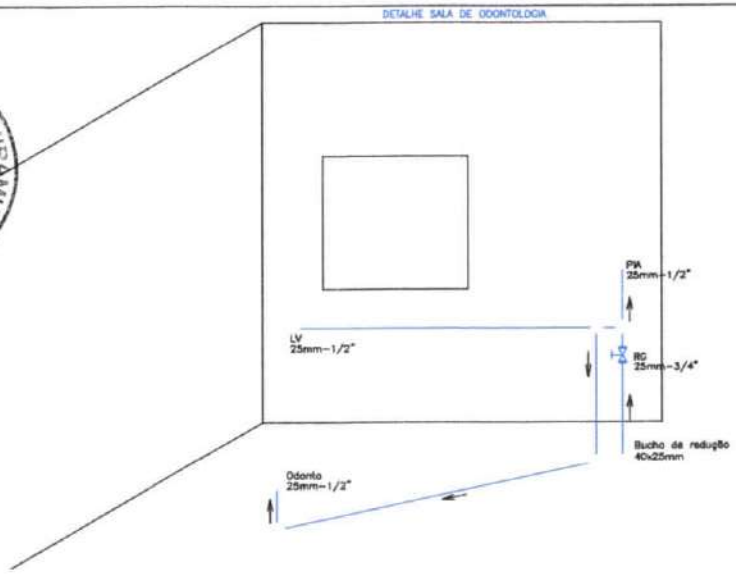

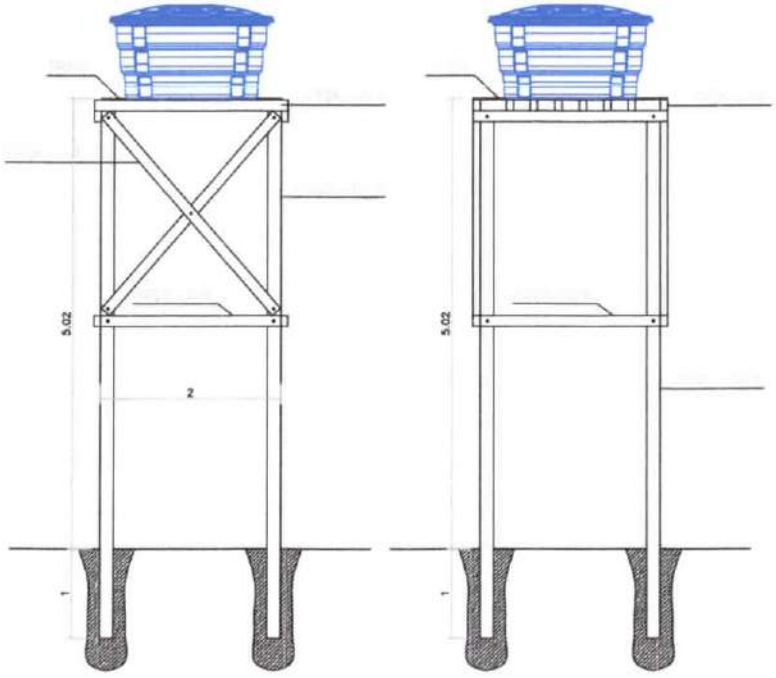

DETALHE DML

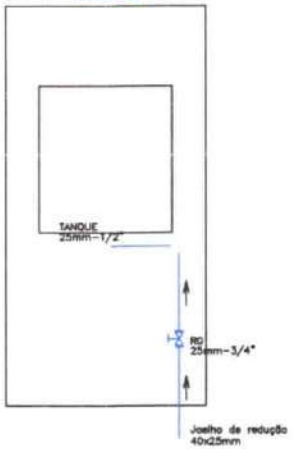

DETALHE SALA DE PREP. DE PACIENTES

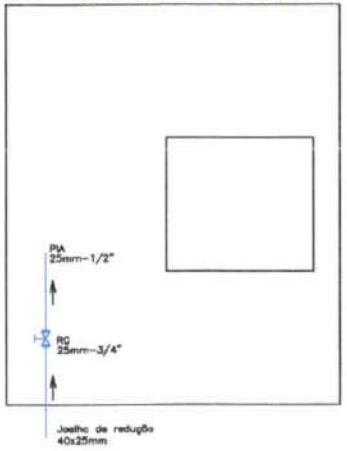

DETALHE CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO

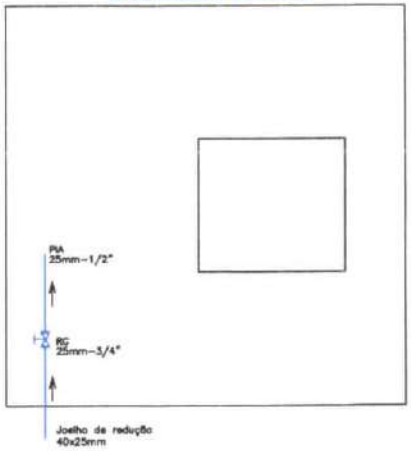

① DETALHES
S/ ESCALA

NOTA: A LOCAÇÃO DOS PONTOS DEVERÁ SER COMPATIBILIZADA EM LOCO.

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI			
LOCAL: COMUNIDADES INDÍGENAS UIRAMUTÃ			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ			
RESPONSÁVEL/AUTOR: Engª Civil. Marcos Domingos da Silva CREA-RR nº 090540[illegible]	PRANCHA: HIDRAUL. DETALHES	ÁREA: 175,13m	FOLHA: 2/2
	DATA:	ESCALA: INDICADA	

CONFIDENTIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 1047
Rúbrica



③ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ABRIGO DE RESÍDUOS
ESCALA 1:50

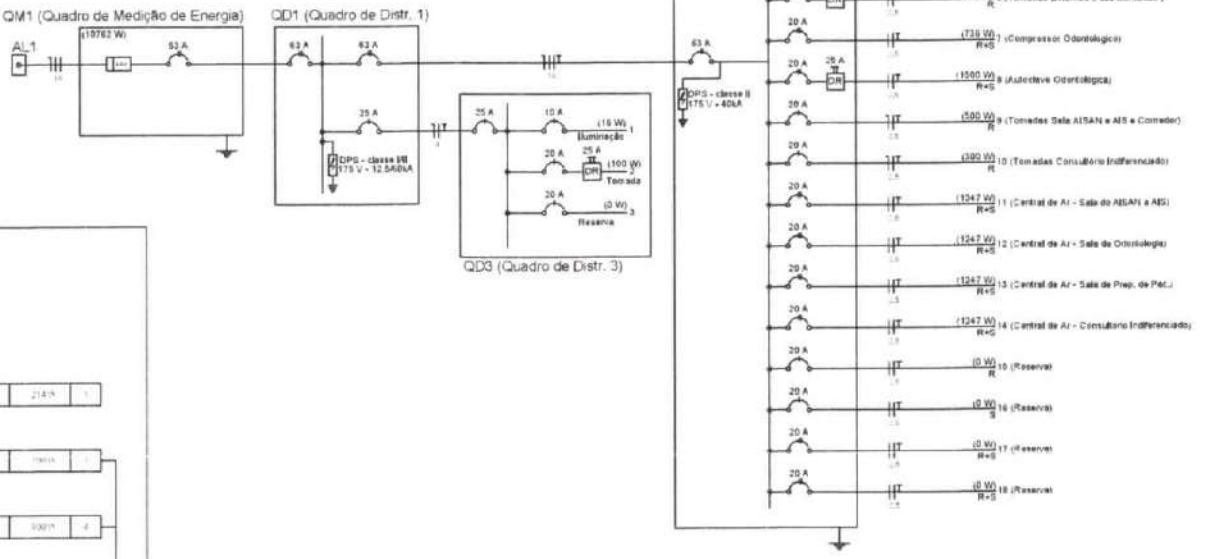

QD2 (Quadro de Distribuição 02)

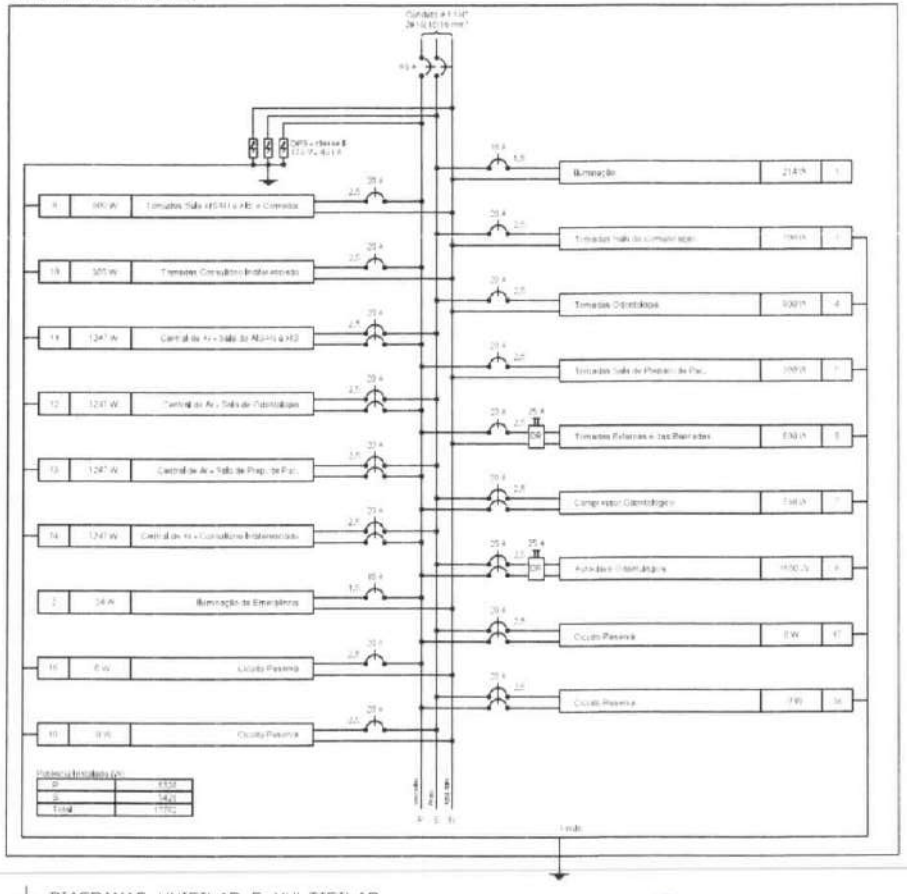

② DIAGRAMAS UNIFILAR E MULTIFILAR
S/ ESCALA

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI			
LOCAL: COMUNIDADES INDÍGENAS UIRAMUTÃ			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ			
RESPONSÁVEL/AUTOR: Engº Civil. Marcos Domingos da Silva CREA-RR nº 090540368	PRANCHA: DETALHES	AREA: 175,13m	FOLHA: 1/3
	DATA:	ESCALA: INDICADA	

COPY

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls.
Rúbrica

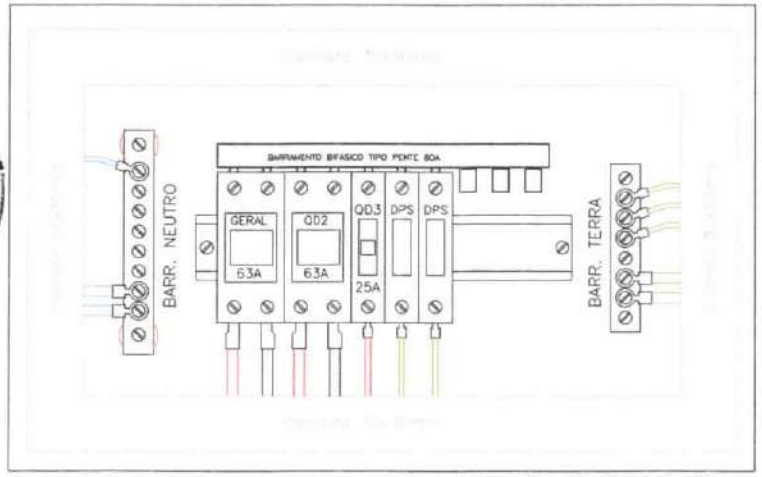

⑥ ESQUEMA INTERNO DE MONTAGEM DO QUADRO QD1
S/ ESCALA

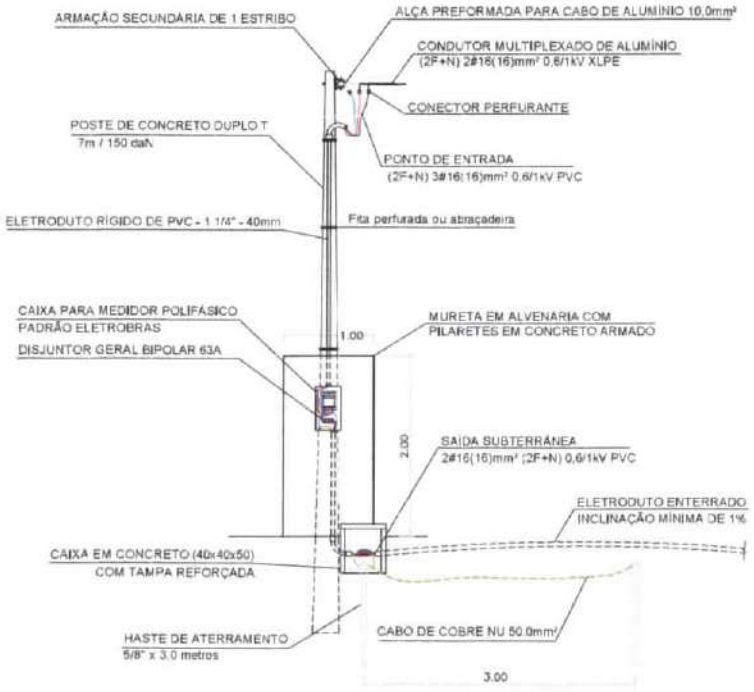

④ PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA
S/ ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls.
Rúbrica

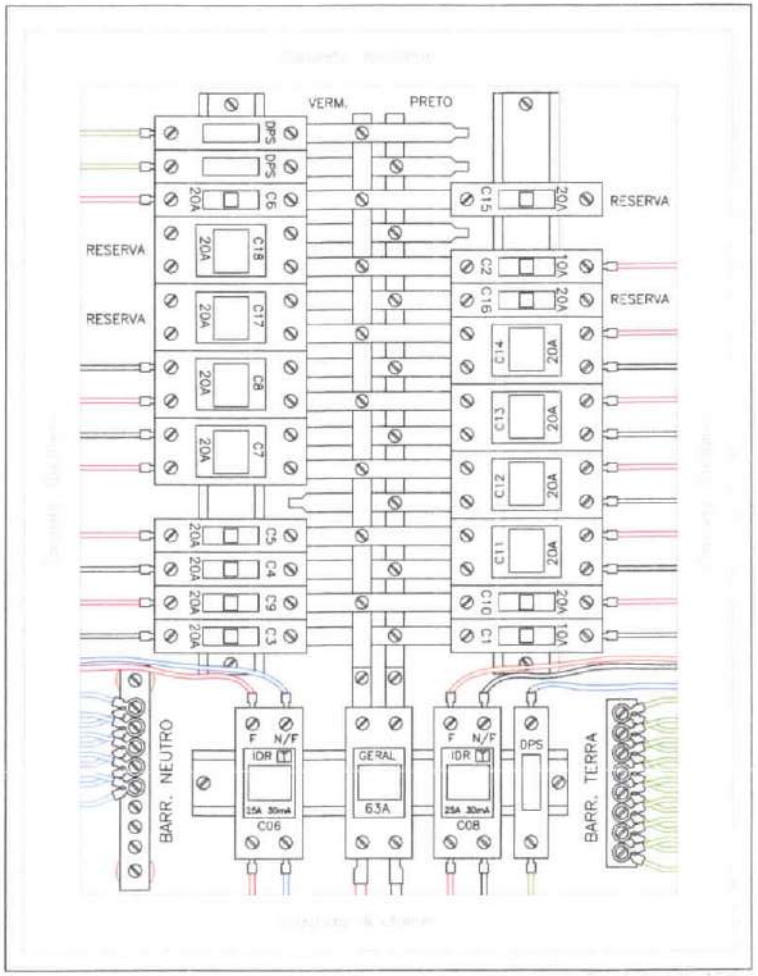

⑤ ESQUEMA INTERNO DE MONTAGEM DO QUADRO QD2
S/ ESCALA

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI			
LOCAL: COMUNIDADES INDIGENAS UIRAMUTÃ			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ			
RESPONSÁVEL/AUTOR: Engº Civil. Marcos Domingos da Silva CREA-RR nº 0905404068	PRANCHA: DETALHES	AREA: 175,13m	FOLHA: 2/3
	DATA:	ESCALA: INDICADA	

EMBARGO

Quadro de Cargas (QDC)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	In - R (A)	In - S (A)	FP	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	dV Part. (%)
1	Iluminação	F+N	B1	115 V	233	214	S		214		2,0	0,92	1,00	0,60	2,9	2,0	1,5	17,5	10,0	0,18	3,98	
	a				11	10	S		10					0,60	0,1		1,5	17,5				
	b				43	40	S		40		0,4			0,60	0,6		1,5	17,5				
	c				22	20	S		20		0,2			0,70	0,3		1,5	17,5				
	d				11	10	S		10					0,80	0,1		1,5	17,5				
	e				22	20	S		20		0,2			0,80	0,2		1,5	17,5				
	f				11	10	S		10					0,50	0,1		1,5	17,5				
	g				43	40	S		40		0,4			0,60	0,6		1,5	17,5				
	h				22	20	S		20		0,2			0,65	0,3		1,5	17,5				
	i				22	20	S		20		0,2			0,60	0,2		1,5	17,5				
	j				26	24	S		24		0,2			0,60	0,4		1,5	17,5				
2	Iluminação de Emergência	F+N	B1	115 V	26	24	R	24		0,2		0,92	1,00	0,70	0,3	0,2	1,5	17,5	10,0	0,01	3,81	
3	Tomadas Sala de Comunicação	F+N+T	B1	115 V	761	700	S		700		6,6	0,92	1,00	0,70	9,5	6,6	2,5	24,0	20,0	0,72	4,52	
4	Tomadas Odontologia	F+N+T	B1	115 V	978	900	S		900		8,5	0,92	1,00	0,60	14,2	8,5	2,5	24,0	20,0	0,87	4,67	
5	Tomadas Sala de Preparo de Pac.	F+N+T	B1	115 V	326	300	R	300		2,8		0,92	1,00	0,65	4,4	2,8	2,5	24,0	20,0	0,28	4,05	
6	Tomadas Externas e das Bancadas	F+N+T	B1	115 V	652	600	R	600		5,7		0,92	1,00	0,60	8,1	5,7	2,5	24,0	20,0	0,27	4,07	
7	Compressor Odontológico	F+F+T	B1	230 V	1085	736	R+S	368	368	4,7	4,7	0,68	1,00	0,60	7,9	4,7	2,5	24,0	20,0	0,25	4,05	4,38
8	Autoclave Odontológica	F+F+T	B1	230 V	1500	1500	R+S	750	750	6,5	6,5	1,00	1,00	0,60	10,9	6,5	2,5	24,0	20,0	0,31	4,11	
9	Tomadas Sala AISAN e AIS e Corredor	F+N+T	B1	115 V	543	500	R	500		4,7		0,92	1,00	0,60	6,8	4,7	2,5	24,0	20,0	0,33	4,13	
10	Tomadas Consultório Indiferenciado	F+N+T	B1	115 V	326	300	R	300		2,8		0,92	1,00	0,60	4,7	2,8	2,5	24,0	20,0	0,23	4,03	
11	Central de Ar - Sala do AISAN a AIS	F+F+T	B1	230 V	1355	1247	R+S	624	624	5,9	5,9	0,92	1,00	0,70	8,4	5,9	2,5	24,0	20,0	0,29	4,09	
12	Central de Ar - Sala de Odontologia	F+F+T	B1	230 V	1355	1247	R+S	624	624	5,9	5,9	0,92	1,00	0,60	9,8	5,9	2,5	24,0	20,0	0,25	4,05	
13	Central de Ar - Sala de Prep. de Pac.	F+F+T	B1	230 V	1355	1247	R+S	624	624	5,9	5,9	0,92	1,00	0,65	9,1	5,9	2,5	24,0	20,0	0,29	4,09	
14	Central de Ar - Consultório Indiferenciado	F+F+T	B1	230 V	1355	1247	R+S	624	624	5,9	5,9	0,92	1,00	0,60	9,8	5,9	2,5	24,0	20,0	0,30	4,10	
TOTAL					11853	10762	R+S	5336	5426													

Quadro de Demanda (QDD)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Uso específico	8,01	100	8,01
Iluminação e Tomadas - UBSI I	3,85	80	3,08
		TOTAL	11,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 112
Rúbrica

NOTAS:

- A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS NR10, NBR 5410/2005 E NBR 5419/2015. O PROJETO DEVERÁ SER EXECUTADO FIELMENTE. EM CASO DE DÚVIDAS A EMPRESA DEVE CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO.
- TODOS OS CABOS DE ALIMENTADORES DOS QUADROS DEVERÁ SER DE ISOLAÇÃO 1kV, CARACTERISTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO À FOGO, LIVRE DE HALOGÊNIOS;
- TODOS OS ELETRODUTOS DE PVC DEVERÃO SER RÍGIDO ROSCÁVEL CLASSE "A", DE ACORDO COM A EB-744(ABNT);
- ELETRODUTOS DE PVC NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE DIÂMETRO NOMINAL ø25mm.
- EM NENHUM TRECHO A FIAÇÃO PODERÁ ESTAR EXPOSTA OU EMBUTIDA DIRETAMENTE NA ALVENARIA OU REBOCO;
- FIAÇÃO NÃO ESPECIFICADA SERÁ DE 1,5mm²;
- CORES DOS CONDUTORES = (ELETRICA REDE COMUM) FASES: VERMELHO E PRETO; NEUTRO : AZUL CLARO; TERRA : VERDE
- OS ELETRODUTOS SERÃO FIXADOS FIRMEMENTE NAS PAREDES OU ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO FORRO COM O USO DE ABRAÇADEIRAS DO TIPO "D" OU TIRANTES;
- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS NO INTERIOR DOS QUADROS E JUNTO AS TOMADAS;
- AS TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS EXTERNAMENTE;
- TODAS AS EMENDAS DE CABOS FLEXÍVEIS DEVERÃO SER ISOLADAS COM FITA DE AUTO FUSÃO E FINALIZADAS COM FITA ISOLANTE COMUM;
- TODAS AS PARTES METÁLICAS NORMALMENTE NÃO ENERGIZADAS DEVERÃO SER ATERRADAS;
- TODAS AS LIGAÇÕES NAS CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS DEVERÃO SER FEITAS UTILIZANDO DE BUCHA E ARRUELA;
- TODAS AS TOMADAS 2P+T CONFORME PADRÃO BRASILEIRO ABNT NBR 14136, DEVERÃO POSSUIR CERTIFICÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELO INMETRO;
- TODAS AS CONEXÕES DOS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE SOLDA EXOTERMICA;
- OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA PROFUNDIDADE DE 50cm. DEVERÃO SER UTILIZADAS SOLDA TIPO EXOTÉRMICAS NAS CONEXÕES CABO-HASTE E CABO-CABO.

⑦ QUADRO DE CARGAS, NOTAS E ADVERTÊNCIAS
S/ ESCALA

NOTAS continuação:

- INSTALAR DISJUNTOR PADRÃO EUROPEU - DIN;
- CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO CORRENTE MÍNIMA DE 3,0kA, QUANDO NÃO INDICADO;
- IDENTIFICAR CADA CIRCUITO COM PLAQUETA ACRÍLICA;
- UTILIZAR CONECTORES ADEQUADOS:
  DISJUNTORES: CONECTOR TIPO PINO;
  BARRAMENTO NEUTRO E TERRA: CONECTOR TIPO OLHAL;
- INSTALAR PORTA PROJETOS;
- UTILIZAR ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE OS DISPOSITIVOS PARA EVITAR AQUECIMENTO;
- UTILIZAR IDR BIPOLAR 25A 30mA NOS CIRCUITOS PARA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE;
- UTILIZAR DPS CLASSE I/II 175V 12,5/60kA NA MURETA DE ENTRADA DE ENERGIA;
- UTILIZAR DPS CLASSE II 175V 40kA NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA UBSI.

ADVERTÊNCIA A SER INSTALADA NOS QUADROS:

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga. Por isso, nunca troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção(bitola).
2. Da mesma forma, nunca desative ou remova a chave automática de proteção contra choque elétrico (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamento sem causa aparente. Se os desligamento forem freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiver êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anormalias internas, que só podem ser identificados e corrigidas por profissionais qualificados.

A desativação ou remoção da chave significa a eliminação de medida protetora contra choque elétrico e risco de vida para os usuários da instalação.

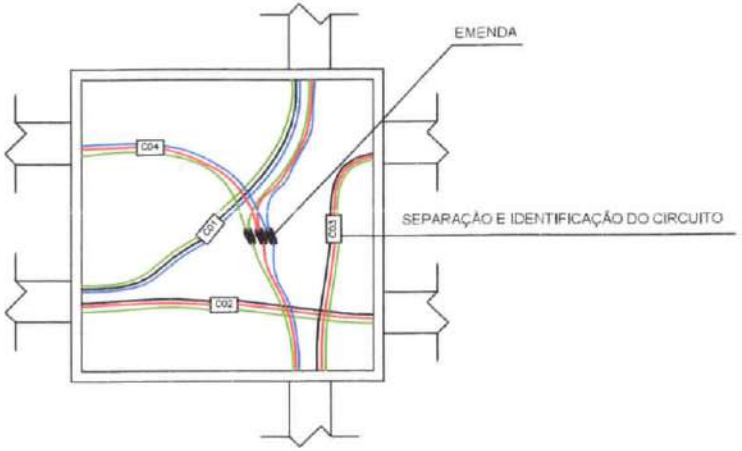

⑧ SEPARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS NAS CAIXAS DE PASSAGEM
S/ ESCALA

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI

LOCAL: COMUNIDADES INDIGENAS UIRAMUTÃ

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

RESPONSÁVEL/AUTOR: Engª Civil. Marcos Domingos da Silva CREA-RR nº 09[illegible]4068

PRANCHA: DETALHES | ÁREA: 175,13m | FOLHA: 3/3

DATA:

ESCALA: INDICADA

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 143
Rúbrica

RELATORIO FOTOGRÁFICO
(ANEXO 4 DISPONIBILIZADO EM MÍDIA)

EM BRANCO

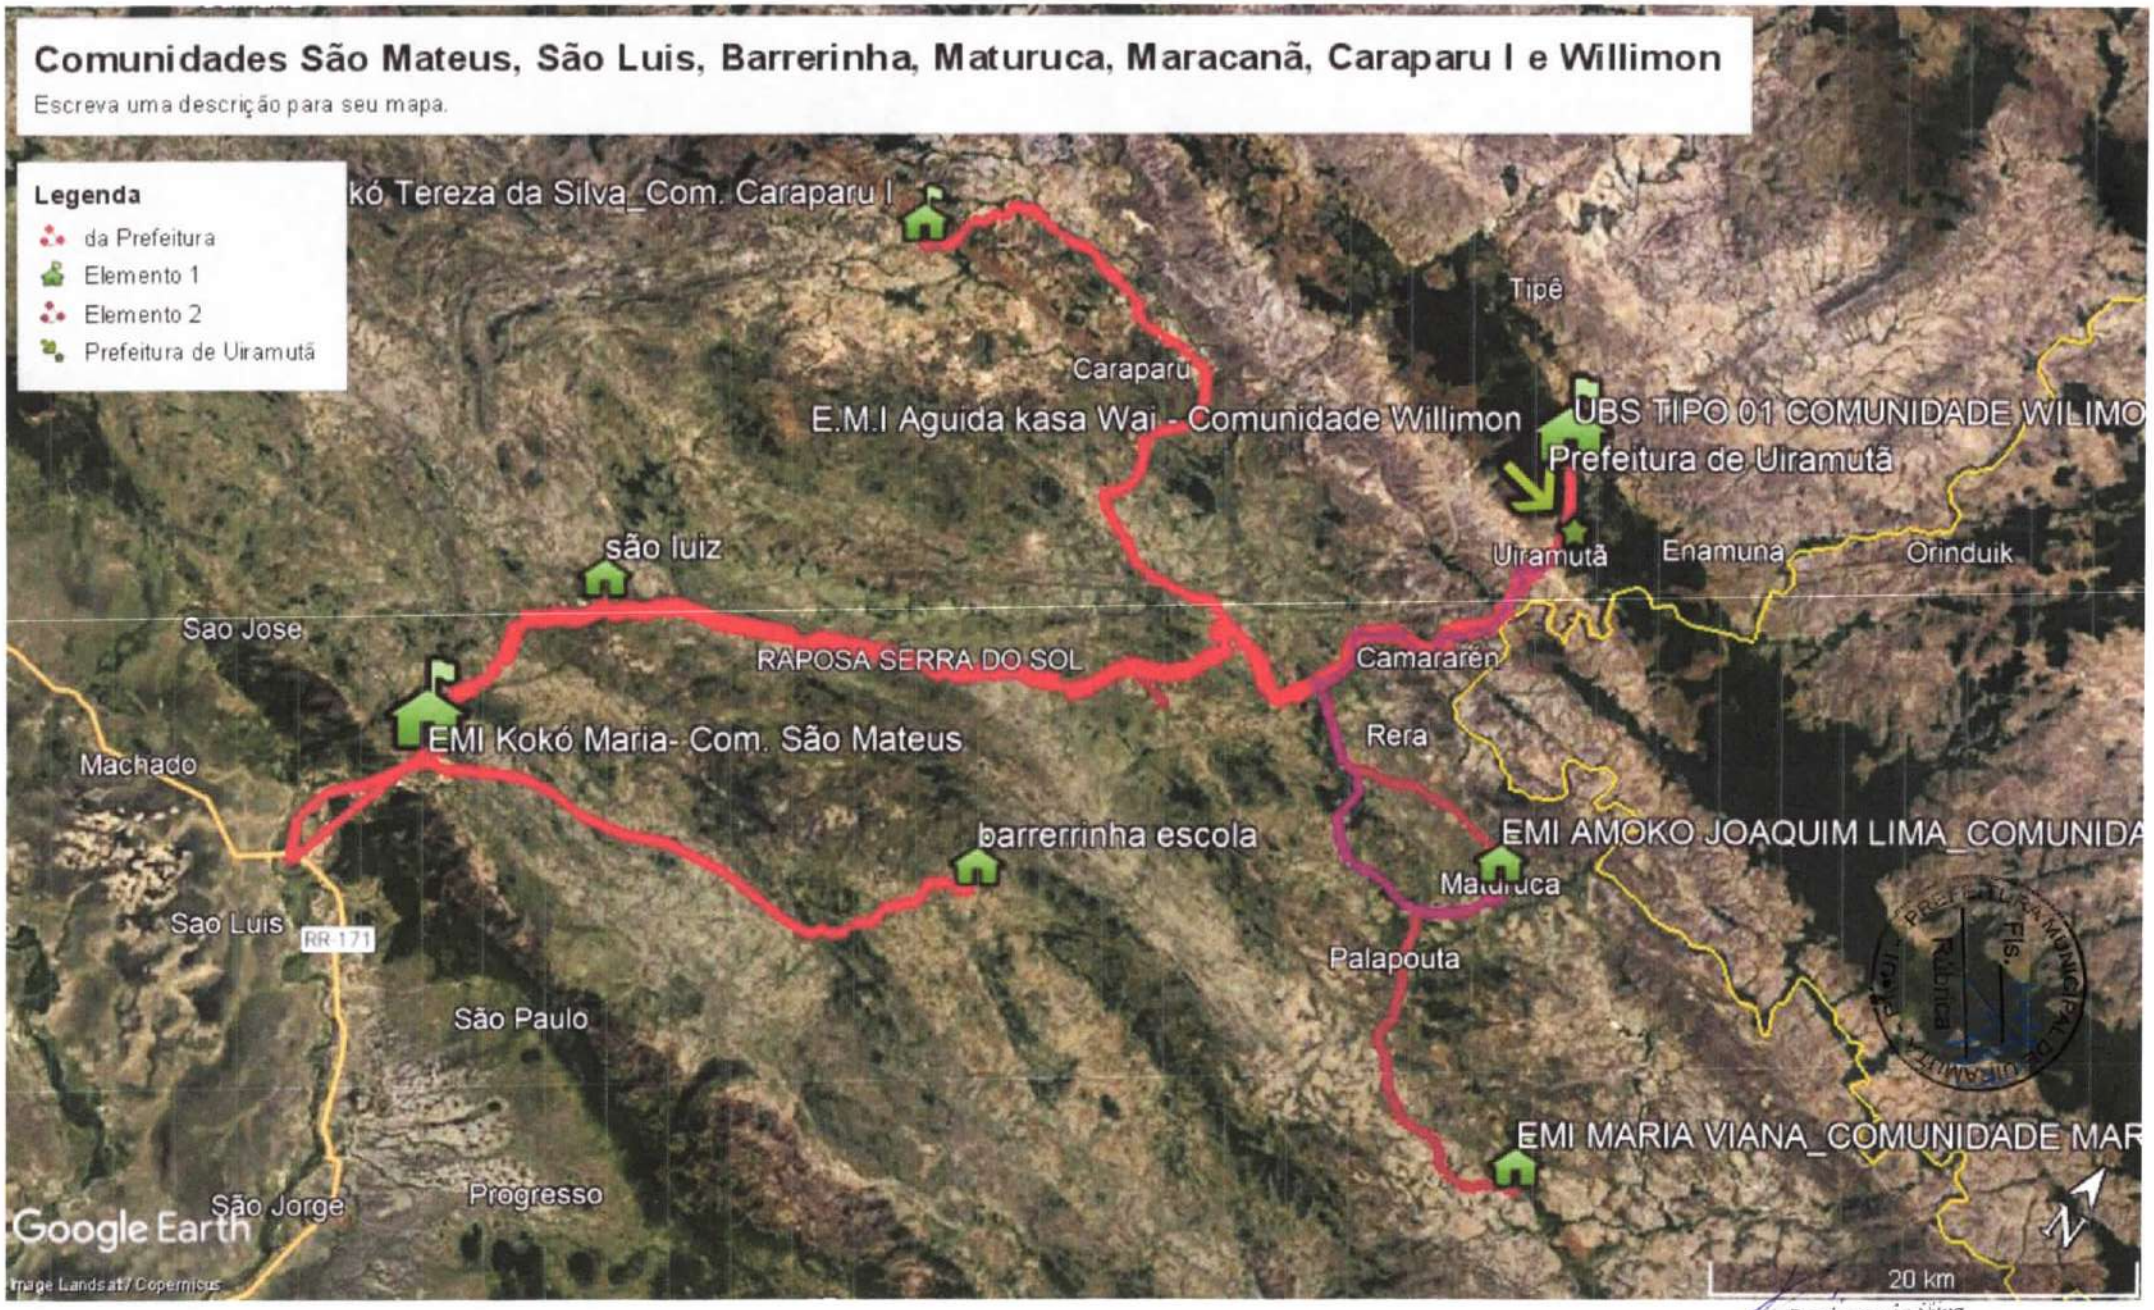

José Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 090540[illegible]

EM BRANCO

PREFEITURA DE UIRAMUTÃ

SEMECD UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 145
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – SEMECD

Da: Secretaria de Educação Cultura e Desporto
Para: Gabinete do Prefeito

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO –Comunidade BARREIRINHA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR".

Em atendimento ao Art. 14 da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, informamos a Vossa Excelência a existência de credito orçamentário, visando a construção da escola municipal indígena na comunidade BARREIRINHA no município de UIRAMUTÃ –RR, conforme PAMPS, projeto Básico e Anexos.

Os recursos para essa contratação estão seguros na Classificação Orçamentaria:

Unidade Orçamentaria: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Exercício: 2022.
Programa de atividade: 12.361.3400.1020.0000
Elemento de Despesa: 44905100
Tipo de empenho: GLOBAL
Fonte de recurso: FUNDEB

UIRAMUTÃ – RR, 26 de Setembro de 2022.

Vanderlane James Lima

VANDERLANE JAMES LIMA
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto
PORTARIA Nº 459/2022

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 146
Rubrica
PMU

AUTORIZAÇÃO

Estando devidamente cumpridas as formalidades previstas non art. 38, caput, da Lei Federal n. 8.666/93, e suas alterações posteriores, conforme se constante no despacho anexado, AUTORIZO a abertura do processo licitatório visando a Construção da escola municipal indígena na comunidade BARREIRINHA no município de UIRAMUTÃ –RR. Conforme PAMS, Projeto Básico, e anexos.
Na qualidade de ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de UIRAMUTÃ –RR, declaro para os efeitos do inciso II, do Art. 16 da Lei Complementar n. 101- Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa abaixo especificada possui adequação orçamentaria e financeira com a Lei Orçamentaria Anual (LDO) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO).

Remeta-se o procedimento a Comissão Permanente de Licitação - CPL para os procedimentos cabíveis. Após sejam os autos submetidos a análise da Assessoria Jurídica para emissão de parecer jurídico.

UIRAMUTÃ – RR, 29 de Setembro de 2022.

BRS

Benisio Roberto de Souza
Prefeito do Município de Uiramuta- RR

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO – CPL/PMU

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 147
Rubrica
PMUI

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS Nº: 012/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO –Comunidade BARREIRINHA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR".

REQUERENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO - SMECD

AUTUAÇÃO

Hoje, nesta cidade, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, autuo o processo licitatório **n. 134/2022,** do que para constar, lavrei este termo. Eu SANDRO DA SILVA MAFRA, Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, o subscrevo.

UIRAMUTÃ – RR, 29 de Setembro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 148
Rúbrica

PORTARIA Nº 003A/2022

Dispõe sobre a Nomeação da Comissão permanente de Licitação e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE

Art. 1º Nomear os servidores abaixo relacionados para recompor a Equipe de Apoio da Comissão Permanente de Licitação – CPL:

Senhor **Sandro da Silva Mafra**, portador do CPF: 889.112.762-00, como Presidente;

Senhora **Juliana Souza da Silva**, portador do CPF: 686.860.992-20, como membro;

Senhora **Cleiciane Pinho de Assis**, portadora do CPF: 973.284.642-91, como membro.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito de Uiramutã-RR.03 de janeiro de 2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito

PUBLICADO NO MURAL
EM 03/01/22
Eloiza Cavalcante de Lima
Chefe de Gabinete
Port. 010/2021

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 149
Rúbrica

PROCESSO 134/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 150
Rúbrica

NOTA EXPLICATIVA

A presente licitação visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL. Verifique se este exemplar está completo.

O Edital desta licitação contém a presente nota explicativa, o preâmbulo, as normas de especificação, as regras de procedimento e julgamento, bem como as de contratação do objetodeste certame e os seguintes anexos que integram o Edital:

Anexo I – Relação da equipe técnica básica / Declaração de disponibilidade da equipe.
Anexo II – Declaração de disponibilidade dos equipamentos e instalações.
Anexo III – Modelo de Atestado de Visita Técnica.
Anexo IV – Modelo de credenciamento de participação em visita técnica.
Anexo V – Modelo de credenciamento de participação.
Anexo VI – Modelo de declaração de integral submissão ao edital
Anexo VII – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo da habilitação.
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.
Anexo IX – Modelo de declaração de enquadramento de microempresa;
Anexo X – Modelo da Proposta de Preços.
Anexo XI – Minuta de Contrato.
Anexo XII – Planilha Orçamentária (disponível em mídia).
Anexo XIII – Cronograma Físico-Financeiro (disponível em mídia).
Anexo XIV – Memorial Descritivo (disponível em mídia).
Anexo XV – Projeto (disponível em mídia).

Para a perfeita compreensão das normas reguladoras da presente licitação, examine atentamente todas as peças deste Edital e seus Anexos.

Os envelopes contendo propostas de preço, propostas técnicas e documentos de habilitação serão apresentados pelos licitantes, **devidamente lacrados**, em suporte físico e só poderão ser abertos após a sua publicização, pelo servidor responsável pela licitação e os documentos que compõem os envelopes de habilitação e proposta deverão, **obrigatoriamente, por todos os licitantes, conter sumário e paginação, a fim de evitar discussão futura quanto aos seus conteúdos**.

O descumprimento de tais determinações não poderão ser interpretadas em prejuízo da Administração Pública.

O Edital prevê o procedimento a ser observado pelo licitante em caso de dúvida de caráter técnico ou legal na interpretação de seus termos. O protocolamento da proposta presume o pleno conhecimento e entendimento de todas as condições por parte da licitante e, nos termos dalei, implica a sua aceitação automática, integral e irretratável, motivo por que, após este ato, a Administração não tomará conhecimento de qualquer reclamação da proponente, fundada em erro, omissão ou obscuridade do Edital.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 151
Rúbrica

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei, através do e-mail **cpluiramita@gmail.com** ou carta protocolada na Prefeitura Municipal, situada a Rua Cici Mota, s/n.º, Centro, em até **05 (cinco) dias úteis** antesda data fixada para a entrega da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS,devendo a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO julgar e responder à impugnação ematé **3 (três) dias úteis**, nos termos do § 1º do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93 e encaminhara decisão do julgamento via e-mail, com a devida publicação no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR.

ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 152
Rubrica

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 012/2022

PROCESSO Nº 134/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022

PREÂMBULO

O Município de Uiramutã/RR, em atendimento à Secretaria Municipal Educação, Cultura e Desporto, torna público que a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 003-A/2022, a fim de realizar certame licitatório, sob a modalidade Tomada de Preço, receberá na sala da CPL situado na Rua Cici Mota s/n, Centro, no município de Uiramutã/RR, envelopes contendo documentos de habilitação e proposta, para julgamento da mais vantajosa, em tudo observando a Lei 8.666/93 e nos termos do presente edital.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às XXhXXmin do dia XX de XXXXX de 2022.
ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia XX de XXXX de 2022 às XXhXXmin.
Qualquer cidadão interessado poderá acompanhar as sessões informado neste edital.

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei, através do e-mail **cpluiramuta@gmail.com** ou carta protocolada na Prefeitura Municipal, situada a Rua Cici Mota, s/n.º , Centro, em até **05 (cinco) dias úteis** antesda data fixada para a entrega da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS,devendo a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO julgar e responder à impugnação em até **3(três) dias úteis**, nos termos do § 1º do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93, via e-mail.

Decairá o direito de impugnar os termos deste edital de licitação, por falhas ou irregularidadesque o viciariam, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para a abertura da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e PROPOSTAS, hipótese em quetal comunicação não terá efeito de recurso.

I - OBJETO

1.1. Constitui o objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

1.2 O valor estimado do referido processo licitatório é **R$ 494.948,16 (quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos)**, devendo as propostas se limitar a este valor, sob pena de desclassificação.

II – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR

2.1. Poderão participar da presente licitação todos os interessados que satisfaçam as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, e ainda, cujo contrato social esteja em vigor, registrado no órgão competente, com o ramo de atividade compatível ao objeto deste edital.

2.2. Não poderá participar da presente licitação pessoa jurídica:

2.2.1. Que esteja sob falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação e não sejam controladas, coligadas ou subsidiarias entre si;

2.2.2. Declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com o Município de Uiramutã, oucom declaração de



MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 153
Rubrica

inidoneidade e/ou impedimento de licitar com a Administração Pública;
2.2.3. Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;
2.2.4. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
2.2.5. Que possua qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do Termo de Referência/Projeto e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários;
2.2.6. O disposto no item anterior aplica-se também aos membros da comissão de licitação.
2.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.

III - CADASTRO

3.1. O interessado deverá requerer cadastramento até **três (03) dias** anteriores à data fixada para a entrega da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, junto à Comissão Permanente de Licitação, situado a Rua Cici Mota, s/n° - Centro, município de Uiramutã/RR, anexando cópias autenticadas dos documentos abaixo relacionados ou acompanhada dos respectivos originais para conferencia pela Comissão Permanente de Licitação:
3.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as suas alterações ou Contrato Social Consolidado e alterações posteriores, devidamente registrado no órgão competente; no caso de Sociedades por Ações, documento de eleição de seus administradores; no caso de Empresa Individual, Registro Comercial;
3.1.2. Carteira de Identidade e CPF dos sócios;
3.1.3. Prova de inscrição no CNPJ;
3.1.4. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal;
3.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa;
3.1.6. Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
3.1.7. Certidão Negativa de Falência e Concordata;
3.1.8. Certidão de Registro e Quitação de Empresa, expedida pelo CREA e/ou CAU, comprovando sua situação de registro, bem como de seu(s) responsável(is) técnico(s);
3.1.9. Declaração de Micro e Pequena Empresa, se for o caso.
Os **certificados de registros cadastrais**, expedidos pela Prefeitura Municipal de Uiramutã, estarão à disposição dos interessados até as 16h00min, do dia anterior a data fixada para a entrega da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, no endereço acima mencionado.

IV - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

4.1. As empresas participantes deverão apresentar dois envelopes contendo habilitação e proposta, os mesmos deverão ser apresentados, em envelope não transparente, fechado e indevassável, ambos contendo em sua parte externa, a identificação da licitante, e os seguintes dizeres:

BIBRICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 154
Rubrica

MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 012/2022
ENVELOPE N° 1 – HABILITAÇÃO

MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 012/2022
ENVELOPE N° 2 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: _____

4.1.1. No verso dos envelopes deverá constar o nome e o endereço do proponente.
4.1.2. Os documentos que compõem os envelopes de habilitação e proposta deverão conter sumário e paginação, a fim de evitar discussão futura quanto aos seus conteúdos;
4.2. O PRIMEIRO ENVELOPE, constando, o subscrito acima, deverá conter, em cópias autenticadas ou acompanhados dos respectivos originais, para conferencia da Comissão Permanente de Licitação nos termos do artigo 32 da Lei n° 8.666/93, no ato da abertura do envelope, sendo esses últimos devolvidos após a autenticação requerida, ao representante legal presente:

4.2.1 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento do objeto de licitação (Recibo de Retirada do Edital).
b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Lei nº 5.194/66) (Lei n° 12.378/2010), na qual constem todos os seus responsáveis técnicos, com jurisdição sobre o domicílio da sede da LICITANTE;
c) Certidão de Registro de Pessoa Física emitida pelo CREA da jurisdição do domicílio do profissional, em nome de cada integrante da Equipe Técnica do subitem onde conste atribuição compatível com a área de atuação indicada pela licitante;
d) A Licitante deverá apresentar nos termos de seu art. 30, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações Atestado de Capacidade Técnica-Operacional emitido por pessoa Jurídica de direito pública ou privada, com atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação conforme itens de maior relevância a seguir:

QUANTITATIVO PARA ACERVO TÉCNICO E OPERACIONAL			
Itens	**Descrição**	**Un.**	**40% ref. Aos itens de maior relevância dos serviços executados**
1,1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	204,24
1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	130,57
1.3	Massa única para recebimento de pintura em		

EM BRANCO

Fls. 155
Rubrica

	argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	434,60
1.4	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	18,21
1.5	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	185,13

e) O Atestado de Capacidade Técnica-Operacional só será válido se reconhecido e ou chancelado pelo CREA devidamente acompanhado da Certidão de Acervo Técnico - CAT do Profissional que realizou a obra/serviços;
f) A Licitante deverá apresentar nos termos de seu art. 30, § 1°, inc. I da Lei 8.666/93 e suas alterações, Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA de obras e serviços semelhantes ao do objeto licitado;
g). Caso o Responsável Técnico da empresa não seja o detentor da Certidão de Acervo Técnico – CAT que originou o Atestado de Capacidade Técnica Operacional apresentado pela Licitante, o mesmo deverá apresentar a Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA com os serviços compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação conforme itens de maior relevância a seguir, além de comprovar que o detentor do acerco possuam vínculo com a empresa.

4.2.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.2.2.1. Certidão Negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; datado dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
4.2.2.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelo INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.
4.2.2.2.1. O Balanço e as Demonstrações deverão ser apresentados por cópias reprográficas da página do Livro Diário, onde se encontram transcritos, comprobatório do registro na Junta Comercial. Poderá também ser apresentada cópia reprográfica de publicação em jornal, na forma da lei. As cópias deverão ser autenticadas.
4.2.2.2.2. Caso a licitante tenha iniciado suas atividades no presente exercício, deverá apresentar cópia do Balanço de Abertura ou do Livro Diário, apresentados na forma da lei para lançamento dos índices mencionados.
4.2.2.2.3. As empresas optantes do "SIMPLES NACIONAL" não estão dispensadas de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis.
4.2.2.2.4. **O Balanço Patrimonial e demonstrações apresentadas para fins de habilitação após o dia 31 de maio do corrente ano serão, obrigatoriamente, do exercício imediatamente anterior**.
4.2.2.3. A boa situação econômico-financeira da empresa licitante estará consubstanciada nos seguintes índices, devidamente justificados no processo licitatório:

- Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1% (um por cento), a ser obtido pela fórmula:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

EM BRANCO

Fls. 156
Rubrica

- Índice de Endividamento Patrimonial (IEP) igual ou inferior a 1% (um por cento), que mostrará a relação entre Capital de Terceiros (Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo) e o Capital Próprio (Patrimônio Líquido), a ser calculado pela fórmula:

$$IEP = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

4.2.2.3.1. Caso o licitante apresente índices incompatíveis com o item 6.1.4.3, a comprovação de qualificação econômica financeira poderá ser demonstrada através da comprovação de patrimônio líquido no importe de 10% (dez por cento) do valor orçado para licitação (item 7.1 deste edital).

4.2.2.3.1.1. A licitante deverá apresentar cálculo demonstrativo da atualização do Capital Social, sempre que o valor nominal constante do contrato social não estiver grafado em real.

4.2.3 – OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

4.2.3.1. Certificado de Registro Cadastral atualizado, emitido pela Prefeitura Municipal de Uiramutã;

4.2.3.1.1. Caso a empresa interessada não houver se cadastrado, conforme exigido no item 03 deste edital, mas atenda a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, esta poderá apresentar os documentos relacionados no mesmo item, no invólucro nº 01 – "Documentação para Habilitação".

4.2.3.1.2. Na hipótese de apresentação do CRC, caso algum documento já se encontre vencido, o licitante deverá apresentá-lo atualizado, dentro do invólucro nº 01 - Documentação para Habilitação, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas.

4.2.3.2. Carta de Credenciamento para participação na respectiva licitação, conforme **ANEXO V**.

4.2.3.2.1. Tratando-se de procurador, deverá ser apresentada procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, e documentooficial de identificação que contenha foto.

4.2.3.3. Declaração de Integral submissão ao edital, conforme **ANEXO VI**.

4.2.3.4. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, do art. 32 da Lei 8.666/93, alterado pela Lei nº 9.648/98, conforme **ANEXO VII**.

4.2.3.5. Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme **ANEXO VIII**.

4.2.3.6. As **MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE** e **EQUIPARADAS**, que desejarem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006 e suas posteriores alterações, deverão apresentar, os seguintes documentos:

4.2.3.6.1. Declaração assinada pelo responsável legal da empresa, atestando que até a presente data a empresa esta enquadrada no regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo constante no **ANEXO IX**; e,

4.2.3.6.2. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa;

4.2.3.6.3. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da pequena empresa.

EM BRANCO

4.3. No SEGUNDO ENVELOPE, que será apresentado da mesma forma que o primeiro, e deve conter proposta com preço unitário e total e também o valor global proposto para execução da obra.

4.3.1 A proposta de preço deverá ser legível, digitada ou impressa em processador de texto sem emendas ou rasuras, em uma única via, em papel timbrado onde conste o CNPJ ou carimbo padronizado do CNPJ da proponente, datada, assinada pelo representante legal da licitante, com prazo de validade no mínimo de 60 (sessenta) dias.

4.3.2. A proposta de preços, **ANEXO X**, deverá ser apresentada, sob pena de desclassificação, juntamente com os seguintes documentos:

4.3.2.1. Planilha de orçamento.

4.3.2.1.1. Os preços deverão estar grafados em reais, com duas casas decimais após a vírgula.

4.3.2.2 Cronograma Físico Financeiro.

4.3.3. A proposta de preços deverá indicar o valor da execução completa dos serviços e obras, segundo a cotação de preços unitários aplicados pela proponente nos itens da planilha de orçamento deste edital. Os preços terão como base o mês de apresentação das propostas.

4.3.4. A empresa deverá preencher a planilha de orçamento, que integra este Edital com os preços unitários por ela propostos, e com valor final indicado em algarismos e por extenso. Poderá ser apresentada planilha computadorizada pela própria proponente, desde que guarde, sob pena de desclassificação, absoluta fidelidade com a planilha de orçamento integrante deste edital, no que se refere aos itens, às atividades, unidades e quantidades.

4.3.5. Todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, os fretes, seguros, bem como todas as despesas diretas e indiretas que incidirem nos serviços, deverão estar inclusos no preço.

4.3.6. A apresentação da proposta implica na aceitação tácita de todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como a aceitação de que, caso necessário, a CPL, no transcorrer da licitação poderá solicitar que as licitantes estendam o período de validade das mesmas para igual período adicional.

4.3.6.1. A solicitação prevista acima, bem como as respostas dos proponentes, será feita por escrito, circunstanciadas na respectiva ata ou através de e-mail;

4.3.6.2. A proponente poderá recusar a solicitação, resultando na desistência da participação do processo licitatório, sem que a ele sejam imputadas penalidades para tal ato.

V - DO JULGAMENTO

5.1. A Comissão Permanente de Licitação – CPL, abrirá em primeiro lugar o envelope nº 1 – **DOCUMENTAÇÃO**, para que os membros da Comissão possam examinar e rubricar cada documento e os representantes presentes na Sessão, possam ratificar as informações.

5.2. A Comissão Permanente de Licitação – CPL poderá suspender a sessão sempre que julgar necessário analisar os documentos e propostas oferecidas pelos licitantes, objetivando confirmar as informações prestadas.

5.3. Após o exame da documentação apresentada e a formulação de eventuais impugnações, deverá a Comissão Permanente de Licitação apresentar sua decisão sobre a habilitação das licitantes e consultá-las sobre a interposição de recursos, determinando o prazo para este fim.

5.4. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer às exigências desta Tomada de Preços.

5.5. Os envelopes de proposta dos licitantes inabilitados serão devolvidos fechados, logo após a decisão definitiva da inabilitação.

5.6. Transcorrido o prazo sem interposição de recursos, tendo havido expressa desistência deles ou após julgamento dos recursos interpostos, proceder-se-á a abertura dos envelopes nº 02.

5.7. Na classificação das propostas observar-se-ão seu valor global e os preços unitários

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 158
Rubrica

oferecidos, atendidos os seguintes critérios:

5.7.1. O **Preço de Referência** – valor estimado da contratação, constante deste Edital - item 1.2, **é o preço teto**, limite para as propostas das licitantes, **sendo desclassificadas as que superarem o valor estipulado**.

5.7.2. Será classificada em primeiro lugar a proposta apresentada de acordo com as especificações deste Edital, que contiver oferta do **MENOR PREÇO GLOBAL**.

5.8. A Comissão desclassificará propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim entendidas aquelas definidas nos termos da alínea "a" e "b" do parágrafo 1º do inciso II, do art. 48 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

5.9. A Comissão Permanente de Licitação no julgamento das propostas de preços, poderá determinar que sejam promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como:

a) Discrepância entre valores grifados em algarismo ou por extenso: prevalecerá o valor por extenso;
b) Erro de multiplicação do valor unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o valor total;
c) Erro de adição será retificado conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;
d) Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço unitário e as quantidades previstas, alterando-se o valor final;
e) Erro no preço total será corrigido de acordo com o disposto nas letras acima.

5.9.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar das licitantes que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Proposta de Preços, desde que, as informações não alterem os preços apresentados e não correspondam a documentos que, originalmente, deveriam figurar na proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na desclassificação da licitante.

5.10. A Comissão Permanente de Licitação observará também, quando do julgamento das propostas, os seguintes procedimentos:

5.10.1. Não utilizará qualquer elemento, fator ou critério sigiloso ou subjetivo, secreto ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.

5.10.2. Não considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes.

5.11. No caso de empate entre duas ou mais propostas, referente ao objeto licitado, de empresas não enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, a classificação dar-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público para o qual todos os licitantes serão convocados (Lei nº 8.666/93, e alterações, art. 45, § 2.º, segunda parte).

5.11.1. Se desta Tomada de Preços estiverem participando microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação destas.

5.11.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

5.11.3. Ocorrendo o empate entre microempresas e empresas de pequeno porte, a Comissão Permanente de licitação procederá da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea a, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 5.11.2. deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 159
Rubrica

5.11.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 5.11.1. deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
5.11.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 5.11, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
5.11.6. O disposto no subitem 5.11 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
5.12. Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou forem todas as propostas desclassificadas, poderá a Administração fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou novas propostas, escoimadas das causas que levaram à inabilitação ou desclassificação.
5.13. Deverá a Comissão Julgadora, em conjunto com a equipe de apoio, especialmente convocada para este certame, consignar, em ata, a síntese de fatos ocorridos e pronunciados, submetendo todo o procedimento à homologação da autoridade competente.
5.14. O Município de Uiramutã se reserva o direito de, por despacho fundamentado, decidir:
5.14.1. Pela revogação desta licitação, em razão de interesse público.
5.14.2. Anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida no seu curso.
5.14.3. Homologar a licitação, sem prejuízo da redução superveniente das obras e serviços a serem contratados.
5.15. Observando-se o disposto no art. 109 da Lei 8.666/93, admitir-se-á a interposição de recurso em qualquer fase desta licitação ou durante a execução do contrato que dela resultar.

VI - DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Os recursos financeiros são os constantes no Projeto Básico;

VII – DOS PRAZOS

7.1. A vigência do contrato será de **90 (noventa) dias**, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso ocorra algumas das hipóteses elencadas no § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
7.2. O prazo de execução dos serviços deverá obedecer ao cronograma físico-financeiro – Anexo XIII, parte integrante deste edital.

VIII - DA GARANTIA À EXECUÇÃO

8.1. Homologada a licitação e adjudicado o seu objeto à licitante vencedora, esta será convocada pela Administração para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prestar garantia à execução, que deverá cobrir o prazo contratual de execução da obra até o seu recebimento definitivo e ainda ser prorrogada sua vigência, na hipótese de ocorrer prorrogação do prazo contratual.
8.2. A garantia à execução poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no parágrafo primeiro do artigo 56 da Lei 8.666/93.
8.2.1. Caso a licitante vencedora do certame opte por formalizá-la em espécie, deverá depositar a referida importância na conta caução de execução n° 10.693-3, agência 0591-6, do Banco Brasil localizada no Município de Uiramutã.
8.2.2. Caso a licitante vencedora do certame opte por formalizá-la em outra modalidade, deverá depositá-la na Tesouraria do Município, localizada na Rua Cici Mota, s/n° , Centro,nesta cidade, no horário de 08h00min às 12h00min, que emitirá o respectivo recibo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 160
Rubrica

8.3. A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações estipuladas no Contrato.
8.4. Não serão aceitos instrumentos de garantia que possuam, em seu bojo, cláusulas de exclusão de sua aplicabilidade em casos de inexecução contratual e em situações que representem potencial risco de prejuízo ao CONTRATANTE.
8.5. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
8.5.1. Ocorrendo alteração, dentro dos limites legais, dos valores constantes do contrato ou prorrogação do prazo de execução da obra ou, ainda, qualquer outra causa que impeça a entrega do objeto no prazo avençado, a CONTRATADA deverá providenciar a complementação ou prorrogação, conforme o caso, da garantia prestada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do respectivo termo.
8.6. A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à contratada, podendo ser retida para a satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão dolosa ou culposa da contratada.
8.7. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
8.7.1. Na notificação devem constar as razões da utilização da garantia, com referência ao documento em que a contratada foi cientificada das correções que deveria providenciar e do valor das mesmas.
8.8. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída no prazo máximo de 30 (trinta) dias da solicitação da contratada.
8.9. O contrato firmado pelo Município de Uiramutã poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer das condições previstas no artigo 65 da Lei 8.666/93 em especial paraprorrogação do prazo contratual de execução avençado, conforme disposto no artigo 57 da referida lei.

IX - DA EXECUÇÃO DA OBRA

9.1. A obra e suas etapas serão executadas mediante autorização(ões), expedida(s) pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .

X - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos serão efetuados em parcelas, mediante apresentação de Nota Fiscal, à qual o Secretário requisitante aporá seu visto, solicitando sua regular quitação, acompanhada de relatório de medição e memória de cálculo, assinada pelo RT da Contratada, e aprovada pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .
Parágrafo primeiro: O pagamento está condicionado à apresentação de:
10.1.1. A comprovação de sua situação regular perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho (CNDT), extrato do Simples Nacional, quando for o caso, bem como quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços.
10.1.2. Deverão ser apresentados também o comprovante de pagamento dos tributos relativos à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) vencidos até a data da nota fiscal.
10.1.3. GFIP tendo como tomador a Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, relativo ao CEI da obra.
Parágrafo segundo: A última parcela só será paga mediante execução integral da obra,

EN BLANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 161
Rubrica

comprovada por relatório, assinado pelo Responsável Técnico pela fiscalização da obra.

XI - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

11.1. A prática de ato ilícito na licitação ou na execução do contrato e o descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão as sanções previstas nos arts. 81 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei Estadual n° 14.184, de 31 de janeiro de 2002, e nos arts. 19 a 22 do Decreto Estadual n° 44.431, de 29 de dezembro de 2006.
11.2. A ADJUDICATÁRIA perderá em favor da ADJUDICANTE a garantia a que se refere o item 8.1, no caso de recusa injustificada em assinar o contrato.
11.3. Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo as multas nos seguintes percentuais:
11.3.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia, até o trigésimo dia, de atraso, sobre valor dos serviços previstos no cronograma físico não executados;
11.3.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;
11.3.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços previstos no Cronograma Físico não executados, no caso de atraso superior a 30(trinta) dias;
11.3.4. 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.
11.3.5. As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes, ressalvada a situação descrita nos itens **11.3.6** e **11.3.7**.
11.3.6. O atraso no cumprimento do Cronograma Físico- Financeiro previsto para execução dos serviços será verificado nas medições mensais, a partir do qual incidirá a multa prevista no item **11.3.1**.
11.3.7. Verificando o atraso, na forma do item anterior, a CONTRATADA será notificada, por escrito, para sanar a irregularidade.
11.3.8. Persistindo a irregularidade prevista no item **11.3.6**, até a medição mensal subsequente, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento da multa prevista no item **11.3.3**, que substituirá aquela constante do item **11.3.1**.

11.4. Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição pela Prefeitura Municipal de Ordens de Início, Reinício ou Paralisão de Serviços.
11.5. As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de idoneidade poderão ser aplicadas comulativamente com a de multa, assegurando-se ao interessado o direito de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de idoneidade, em prazo será de 10 (dez) dias.
11.5.1. Para aplicação das sanções referidas no item anterior, deverá ser instaurado processo administrativo punitivo, seguindo de notificação para defesa, em coformidade com o disposto nos arts. 19 a 22 do Decreto Estadual n° 44.431/06, submetida a aplicação das sanções à decisão do Secretário Municipal, salvo na hipótese de aplicação de sanção de declaração de indoneidade, de competência exclusiva do Prefeito Municipal, ou de autoridade a ele equivalente, nos termos da lei.
11.6. As multas deverão ser recolhidas no Departamento de Fazenda do município de Uiramutã, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contado à partir da decisão definitiva na esfera administrativa.
11.7. Se a multa aplicada for de valor superior ao da garantia prestada, além da sua perda responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda quando for o caso, cobrada judicialmente.
11.8. Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações

EN BLANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 162
Rubrica

compensatórias expressandamente concedidas pela CONTRATANTE ou resultante de fato superviniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade da CONTRATADA, tais como o estado de calamidade pública, guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas características.

11.9. As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente fundamentedas através de registro no Diário de Obras realizado pela FISCALIZAÇÃO.

XII - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

12.1. A presente licitação poderá ser revogada ou anulada em qualquer das fases, em conformidade com a Lei 8.666/93.

XIII - DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

13.1. Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

13.1.1. Considera-se receita bruta, para fins do disposto no item A.1, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

13.1.2. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o item 13.1 será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.

13.1.3. O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados.

13.1.4. Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item A.1 deste Edital;

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item A.1 deste Edital;

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item A.1 deste Edital;

f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

Fls. 163
Rubrica

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;
h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
j) constituída sob a forma de sociedade por ações.

13.1.5. O disposto nas alíneas itens d e g do subitem 13.1.4 não se aplica à participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio previsto na Lei Complementar nº 123/2006, e associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.

13.1.6. Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações previstas nas alíneas do subitem 13.1.4 deste Edital, será excluída do regime de que trata a Lei Complementar nº 123/2006, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.

13.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, que participarem desta Concorrência, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

13.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado ao licitante, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que este for declarado o vencedor do presente certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

13.2.1.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 13.2.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1. Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições da Lei Federal Nº 8.666/93 no que couber.

14.2. Este Edital de Licitação, seus anexos e a Proposta de Preços oferecida pela contratada constituirão peças integrantes do Contrato, independentemente de transcrição no instrumento respectivo.

XV - ANEXO

15.1. Fazem parte integrante deste edital:
Anexo I – Relação da equipe técnica básica / Declaração de disponibilidade da equipe.
Anexo II – Declaração de disponibilidade dos equipamentos e instalações.
Anexo III – Modelo de Atestado de Visita Técnica.
Anexo IV – Modelo de credenciamento de participação em visita técnica.
Anexo V – Modelo de credenciamento de participação.
Anexo VI – Modelo de declaração de integral submissão ao edital.

EM BRANCO

Anexo VII – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo da habilitação.
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.
Anexo IX – Modelo de declaração de enquadramento de microempresa.
Anexo X – Modelo da Proposta de Preços.
Anexo XI – Minuta de Contrato.
Anexo X – Planilha Orçamentária (disponível em mídia);
Anexo XI – Cronograma Físico-Financeiro (disponível em mídia);
Anexo XII – Memorial Descritivo (disponível mídia);Anexo XIII – Projeto (disponível em mídia).

Uiramutã, XX de XXXXX de 2022.

Sandro da Silva Mafra
Presidente da Comissão de Licitações

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 165
Rubrica

ANEXO

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA BÁSICA / DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022
Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

A licitante .....CNPJ:....., declara ter disponibilidade de pessoal técnico especializada e compromete-se a compor a Equipe Técnica Básica aqui relacionada, caso o objeto da licitação venha a ser contratado com a mesma.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA	
NOME	**ESPECIALIZAÇÃO**
OBS:	

Por ser verdade, firmo a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EX BRAND

Fls. 166
Rubrica

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022
Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

A licitante .....CNPJ:....., declara ter disponibilidade de, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o adequado cumprimento do objeto da licitação e compromete-se a utilizá-los, caso o objeto venha a ser contratado com a mesma.

Por ser verdade, firmo a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 167
Rubrica

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

PROCESSO Nº 134/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ DECLARA, para fins do disposto no Edital de Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital T.P. nº 012/2022; que a empresa _____, cadastrada com o CNPJ nº_____, com sede na_____, nº_____, Bairro_____, CEP: _____, no município de_____, vistoriou o local onde será executada a obra, observando o local onde será executado, inteirando-se assim das condicionantes, não cabendo, posteriormente, em hipótese alguma, alegações de desconhecimento ou dúvida no que tange ao referido objeto, sendo de sua inteira responsabilidade, caso seja vencedora do mesmo, quaisquer ônus porventura decorrentes.

Uiramutã,_____de_____de 2022.

_____
Prefeitura Municipal de Uiramutã

Declaramos nossa concordância com os termos acima expostos, dando-nos por satisfeitos com as informações e detalhes obtidos e julgando-nos plenamente capacitados a elaborar nossa proposta de licitação.

_____
Empresa Participante
Representante da empresa
Nº do documento

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 168
Rubrica

MODELO DE CREDENCIAMENTO DE VISITA TÉCNICA

Uiramutã/RR,_____de_____de 20---.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022
Processo Licitatório nº 0134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

O abaixo assinado, responsável legal pela empresa_____vem pela presente, informar a V. Sas. que o_____, CREA/CAU/CPF/RG Nº_____, é a pessoa designada para representar nossa empresa na visita técnica da Licitação acima referida.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 169
Rubrica

CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO

Uiramutã/RR,_____de_____de 20---.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022
Processo Licitatório nº 0134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

O abaixo assinado responsável legal pela empresa_____vem pela presente, informar a V. Sas. que o Sr._____, carteira de identidade nº_____, é pessoa designada para representar nossa empresa na Licitação acima referida, na sessão de entrega, recebimento e abertura dos envelopes contendo documentos e proposta comercial, podendo examinar e rubricar documentos, assinar atas, apresentar impugnações e recursos, inclusive renúncia expressa a recurso.

Atenciosamente,

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EN BLANCO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TOTAL SUBMISSÃO AO EDITAL

Uiramutã/RR,_____de_____de 20---.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022
Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

Declaro, para os devidos fins, a minha total submissão ao Edital Tomada de Preços 012/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.
Por ser verdade, firmo a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

CA BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 131
Rubrica

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022
Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

A empresa....., inscrita no CNPJ sob o nº. ....., DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firma a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

Fls. 92
Rubrica

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de UiramutãComissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022
Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

A Empresa....., inscrita no CNPJ sob o nº....., DECLARA, sob as penas da lei, para surtir efeito junto à Prefeitura do Município de Uiramutã, no procedimento licitatório sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, que **não** incide na proibição contida no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.

Por ser verdade, firma a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RORAIMA
Fls. 133
Rubrica

MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022
Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

.....(Razão Social da Empresa) ....., estabelecida na .....(endereço completo) ....., inscrita no CNPJ sob n.º ....., representada pelo....., brasileiro, RG nº....., CPF nº..... residente e domiciliado (endereço) declara para os devidos fins que na presente data a mesma se encontra enquadrada nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 de 14/12/2006, que trata do Regime das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estando apta portanto a sua participação no processo n º....., tomada de preço nº ....., junto ao Município de Uiramutã. Por ser verdade,

firma a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RORAIMA
Fls. 134
Rubrica

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022
Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob o nº....., com endereço na Rua ....., por seu representante legal, Sr....., portador da Carteira de Identidade nº ....., DECLARA que concorda e submete-se a todos os termos do edital da Tomada de Preço nº 012/2022 e vem, apresentar PROPOSTA DE PREÇOS conforme planilha em anexo com a discriminação dos quantitativos, valores unitários, valores de mão-de-obra e materiais, valor final de R$..... (.....).

Nos preços apresentados já estão incluídos todos os encargos tributários, previdenciários, trabalhistas e todos os demais custos para a prestação dos serviços objeto da licitação.
O prazo máximo de execução é de 02 (dois) meses, observado o cronograma físico-financeiro da Prefeitura Municipal de Uiramutã.

A presente proposta tem prazo de validade de 60 dias a contar da data da entrega das propostas, excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

Atenciosamente,

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 135
Rubrica

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº .../2022.

PROCESSO Nº 134/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022

Contrato que, entre si, fazem o **MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ**, Estado de Roraima, inscrita no CNPJ sob nº 01.612.681/0001-01, com sua sede administrativa na Rua Cici Mota, s/n – Centro – Uiramutã, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de -----, Sr.(ª) ----------, delegatório(a) autorizado(a) pelo Decreto Municipal n° XX/202X,doravante denominado **CONTRATANTE**, denominada doravante CONTRATANTE e a empresa__, cadastrada no CNPJ sob o n° _____, sediada na_____, telefone_____, e-mail _____, representada por_____, inscrito no CPF sob o n°_____, residente e domiciliado_____, denominada CONTRATADA, de conformidade com a Tomada de Preços 003/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.O presente contrato tem como objeto a execução da obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS AO EDITAL, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor inicial deste contrato é de **R$** _____ (_____), correspondente à proposta ofertada pela CONTRATADA, aplicada às quantidades estimadas nas planilhas de orçamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA A EXECUÇÃO

3.1. Como garantia de execução deste contrato a CONTRATADA apresentou antes de sua assinatura, comprovante de garantia na modalidade_____, na importância de R$ _____ (_____), (Guia de Recolhimento acostada ao Processo nº 134/2022 – Tomada de Preços nº 012/2022, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual.

3.2. A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações estipuladas neste Contrato.

3.3. No caso de alteração do valor deste contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

3.3.1. Ocorrendo alteração, dentro dos limites legais, dos valores constantes do contrato ou prorrogação do prazo de execução da obra ou, ainda, qualquer outra causa que impeça a entrega do objeto no prazo avençado, a CONTRATADA deverá providenciar a complementação ou prorrogação, conforme o caso, da garantia prestada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do respectivo termo.

3.4. A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à contratada, podendo ser retida para a satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão dolosa ou culposa da contratada.

EMBARGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 126
Rubrica

3.5. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
3.5.1. Na notificação devem constar as razões da utilização da garantia, com referência ao documento em que a contratada foi cientificada das correções que deveria providenciar e do valor das mesmas.
3.6. Após a execução deste contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída no prazo máximo de 30 (trinta) dias da solicitação da contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DA GESTÃO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

4.1. A gestão e execução do presente contrato será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .
4.2. A fiscalização do objeto da presente contratação pela Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, será exercida pelo servidor **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
4.2.1. É permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
4.2.2. É permitida a substituição do servidor designado neste item sempre que a Administração julgar necessário, devendo a CONTRATADA ser cientificada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
4.3. Além das atividades neste contrato, no edital que originou esse contrato, bem como em seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:
4.3.1. Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;
4.3.2. Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos que envolvem a obra: projetos, licitação, contrato, medições, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como Construído (As Built), termos de recebimento provisório e definitivo e devolução de cauções, etc.
4.3.3. Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra;
4.3.4. Aferir as medições dos serviços executados que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo;
4.3.5. Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;
4.3.6. Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.
4.3.7. Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execução de cada serviço/etapa será aferida, em cada medição, consoante CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, previamente aprovado e que a aferição dos prazos se dará mediante a comparação entre o valor total da etapa prevista no cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - Roraima
Fls. 137
Rubrica

4.4. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
4.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou.

CLÁUSULA QUINTA – DA MEDIÇÃO E DOS PAGAMENTOS

5.1. As medições serão formalizadas e datadas no último dia de cada mês e serão pagas até 30 (trinta) dias da data de sua aceitação, de acordo com o cronograma físico financeiro, pelo valor nominal nela expresso.
5.2. A Prefeitura Municipal de Uiramutã terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da medição para aceitá-la ou não;
5.3. Acompanhando a primeira fatura deverá ser apresentada a "anotação de responsabilidade técnica" - ART no CREA.
5.4. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR até o 10º (décimo) dia útil após aprovada a medição pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos , mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, sendo efetuada a retenção de tributos sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a legislação vigente.
5.4. O pagamento está condicionado à apresentação de:
5.4.1. A comprovação de sua situação regular perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho (CNDT), extrato do Simples Nacional, quando for o caso, bem como quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços.
5.4.2. Deverão ser apresentados também o comprovante de pagamento dos tributos relativos à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) vencidos até a data da nota fiscal – guia recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) de todos os empregados alocados na execução do contrato.
5.4.3. GFIP tendo como tomador a Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, relativo ao CEI da obra.
5.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta tenha comprovado, por antecipação, a matrícula da obra junto ao INSS, ou antes, de paga ou relevada à multa que lhe tenha sido aplicada.
5.6. A última parcela só será paga mediante execução integral da obra, comprovada por relatório, assinado pelo Responsável Técnico pela fiscalização da obra.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

6.1. Durante a vigência do Contrato os preços serão fixos e passíveis de recomposição e reajuste, desde que comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65, bem como, parágrafo 8º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, respectivamente, ou de redução dos preços praticados no Mercado.
6.2. Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, a Contratada poderá solicitar a atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao Município de Uiramutã, instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido.
6.3. Mesmo comprovada às ocorrências das hipóteses previstas na alínea "d" do inciso II do artigo 65, bem como, parágrafo 8º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro Processo Licitatório.
6.4. Comprovada a redução dos preços praticados no Mercado nas mesmas condições do contrato e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, a Contratada será convocada pelo Município de Uiramutã para a alteração, por aditamento, do

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 78
Rubrica

preço contratado, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA SETIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO

7.1. O prazo da presente execução de obras e prestação de serviços é de 60 **(sessenta) dias**, contados da data da "Ordem de Serviço" que autorizar o início das atividades.

CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato terá vigência de XX **(XXXX) meses**, a partir da data de sua assinatura, com termo final em ..... de ..... de ....., podendo ser prorrogado, caso ocorra algumas das hipóteses elencadas no § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fonte de Recurso: XXXXXX.**

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES

10.1. São Obrigações da contratada:

10.1.1. Apresentar-se ao Município de Uiramutã/rr – Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a ordem de serviço inicial, o seguinte:

a) Apresentar cronograma físico – financeiro compatível com a planilha vencedora;

b) Anotações de Responsabilidade Técnica- ART, no CREA/CAU, em nome do Engenheiro Responsável Técnico pela obra ou serviço;

c) Abertura de Certificado de Matrícula da obra/serviço – CEI INSS junto com a primeira medição;

d) Visto junto ao CREA/CAU/RR, para as empresas que possuírem CRPJ de outros Estados da Federação.

e) Plano de Segurança específico da Obra, elaborado conforme as normas regulamentares da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e alterações posteriores;

f) Plano de sinalização diurna e noturna, aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

g) Apresentar cronograma de utilização da equipe técnica, de acordo com o prazo de execução de cada obra/serviço, observada a mesma ordem e quantidade da relação de que trata o subitem 6.1.3.3, Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 012/2022, devendo ser aprovado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .

h) Apresentar cronograma de utilização de equipamentos e instalações, de acordo com o prazo de execução da obra/serviço, observada a necessidade de cada projeto, devendo ser aprovado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .

10.1.2. Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas.

8.1.3. Assegurar, durante a execução das obras/serviços, a proteção e a conservação dos serviços realizados.

10.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

10.1.5. Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão do Município de Uiramutã/ RR – Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos a inspeção das obras em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 139
Rúbrica

10.1.6. Providenciar as placas da obra com seus dados indicativos, conforme modelo apresentado pela fiscalização, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados à partir da ordem de serviço.
10.1.7. Obedecer ao plano de segurança das obras, conforme as Normas de Segurança do Trabalho.
10.1.8. Participar à fiscalização ou à supervisão do Município de Uiramutã aocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão da obra, no todo o em parte, de acordo com o cronograma da mesma, indicando as medidas para corrigir talsituação.
10.1.9. Executar, conforme a melhor técnica, as obras contratadas, obedecendo rigorosamente às normas ABNT, bem como as instruções, especificações e os detalhes fornecidos ou editados pela Administração.
10.1.10. Manter atualizado "Diário de Obras", nele registrando todas as ocorrências que afetem o prazo de execução ou orçamento das obras.
10.1.11. Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e as posturas municipais sobre a execução de obras em locais públicos.
10.1.12. Manter à frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta ou a que venha a ser aprovada pela Administração, sempre liderada por engenheiro qualificado com capacidade e poderes bastantes para representá-la perante a Fiscalização e resolver problemas referentes às obras em execução.
10.1.13. Manter na obra em bom estado todo o equipamento necessário à perfeita execução dos serviços contratados, objetivando atender ao cronograma físico, à qualidade e às especificações técnicas.
10.1.14. Manter equipe para o acompanhamento topográfico da obra, adequada e compatível com as exigências e qualidades técnicas pertinentes.
10.1.15. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.2. Constitui obrigação do Município:

10.2.1 Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, recebendo seu objeto, conforme especificações constantes dos itens 10 e 11 do presente edital.
10.2.2. Realizar o pagamento conforme cláusula terceira deste contrato.
10.2.3. Notificar a empresa a ser contratada da ocorrência de qualquer descumprimento dos termos do edital da TOMADA DE PREÇOS nº 012/2022 e deste instrumento.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS

11.1. A CONTRATADA será responsável pelos seguintes encargos:

11.1.1. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, as responsabilidades advindas deste Contrato. A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE, desde que não afetem a boa execução do presente instrumento;
11.1.2. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais, e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;
11.1.3. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas relacionados com o objeto deste contrato;
11.1.4. Assumir a responsabilidade exclusiva por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência de falhas decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA.

EMBRAGO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES

12.1. A prática de ato ilícito na licitação ou na execução do contrato e o descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão as sanções previstas nos artis. 81 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei Estadual n° 14.184, de 31 de Janeiro de 2002,e nos arts. 19 a 22 do Decreto Estadual n° 44.431, de 29 de dezembro de 2006.

12.2. A ADJUDICATÁRIA perderá em favor da ADJUDICANTE a garantia a que se refere o item 8.1, no caso de recusa injustificada em assinar o contrato.

12.3. Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo as multas nos seguintes percentuais:

12.3.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia, até o trigésimo dia, de atraso, sobre valor dos serviços previstos no cronograma físico não executados;

12.3.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

12.3.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços previstos no Cronograma Físico não executados, no caso de atraso superior a 30(trinta) dias;

12.3.4. 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.

12.3.5. As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes, ressalvada a situação descrita nos itens **12.3.6** e **12.3.7**.

12.3.6. O atraso no cumprimento do Cronograma Físico- Financeiro previsto para execução dos serviços será verificado nas medições mensais, a partir do qual incidirá a multa prevista no item **12.3.1**.

12.3.7. Verificando o atraso, na forma do item anterior, a CONTRATADA será notificada, por escrito, para sanar a irregularidade.

12.3.8. Persistindo a irregularidade prevista no item **12.3.6**, até a medição mensal subsequente, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento da multa prevista no item **12.3.3**, que substituirá aquela constante do item **12.3.1**.

12.4. Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição pela Prefeitura Municipal de Ordens de Início, Reinício ou Paralisação de Serviços.

12.5. As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de idoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a de multa, assegurando-se ao interessado o direito de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de idoneidade, em prazo será de 10 (dez) dias.

12.5.1. Para aplicação das sanções referidas no item anterior, deverá ser instaurado processo administrativo punitivo, seguindo de notificação para defesa, em conformidade com o disposto nos arts. 19 a 22 do Decreto Estadual n° 44.431/06, submetida a aplicação das sanções à decisão do Secretário Municipal, salvo na hipótese de aplicação de sanção de declaração de inidoneidade, de competência exclusiva do Prefeito Municipal, ou de autoridade a ele equivalente, nos termosda lei.

12.6. As multas deverão ser recolhidas no Departamento de Fazenda do município de Uiramutã, no prazo de 72(setenta e duas) horas, contado à partir da decisão definitiva na esfera administrativa.

12.7. Se a multa aplicada for de valor superior ao da garantia prestada, além da sua perda responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda quando for o caso, cobrada judicialmente.

12.8. Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações compensatórias expressamente concedidas pela CONTRATANTE ou resultante de fato superveniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade da CONTRATADA, tais como o

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 181
Rubrica

estado de calamidade pública, guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas características.

12.9. As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente fundamentadas através de registro no Diário de Obras realizado pela FISCALIZAÇÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1. Operar-se-á de pleno direito a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 012/2022, quando ocorrerem as hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ABSTENÇÃO

14.1. A abstenção pelo CONTRATANTE do uso dos direitos que lhe são assegurados neste contrato não será considerada novação ou renúncia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

15.1. Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93, sempre através de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES

16.1. O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei 8.666/93 e suas modificações supervenientes, complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais constantes da TOMADA DE PREÇOS nº 012/2022 e seus anexos, bem como a proposta de preços, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, apresentados pela CONTRATADA, que fazem parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pacaraima/RR para dirimir as dúvidasoriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo, para os fins de direito.

Uiramutã, -- de ---------- de 2022.

_____

Secretário Municipal de ----------

_____

Contratada

_____ _____

Testemunha **Testemunha**

EM BRANCO

PREFEITURA DE UIRAMUTÃ

SEMECD UIRAMUTÃ

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – SEMECD

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ Fls 182 Rubrica PMUI

Da: Comissão Permanente de Licitação – CPL
Para: Assessoria Jurídica

Para análise e emissão de parecer jurídico, quanto a legalidade da contratação que se pretende levar o efeito e a minuta de Edital e minuta de Contrato, concernente ao Processo n°134/2022, mediante Tomada de Preços n° 008/2022, conforme Lei Federal n° 8.666/93.

UIRAMUTÃ – RR, 27 de Setembro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

EM BRANCO

Fls. 183
Rúbrica

PARECER JURÍDICO

PROCESSO Nº 134/2022

REFERÊNCIA : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA – NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR.

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

1. DO RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo autuado sob o nº 134/2022, instaurado a partir de solicitação da Ilustre Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, visando a Contratação de Empresa Especializada em Execução de Serviços de Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno – Comunidade Barreirinha - no MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR, conforme especificações do Projeto Básico e Planilhas Orçamentárias.

Cumpre salientar, que a presente manifestação toma por base somente os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe, cabendo-lhe prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito administrativo.

2. DO PARECER

Inicialmente, o procedimento em análise encontra-se instruído com: a) solicitação de autorização do serviço, devidamente acompanhada de Projeto Básico e Planilhas Orçamentárias; b) declaração de disponibilidade e adequação financeira de ordem da Secretária de Educação, Cultura e Desportos; c) Minuta de Edital de Tomada de Preços e seus anexos.

Convém esclarecer, diante da justificativa, tendo em vista que o inciso I, alínea "b", do art. 23, da Lei nº 8.666/93, prevê expressamente a possibilidade de tomada de preço para tais hipóteses, in verbis:

> "Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior, serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação, alterada pelo Decreto 9412/2018:

EM BRANCO

Fls. 184
Rubrica

I - para obras e serviços de Engenharia:

b) tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais);".

Verificando-se os autos, comprova-se a abertura de procedimento administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado a partir de autorização expressa do gestor público, bem como a correta instrução do procedimento a partir dos requisitos mínimos estabelecidos por força da Lei nº 8.666/93, haja vista a descrição sucinta de seu objeto e do recurso para a despesa.

A minuta editalícia juntada aos autos (bem como seus anexos) atende às obediências legais, justificando-se pela edição do Projeto básico e Planilhas Orçamentárias, bem como os elementos técnicos sobre os quais a justificativa deve estar apoiada.

3. DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, evidenciada a submissão dos atos deste procedimento licitatório aos ditames legais norteadores da matéria, em especial à Lei nº 8.666/93, atesta-se, portanto, a regularidade jurídico-formal do procedimento, o qual se entende apto à continuidade do certame.

Uiramutã/RR, 29 de setembro de 2022,

JANIO FERREIRA
OAB/RR Nº 1060
Assessoria Jurídica

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 185
Rubrica

PROCESSO 134/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

EDITAL DE LICITAÇÃO

EM BRANCO

Fls. 186

NOTA EXPLICATIVA

A presente licitação visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL. Verifique se este exemplar está completo.

O Edital desta licitação contém a presente nota explicativa, o preâmbulo, as normas de especificação, as regras de procedimento e julgamento, bem como as de contratação do objetodeste certame e os seguintes anexos que integram o Edital:

Anexo I – Relação da equipe técnica básica / Declaração de disponibilidade da equipe.
Anexo II – Declaração de disponibilidade dos equipamentos e instalações.
Anexo III – Modelo de Atestado de Visita Técnica.
Anexo IV – Modelo de credenciamento de participação em visita técnica.
Anexo V – Modelo de credenciamento de participação.
Anexo VI – Modelo de declaração de integral submissão ao edital
Anexo VII – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo da habilitação.
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.
Anexo IX – Modelo de declaração de enquadramento de microempresa;
Anexo X – Modelo da Proposta de Preços.
Anexo XI – Minuta de Contrato.
Anexo XII – Planilha Orçamentária (disponível em mídia).
Anexo XIII – Cronograma Físico-Financeiro (disponível em mídia).
Anexo XIV – Memorial Descritivo (disponível em mídia).
Anexo XV – Projeto (disponível em mídia).

Para a perfeita compreensão das normas reguladoras da presente licitação, examine atentamente todas as peças deste Edital e seus Anexos.

Os envelopes contendo propostas de preço, propostas técnicas e documentos de habilitação serão apresentados pelos licitantes, **devidamente lacrados**, em suporte físico e só poderão ser abertos após a sua publicização, pelo servidor responsável pela licitação e os documentos que compõem os envelopes de habilitação e proposta deverão, **obrigatoriamente, por todos os licitantes, conter sumário e paginação, a fim de evitar discussão futura quanto aos seus conteúdos**.

O descumprimento de tais determinações não poderão ser interpretadas em prejuízo da Administração Pública.

O Edital prevê o procedimento a ser observado pelo licitante em caso de dúvida de caráter técnico ou legal na interpretação de seus termos. O protocolamento da proposta presume o pleno conhecimento e entendimento de todas as condições por parte da licitante e, nos termos dalei, implica a sua aceitação automática, integral e irretratável, motivo por que, após este ato, a Administração não tomará conhecimento de qualquer reclamação da proponente, fundada em erro, omissão ou obscuridade do Edital.

EM BRANCO

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei, através do e-mail **cpluiramita@gmail.com** ou carta protocolada na Prefeitura Municipal, situada a Rua Cici Mota, s/n.°, Centro, em até **05 (cinco) dias úteis** antesda data fixada para a entrega da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, devendo a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO julgar e responder à impugnação ematé **3 (três) dias úteis**, nos termos do § 1° do artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/93 e encaminhara decisão do julgamento via e-mail, com a devida publicação no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR.

EM BRANCO

Fls. 1088
Rúbrica

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 012/2022

PROCESSO Nº 134/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022

PREÂMBULO

O Município de Uiramutã/RR, em atendimento à Secretaria Municipal Educação, Cultura e Desporto, torna público que a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 003-A/2022, a fim de realizar certame licitatório, sob a modalidade Tomada de Preço, receberá na sala da CPL situado na Rua Cici Mota s/n, Centro, no município de Uiramutã/RR, envelopes contendo documentos de habilitação e proposta, para julgamento da mais vantajosa, em tudo observando a Lei 8.666/93 e nos termos do presente edital.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h30min do dia 24 de outubro de 2022.
ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 24 de outubro de 2022 às 08h30min.
Qualquer cidadão interessado poderá acompanhar as sessões informado neste edital.

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei, através do e-mail **cpluiramuta@gmail.com** ou carta protocolada na Prefeitura Municipal, situada a Rua Cici Mota, s/n.° , Centro, em até **05 (cinco) dias úteis** antesda data fixada para a entrega da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS,devendo a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO julgar e responder à impugnação em até **3(três) dias úteis**, nos termos do § 1º do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93, via e-mail.

Decairá o direito de impugnar os termos deste edital de licitação, por falhas ou irregularidadesque o viciariam, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para a abertura da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e PROPOSTAS, hipótese em quetal comunicação não terá efeito de recurso.

I - OBJETO

1.1. Constitui o objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

1.2 O valor estimado do referido processo licitatório é **R$ 494.948,16 (quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos)**, devendo as propostas se limitar a este valor, sob pena de desclassificação.

II – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR

2.1. Poderão participar da presente licitação todos os interessados que satisfaçam as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, e ainda, cujo contrato social esteja em vigor, registrado no órgão competente, com o ramo de atividade compatível ao objeto deste edital.

2.2. Não poderá participar da presente licitação pessoa jurídica:

2.2.1. Que esteja sob falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação e não sejam controladas, coligadas ou subsidiarias entre si;

2.2.2. Declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com o Município de Uiramutã, oucom declaração de

Fls. 189

inidoneidade e/ou impedimento de licitar com a Administração Pública;
2.2.3. Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;
2.2.4. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
2.2.5. Que possua qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do Termo de Referência/Projeto e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários;
2.2.6. O disposto no item anterior aplica-se também aos membros da comissão de licitação.
2.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.

III - CADASTRO

3.1. O interessado deverá requerer cadastramento até **três (03) dias** anteriores à data fixada para a entrega da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, junto à Comissão Permanente de Licitação, situado a Rua Cici Mota, s/n° - Centro, município de Uiramutã/RR, anexando cópias autenticadas dos documentos abaixo relacionados ou acompanhada dos respectivos originais para conferencia pela Comissão Permanente de Licitação:
3.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as suas alterações ou Contrato Social Consolidado e alterações posteriores, devidamente registrado no órgão competente; no caso de Sociedades por Ações, documento de eleição de seus administradores; no caso de Empresa Individual, Registro Comercial;
3.1.2. Carteira de Identidade e CPF dos sócios;
3.1.3. Prova de inscrição no CNPJ;
3.1.4. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal;
3.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa;
3.1.6. Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
3.1.7. Certidão Negativa de Falência e Concordata;
3.1.8. Certidão de Registro e Quitação de Empresa, expedida pelo CREA e/ou CAU, comprovando sua situação de registro, bem como de seu(s) responsável(is) técnico(s);
3.1.9. Declaração de Micro e Pequena Empresa, se for o caso.
Os **certificados de registros cadastrais**, expedidos pela Prefeitura Municipal de Uiramutã, estarão à disposição dos interessados até as 16h00min, do dia anterior a data fixada para a entrega da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, no endereço acima mencionado.

IV - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

4.1. As empresas participantes deverão apresentar dois envelopes contendo habilitação e proposta, os mesmos deverão ser apresentados, em envelope não transparente, fechado e indevassável, ambos contendo em sua parte externa, a identificação da licitante, e os seguintes dizeres:

EM BRANCO

Fls. 190

MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 012/2022
ENVELOPE N° 1 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE: _____

MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 012/2022
ENVELOPE N° 2 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: _____

4.1.1. No verso dos envelopes deverá constar o nome e o endereço do proponente.

4.1.2. Os documentos que compõem os envelopes de habilitação e proposta deverão conter sumário e paginação, a fim de evitar discussão futura quanto aos seus conteúdos;

4.2. O PRIMEIRO ENVELOPE, constando, o subscrito acima, deverá conter, em cópias autenticadas ou acompanhados dos respectivos originais, para conferencia da Comissão Permanente de Licitação nos termos do artigo 32 da Lei n° 8.666/93, no ato da abertura do envelope, sendo esses últimos devolvidos após a autenticação requerida, ao representante legal presente:

4.2.1 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento do objeto de licitação (Recibo de Retirada do Edital).
b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Lei nº 5.194/66) (Lei nº 12.378/2010), na qual constem todos os seus responsáveis técnicos, com jurisdição sobre o domicílio da sede da LICITANTE;
c) Certidão de Registro de Pessoa Física emitida pelo CREA da jurisdição do domicílio do profissional, em nome de cada integrante da Equipe Técnica do subitem onde conste atribuição compatível com a área de atuação indicada pela licitante;
d) A Licitante deverá apresentar nos termos de seu art. 30, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações Atestado de Capacidade Técnica-Operacional emitido por pessoa Jurídica de direito pública ou privada, com atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação conforme itens de maior relevância a seguir:

QUANTITATIVO PARA ACERVO TÉCNICO E OPERACIONAL			
Itens	**Descrição**	**Un.**	**40% ref. Aos itens de maior relevância dos serviços executados**
1,1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	204,24
1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	130,57
1.3	Massa única para recebimento de pintura em		

EM BRANCO

Fls. 191
Rubrica

	argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	434,60
1.4	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	18,21
1.5	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	185,13

e) O Atestado de Capacidade Técnica-Operacional só será válido se reconhecido e ou chancelado pelo CREA devidamente acompanhado da Certidão de Acervo Técnico - CAT do Profissional que realizou a obra/serviços;
f) A Licitante deverá apresentar nos termos de seu art. 30, § 1°, inc. I da Lei 8.666/93 e suas alterações, Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA de obras e serviços semelhantes ao do objeto licitado;
g). Caso o Responsável Técnico da empresa não seja o detentor da Certidão de Acervo Técnico – CAT que originou o Atestado de Capacidade Técnica Operacional apresentado pela Licitante, o mesmo deverá apresentar a Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA com os serviços compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação conforme itens de maior relevância a seguir, além de comprovar que o detentor do acerco possuam vínculo com a empresa.

4.2.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.2.2.1. Certidão Negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; datado dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

4.2.2.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelo INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

4.2.2.2.1. O Balanço e as Demonstrações deverão ser apresentados por cópias reprográficas da página do Livro Diário, onde se encontram transcritos, comprobatório do registro na Junta Comercial. Poderá também ser apresentada cópia reprográfica de publicação em jornal, na forma da lei. As cópias deverão ser autenticadas.

4.2.2.2.2. Caso a licitante tenha iniciado suas atividades no presente exercício, deverá apresentar cópia do Balanço de Abertura ou do Livro Diário, apresentados na forma da lei para lançamento dos índices mencionados.

4.2.2.2.3. As empresas optantes do "SIMPLES NACIONAL" não estão dispensadas de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis.

4.2.2.2.4. <u>O Balanço Patrimonial e demonstrações apresentadas para fins de habilitação após o dia 31 de maio do corrente ano serão, obrigatoriamente, do exercício imediatamente anterior</u>.

4.2.2.3. A boa situação econômico-financeira da empresa licitante estará consubstanciada nos seguintes índices, devidamente justificados no processo licitatório:

- Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1% (um por cento), a ser obtido pela fórmula:

ILC = <u>Ativo Circulante</u>
Passivo Circulante

Fls. 192
Rubrica

- Índice de Endividamento Patrimonial (IEP) igual ou inferior a 1% (um por cento), que mostrará a relação entre Capital de Terceiros (Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo) e o Capital Próprio (Patrimônio Líquido), a ser calculado pela fórmula:

$$IEP = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

4.2.2.3.1. Caso o licitante apresente índices incompatíveis com o item 6.1.4.3, a comprovação de qualificação econômica financeira poderá ser demonstrada através da comprovação de patrimônio líquido no importe de 10% (dez por cento) do valor orçado para licitação (item 7.1 deste edital).

4.2.2.3.1.1. A licitante deverá apresentar cálculo demonstrativo da atualização do Capital Social, sempre que o valor nominal constante do contrato social não estiver grafado em real.

4.2.3 – OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

4.2.3.1. Certificado de Registro Cadastral atualizado, emitido pela Prefeitura Municipal de Uiramutã;

4.2.3.1.1. Caso a empresa interessada não houver se cadastrado, conforme exigido no item 03 deste edital, mas atenda a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, esta poderá apresentar os documentos relacionados no mesmo item, no invólucro nº 01 – "Documentação para Habilitação".

4.2.3.1.2. Na hipótese de apresentação do CRC, caso algum documento já se encontre vencido, o licitante deverá apresentá-lo atualizado, dentro do invólucro nº 01 - Documentação para Habilitação, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas.

4.2.3.2. Carta de Credenciamento para participação na respectiva licitação, conforme **ANEXO V**.

4.2.3.2.1. Tratando-se de procurador, deverá ser apresentada procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, e documentooficial de identificação que contenha foto.

4.2.3.3. Declaração de Integral submissão ao edital, conforme **ANEXO VI**.

4.2.3.4. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, do art. 32 da Lei 8.666/93, alterado pela Lei nº 9.648/98, conforme **ANEXO VII**.

4.2.3.5. Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme **ANEXO VIII**.

4.2.3.6. As **MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE** e **EQUIPARADAS**, que desejarem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006 e suas posteriores alterações, deverão apresentar, os seguintes documentos:

4.2.3.6.1. Declaração assinada pelo responsável legal da empresa, atestando que até a presente data a empresa esta enquadrada no regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo constante no **ANEXO IX**; e,

4.2.3.6.2. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa;

4.2.3.6.3. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da pequena empresa.

EM BRANCO

Fls. 193
Rubrica

4.3. No SEGUNDO ENVELOPE, que será apresentado da mesma forma que o primeiro, e deve conter proposta com preço unitário e total e também o valor global proposto para execução da obra.

4.3.1 A proposta de preço deverá ser legível, digitada ou impressa em processador de texto sem emendas ou rasuras, em uma única via, em papel timbrado onde conste o CNPJ ou carimbo padronizado do CNPJ da proponente, datada, assinada pelo representante legal da licitante, com prazo de validade no mínimo de 60 (sessenta) dias.

4.3.2. A proposta de preços, **ANEXO X**, deverá ser apresentada, sob pena de desclassificação, juntamente com os seguintes documentos:

4.3.2.1. Planilha de orçamento.

4.3.2.1.1. Os preços deverão estar grafados em reais, com duas casas decimais após a vírgula.

4.3.2.2 Cronograma Físico Financeiro.

4.3.3. A proposta de preços deverá indicar o valor da execução completa dos serviços e obras, segundo a cotação de preços unitários aplicados pela proponente nos itens da planilha de orçamento deste edital. Os preços terão como base o mês de apresentação das propostas.

4.3.4. A empresa deverá preencher a planilha de orçamento, que integra este Edital com os preços unitários por ela propostos, e com valor final indicado em algarismos e por extenso. Poderá ser apresentada planilha computadorizada pela própria proponente, desde que guarde, sob pena de desclassificação, absoluta fidelidade com a planilha de orçamento integrante deste edital, no que se refere aos itens, às atividades, unidades e quantidades.

4.3.5. Todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, os fretes, seguros, bem como todas as despesas diretas e indiretas que incidirem nos serviços, deverão estar inclusos no preço.

4.3.6. A apresentação da proposta implica na aceitação tácita de todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como a aceitação de que, caso necessário, a CPL, no transcorrer da licitação poderá solicitar que as licitantes estendam o período de validade das mesmas para igual período adicional.

4.3.6.1. A solicitação prevista acima, bem como as respostas dos proponentes, será feita por escrito, circunstanciadas na respectiva ata ou através de e-mail;

4.3.6.2. A proponente poderá recusar a solicitação, resultando na desistência da participação do processo licitatório, sem que a ele sejam imputadas penalidades para tal ato.

V - DO JULGAMENTO

5.1. A Comissão Permanente de Licitação – CPL, abrirá em primeiro lugar o envelope nº 1 – **DOCUMENTAÇÃO**, para que os membros da Comissão possam examinar e rubricar cada documento e os representantes presentes na Sessão, possam ratificar as informações.

5.2. A Comissão Permanente de Licitação – CPL poderá suspender a sessão sempre que julgar necessário analisar os documentos e propostas oferecidas pelos licitantes, objetivando confirmar as informações prestadas.

5.3. Após o exame da documentação apresentada e a formulação de eventuais impugnações, deverá a Comissão Permanente de Licitação apresentar sua decisão sobre a habilitação das licitantes e consultá-las sobre a interposição de recursos, determinando o prazo para este fim.

5.4. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer às exigências desta Tomada de Preços.

5.5. Os envelopes de proposta dos licitantes inabilitados serão devolvidos fechados, logo após a decisão definitiva da inabilitação.

5.6. Transcorrido o prazo sem interposição de recursos, tendo havido expressa desistência deles ou após julgamento dos recursos interpostos, proceder-se-á a abertura dos envelopes nº 02.

5.7. Na classificação das propostas observar-se-ão seu valor global e os preços unitários

EM BRANCO

oferecidos, atendidos os seguintes critérios:

5.7.1. O **Preço de Referência** – valor estimado da contratação, constante deste Edital - item 1.2, **é o preço teto**, limite para as propostas das licitantes, **sendo desclassificadas as que superarem o valor estipulado**.

5.7.2. Será classificada em primeiro lugar a proposta apresentada de acordo com as especificações deste Edital, que contiver oferta do **MENOR PREÇO GLOBAL**.

5.8. A Comissão desclassificará propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim entendidas aquelas definidas nos termos da alínea "a" e "b" do parágrafo 1° do inciso II, do art. 48 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

5.9. A Comissão Permanente de Licitação no julgamento das propostas de preços, poderá determinar que sejam promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como:

a) Discrepância entre valores grifados em algarismo ou por extenso: prevalecerá o valor por extenso;
b) Erro de multiplicação do valor unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o valor total;
c) Erro de adição será retificado conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;
d) Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço unitário e as quantidades previstas, alterando-se o valor final;
e) Erro no preço total será corrigido de acordo com o disposto nas letras acima.

5.9.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar das licitantes que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Proposta de Preços, desde que, as informações não alterem os preços apresentados e não correspondam a documentos que, originalmente, deveriam figurar na proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na desclassificação da licitante.

5.10. A Comissão Permanente de Licitação observará também, quando do julgamento das propostas, os seguintes procedimentos:

5.10.1. Não utilizará qualquer elemento, fator ou critério sigiloso ou subjetivo, secreto ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.

5.10.2. Não considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes.

5.11. No caso de empate entre duas ou mais propostas, referente ao objeto licitado, de empresas não enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, a classificação dar-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público para o qual todos os licitantes serão convocados (Lei nº 8.666/93, e alterações, art. 45, § 2.º, segunda parte).

5.11.1. Se desta Tomada de Preços estiverem participando microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação destas.

5.11.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

5.11.3. Ocorrendo o empate entre microempresas e empresas de pequeno porte, a Comissão Permanente de licitação procederá da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea a, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 5.11.2. deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

EM BRANCO

Fls. 193

5.11.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 5.11.1. deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
5.11.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 5.11, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
5.11.6. O disposto no subitem 5.11 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
5.12. Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou forem todas as propostas desclassificadas, poderá a Administração fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou novas propostas, escoimadas das causas que levaram à inabilitação ou desclassificação.
5.13. Deverá a Comissão Julgadora, em conjunto com a equipe de apoio, especialmente convocada para este certame, consignar, em ata, a síntese de fatos ocorridos e pronunciados, submetendo todo o procedimento à homologação da autoridade competente.
5.14. O Município de Uiramutã se reserva o direito de, por despacho fundamentado, decidir:
5.14.1. Pela revogação desta licitação, em razão de interesse público.
5.14.2. Anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida no seu curso.
5.14.3. Homologar a licitação, sem prejuízo da redução superveniente das obras e serviços a serem contratados.
5.15. Observando-se o disposto no art. 109 da Lei 8.666/93, admitir-se-á a interposição de recurso em qualquer fase desta licitação ou durante a execução do contrato que dela resultar.

VI - DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Os recursos financeiros são os constantes no Projeto Básico;

VII – DOS PRAZOS

7.1. A vigência do contrato será de **90 (noventa) dias**, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso ocorra algumas das hipóteses elencadas no § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
7.2. O prazo de execução dos serviços deverá obedecer ao cronograma físico-financeiro – Anexo XIII, parte integrante deste edital.

VIII - DA GARANTIA À EXECUÇÃO

8.1. Homologada a licitação e adjudicado o seu objeto à licitante vencedora, esta será convocada pela Administração para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prestar garantia à execução, que deverá cobrir o prazo contratual de execução da obra até o seu recebimento definitivo e ainda ser prorrogada sua vigência, na hipótese de ocorrer prorrogação do prazo contratual.
8.2. A garantia à execução poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no parágrafo primeiro do artigo 56 da Lei 8.666/93.
8.2.1. Caso a licitante vencedora do certame opte por formalizá-la em espécie, deverá depositar a referida importância na conta caução de execução n° 10.693-3, agência 0591-6, do Banco Brasil localizada no Município de Uiramutã.
8.2.2. Caso a licitante vencedora do certame opte por formalizá-la em outra modalidade, deverá depositá-la na Tesouraria do Município, localizada na Rua Cici Mota, s/n° , Centro,nesta cidade, no horário de 08h00min às 12h00min, que emitirá o respectivo recibo.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RORAIMA
Fls. 196
Rubrica

8.3. A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações estipuladas no Contrato.
8.4. Não serão aceitos instrumentos de garantia que possuam, em seu bojo, cláusulas de exclusão de sua aplicabilidade em casos de inexecução contratual e em situações que representem potencial risco de prejuízo ao CONTRATANTE.
8.5. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
8.5.1. Ocorrendo alteração, dentro dos limites legais, dos valores constantes do contrato ou prorrogação do prazo de execução da obra ou, ainda, qualquer outra causa que impeça a entrega do objeto no prazo avençado, a CONTRATADA deverá providenciar a complementação ou prorrogação, conforme o caso, da garantia prestada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do respectivo termo.
8.6. A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à contratada, podendo ser retida para a satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão dolosa ou culposa da contratada.
8.7. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
8.7.1. Na notificação devem constar as razões da utilização da garantia, com referência ao documento em que a contratada foi cientificada das correções que deveria providenciar e do valor das mesmas.
8.8. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída no prazo máximo de 30 (trinta) dias da solicitação da contratada.
8.9. O contrato firmado pelo Município de Uiramutã poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer das condições previstas no artigo 65 da Lei 8.666/93 em especial paraprorrogação do prazo contratual de execução avençado, conforme disposto no artigo 57 da referida lei.

IX - DA EXECUÇÃO DA OBRA

9.1. A obra e suas etapas serão executadas mediante autorização(ões), expedida(s) pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .

X - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos serão efetuados em parcelas, mediante apresentação de Nota Fiscal, à qual o Secretário requisitante aporá seu visto, solicitando sua regular quitação, acompanhada de relatório de medição e memória de cálculo, assinada pelo RT da Contratada, e aprovada pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .
Parágrafo primeiro: O pagamento está condicionado à apresentação de:
10.1.1. A comprovação de sua situação regular perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho (CNDT), extrato do Simples Nacional, quando for o caso, bem como quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços.
10.1.2. Deverão ser apresentados também o comprovante de pagamento dos tributos relativos à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) vencidos até a data da nota fiscal.
10.1.3. GFIP tendo como tomador a Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, relativo ao CEI da obra.
Parágrafo segundo: A última parcela só será paga mediante execução integral da obra,

EUROPEAN
Patent Office

Fls. 197

comprovada por relatório, assinado pelo Responsável Técnico pela fiscalização da obra.

XI - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

11.1. A prática de ato ilícito na licitação ou na execução do contrato e o descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão as sanções previstas nos arts. 81 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei Estadual n° 14.184, de 31 de janeiro de 2002, e nos arts. 19 a 22 do Decreto Estadual n° 44.431, de 29 de dezembro de 2006.
11.2. A ADJUDICATÁRIA perderá em favor da ADJUDICANTE a garantia a que se refere o item 8.1, no caso de recusa injustificada em assinar o contrato.
11.3. Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo as multas nos seguintes percentuais:
11.3.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia, até o trigésimo dia, de atraso, sobre valor dos serviços previstos no cronograma físico não executados;
11.3.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;
11.3.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços previstos no Cronograma Físico não executados, no caso de atraso superior a 30(trinta) dias;
11.3.4. 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.
11.3.5. As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes, ressalvada a situação descrita nos itens **11.3.6** e **11.3.7**.
11.3.6. O atraso no cumprimento do Cronograma Físico- Financeiro previsto para execução dos serviços será verificado nas medições mensais, a partir do qual incidirá a multa prevista no item **11.3.1**.
11.3.7. Verificando o atraso, na forma do item anterior, a CONTRATADA será notificada, por escrito, para sanar a irregularidade.
11.3.8. Persistindo a irregularidade prevista no item **11.3.6**, até a medição mensal subsequente, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento da multa prevista no item **11.3.3**, que substituirá aquela constante do item **11.3.1**.

11.4. Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição pela Prefeitura Municipal de Ordens de Início, Reinício ou Paralisão de Serviços.
11.5. As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de idoneidade poderão ser aplicadas comulativamente com a de multa, assegurando-se ao interessado o direito de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de idoneidade, em prazo será de 10 (dez) dias.
11.5.1. Para aplicação das sanções referidas no item anterior, deverá ser instaurado processo administrativo punitivo, seguindo de notificação para defesa, em coformidade com o disposto nos arts. 19 a 22 do Decreto Estadual n° 44.431/06, submetida a aplicação das sanções à decisão do Secretário Municipal, salvo na hipótese de aplicação de sanção de declaração de indoneidade, de competência exclusiva do Prefeito Municipal, ou de autoridade a ele equivalente, nos termos da lei.
11.6. As multas deverão ser recolhidas no Departamento de Fazenda do município de Uiramutã, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contado à partir da decisão definitiva na esfera administrativa.
11.7. Se a multa aplicada for de valor superior ao da garantia prestada, além da sua perda responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda quando for o caso, cobrada judicialmente.
11.8. Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações

EM BRANCO

compensatórias expressandamente concedidas pela CONTRATANTE ou resultante de fato superviniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade da CONTRATADA, tais como o estado de calamidade pública, guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas características.

11.9. As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente fundamentedas através de registro no Diário de Obras realizado pela FISCALIZAÇÃO.

XII - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

12.1. A presente licitação poderá ser revogada ou anulada em qualquer das fases, em conformidade com a Lei 8.666/93.

XIII - DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

13.1. Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

13.1.1. Considera-se receita bruta, para fins do disposto no item A.1, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

13.1.2. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o item 13.1 será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.

13.1.3. O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados.

13.1.4. Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item A.1 deste Edital;

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item A.1 deste Edital;

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item A.1 deste Edital;

f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

EM BRANCO

Fls. 197
Rubrica

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;
h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
j) constituída sob a forma de sociedade por ações.

13.1.5. O disposto nas alíneas itens d e g do subitem 13.1.4 não se aplica à participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio previsto na Lei Complementar nº 123/2006, e associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.

13.1.6. Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações previstas nas alíneas do subitem 13.1.4 deste Edital, será excluída do regime de que trata a Lei Complementar nº 123/2006, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.

13.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, que participarem desta Concorrência, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

13.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado ao licitante, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que este for declarado o vencedor do presente certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

13.2.1.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 13.2.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1. Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições da Lei Federal Nº 8.666/93 no que couber.

14.2. Este Edital de Licitação, seus anexos e a Proposta de Preços oferecida pela contratada constituirão peças integrantes do Contrato, independentemente de transcrição no instrumento respectivo.

XV - ANEXO

15.1. Fazem parte integrante deste edital:
Anexo I – Relação da equipe técnica básica / Declaração de disponibilidade da equipe.
Anexo II – Declaração de disponibilidade dos equipamentos e instalações.
Anexo III – Modelo de Atestado de Visita Técnica.
Anexo IV – Modelo de credenciamento de participação em visita técnica.
Anexo V – Modelo de credenciamento de participação.
Anexo VI – Modelo de declaração de integral submissão ao edital.

EM BRANCO

Fls. 200
Rubrica

Anexo VII – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo da habilitação.
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.
Anexo IX – Modelo de declaração de enquadramento de microempresa.
Anexo X – Modelo da Proposta de Preços.
Anexo XI – Minuta de Contrato.
Anexo X – Planilha Orçamentária (disponível em mídia);
Anexo XI – Cronograma Físico-Financeiro (disponível em mídia);
Anexo XII – Memorial Descritivo (disponível mídia);Anexo XIII – Projeto (disponível em mídia).

Uiramutã, 30 de setembro de 2022.

Sandro da Silva Mafra
Presidente da Comissão de Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 29
Rubrica

ANEXO

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA BÁSICA / DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022
Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

A licitante .....CNPJ:....., declara ter disponibilidade de pessoal técnico especializada e compromete-se a compor a Equipe Técnica Básica aqui relacionada, caso o objeto da licitação venha a ser contratado com a mesma.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA	
NOME	**ESPECIALIZAÇÃO**
OBS:	

Por ser verdade, firmo a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022
Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

A licitante .....CNPJ:....., declara ter disponibilidade de, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o adequado cumprimento do objeto da licitação e compromete-se a utilizá-los, caso o objeto venha a ser contratado com a mesma.

Por ser verdade, firmo a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 203
Rubrica

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

PROCESSO Nº 134/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ DECLARA, para fins do disposto no Edital de Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO MÉDICO DAVI CAVALCANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE UIRAMUA/RR, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital T.P. nº 012/2022; que a empresa _____, cadastrada com o CNPJ nº_____, com sede na_____, nº_____, Bairro_____, CEP: _____, no município de_____, vistoriou o local onde será executada a obra, observando o local onde será executado, inteirando-se assim das condicionantes, não cabendo, posteriormente, em hipótese alguma, alegações de desconhecimento ou dúvida no que tange ao referido objeto, sendo de sua inteira responsabilidade, caso seja vencedora do mesmo, quaisquer ônus porventura decorrentes.

Uiramutã,_____de_____de 2022.

_____
Prefeitura Municipal de Uiramutã

Declaramos nossa concordância com os termos acima expostos, dando-nos por satisfeitos com as informações e detalhes obtidos e julgando-nos plenamente capacitados a elaborar nossa proposta de licitação.

_____
Empresa Participante
Representante da empresa
Nº do documento

EM BRANCO

MODELO DE CREDENCIAMENTO DE VISITA TÉCNICA

Uiramutã/RR,_____de_____de 20---.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022
Processo Licitatório nº 0134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

O abaixo assinado, responsável legal pela empresa_____vem pela presente, informar a V. Sas. que o_____, CREA/CAU/CPF/RG Nº_____, é a pessoa designada para representar nossa empresa na visita técnica prevista no item 6.1.3, letra G do Edital, da Licitação acima referida.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 2015
Rubrica

CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO

Uiramutã/RR,_____de_____de 20---.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022
Processo Licitatório nº 0134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

O abaixo assinado responsável legal pela empresa_____vem pela presente, informar a V. Sas. que o Sr._____, carteira de identidade nº_____, é pessoa designada para representar nossa empresa na Licitação acima referida, na sessão de entrega, recebimento e abertura dos envelopes contendo documentos e proposta comercial, podendo examinar e rubricar documentos, assinar atas, apresentar impugnações e recursos, inclusive renúncia expressa a recurso.

Atenciosamente,

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 206
Rubrica

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TOTAL SUBMISSÃO AO EDITAL

Uiramutã/RR,_____de_____de 20---.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022
Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

Declaro, para os devidos fins, a minha total submissão ao Edital Tomada de Preços 012/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.
Por ser verdade, firmo a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 207
Rubrica

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022
Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

A empresa....., inscrita no CNPJ sob o nº. ....., DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firma a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de UiramutãComissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022
Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

A Empresa....., inscrita no CNPJ sob o nº....., DECLARA, sob as penas da lei, para surtir efeito junto à Prefeitura do Município de Uiramutã, no procedimento licitatório sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, que **não** incide na proibição contida no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.

Por ser verdade, firma a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EL BANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 299
Rúbrica

MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022
Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

.....(Razão Social da Empresa) ....., estabelecida na .....(endereço completo) ....., inscrita no CNPJ sob n.º ....., representada pelo....., brasileiro, RG nº....., CPF nº..... residente e domiciliado (endereço) declara para os devidos fins que na presente data a mesma se encontra enquadrada nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 de 14/12/2006, que trata do Regime das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estando apta portanto a sua participação no processo n º....., tomada de preço nº ....., junto ao Município de Uiramutã. Por ser verdade,

firma a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 210
Rubrica

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022
Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS A ESTE EDITAL.

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob o nº....., com endereço na Rua ....., por seu representante legal, Sr....., portador da Carteira de Identidade nº ....., DECLARA que concorda e submete-se a todos os termos do edital da Tomada de Preço nº 012/2022 e vem, apresentar PROPOSTA DE PREÇOS conforme planilha em anexo com a discriminação dos quantitativos, valores unitários, valores de mão-de-obra e materiais, valor final de R$..... (.....).

Nos preços apresentados já estão incluídos todos os encargos tributários, previdenciários, trabalhistas e todos os demais custos para a prestação dos serviços objeto da licitação.
O prazo máximo de execução é de 02 (dois) meses, observado o cronograma físico-financeiro da Prefeitura Municipal de Uiramutã.

A presente proposta tem prazo de validade de 60 dias a contar da data da entrega das propostas, excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

Atenciosamente,

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 27
Rubrica

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº .../2022.

PROCESSO Nº 134/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022

Contrato que, entre si, fazem o **MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ**, Estado de Roraima, inscrita no CNPJ sob nº 01.612.681/0001-01, com sua sede administrativa na Rua Cici Mota, s/n – Centro – Uiramutã, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de -----, Sr.(ª) ----------, delegatório(a) autorizado(a) pelo Decreto Municipal n° XX/202X,doravante denominado **CONTRATANTE**, denominada doravante CONTRATANTE e a empresa__, cadastrada no CNPJ sob o n° _____, sediada na_____, telefone_____, e-mail _____, representada por_____, inscrito no CPF sob o n°_____, residente e domiciliado_____, denominada CONTRATADA, de conformidade com a Tomada de Preços 003/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.O presente contrato tem como objeto a execução da obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARRERINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, ANEXOS AO EDITAL, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor inicial deste contrato é de **R$** _____ (_____), correspondente à proposta ofertada pela CONTRATADA, aplicada às quantidades estimadas nas planilhas de orçamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA A EXECUÇÃO

3.1. Como garantia de execução deste contrato a CONTRATADA apresentou antes de sua assinatura, comprovante de garantia na modalidade_____, na importância de R$ _____ (_____), (Guia de Recolhimento acostada ao Processo nº 134/2022 – Tomada de Preços nº 012/2022, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual.

3.2. A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações estipuladas neste Contrato.

3.3. No caso de alteração do valor deste contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

3.3.1. Ocorrendo alteração, dentro dos limites legais, dos valores constantes do contrato ou prorrogação do prazo de execução da obra ou, ainda, qualquer outra causa que impeça a entrega do objeto no prazo avençado, a CONTRATADA deverá providenciar a complementação ou prorrogação, conforme o caso, da garantia prestada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do respectivo termo.

3.4. A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à contratada, podendo ser retida para a satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão dolosa ou culposa da contratada.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RORAIMA
Fls. 217
Rubrica

3.5. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
3.5.1. Na notificação devem constar as razões da utilização da garantia, com referência ao documento em que a contratada foi cientificada das correções que deveria providenciar e do valor das mesmas.
3.6. Após a execução deste contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída no prazo máximo de 30 (trinta) dias da solicitação da contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DA GESTÃO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

4.1. A gestão e execução do presente contrato será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .
4.2. A fiscalização do objeto da presente contratação pela Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, será exercida pelo servidor **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
4.2.1. É permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
4.2.2. É permitida a substituição do servidor designado neste item sempre que a Administração julgar necessário, devendo a CONTRATADA ser cientificada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
4.3. Além das atividades neste contrato, no edital que originou esse contrato, bem como em seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:
4.3.1. Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;
4.3.2. Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos que envolvem a obra: projetos, licitação, contrato, medições, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como Construído (As Built), termos de recebimento provisório e definitivo e devolução de cauções, etc.
4.3.3. Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra;
4.3.4. Aferir as medições dos serviços executados que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo;
4.3.5. Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;
4.3.6. Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.
4.3.7. Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execução de cada serviço/etapa será aferida, em cada medição, consoante CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, previamente aprovado e que a aferição dos prazos se dará mediante a comparação entre o valor total da etapa prevista no cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 213
Rubrica

4.4. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
4.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou.

CLÁUSULA QUINTA – DA MEDIÇÃO E DOS PAGAMENTOS

5.1. As medições serão formalizadas e datadas no último dia de cada mês e serão pagas até 30 (trinta) dias da data de sua aceitação, de acordo com o cronograma físico financeiro, pelo valor nominal nela expresso.
5.2. A Prefeitura Municipal de Uiramutã terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da medição para aceitá-la ou não;
5.3. Acompanhando a primeira fatura deverá ser apresentada a "anotação de responsabilidade técnica" - ART no CREA.
5.4. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR até o 10º (décimo) dia útil após aprovada a medição pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos , mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, sendo efetuada a retenção de tributos sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a legislação vigente.
5.4. O pagamento está condicionado à apresentação de:
5.4.1. A comprovação de sua situação regular perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho (CNDT), extrato do Simples Nacional, quando for o caso, bem como quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços.
5.4.2. Deverão ser apresentados também o comprovante de pagamento dos tributos relativos à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) vencidos até a data da nota fiscal – guia recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) de todos os empregados alocados na execução do contrato.
5.4.3. GFIP tendo como tomador a Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, relativo ao CEI da obra.
5.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta tenha comprovado, por antecipação, a matrícula da obra junto ao INSS, ou antes, de paga ou relevada à multa que lhe tenha sido aplicada.
5.6. A última parcela só será paga mediante execução integral da obra, comprovada por relatório, assinado pelo Responsável Técnico pela fiscalização da obra.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

6.1. Durante a vigência do Contrato os preços serão fixos e passíveis de recomposição e reajuste, desde que comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65, bem como, parágrafo 8º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, respectivamente, ou de redução dos preços praticados no Mercado.
6.2. Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, a Contratada poderá solicitar a atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao Município de Uiramutã, instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido.
6.3. Mesmo comprovada às ocorrências das hipóteses previstas na alínea "d" do inciso II do artigo 65, bem como, parágrafo 8º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro Processo Licitatório.
6.4. Comprovada a redução dos preços praticados no Mercado nas mesmas condições do contrato e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, a Contratada será convocada pelo Município de Uiramutã para a alteração, por aditamento, do

EMBARGO

Fls. 214
Rubrica

preço contratado, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA SETIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO

7.1. O prazo da presente execução de obras e prestação de serviços é de 60 **(sessenta) dias**, contados da data da "Ordem de Serviço" que autorizar o início das atividades.

CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato terá vigência de XX **(XXXX) meses**, a partir da data de sua assinatura, com termo final em ..... de ..... de ....., podendo ser prorrogado, caso ocorra algumas das hipóteses elencadas no § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fonte de Recurso: XXXXXX.**

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES

10.1. São Obrigações da contratada:

10.1.1. Apresentar-se ao Município de Uiramutã/rr – Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a ordem de serviço inicial, o seguinte:

a) Apresentar cronograma físico – financeiro compatível com a planilha vencedora;

b) Anotações de Responsabilidade Técnica- ART, no CREA/CAU, em nome do Engenheiro Responsável Técnico pela obra ou serviço;

c) Abertura de Certificado de Matrícula da obra/serviço – CEI INSS junto com a primeira medição;

d) Visto junto ao CREA/CAU/RR, para as empresas que possuírem CRPJ de outros Estados da Federação.

e) Plano de Segurança específico da Obra, elaborado conforme as normas regulamentares da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e alterações posteriores;

f) Plano de sinalização diurna e noturna, aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

g) Apresentar cronograma de utilização da equipe técnica, de acordo com o prazo de execução de cada obra/serviço, observada a mesma ordem e quantidade da relação de que trata o subitem 6.1.3.3, Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 012/2022, devendo ser aprovado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .

h) Apresentar cronograma de utilização de equipamentos e instalações, de acordo com o prazo de execução da obra/serviço, observada a necessidade de cada projeto, devendo ser aprovado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .

10.1.2. Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas.

8.1.3. Assegurar, durante a execução das obras/serviços, a proteção e a conservação dos serviços realizados.

10.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

10.1.5. Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão do Município de Uiramutã/ RR – Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos a inspeção das obras em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

ENGRAVED

10.1.6. Providenciar as placas da obra com seus dados indicativos, conforme modelo apresentado pela fiscalização, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados à partir da ordem de serviço.
10.1.7. Obedecer ao plano de segurança das obras, conforme as Normas de Segurança do Trabalho.
10.1.8. Participar à fiscalização ou à supervisão do Município de Uiramutã aocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão da obra, no todo o em parte, de acordo com o cronograma da mesma, indicando as medidas para corrigir talsituação.
10.1.9. Executar, conforme a melhor técnica, as obras contratadas, obedecendo rigorosamente às normas ABNT, bem como as instruções, especificações e os detalhes fornecidos ou editados pela Administração.
10.1.10. Manter atualizado "Diário de Obras", nele registrando todas as ocorrências que afetem o prazo de execução ou orçamento das obras.
10.1.11. Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e as posturas municipais sobre a execução de obras em locais públicos.
10.1.12. Manter à frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta ou a que venha a ser aprovada pela Administração, sempre liderada por engenheiro qualificado com capacidade e poderes bastantes para representá-la perante a Fiscalização e resolver problemas referentes às obras em execução.
10.1.13. Manter na obra em bom estado todo o equipamento necessário à perfeita execução dos serviços contratados, objetivando atender ao cronograma físico, à qualidade e às especificações técnicas.
10.1.14. Manter equipe para o acompanhamento topográfico da obra, adequada e compatível com as exigências e qualidades técnicas pertinentes.
10.1.15. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.2. Constitui obrigação do Município:
10.2.1 Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, recebendo seu objeto, conforme especificações constantes dos itens 10 e 11 do presente edital.
10.2.2. Realizar o pagamento conforme cláusula terceira deste contrato.
10.2.3. Notificar a empresa a ser contratada da ocorrência de qualquer descumprimento dos termos do edital da TOMADA DE PREÇOS nº 012/2022 e deste instrumento.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS

11.1. A CONTRATADA será responsável pelos seguintes encargos:
11.1.1. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, as responsabilidades advindas deste Contrato. A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE, desde que não afetem a boa execução do presente instrumento;
11.1.2. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais, e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;
11.1.3. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas relacionados com o objeto deste contrato;
11.1.4. Assumir a responsabilidade exclusiva por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência de falhas decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA.

EN BLANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 216
Rubrica

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES

12.1. A prática de ato ilícito na licitação ou na execução do contrato e o descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão as sanções previstas nos artis. 81 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei Estadual n° 14.184, de 31 de Janeiro de 2002,e nos arts. 19 a 22 do Decreto Estadual n° 44.431, de 29 de dezembro de 2006.

12.2. A ADJUDICATÁRIA perderá em favor da ADJUDICANTE a garantia a que se refere o item 8.1, no caso de recusa injustificada em assinar o contrato.

12.3. Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo as multas nos seguintes percentuais:

12.3.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia, até o trigésimo dia, de atraso, sobre valor dos serviços previstos no cronograma físico não executados;

12.3.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

12.3.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços previstos no Cronograma Físico não executados, no caso de atraso superior a 30(trinta) dias;

12.3.4. 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.

12.3.5. As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes, ressalvada a situação descrita nos itens **12.3.6** e **12.3.7**.

12.3.6. O atraso no cumprimento do Cronograma Físico- Financeiro previsto para execução dos serviços será verificado nas medições mensais, a partir do qual incidirá a multa prevista no item **12.3.1**.

12.3.7. Verificando o atraso, na forma do item anterior, a CONTRATADA será notificada, por escrito, para sanar a irregularidade.

12.3.8. Persistindo a irregularidade prevista no item **12.3.6**, até a medição mensal subsequente, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento da multa prevista no item **12.3.3**, que substituirá aquela constante do item **12.3.1**.

12.4. Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição pela Prefeitura Municipal de Ordens de Início, Reinício ou Paralisação de Serviços.

12.5. As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de idoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a de multa, assegurando-se ao interessado o direito de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de idoneidade, em prazo será de 10 (dez) dias.

12.5.1. Para aplicação das sanções referidas no item anterior, deverá ser instaurado processo administrativo punitivo, seguindo de notificação para defesa, em conformidade com o disposto nos arts. 19 a 22 do Decreto Estadual n° 44.431/06, submetida a aplicação das sanções à decisão do Secretário Municipal, salvo na hipótese de aplicação de sanção de declaração de inidoneidade, de competência exclusiva do Prefeito Municipal, ou de autoridade a ele equivalente, nos termosda lei.

12.6. As multas deverão ser recolhidas no Departamento de Fazenda do município de Uiramutã, no prazo de 72(setenta e duas) horas, contado à partir da decisão definitiva na esfera administrativa.

12.7. Se a multa aplicada for de valor superior ao da garantia prestada, além da sua perda responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda quando for o caso, cobrada judicialmente.

12.8. Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações compensatórias expressamente concedidas pela CONTRATANTE ou resultante de fato superveniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade da CONTRATADA, tais como o

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RORAIMA
Fls. 217
Rubrica

estado de calamidade pública, guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas características.

12.9. As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente fundamentadas através de registro no Diário de Obras realizado pela FISCALIZAÇÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1. Operar-se-á de pleno direito a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 012/2022, quando ocorrerem as hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ABSTENÇÃO

14.1. A abstenção pelo CONTRATANTE do uso dos direitos que lhe são assegurados neste contrato não será considerada novação ou renúncia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

15.1. Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93, sempre através de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES

16.1. O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei 8.666/93 e suas modificações supervenientes, complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais constantes da TOMADA DE PREÇOS nº 012/2022 e seus anexos, bem como a proposta de preços, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, apresentados pela CONTRATADA, que fazem parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pacaraima/RR para dirimir as dúvidasoriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo, para os fins de direito.

Uiramutã, -- de ---------- de 2022.

_____

Secretário Municipal de ----------

_____

Contratada

_____ Testemunha

_____ **Testemunha**

EM BRANCO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n - Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 132/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Arthur Nabuco de Araújo- Comunidade Maracanã I, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 14:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com.

Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n - Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 135/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva-Comunidade Caraparú I, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/10/2022 às 10:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com.

Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n - Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 134/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno - Comunidade Barreirinha, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/10/2022 às 08:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com.

Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2022 - PMBC - UASG: 988039

COMPRASNET Nº 167/2022. OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, pelo período de 12 (doze) meses, segundo as conveniências da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional. Proposta e Habilitação deverão ser registradas no sistema COMPRASNET, até dia 21 (vinte e um) de outubro de 2022. Horário: 13h30min. Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br. Valor Máximo Aceitável: R$ 2.584.721,16.

Balneário Camboriú, 3 de outubro de 2022.
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2022 - PMBC - UASG: 988039

COMPRASNET Nº 145/2022
OBJETO: Registro de preços para aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (OPME).
VALOR: R$ 141.843,34.
DATA DA SESSÃO ELETRÔNICA: 20 (vinte) de outubro de 2022.
HORÁRIO: 09h00min.
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br.

Em 3 de outubro de 2022
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022 - PREF

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 075/2022 - PREF

O Município de Bela Vista do Toldo, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, na modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO, onde o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÕES DO CONJUNTO BRITAGEM MÓVEL 620mm X 400mm REBOCADO POR PINO REI, PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA ABERTURA DE ENVELOPES: Dia 20/10/2022 às 09h05min, Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL: www.bll.org.br

Informações poderão ser solicitadas pelo e-mail compras.licitacao@pmbvt.sc.gov.br.

Bela Vista do Toldo, 3 de Outubro de 2022.
ALFREDO CEZAR DREHER
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS

AVISO DE ALTERAÇÃO

2ª ALTERAÇÃO DE EDITAL E DATA DE ABERTURA
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ nº. 11.455.005/0001-25, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, torna público, que alterou a data do Aviso descrito acima. Diante disto, a data de abertura e início da sessão, foi transferida para o dia 20/10/2022, ficando estipulado os seguintes horários: até às 13h45min entrega de envelopes no setor de protocolos, e 14h00min início da sessão. Informações (047) 3621-7705. Cópia do edital no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

WILLIAN GODOY FERREIRA DE SOUZA
Prefeito
interino

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº FMAS Nº 4/2022

O Município de Canoinhas/SC, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ nº. 11.455.005/0001-25, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 19/10/2022, às 09h00min, licitação para AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS, ZERO QUILÔMETROS, CONFORME DESCRIÇÃO INDIVIDUAL DO ITEM, SENDO 01 (UM) VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO DO CRAS "MARIA IRACEMA KOHLER FEDALTO" E 01 (UM) VEÍCULO PARA USO EXCLUSIVO DA APAE. Recebimento de propostas até às 08h00mim, no endereço eletrônico www.bll.org.br do dia 19/10/2022. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site: www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

WILLIAN GODOY FERREIRA DE SOUZA
Prefeito interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 - FMS

Aquisição de Bens
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para possível aquisição de produtos farmacêuticos, correlatos, vitaminas e/ou suplementos vitamínicos para atendimento da demanda existente nas unidades de saúde municipais, referente a programas oficiais e contemplados pela Atenção Básica, determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, setor de Assistência Social e demais programas ofertados pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme descrições constantes nos anexos "A" e "B" do edital. Tipo: Menor Preço Por Item. Recebimento das propostas: até as 08h15min do dia 17/10/2022. Abertura: dia 17/10/2022 as 08h30min. Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2167. Registrado no TCE com a chave: F4450F8D49E1A4CB603AD2245B0B83057D26D9AA.

Concórdia-SC, 3 de outubro de 2022.
LEANDRO BOEIRA ZORZAN
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
Em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 571/SMA/SUPLC/2022

A Secretaria Municipal da Administração torna público para o conhecimento dos interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço por lote, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para execução da construção do Centro de Convivência do bairro Ingleses - Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será até as 16h50min do dia 20/10/2022. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 17h, na Secretaria Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC.

O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br

FERNANDA ZIEGLER
Diretora do Sistema de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 582/SMA/SUPLC/2022

A Secretaria Municipal da Administração torna público para o conhecimento dos interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço, tendo como objeto Contratação de empresa especializada para execução da recuperação da Passarela Metálica em frente ao Terminal Rodoviário Rita Maria - Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será até as 14h50min do dia 22/10/2022. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 15h, na Secretaria Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC.

O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.

FERNANDA ZIEGLER
Diretora do Sistema de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 578/SMA/SUPLC/2022

A Secretaria Municipal da Administração torna público para o conhecimento dos interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço, tendo como objeto Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação e drenagem das Servidões Aciomar da Costa, Jari e Lua Grande, Pedro Santos Filho, Rosa Maria das Neves, 20 de Setembro e José Araújo Rabelo - Ingleses do Rio Vermelho - Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será até as 13h20min do dia 22/10/2022. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 13h30min, na Secretaria Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC.

O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br

FERNANDA ZIEGLER
Diretora do Sistema de Licitações e Contratos

EM BRANCO

MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 219
Rúbrica

PREFEITURAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 129/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Joaquim de Lima- Comunidade Maturuca, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 08:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 130/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Águida Kasa Wai- Comunidade Willimom, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 10:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 131/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO- COMUNIDADE SÃO LUIZ /RR, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 11:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 132/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Arthur Nabuco de Araújo- Comunidade Maracanã I, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 14:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 133/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Maria- Comunidade São Mateus- Município de Uiramutã/ RR, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 16:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 134/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno - Comunidade Barreirinha, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/10/2022 às 08:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 135/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva-Comunidade Caraparú I, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/10/2022 às 10:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

OUTRAS PUBLICAÇÕES

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA
CRC/RR

Termo de Inexigibilidade de Licitação n° 006/2022.

Processo de Compras nº: 2022/000025.

Contratante: Conselho Regional de Contabilidade De Roraima, CNPJ: 08.862.643/0001-44. Contratada: Fundação Brasileira De Contabilidade (FBC), CNPJ nº 02.428.413/0001-05. Objeto: locação de espaço (estande) cota Bronze, no evento denominado "5º Encontro Nacional de Jovens Lideranças Contábeis – 5º ENJLC". Fundamento Legal: Art. 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93. Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ratificação da Autoridade Superior: Artigo 26 da Lei Federal nº 8666/93 – Contadora Itajay Maria Soares, Presidente do CRC/RR, em 22 de setembro de 2022.

EM BRANCO

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 135/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva- Comunidade Caraparú I, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/10/2022 às 10:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 129/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Joaquim de Lima- Comunidade Maturuca, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 08:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 130/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Agualica Kasa Wai- Comunidade Willimom, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 10:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 131/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO- COMUNIDADE SÃO LUIZ /RR, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 11:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 132/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Arthur Nabuco de Araújo- Comunidade Maracanã I, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 14:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 134/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno - Comunidade Barreirinha, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/10/2022 às 08:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

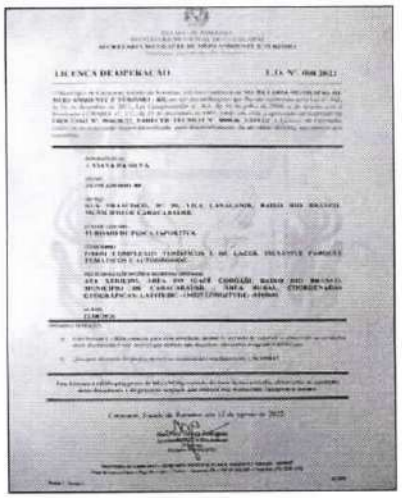

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ-RR
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Mucajaí/RR, através da CPL, torna pública a TP nº 05/2022 - Processo nº 0462/2022, OBJETO: Contratação por menor preço em regime de empreitada global, de empresa especializada em obras e serviços de Reforma, para os serviços de Reforma de Praça, data da apresentação da Documentação e Proposta 21/10/2022 – 08h00min. EDITAL E ANEXOS: Retirar na CPL da Prefeitura Municipal de Mucajaí, situada na Av. Nossa Senhora de Fatima, n. 32W - Centro, no horário das 08h00min s 12h00min, mediante carimbo com CNPJ.

Mucajaí-RR, 04 de outubro de 2022
JEAN CLEBER FREITAS DE LIMA
Presidente da CPL









PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ Fls. Rubrica

EM BRANCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 134/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno - Comunidade Barreirinha, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/10/2022 às 08:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com.

Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA.
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ Fls.____ Rúbrica

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:F3D938CD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 135/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva- Comunidade Caraparú I, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/10/2022 às 10:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com.

Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA.
Presidente da CPL.

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:F17711A5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 132/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Arthur Nabuco de Araújo- Comunidade Maracanã I, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 14:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com.

Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA.
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ Fls. 221 Rubrica

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:CB8C0BCB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 129/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Joaquim de Lima- Comunidade Maturuca, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 08:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com.

Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA.
Presidente da CPL.

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:D8E32D18

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 131/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO- COMUNIDADE SÃO LUIZ /RR, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 11:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com.

Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA.
Presidente da CPL.

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:C121D3A5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 133/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Maria- Comunidade São Mateus- Município de Uiramutã/ RR, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 16:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com.

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 222
Rubrica
PMUI

COMPROVANTE DE RETIRADO DE EDITAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL

RECIBO DO ENTREGA DE TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARREIRINHA

Razão Social: A. Almeida Feitosa de Sousa Ltda

CNPJ: 37.170.418/0001-57

Endereço: AV: Santos Dumont, 2180 Sala 01

Cidade: Boa Vista **Estado:** Roraima **Telefone:** 99131-2944

Fone: 95- 99131-2944

Pessoa para contato: _____

Recebemos, através da Comissão Permanente de Licitação do Município de Uiramutã, cópia do instrumento convocatório acima identificado e todos os seus anexos.

Data: ____/____/____

Assinatura.: Anselmo Almeida Feitosa de Sousa

CNPJ: 37.170.418/0001-57
A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA-ME
Av: Santos Dumont, 2180 - Sala 1
Bairro: Trinta E Um De Marco -CEP: 69.305-340
Boa Vista - RR

Cleiciane Pinho de Assis

CLEICIANE PINHO DE ASSIS
Membro da CPL

Gmail

cpl uiramuta <cpluiramuta@gmail.com>

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 223
Rubrica
PMU

Editais

2 mensagens

Edson Coelho <Construtoraanaua@hotmail.com>
Para: "cpluiramuta@gmail.com" <cpluiramuta@gmail.com>
6 de outubro de 2022 15:58

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR

EMPRESA CONSTRUTORA ANAUA Inscrita no CNPJ sob nº 15.285.334.0001-26, com sede a Rua: São Silvestre nº 49, na cidade de Boa vista , Estado de Roraima, neste ato representado pelo Sr (a) Edson Pedroso Coelho, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, solicitar cópias dos Editais/Tomadas de Preço nº07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
13/2022 para fins de participação no certame.

Nestes Termos

P. Deferimento

Boa vista RR, 06 de outubro de 2022.

Obter o Outlook para Android

cpl uiramuta <cpluiramuta@gmail.com>
Para: Edson Coelho <Construtoraanaua@hotmail.com>
6 de outubro de 2022 19:28

ANEXO

PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...
PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...
Edital_TP_011_2022.zip
PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha.zip
10891K

PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal Indígena Koko Tereza da Silva_Comunidade Caraparú I.zip
10897K

Gmail

cpl uiramuta <cpluiramuta@gmail.com>

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
Rubrica
PMUI

SOLICITAÇÃO DE EDITAIS

2 mensagens

Ido Beserra <ido.adm@hotmail.com>
Para: cpl uiramuta <cpluiramuta@gmail.com>

6 de outubro de 2022 09:05

Bom Dia,

Venho respeitosamente solicitar os editais, TP07, TP08, TP09,TP10,TP11,TP12, referente a construção de escolas nas comunidades indígenas.

NORTH COM E SERV LTDA
CNPJ:07.164.503/0001-41

IDO FELIPE DA SILVA BESERRA
CRA-RR 3-726

FONE: 95 98406-6211

cpl uiramuta <cpluiramuta@gmail.com>
Para: Ido Beserra <ido.adm@hotmail.com>

6 de outubro de 2022 19:24

PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...
PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...
PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...
PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...
PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...

Segue edital.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal Indígena Comunidade Willimom.zip
11308K

Edital_TP_011_2022.zip
8806K

Gmail

cpl uiramuta <cpluiramuta@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE EDITAL

2 mensagens

Vitor Mateus <vkempreendimento@gmail.com>
Para: cpluiramuta@gmail.com

4 de outubro de 2022 23:51

Venho por meio deste solicitar os editais para as seguintes Tomadas de Preços.
TP 007/2022 - Comunidade Maturuca
TP 008/2022 - Comunidade Willimom
TP 009/2022 - Comunidade São Luiz
TP 010/2022 - Comunidade Maracanã I
TP 011/2022 - Comunidade São Mateus
TP 012/2022 - Comunidade Barreirinha
TP 013/2022 - Comunidade Caraparú I

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 225
Rubrica
PMU

--

Vitor Mateus
CRC-RR 001569/O-6
(95)991265783
vkcontabilidade@gmail.com
Consultoria e assessoria

cpl uiramuta <cpluiramuta@gmail.com>
Para: Vitor Mateus <vkempreendimento@gmail.com>

6 de outubro de 2022 19:20

Segue conforme solicitado.

- **PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...**
- **PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...**
- **PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...**
- **Edital_TP_011_2022.zip**
- **PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha.zip
10891K

PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal Indígena Koko Tereza da Silva_Comunidade Caraparú I.zip
10897K

Gmail

cpl uiramuta <cpluiramuta@gmail.com>

Pedido de edital

2 mensagens

Tk Construções e serviços <tkconstrucoeseservicos@gmail.com> 10 de outubro de 2022 09:46
Para: cpluiramuta@gmail.com

Tomada de preço 12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
Fls 226
Rubrica
PMU


TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022

Screenshot_20221010-094011_Chrome.jpg
277K

cpl uiramuta <cpluiramuta@gmail.com> 10 de outubro de 2022 12:43
Para: Tk Construções e serviços <tkconstrucoeseservicos@gmail.com>

ANEXO

Em seg., 10 de out. de 2022 às 09:47, Tk Construções e serviços <tkconstrucoeseservicos@gmail.com> escreveu:
> Tomada de preço 12/2022

PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha.zip
10891K

SOUSA & SOUSA
CONSTRUÇÕES

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc.Mun: 972928.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMUI
Fls.
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls
Rubrica
PMUI

CREDENCIAMENTO

Av. Santos Dumont, 2180, Sala. 01 - Bairro 31 de Março - CEP 69.305-340 - Boa Vista / RR
Telefone. (095) 99131-2944 | @sousasousaconstrucoes | E-mail:anselmosousa663@gmail.com

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU - Fls. 2205 Rubrica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Roraima

Nome: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
RRP2100003863

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		046	1	TRANSFORMACAO

BOA VISTA
Local

11 Fevereiro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal

_____ Vogal

_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 14600019154 em 11/02/2021 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210018399 - 10/02/2021. Autenticação: 78C3E5FB67EA7DE9613AC6D4D0922ADBD6347DCC. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/001 839-9 e o código de segurança sqxU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU -
Fls. 229
Rúbrica

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/001.839-9	RRP2100003863	10/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 14600019154 em 11/02/2021 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210018399 - 10/02/2021. Autenticação: 78C3E5FB67EA7DE9613AC6D4D0922ADBD6347DCC. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/001.839-9 e o código de segurança sqxU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 230 Rubrica

ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 19/04/1973, nº do CPF 498.100.903-82, documento de identidade 228693, SSP, RR, com domicílio / residência a RUA URUGUAI, número 326, bairro / distrito CAUAME, município BOA VISTA - RORAIMA, CEP 69.311-134, titular da empresa individual A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, NIRE 1410030157-8, CNPJ 37.170.418/0001-57, com sede e domicílio na AVENIDA SANTOS DUMONT, número 2180, SALA 1, bairro / distrito TRINTA E UM DE MARCO, município BOA VISTA - RORAIMA, CEP 69.305-340 resolve transformar a empresa individual em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia SOUZA & SOUSA CONSTRUÇÕES.

Cláusula Segunda - O objeto será OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE FUNDACOES, ADMINISTRACAO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORARIAS, OBRAS DE ALVENARIA, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 14600019154 em 11/02/2021 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210018399 - 10/02/2021. Autenticação: 78C3E5FB67EA7DE9613AC6D4D0922ADBD6347DCC. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/001.839-9 e o código de segurança sqxU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO-GERAL

ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU - Fls. 231 Rúbrica

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na AVENIDA SANTOS DUMONT, número 2180, SALA 1, bairro / distrito TRINTA E UM DE MARCO, município BOA VISTA - RR, CEP 69.305-340.

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 18/05/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R$ 120.000,00 (CENTO e VINTE MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de BOA VISTA - RR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

BOA VISTA/RR, 11 de Fevereiro de 2021.

ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
Titular/Administrador

8

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

MODULO INTEGRADOR: 10 RRP2100003863 RR10930764

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 14600019154 em 11/02/2021 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210018399 - 10/02/2021. Autenticação: 78C3E5FB67EA7DE9613AC6D4D0922ADBD6347DCC. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/001.839-9 e o código de segurança sqxU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO-GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 232
Rubrica

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/001.839-9	RRP2100003863	10/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 233 Rubrica

Eu, ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 19/04/1973, RG Nº 228693 SSP-RR, CPF 498.100.903-82, RUA URUGUAI, Nº 326, BAIRRO CAUAME, CEP 69311-134, BOA VISTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 11 de fevereiro de 2021.

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 14600019154 em 11/02/2021 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210018399 - 10/02/2021. Autenticação: 78C3E5FB67EA7DE9613AC6D4D0922ADBD6347DCC. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/001.839-9 e o código de segurança sqxU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 234
Rúbrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI, de CNPJ 37.170.418/0001-57 e protocolado sob o número 21/001.839-9 em 10/02/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 14600019154, em 11/02/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Fyama Maria Pimentel Barreiros.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Marcos de Meira Lins Filho. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Boa Vista, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Fyama Maria Pimentel Barreiros, Servidor(a) Público(a), em 11/02/2021, às 16:26 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 21/001.839-9.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PMUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 234
Rúbrica

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
664.933.154-68	MARCOS DE MEIRA LINS FILHO

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Boa Vista. quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 236
Rúbrica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
14100301578	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Roraima

Nome: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
RRE2100003440

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		046	1	TRANSFORMACAO

BOA VISTA
Local

11 Fevereiro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 523528 em 11/02/2021 da Empresa A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210018437 - 10/02/2021. Autenticação: 949766A8A1C5A894752FE58741789A7A078037. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/001.843-7 e o código de segurança J0Yz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 237
Rúbrica

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/001.843-7	RRE2100003440	10/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 523528 em 11/02/2021 da Empresa A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210018437 - 10/02/2021. Autenticação: 949766A8A1C5A894752FE58741789A7A078037. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/001.843-7 e o código de segurança J0Yz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1410030157-8	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL SOLTEIRO
SEXO M [X] F [ ]	REGIME DE BENS (se casado)

FILIAÇÃO
VICENTE BARROS DE SOUSA
(mãe)
EVA ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

NASCIDO EM (data de nascimento) 19/04/1973	IDENTIDADE (número) 228693	Órgão Emissor SSP	UF RR	CPF (número) 498.100.903-82

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.) RUA URUGUAI	NUMERO 326

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CAUAME	CEP 69311134

MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Roraima:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	046	TRANSFORMACAO
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

LOGRADOURO (rua, av. etc.) AVENIDA SANTOS DUMONT	NUMERO 2180

COMPLEMENTO SALA 1	BAIRRO / DISTRITO TRINTA E UM DE MARCO	CEP 69305340

MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4313400 Atividades secundárias 4322301 4321500 4330404 4213800 4120400	DESCRIÇÃO DO OBJETO OBRAS DE TERRAPLENAGEM COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 18/05/2020	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 37170418000157	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA 11/02/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: RRE2100003440

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 523528 em 11/02/2021 da Empresa A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210018437 - 10/02/2021. Autenticação: 949766A8A1C5A894752FE58741789A7A078037. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/001.843-7 e o código de segurança J0Yz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1410030157-8	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL SOLTEIRO
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado)
FILIAÇÃO VICENTE BARROS DE SOUSA	(mãe) EVA ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
19/04/1973	228693	SSP	RR	498.100.903-82

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.) RUA URUGUAI	NUMERO 326

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CAUAME	CEP 69311134

MUNICIPIO BOA VISTA	UF RR

Declaro que a atividade se

☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte

☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Roraima:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	046	TRANSFORMACAO
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA	
LOGRADOURO (rua, av. etc.) AVENIDA SANTOS DUMONT	NUMERO 2180

COMPLEMENTO SALA 1	BAIRRO / DISTRITO TRINTA E UM DE MARCO	CEP 69305340

MUNICIPIO BOA VISTA	UF RR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4313400 Atividades secundárias 4744099 4924800 4923002 8130300 7731400	DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
18/05/2020	37170418000157			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
11/02/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAMUTA - PMU
Fls. 230
Rúbrica

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

MÓDULO INTEGRADOR: RRE2100003440

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU - Fls. 24 Rubrica

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1410030157-8	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL SOLTEIRO
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado)
FILIAÇÃO VICENTE BARROS DE SOUSA	(mãe) EVA ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
NASCIDO EM (data de nascimento) 19/04/1973	IDENTIDADE (número) 228693
Órgão Emissor SSP	UF RR
CPF (número) 498.100.903-82	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.) RUA URUGUAI	NUMERO 326
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CAUAME
CEP 69311134	
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR

Declaro que a atividade se

☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte

☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Roraima:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	046	TRANSFORMACAO
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA	
LOGRADOURO (rua, av. etc.) AVENIDA SANTOS DUMONT	NÚMERO 2180
COMPLEMENTO SALA 1	BAIRRO / DISTRITO TRINTA E UM DE MARCO
CEP 69305340	
MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR
PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4313400 Atividade secundária 7732201	DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 18/05/2020	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 37170418000157	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA 11/02/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. ____/____/____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

MÓDULO INTEGRADOR: RRE2100003440

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 523528 em 11/02/2021 da Empresa A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210018437 - 10/02/2021. Autenticação: 949766A8A1C5A894752FE58741789A7A078037. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/001.843-7 e o código de segurança J0Yz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI -
Fls. 244
Rúbrica

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/001.843-7	RRE2100003440	10/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 523528 em 11/02/2021 da Empresa A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210018437 - 10/02/2021. Autenticação: 949766A8A1C5A894752FE58741789A7A078037. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/001.843-7 e o código de segurança J0Yz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 242
Rúbrica

Eu, ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 19/04/1973, RG Nº 228693 SSP-RR, CPF 498.100.903-82, RUA URUGUAI, Nº 326, BAIRRO CAUAME, CEP 69311-134, BOA VISTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 11 de fevereiro de 2021.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 523528 em 11/02/2021 da Empresa A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210018437 - 10/02/2021. Autenticação: 949766A8A1C5A894752FE58741789A7A078037. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/001.843-7 e o código de segurança J0Yz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 243
Rubrica:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, de CNPJ 37.170.418/0001-57 e protocolado sob o número 21/001.843-7 em 10/02/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 523528, em 11/02/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Fyama Maria Pimentel Barreiros.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Marcos de Meira Lins Filho. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

Boa Vista, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Fyama Maria Pimentel Barreiros, Servidor(a) Público(a), em 11/02/2021, às 16:25 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 21/001.843-7.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 244
Rúbrica

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
664.933.154-68	MARCOS DE MEIRA LINS FILHO

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Boa Vista, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU - Fls. 243 Rubrica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Roraima

Nome: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

RRP2100084529

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		046	1	TRANSFORMACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BOA VISTA
Local

23 Novembro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 14200148593 em 23/11/2021 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210146265 - 19/11/2021. Autenticação: B4465440327F2FA40C2D35E99A810E691FBE2. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/014.626-5 e o código de segurança O9JB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 246
Rúbrica

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/014.626-5	RRP2100084529	19/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA	23/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 242 Rúbrica

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO COSNTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LTDA A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI

ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, NASCIDO EM 19/04/1973, PORTADOR DO **CPF Nº. 498.100.903-82** E DOCUMENTO DE IDENTIDADE **RG 228.693 SSP/RR**, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA URUGUAI, Nº 326, BAIRRO CAUAMÉ, BOA VISTA – RR, CEP: 69.311-134, TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI**, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS **CNPJ: 37.170.418/0001-57**, COM SEDE NA AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº. 2180 - SALA 1, BAIRRO TRINTA E UM DE MARÇO, BOA VISTA – RR, CEP: 69.305-340, COM CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA SOB **Nº. 14600019154**, POR DESPACHO DE **11 DE FEVEREIRO DE 2021**, CONSOANTE A FACULDADE PREVISTA NO PARÁGRAGO ÚNICO DO ARTIGO 1.033, DA LEI Nº 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL), RESOLVE ALTERAR SEU CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS:

CLÁUSULA 1ª – DO TIPO JURÍDICO:
FICA TRANSFORMADA ESTA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, PASSANDO A DENOMINAÇÃO SOCIAL A SER **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA**, COM SUBROGAÇÃO DE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PERTINENTES.

CLÁUSULA 2ª – DO ACERVO:
O ACERVO DESTA EMPRESA INDIVIDUAL DE ESPONSABILIDADE LIMITDA - EIRELI, QUE É NO VALOR DE R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), PASSANDO A CONSTITUIR O CAPITAL DA SOCIEDADE LIMITADA.

PORTANTO, PASSA A TRANSCREVER NESTA DATA EM ATO CONTÍNUO O CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, NASCIDO EM 19/04/1973, PORTADOR DO **CPF Nº. 498.100.903-82** E DOCUMENTO DE IDENTIDADE **RG 228.693 SSP/RR**, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA URUGUAI, Nº 326, BAIRRO CAUAMÉ, BOA VISTA – RR, CEP: 69.311-134. PASSA A CONSTITUIR O TIPO JURÍDICO DA SOCIEDADE LIMITADA, A QUAL REGERÁ, PELO PRESENTE CONTRATO SOCIAL AO QUAL SE OBRIGA MUTUAMENTE O SÓCIO:

CLÁUSULA 1ª – A EMPRESA GIRARÁ SOB O NOME EMPRESARIAL **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA**, COM SEDE NA AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº. 2180 - SALA 1, BAIRRO TRINTA E UM DE MARÇO, BOA VISTA – RR, CEP: 69.305-340, INSCRITA SOB O **CNPJ Nº 37.170.418/0001-57**.

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 14200148593 em 23/11/2021 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210146265 - 19/11/2021. Autenticação: B4465440327F2FA40C2D35E99A810E691FBE2. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/014.626-5 e o código de segurança O9JB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 248
Rúbrica

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO COSNTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LTDA A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI

CLÁUSULA 2ª – A EMPRESA PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, ABRIR OU FECHAR FILIAL OU OUTRA DEPENDÊNCIA, MEDIANTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

CLÁUSULA 3ª – A EMPRESA INICIOU SUAS ATIVIDADES EM **18/05/2020** E SEU PRAZO DE DURAÇÃO É POR TEMPO INDETERMINADO.

CLÁUSULA 4ª – O CAPITAL SOCIAL SERÁ DE **R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)**, DIVIDIDOS EM 200.000 (DUZENTAS MIL) QUOTAS DE CAPITAL NO VALOR NOMINAL DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA UMA, SUBSCRITA E JÁ TOTALMENTE INTEGRALIZADAS NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, PELO SÓCIO E DISTRIBUÍDAS DA SEGUINTE FORMA:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA	200.000	200.000,00
TOTAL	200.000	200.000,00

CLÁUSULA 5ª – AS QUOTAS SÃO INDIVISÍVEIS E NÃO PODERÃO SER CEDIDAS OU TRANSFERIDAS A TERCEIROS SEM O CONSENTIMENTO DOS OUTROS SÓCIOS, A QUEM FICA ASSEGURADO, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES E PREÇO DIRETO DE PREFERENCIA PARA A SUA AQUISIÇÃO, SE POSTAS A VENDA, FORMALIZANDO, SE REALIZADA A CESSÃO DELAS, ALTERAÇÃO CONTRATUAL PERTINENTE.

CLÁUSULA 6ª – A EMPRESA TEM POR OBJETO SOCIAL:

OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 14200148593 em 23/11/2021 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210146265 - 19/11/2021. Autenticação: B4465440327F2FA40C2D35E99A810E691FBE2. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/014.626-5 e o código de segurança O9JB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU - Fls. 249 Rúbrica

ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE FUNDACOES, ADMINISTRACAO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORARIAS, OBRAS DE ALVENARIA, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

CLÁUSULA 7ª – AS ATIVIDADES ECONÔMICAS SÃO:

43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS

42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

43.29-1-03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES

43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 250
Rúbrica

43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR
71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

CLÁUSULA 8ª – A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CABERÁ AO SÓCIO **ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA**, QUE RECEBE PODERES E ATRIBUIÇÕES DE REPRESENTAR A EMPRESA ATIVA, PASSIVA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, PODENDO PRATICAR TODOS OS ATOS COMPREENDIDOS NO OBJETO.

CLÁUSULA 9ª – O TITULAR DA EMPRESA DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS; OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO, OU CONTRA

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 14200148593 em 23/11/2021 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210146265 - 19/11/2021. Autenticação: B4465440327F2FA40C2D35E99A810E691FBE2. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/014.626-5 e o código de segurança O9JB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 23
Rúbrica

A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE.

CLÁUSULA 10ª – AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, EM 31 DE DEZEMBRO, OS ADMINISTRADORES PRESTARAM CONTAS JUSTIFICADAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, PROCEDENDO À ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO, DO BALANÇO PATRIMONIAL E DO BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO.

CLÁUSULA 11ª – FALECENDO OU INTERDITADO O SÓCIO, A SOCIEDADE CONTINUARÁ SUAS ATIVIDADES COM OS HERDEIROS SUCESSORES E O INCAPAZ. NÃO SENDO POSSÍVEL OU INEXISTINDO INTERESSES DESTES OU DO SÓCIO REMANESCENTE, O VALOR DE SEUS HAVERES SERÁ APURADO E LIQUIDADO COM BASE NASITUAÇÃO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE, À DATA DA RESOLUÇÃO, VERIFICADA EM BALANÇO ESPECIALMENTE LEVANTADO.

CLÁUSULA 12ª – A EMPRESA É UMA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL POR TEMPO INDETERMINADO, CONFORME O NOVO ART. 1.052 § 1° E § 2° CC.

CLÁUSULA 13ª – FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DO MUNICÍPIO BOA VISTA, ESTADO DE RORAIMA PARA O EXERCÍCIO E CUMPRIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTE CONTRATO. COMO COMPETENTE PARA DIRIMIR TODAS AS DÚVIDAS, QUESTÕES E AÇÕES ORIUNDA DO PRESENTE CONTRATO SOCIAL, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER OUTRO, POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA.

E POR ESTÁ JUSTO E CONTRATADO ASSINA O PRESENTE DOCUMENTO EM 01 (UMA) VIA DE IGUAL TEOR E FORMA.

BOA VISTA – RR, 22 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
SÓCIO / ADMINISTRADOR

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 14200148593 em 23/11/2021 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 210146265 - 19/11/2021. Autenticação: B4465440327F2FA40C2D35E99A810E691FBE2. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/014.626-5 e o código de segurança O9JB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU - Fls. 252 Rúbrica

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/014.626-5	RRP2100084529	19/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA	23/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br - ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 253
Rúbrica

Eu, ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 19/04/1973, RG Nº 228.693 SSP-RR, CPF 498.100.903-82, RUA URUGUAI, Nº 326, BAIRRO CAUAME, CEP 69311-134, BOA VISTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 23 de novembro de 2021.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
Assinado digitalmente por certificação A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 254
Rúbrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA, de CNPJ 37.170.418/0001-57 e protocolado sob o número 21/014.626-5 em 19/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 14200148593, em 23/11/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador IGOR PINHO DA SILVA.

Certifica o registro, o Secretário Geral, MARCOS DE MEIRA LINS FILHO. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA	23/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA	23/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA	23/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 22/11/2021

Documento assinado eletronicamente por IGOR PINHO DA SILVA, Servidor(a) Público(a), em 23/11/2021, às 11:10.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 21/014.626-5.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
664.933.154-68	MARCOS DE MEIRA LINS FILHO



Boa Vista, terça-feira, 23 de novembro de 2021

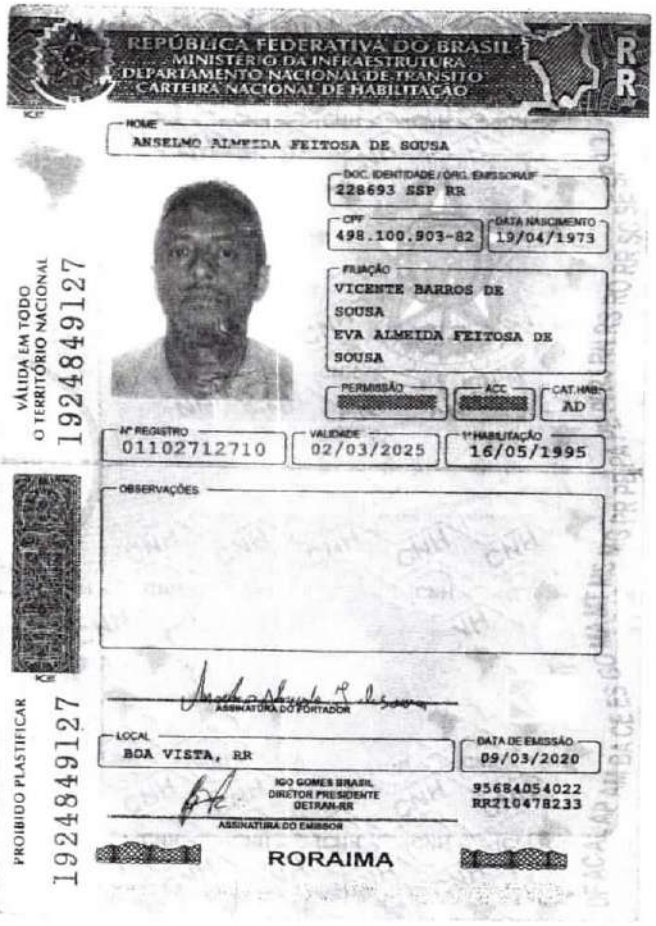

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RR

NOME
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
228693 SSP RR

CPF
498.100.903-82

DATA NASCIMENTO
19/04/1973

FILIAÇÃO
VICENTE BARROS DE SOUSA
EVA ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
01102712710

VALIDADE
02/03/2025

1ª HABILITAÇÃO
16/05/1995

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BOA VISTA, RR

DATA DE EMISSÃO
09/03/2020

IGO GOMES BRASIL
DIRETOR PRESIDENTE
DETRAN-RR

ASSINATURA DO EMISSOR

95684054022
RR210478233

RORAIMA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1924849127

PROIBIDO PLASTIFICAR
1924849127

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 256
Rúbrica

CONFERE COM ORIGINAL
Conferência
Deste Documento
Consulta
Via Internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 257
Rúbrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.170.418/0001-57 MATRIZ		18/05/2020

NOME EMPRESARIAL
A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SOUSA & SOUSA CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SANTOS DUMONT	**2180**	**SALA 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.305-340	**TRINTA E UM DE MARCO**	**BOA VISTA**	**RR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM	**(95) 9131-2944**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/11/2021** às **13:00:51** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 258
Rúbrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.170.418/0001-57 **MATRIZ**		**18/05/2020**

NOME EMPRESARIAL
A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SANTOS DUMONT	**2180**	**SALA 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.305-340	**TRINTA E UM DE MARCO**	**BOA VISTA**	**RR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM	**(95) 9131-2944**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/11/2021** às **13:00:51** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 259
Rúbrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.170.418/0001-57 **MATRIZ**		**18/05/2020**

NOME EMPRESARIAL
A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SANTOS DUMONT	**2180**	**SALA 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.305-340	**TRINTA E UM DE MARCO**	**BOA VISTA**	**RR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM	**(95) 9131-2944**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/11/2021** às **13:00:51** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 260
Rúbrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.170.418/0001-57
Razão Social: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT 2180 SALA 1 / TRINTA E UM DE MARC / BOA VISTA / RR / 69305-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/09/2022 a 24/10/2022

Certificação Número: 2022092501555452996164

Informação obtida em 06/10/2022 08:04:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 261
Rúbrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA
CNPJ: 37.170.418/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:34:20 do dia 31/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/01/2023.
Código de controle da certidão: **A271.AEF4.7F61.A8EC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 262
Rúbrica

Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"

CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND

CGF/CPF/CNPJ	Nome / Razão Social
37.170.418/0001-57	A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA

É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria SEFAZ/GAB n° 367/2011 publicada no D.O.E n° 1562 do dia 08/06/2011.

Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Data de emissão: 06/10/2022 **Validade:** 04/01/2023

A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de resposabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, no endereço: https://www.sefaz.rr.gov.br/

Código de Autenticação: 07354A

As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Departamento de Tributos
Rua Coronel Pinto, 188 - Centro
BOA VISTA - RR - CEP: 69301-150
FONE(S): 95 3621 1653 CNPJ/MF: 05.943.030/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 263
Rúbrica

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 003425/2022

Nome/Razão Social: **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA**

Nome Fantasia: **SOUZA & SOUSA CONSTRUCOES**

Inscrição Municipal: **972928.3** CPF/CNPJ: **37.170.418/0001-57**

Endereço: **AV SANTOS DUMONT, 2180 SALA: 1 31 DE MARÇO**
BOA VISTA - RR - CEP: 69305-340

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADOS DÉBITOS PARCELADOS E/OU COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Data de Emissão: **10/10/2022**

Validade: **30** (**TRINTA DIAS** **********)

Esta certidão abrange somente o contribuinte acima identificado.

Observações:

****
****
****
****
****

Código de controle da certidão: **11000013059800000590180300034252022101 09**

Emissor: EDSON

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 264
Rúbrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.170.418/0001-57
Certidão nº: 33682355/2022
Expedição: 06/10/2022, às 07:58:14
Validade: 04/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.170.418/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU -
Fls. 265
Rúbrica

Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências

(Primeira e Segunda Instâncias)

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima CERTIFICA que, revendo os registros de Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências, nas comarcas deste Estado, até a presente data, NADA CONSTA contra:

NOME: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI
CPF/CNPJ: 37.170.418/0001-57

OBSERVAÇÕES:
1) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Portaria Presidencial nº 493, do dia 09 de abril de 2014;
2) A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
3) A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;
4) As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça de Roraima, e, ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
5) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RR, pelo endereço http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa, informando o número de autenticidade abaixo.
6) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 2 (dois)anos após a sua expedição.

Número de Autenticidade: 020915984973
Emitida gratuitamente pela internet em: 06/10/2022 as 07:00
Data da última atualização da base de dados: 04/10/2022 as 00:26
Válida até o dia: 05/12/2022

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RR

Nº 507068/2022
Emissão: 04/07/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: x8ADC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 266
Rúbrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Roraima - CREA-RR, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita á(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA

CNPJ: 37.170.418/0001-57

Registro: 0001152289

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 200.000,00

Data do Capital: 23/11/2021

Faixa: 2

Objetivo Social: Atividades que a empresa pode desenvolver na modalidade Civil, comparando os objetivos sociais da mesma e atribuições do profissional, Eng. Civ. SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO, como responsável técnico como sendo: OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS; PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; OBRAS DE FUNDACOES; ADMINISTRACAO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORARIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO; SERVICOS DE ENGENHARIA; SERVICOS DE TOPOGRAFIA; SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ENGENHARIA CIVIL; ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA CIVIL, dentro das suas atribuições conforme ART. 7° da Resolução 218/73 do CONFEA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: Eng. Civ. SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO possui restrições em IRRIGAÇÃO; DRENAGEM; FERROVIAS; DIQUES; AEROPORTOS; CONCRETO PROTENDIDO; ENGENHARIA DE TRÁFEGO;

Endereço Matriz: AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 2180, SALA 1, 31 DE MARÇO, BOA VISTA, RR, 69305340

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/06/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000115262DDRR

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO

Registro: 0907966128

CPF: 437.***.***-87

Data Início: 23/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, OBSERVADO O ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Sócios

Sócio: ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RR

Nº 507068/2022
Emissão: 04/07/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: x8ADC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CPF: 498.***.***-82
Função: SÓCIO ADMINISTRADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 26
Rúbrica

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: x8ADC
Impresso em: 18/10/2022 às 12:12:55 por: adapt, ip: 192.168.100.1

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RR

Nº 507067/2022
Emissão: 04/07/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: CbY5y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 268
Rúbrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-RR.

Interessado(a)

Profissional: SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO
Registro: 0907966128
CPF: 437.***.***-87
Endereço: RUA RUA ALAMEDA BETA, 90, 90, APARECIDA, BOA VISTA, RR, 69306372

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 27/11/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, OBSERVADO O ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.
Restrições: IRRIGAÇÃO; DRENAGEM; FERROVIAS; DIQUES; AEROPORTOS; CONCRETO PROTENDIDO; ENGENHARIA DE TRAFEGO.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Data de Formação: 25/08/2009

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA
Data de Formação: 20/04/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUSERV SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA
Registro: 0000001443
CNPJ: 14.423.040/0001-50
Data Início: 24/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA
Registro: 0001152289
CNPJ: 37.170.418/0001-57
Data Início: 23/06/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA
Registro: 0001156330

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: CbY5y
Impresso em: 11/10/2022 às 10:12:28 por: adapt, ip: 192.168.100.1

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RR

Nº 507067/2022
Emissão: 04/07/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: CbY5y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA - PMUI - Fls. 269 Rúbrica

CNPJ: 13.808.507/0001-18
Data Início: 17/03/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Registro: 0001157531
CNPJ: 84.013.408/0001-98
Data Início: 21/06/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: CbY5y
Impresso em: 11/10/2022 às 10:12:29 por: adapt, ip: 192.168.[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 226
Rúbrica

ANEXO IX

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022 Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Prezados (as) Senhores (as),

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.170.418/0001-57, com sede situada em Boa Vista-RR, à Avenida Santos Dumont, Nº 2180, sala 01, Bairro: Trinta e Um de Março, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Anselmo Almeida Feitosa de Sousa**, portador da Carteira de Identidade n° 228.693 SSP/RR e inscrito no CPF n° 498.100.903-82, declara para os devidos fins que na presente data a mesma se encontra enquadrada nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 de 14/12/2006, que trata do Regime das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estando apta, portanto a sua participação no processo n ° 134/2022, tomada de preço n° 012/2022, junto ao Município de Uiramutã.

Por ser verdade, firma o presente.

Boa Vista-RR, 24 de outubro de 2022.

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
RG228.693 SSP/RR
SÓCIO ADMINISTRADOR

PMU... MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 271
Rúbrica

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022 Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Prezados (as) Senhores (as),

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.170.418/0001-57, com sede situada em Boa Vista-RR, à Avenida Santos Dumont, Nº 2180, sala 01, Bairro: Trinta e Um de Março, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Anselmo Almeida Feitosa de Sousa**, portador da Carteira de Identidade n° 228.693 SSP/RR e inscrito no CPF n° 498.100.903-82, DECLARA em atendimento ao **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 012/2022**, que esta documentação de credenciamento possui folhas numeradas de _____ a _____ incluindo este termo.

Por ser verdade, firma o presente.

Boa Vista-RR, 24 de outubro de 2022.

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
RG 228.693 SSP/RR
SÓCIO ADMINISTRADOR

CP

MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR

PREFEITURA MUNICIPAL UIRAMUTÃ/RR.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL.

TOMADA DE PREÇOS N.° 012/2022.

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.170.418/0001-57
Av: Santos Dumond, n°2180, sala 01, 31 de Março.
Boa Vista – Roraima – Brasil.

ABERTURA EM: 24/10/2022 às 8h30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 273
Rúbrica

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

SOUSA & SOUSA
CONSTRUÇÕES

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc.Mun. 972928.3

...NICIPAL DE UIRAMUTÃ
274
...rica

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Av. Santos Dumont, 2180, Sala. 01 - Bairro 31 de Março - CEP 69.305-340 - Boa Vista / RR
Telefone: (095) 99131-2944 | @sousasousaconstrucoes | E-mail:anselmosousa663@gmail.com

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RR

Nº 507068/2022
Emissão: 04/07/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: x8ADC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Roraima - CREA-RR, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU - Fls. 275 Rúbrica

Interessado(a)

Empresa: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA

CNPJ: 37.170.418/0001-57

Registro: 0001152289

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 200.000,00

Data do Capital: 23/11/2021

Faixa: 2

Objetivo Social: Atividades que a empresa pode desenvolver na modalidade Civil, comparando os objetivos sociais da mesma e atribuições do profissional, Eng. Civ. SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO, como responsável técnico como sendo: OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS; PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; OBRAS DE FUNDACOES; ADMINISTRACAO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORARIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO; SERVICOS DE ENGENHARIA; SERVICOS DE TOPOGRAFIA; SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ENGENHARIA CIVIL; ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA CIVIL, dentro das suas atribuições conforme ART. 7° da Resolução 218/73 do CONFEA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: Eng. Civ. SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO possui restrições em IRRIGAÇÃO; DRENAGEM; FERROVIAS; DIQUES; AEROPORTOS; CONCRETO PROTENDIDO; ENGENHARIA DE TRÁFEGO;

Endereço Matriz: AVENIDA AV SANTOS DUMONT, 2180, SALA 1, 31 DE MARÇO, BOA VISTA, RR, 69305340

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/06/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000115262DDRR

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO

Registro: 0907966128

CPF: 437.***.***-87

Data Início: 23/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, OBSERVADO O ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta via Internet

Sócios

Sócio: ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RR

Nº 507068/2022
Emissão: 04/07/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: x8ADC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CPF: 498.***.***-82
Função: SÓCIO ADMINISTRADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 27
Rúbrica

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publica, com a chave: x8ADC
Impresso em: 18/10/2022 às 12:12:55 por: adam, ip: 192.168.100.1

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RR

Nº 507067/2022
Emissão: 04/07/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: CbY5y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 27 Rúbrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-RR.

Interessado(a)

Profissional: SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO
Registro: 0907966128
CPF: 437.***.***-87
Endereço: RUA RUA ALAMEDA BETA, 90, 90, APARECIDA, BOA VISTA, RR, 69306372
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 27/11/2009

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, OBSERVADO O ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.
Restrições: IRRIGAÇÃO; DRENAGEM; FERROVIAS; DIQUES; AEROPORTOS; CONCRETO PROTENDIDO; ENGENHARIA DE TRÁFEGO.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Data de Formação: 25/08/2009

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA
Data de Formação: 20/04/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUSERV SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA
Registro: 0000001443
CNPJ: 14.423.040/0001-50
Data Início: 24/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA
Registro: 0001152289
CNPJ: 37.170.418/0001-57
Data Início: 23/06/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA
Registro: 0001156330

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RR

Nº 507067/2022
Emissão: 04/07/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: CbY5y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 228
Rúbrica

CNPJ: 13.808.507/0001-18
Data Início: 17/03/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Registro: 0001157531
CNPJ: 84.013.408/0001-98
Data Início: 21/06/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: CbY5y
Impresso em: 11/10/2022 às 10:12:29 por: adapt, ip: 192.168.100.1

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

504976/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo Técnico do profissional **SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - RMU
Fls. 279
Rúbrica

Profissional: **SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO**
Registro: **1837D RR RR** RNP: **0907966128**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **RR20170036194** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2017 Baixada em: 07/07/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69000000
Contrato: 341/2017/SMSA Celebrado em: 04/09/2017
Valor do contrato: R$ 7.791,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - SMOU
Endereço da obra/serviço: RUA RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69000000
Data de início: 20/10/2017 Conclusão efetiva: 15/01/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > FACHADA > #1113 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 17 - FISCALIZAÇÃO 4.09 metro quadrado; **11 - SUPERVISÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 17 - FISCALIZAÇÃO 45.15 metro;

Observações

ART. DE FISCALIZAÇÃO/SUPERVISÃO DE OBRA PÚBLICA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I - UBS NO BAIRRO CAUAMÉ – MODALIDADE DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017-CPL – CONVÊNIO SUS/RECURSOS PRÓPRIOS – PROCESSO 871/2017-SMSA. CONTRATO: 341/2017/SMSA EMITIDO EM 04/09/2017, (PUBLICADO D.O.M. 4483 DE 12/09/2017) PRAZO DO CONTRATO: 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS, ORDEM DE SERVIÇO: 18/10/2017 TERMINO DO CONTRATO: 15/01/2018. (VALOR DA OBRA R$ 300.191,98).

Número da ART: **RR20180041149** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2018 Baixada em: 16/07/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69000000
Contrato: 341/2017/SMSA Celebrado em: 04/09/2017
Valor do contrato: R$ 7.791,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - SMOU
Endereço da obra/serviço: RUA RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69000000
Data de início: 16/01/2018 Conclusão efetiva: 15/06/2018
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atestado a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > FACHADA > #1113 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 17 - FISCALIZAÇÃO 4.09 metro quadrado; **11 - SUPERVISÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 17 - FISCALIZAÇÃO 45.15 metro;

Observações

ART. DE FISCALIZAÇÃO/SUPERVISÃO DE OBRA PÚBLICA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I - UBS NO BAIRRO CAUAMÉ – MODALIDADE DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017-CPL – CONVÊNIO SUS/RECURSOS PRÓPRIOS – PROCESSO 871/2017-SMSA. CONTRATO: 341/2017/SMSA EMITIDO EM 04/09/2017, (PUBLICADO D.O.M. 4483 DE 12/09/2017) PRAZO DO CONTRATO: 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS, ORDEM DE SERVIÇO:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

504976/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

18/10/2017 TERMINO DO CONTRATO: 15/01/2018, (VALOR DA OBRA R$ 300.191,98). 1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO 90 DIAS INICIO:16/01/2018, TERMINO:15/04/2018 2º ADITIVO DE SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 341/2017/SMSA NO VALOR DE R$ 22.879,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU - Fls. 280 Rúbrica

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 504976/2021
07/07/2022, 06:42
8ZA63

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: 8ZA63

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 05.943.030/0001-55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA BOA VISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 281
Rúbrica

ATESTADO DE SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO,** atesta para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **Sávio Júlio Pereira Franco,** CREA 0907966128, acompanhou a execução da obra discriminada abaixo a nível de supervisão/fiscalização de obra pública no período de outubro/2017 a junho/2018.

Processo: nº 871/2017 - SMSA - Portaria de Fiscalização nº 316/2017 de 18/10/2017 - Publicada no D.O.M. 4507 de 20/10/2017 - **Objeto: Serviços remanescentes da construção de Unidade Básica de Saúde Porte I - Ubs no bairro Cauamé - SUS / Tomada de Preços nº 001/2017 / Contrato nº 341/2017/SMSA / RR20170036194 / RR20180041149**

A Obra foi executada pela empresa **CRB ENGENHARIA EIRELI - EPP,** CNPJ 07.929.204/0001-50, tendo como Responsável Técnico: **Carlos Wagner Briglia Rocha,** Eng. Civil / Arquiteto CREA/CAU 040925319-7

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVO**		
1.1	Engenheiro Residente	mês	2,00
1.2	Mestre de Obras	mês	2,00
1.3	Vigilância do Canteiro de Obras	mês	2,00
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	Limpeza mecanizada do terreno com motoniveladora	m²	1.104,35
2.2	Placa da obra (2,00m x 3,00m), padrão PMBV	m²	6,00
2.3	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016	m²	5,00
2.4	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af_02/2016	m²	1,50
2.5	Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor	un	1,00
2.6	Ligações provisórias água/esg. canteiro obra c/escavações, exclusivo reparo pavimento logradouro publico e ligação da concessionária	un	1,00
2.7	**Demolições e retiradas**		
2.7.1	Demolição de marquise de concreto	m³	1,57
2.7.2	Retirada de azulejos	m²	72,36
2.7.3	Retirada de aduelas	un	10,00
2.7.4	Reenquadramento de portas	un	17,00
2.7.5	Demolição de alvenaria	m²	2,88
3.0	**MOVIMENTO DE TERRAS**		
3.1	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhão basculhante 6m³/16t e pa carregadeira sobre pneus 128hp, capacidade de caçamba 1,7 a 2,8m³, peso operacional 11632Kg- Bota - fora	m³	207,07
3.2	Transporte comercial com caminhão basculhante 6m³, rodovia pavimentada - Bota Fora - DMT-11,30km	ton x km	3.743,64
4.0	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	Verga 10X10cm em concreto pré-moldado fck=20MPA (preparo com betoneira) aço CA60, bitola fina, inclusine forma tabua 3A.	m	2,00
4.2	Laje maciça em concreto armado fck=20MPA (preparo com betoneira), altura 13 cm, aço CA50, inclusive forma	m²	15,75
4.3	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica e=3mm	m²	15,75
5.0	**ALVENARIA E VEDAÇÃO**		
5.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X15X20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	7,93
5.2	Divisória em dry wall - fornecimento e instalação	m²	10,44
6.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	Camada impermeabilizadora em concreto simples, e=5cm	m²	176,96
6.2	Camada regularizadora em argamassa de cimento e areia, traço 1:4, e=3cm	m²	176,96
6.3	Piso industrial alta resistência espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	m²	154,74
6.4	Piso cerâmico PEI IV(ou superior) antiderrapante, inclusive rejuntamento.	m²	22,22
6.5	Rodapé (piso de alta resistência), h=10,00 cm	m²	14,95
6.6	Calçada perimetral de proteção em concreto 1:3:5 (fck=12 MPA) preparo mecânico (inclusive rampas de acesso)	m²	40,02
6.7	Pintura com tinta latex acrílico, 02 demãos, em calçada perimetral	m²	40,02
6.8	Soleira em granito	m	8,40
6.9	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	m²	161,84
6.10	Meio-fio	m	45,15

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 504976/2021, emitida em 07/07/2022

Certidão nº 504976/2021
07/07/2022, 10:02
Chave de Impressão 8ZA63
O documento nesta alta registrado foi emitido em 07/07/2022 e contem 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls. 282
Rúbrica

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 05.943.030/0001-55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA BOA VISTA

6.11	Fornecimento e assentamento de piso tátil de alerta ou direcional pigmentado em concreto 25x25x2cm	m	9,25
7.0	**PEITORIL**		
7.1	Peitoril em granito, largura 15 cm	m	26,47
8.0	**REVESTIMENTO**		
8.1	Azulejo (15x15)cm, inclusive rejuntamento	m²	124,49
8.2	Emboço traço 1:7, esp.=1,5cm	m²	120,65
8.3	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m²	25,07
9.0	**COBERTURA E FORRO**		
9.1	Forro em P.V.C., inclusive beirais e entarugamento em madeira	m²	218,36
9.2	Rufo de concreto i=40cm	m	22,85
10.0	**ESQUADRIAS**		
10.1	**Porta em madeira MDF de abrir com revestimento melamínico, inclusive guarnições e acessórios(conforme mapa de esquadrias)**		
10.1.1	0,90m x 2,10m - P1	un	13,00
10.1.2	1,00m x 2,10m - P2	un	1,00
10.2	**Porta em grade de ferro (conforme mapa de esquadrias)**		
10.2.1	1,80m x 2,70m - P3	un	1,00
10.3	**Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnições(conforme mapa de esquadrias)**		
10.3.1	0,90m x 2,10m - P4	m²	5,67
10.4	**Porta em chapa metálica de correr (conforme mapa de esquadrias)**		
10.4.1	1,20m x 2,80m - P5	m²	3,36
10.5	**Janela em grade de ferro (conforme mapa de esquadrias)**		
10.5.1	1,50x1,60-J1	un	26,40
10.6	**Janela em grade de ferro tipo Maxim-ar (conforme mapa de esquadrias)**		
10.6.1	0,75x0,60-J2	un	3,15
10.7	**Visor em alumínio tipo Maxim-arcom vidro incolor 8mm(conforme mapa de esquadrias)**		
10.7.1	2,00x1,10/1,00 - V1	m²	2,20
10.7.2	0,90x1,10/1,00 - V2	m²	0,99
10.8	**Vidro**		
10.8.1	Vidro liso transparente, espessura 4mm	m²	34,59
10.8.2	Vidro temperado incolor espessura 8mm	m²	2,61
10.9	**Fechaduras**		
10.9.1	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio	un	16,00
11.0	**PINTURA**		
11.1	Emassamento acrílico, 02 demãos, em áreas externas e internas, vigas,lajes e pilares, inclusive selador	m²	113,27
11.2	Pintura com tinta latex acrílico, 02 demãos, em áreas externas e internas, vigas, lajes e pilares	m²	604,65
11.3	Pintura com tinta epóxi, 02 demãos, em áreas internas	m²	209,39
11.4	Pintura com esmalte sintético, 02 demãos em porta de chapa metálica	m²	65,82
11.5	Pintura com tinta latex acrílico, 02 demãos, em telhas COR fibrocimento 6mm,inclusive selador	m²	224,63
12.0	**INSTALAÇOES ELETRICAS**		
12.1	**Luminárias e acessórios**		
12.1.1	Lampada fluorescente espiral branca 45W E27	un	33,00
12.1.2	Arandela tipo tartaruga para parede com lâmpada incandescente	un	4,00
12.2	**Tomadas e interruptores**		
12.2.1	Ponto de tomada bipolar 10A/250V com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4X2" com placa	pt	31,00
12.2.2	Ponto de tomada para central de ar (caixa, eletroduto, fios e tomada)	pt	12,00
12.2.3	Ponto interruptor simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2"	pt	16,00
12.2.4	Ponto interruptor duplo simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2"	pt	1,00
12.2.5	Ponto interruptor triplo simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2"	pt	3,00
12.3	**Ponto de Luz**		
12.3.1	Ponto de luz(caixa, eletroduto e fios)	pt	33,00
12.3.2	Ponto luz parede (arandela)	pt	4,00
12.4	**Dispositivo de proteção - Disjuntores**		
12.4.1	Disjuntor termomagnético monopolar padrão 10A	un	6,00
12.4.2	Disjuntor termomagnético monopolar padrão 13A	un	1,00
12.4.3	Disjuntor termomagnético tripolar padrão 16A	un	1,00
12.4.4	Disjuntor termomagnético tripolar padrão 20A	un	1,00
12.4.5	Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 a 150a 40v, fornecimento e instalacao	un	1,00
12.4.6	Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 A 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	11,00
12.4.7	Luminaria plafonier sobrepor aro/base metalica c/ globo esferico vidro leitoso boca 10cm diam 20cm p/ 1 lamp incand, incl soquete porcelana	un	33,00

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 5049/6/2021, emitida em 07/07/2022

Certidão nº 5049/6/2021
07/07/2022, 10:02
Chave de Impressão: 8ZA63
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2022 e contém 4 folhas

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 05.943.030/0001-55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA BOA VISTA

12.5	Outros		
12.5.1	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição trifásico com barramento	un	1,00
12.5.4	Haste Copperweld 5/8 x 3,0m com conector	un	3,00
12.5.5	Caixa de passagem 60x60	un	2,00
12.5.6	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação, af_12/2015	m	60,00
12.5.7	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição trifásico com barramento 40 DISJ.	un	1,00
12.5.8	Entrada de energia em BT Trifásica 100 A, inclusive poste duplo T, h=9,00m	un	1,00
13.0	**INSTALAÇOES TELEFONICAS**		
13.1	Ponto de tomada para telefone, com tomada padrão telebrás em caixa de PVC com placa, eletroduto de PVC rigido e fiação	un	2,00
13.2	Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepor) fornecimento e instalação	un	1,00
14.0	**INSTALAÇOES DE LÓGICA**		
14.1	Ponto de tomada para lógica, com tomada RJ45 em caixa de PVC com placa, eletroduto de PVC rigido e cabo CAT5	un	11,00
14.2	Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepor) fornecimento e instalação	un	1,00
15.0	**INSTALAÇÃO HIDRAULICA**		
15.1	Fornecimento e assentamento de tubo de f 25mm, inclusive conexões	m	26,17
15.2	Fornecimento e assentamento de tubo de f 32mm, inclusive conexões	m	44,75
15.3	Fornecimento e assentamento de tubo de f 40mm, inclusive conexões	m	11,08
15.4	Registro de gaveta 3/4" bruto latão, inclusive conexões	un.	3,00
15.5	**Reservatório de água**		
15.5.1	Castelo d'água em concreto moldado in-loco	un.	1,00
15.5.2	caixa d'água em polietileno, 2000l Litros	un.	1,00
15.5.3	Válvula de esfera em bronze O 3/4"	un.	1,00
15.6	Caixa para hidrômetro em concreto pré-moldado	un.	1,00
15.7	Cavalete para medição de água entrada principal em aço galvanizado DN 25	un.	1,00
15.8	Registro de esfera em bronze d= 1.1/4" fornec e colocacao	un.	1,00
16.0	**INSTALAÇAO SANITARIA**		
16.1	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões	m	60,00
16.2	Ralo sifonado de PVC 100x100mm simples	un	6,00
16.3	Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples	un	4,00
16.4	Caixa de passagem 60x60	un	12,00
16.5	Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado DN 40mm com tampa	un	4,00
17.0	**LOUÇAS E METAIS**		
17.1	Fornecimento e instalação de lavatório em louça, linha comercial, sem coluna, completo, sifão e válvula plástica, inclusive torneira metálica acabamento cromado, f 1/2".	un	4,00
17.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - PNE	un	1,00
17.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca	un	1,00
17.4	Chuveiro plástico branco simples - fornecimento e instalação	un	1,00
17.5	Saboneteira em metal cromado tipo concha de sobrepor	un	4,00
17.6	Porta toalha em metal cromado tipo argola	un	2,00
17.7	Porta papel em metal cromado	un	2,00
17.8	Porta sabonete liquido inox	un	9,00
17.9	Cuba de aço inox 400X340X110mm (NUM 3) em chapa 20.304, válvula de escoamento TP americana 623, sifão 1680 1 1/2"X1 1/2", inclusive torneira	un	8,00
17.10	Balcão em granito/marmore	m²	7,03
17.11	Tanque de mármore sintético 22 litros com válvula em plástico branco 1 .1/4"X1.1/2", sifão plástico tipo copo 1.1/4" e torneira de metal amarelo curta 1/2" ou 3/4" para tanque	un	1,00
17.12	Torneira metálica acabamento cromado longa 1/2", para bancada de aço	un	8,00
17.13	Fornecimento e instalação de suporte de apoio para deficiente físico em inox	m	1,60
18.0	**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**		
18.1	Calha aço galvanizado	m	35,70
18.2	Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, Af_12/2014	und	10,00
18.3	Curva 90 graus, PVC, serie r, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica,fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, af_12/2014	und	6,00
18.4	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, af_12/2014_p	m	68,25
18.5	Caixa de passagem 60x60	un	7,00
19.0	**CONSTRUÇÃO DE MURO**		
19.1	**Movimento de terra**		
19.1.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	36,90
19.1.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência, af_06/2016	m²	61,12

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 504976/2021, emitida em 07/07/2022

Certidão nº 504976/2021
07/07/2022, 10:02
Chave de Impressão 8ZA63
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2022 e contem 4 folhas

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 05.943.030/0001-55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA BOA VISTA

19.1.3	Reaterro de vala com compactação manual	m²	23,99
19.2	**Infraestrutura**		
19.2.1	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante	m²	61,12
19.2.3	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	m²	128,64
19.2.4	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	11,07
19.2.5	Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto	Und	11,07
19.3	**Sistema de vedação / Revestimentos/ Pintura**		
19.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m²	179,50
19.3.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas e externa, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 om preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	359,00
19.3.3	Massa única, para recebimento de pintura ou revestimento cerâmico, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m2, espessura de 20mm com execução de taliscas.	m²	349,50
19.3.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	414,00
19.4	**Esquadrias**		
19.4.1	Gradil metálico frontal	m²	35,34
19.4.2	Pintura esmalte fosco, 2 demãos, sobre superfície metálica	m²	92,88
19.4.3	Portao metálico de abrir 2 folhas - fornecimento e instalação	m²	5,50
19.4.4	Portão metálico metálico de correr, 1 folha	m²	6,60
20.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
20.1	Limpeza final da obra	m²	183,15
20.2	Placa inaugural, em aço escovado 40x60cm	un	1,00
20.3	Anel de concreto acrescido nas caixas de passagem e gordura - Fornecimento e instalação	un	16,00
20.4	Dreno para central de ar - fornecimento e instalação	un	11,00

VALOR DOS SERVIÇOS SUPERVISIONADOS/ AFERIDOS PELO FISCAL: R$ 323.071,61 (trezentos e vinte e três mil, setenta e um reais e sessenta e um centavo).

Boa Vista-RR, 10 de agosto de 2020.

Jésus Eustáquio de Oliveira
Secretário Municipal de Obras – Adjunto
Engenheiro Civil CREA-MG 55014/D
CPF: 508.440.086-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 204
Rúbrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 504976/2021, emitida em 07/07/2022

Certidão nº 504976/2021
07/07/2022, 10:02
Chave de Impressão 8ZA63
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2022 e contem 4 folhas

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
504977/2021
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo Técnico do profissional **SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 285
Rúbrica

Profissional: **SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO**
Registro: **1837D RR RR** RNP: **0907966128**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **RR20150009191** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/09/2015 Baixada em: 11/07/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69000000
Contrato: 045/2015 Celebrado em: 29/07/2015
Valor do contrato: R$ 5.623.601,39 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - SMOU
Endereço da obra/serviço: RUA RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69000000
Data de início: 17/08/2015 Conclusão efetiva: 13/02/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **8 - FISCALIZAÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 17 - FISCALIZAÇÃO 6837.07 metro;

Observações

ART DE FISCALIZAÇÃO / SUPERVISÃO DE OBRA PÚBLICA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AYRTON SENNA - 2ª E 3ª ETAPAS, NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR - SENDO A 2ª ETAPA PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS,RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS. CONCORRÊNCIA PUBLICA 011/2015 Processo nº 061/2015-SMOU Contrato: 045/2015-SMOU PRAZO CONTRATUAL: 240 DIAS DA ASS. DO CONTRATO - INICIO: 29/07/2015 TÉRMINO: 25/03/2016 PRAZO EXECUÇÃO: 180 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO INICIO: 17/08/2015 TÉRMINO: 13/02/2016 Fornecimento e fixação de piso intertravado tipo PAVER liso (10x20x6,0)cm, FCK=35MPa, com superfície lisa, sobre colhão de areia e=6cm. 12386,95 m² Contrapiso em concreto 20MPa preparo mecânico, espessura de 5,0cm, com armação em tela soldada e junta plástica de dilatação 10246,79 m² Piso cimentado desempenado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso pigmentado e espessura de 3,0cm, preparo mecânico 10246,79 m² Demolicao de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro 22988,20 m² Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado dimensões 10x10x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. 6837,07 m Tapume OSB chapa 1,22x2.20x0,08 m -fornecimento e instalação 5923,59 m² Grelha arvoreira, corpo em ferro fundido pintado na cor padrão cinza grafite, 1,00 x 1,00m. Circunferência interna da abertura 0,50m - fornecimento e colocação 422,00 und Banco em chapa metálica plana 3/16" com pintura eletrostática e assento em madeira de lei com pintura em verniz, conforme projeto - fornecimento e instalação 302,00 und Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm 1315,73 m² Demolicao de piso em ladrilho com argamassa 10248,05 m² Brinquedo centopéia - 6 gangorra + Brinquedo balanço com 6 lugares + Brinquedo Dino com 4 escorregadores + Brinquedo caracol + Brinquedo escalada torcida + Brinquedo escada torcida - fornecimento e instalação 1,00 conj Limpeza final da obra 70270,21 m² Meio-fio de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. 2691,61 m Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 2,0cm com juntas plasticas de dilatacao e preparo manual da argamassa 2007,74 m² Engenheiro civil de obra Júnior (1 profissional) 6,00 meses Regularização e compactação de terreno com placa vibratória 22633,74 m² Retirada de meio fio com empilhamento e s/ remoção. 12513,32 m Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 1 km) 54991,46 m³xkm Vigia noturno (2 profissionais) 6,00 meses Mestre de obras (1 profissional) 6,00 meses Plantio de árvore pau pretinho/quaresmeira, altura igual ou maior que 2,00m, em cavas de 50x50x100cm 422,00 und Auxiliar Técnico - Segurança do Trabalho (1 profissional) 6,00 meses Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar-comprimido). 2663,03 m² "Massa única, para recebimento de pintura e revestimento cerâmico, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. " 1091,36 m² Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 545,68 m² Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos 2007,74 m² Concreto ciclópico fck=10 Mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento 40,93 m³ Retirada de alambrado em tubo galvanizado Ø 2"x chapa 14 (2mm), com tela galvanizada malha 5x5 fio 12, emoldurada em cantoneira 1"x1/8"com acabamento em barra chata de 1/2"x 1/8". 1591,22 m² Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante 386,54 m² Pintura latex acrilica, para meio-fio, uma demão 1561,70 m² Instalação de Lixeira de coleta seletiva 50 litros com 2 cestos 156,00 und Corte e Destocamento de árvores D= 0,10 a 0,30m 199,00 und Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demão 1091,36 m² Lastro de areia media 146,83 m³ Apiloamento com maço de 30kg (fundo de vala / viga baldrame) 409,36 m² Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas maiores que 10m² sobre laje, não aderido, espessura 7cm, acabamento reforçado. Af_06/2014 166,00 m² Ladrilho Hidráulico de piso tátil, assentado com argamassa de cimento colante 70,78 m² Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo 84,87 m³ Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fach sem presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 272,84 m² Barracão de obr

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

504977/2021

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - SMOU Fls. 286 Rúbrica

alojamento/escritório/depósito, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias. Reaproveitado 5 vezes 16,00 m² Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura 542,26 m Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento 100,98 m³ Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³ 3956,22 m³ Sanitario com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 modulos e 4m2, paredes chapas de madeira compensada plastificada 10mm, telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, inclusive instalacao e aparelhos, reaproveitado 2 vezes 1,00 und Portão em alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm, inclusive guarnições 14,07 m² Conjunto para futebol de areia (par de traves oficial - 5,50x2,20m - em tubo de aço galv a fogo 3" com requadro e redes polietileno fio 4mm), fornecimento e instalação 1,00 und Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 5x. 95,52 m² Conjunto para futsal (par de traves oficial - 3,00x2,00m - em tubo de aço galv a fogo 3" com requadro e redes polietileno fio 4mm), fornecimento e instalação 1,00 und Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 16,20 m² Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) 55,29 m³ Concreto Fck=15Mpa, virado em betoneira, sem lançamento, com impermeabilizante 4,76 m³ Placa de obra em chapa de aço galvanizado 6,00 m² Par de tabelas de basquete em compensado naval de "1,80 x 1,20" m, com aro de metal e rede, fornecimento e instalação 2,00 und Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco galvanizado 3", h = "255" cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro fornecimento e instalação 1,00 und Luminária tipo Spot de aluminio injetado e pintura eletrostatica para piso, com lâmpada LED PAR 20 de 7W fornecimento e instalação 6,00 und Retirada de Bancos com sustentação em tubo de aço galvanizado chumbado em concreto 168,00 und "Ligações provisórias água / esgoto / elétrica / força Instalação/ligação provisória elétrica baixa tensão p/canteiro obra, m3-chave 100a carga 3kwh,20cv exclusive fornecimento de medidor" 1,00 und Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas sem reaproveitamento 166,00 m² Placa inauguração em alumínio 0,40x0,60m fornecimento e colocação 1,00 und Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. 95,52 m² Eletroduto de PVC rigido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao 58,34 m Retirada de lixeira chumbado em concreto 84,00 und Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes 4,76 m³ Demolição de brinquedos em estrutura de madeira e metálica 12,00 und Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento 3,08 m³ Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 1,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalacao 116,03 m Remocao de pintura a oleo/esmalte sobre superficie metalica 6,86 m² Desativação de ponto hidráulico 1/2" ou 3/4" 16,00 und Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. Utilizacao de revolver (ar-comprimido). 3,43 m² Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 1000W fornecimento e instalação 1,00 und

---

Número da ART: **RR20170033039** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/08/2017 Baixada em: 01/11/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69000000
Contrato: 045/2015 Celebrado em: 29/07/2015
Valor do contrato: R$ 6.537.851,23 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - SMOU
Endereço da obra/serviço: RUA RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69000000
Data de início: 20/03/2017 Conclusão efetiva: 16/09/2017
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Atividade Técnica: 8 - **FISCALIZAÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 17 - FISCALIZAÇÃO 6837,07 metro;

Observações

ART DE REPROGRAMAÇÃO DE SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO / SUPERVISÃO DE OBRA PÚBLICA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AYRTON SENNA - 2ª E 3ª ETAPAS, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR - SENDO A 2ª ETAPA PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS,RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS. CONCORRÊNCIA PUBLICA 011/2015 Processo nº 061/2015-SMOU Contrato: 045/2015-SMOU PRAZO CONTRATUAL: 240 DIAS DA ASS. DO CONTRATO - INICIO: 29/07/2015 TÉRMINO: 25/03/2016 PRAZO EXECUÇÃO: 180 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO: PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 180 DIAS INICIO: 20/03/2017 TÉRMINO: 16/09/2017. Adequação sendo: 1.1 ? Acréscimo no percentual de 10,52% e supressão de 2,20% para o Convênio nº 1014.34-09/2013; 1.2 ? Acréscimo percentual de 10,01% e supressão de 5,47% para o Convênio nº 1019.885-31/2014, que perfaz o valor de R$ 448.619,74 ao contrato nº 045/2015-SMOU. Fornecimento e fixação de piso intertravado tipo PAVER liso (10x20x6,0)cm, FCK=35MPa, com superficie lisa, sobre colhão de areia e=6cm. 12386,95 m² Contrapiso em concreto 20MPa preparo mecânico, espessura de 5,0cm, com armação em tela soldada e junta plástica de dilatação 10246,79 m² Piso cimentado desempenado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso pigmentado e espessura de 3,0cm, preparo mecânico 10246,79 m² Demolicao de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro 22988,20 m² Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 10x10x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. 6837,07 m Tapume OSB chapa 1,22x2,20x0,08 m -fornecimento e instalação 5923,59 m² Grelha arvoreira, corpo em ferro fundido pintado na cor padrão cinza grafite, 1,00 x 1,00m. Circunferência interna da abertura 0,50m - fornecimento e colocação 422,00 und Banco em chapa metálica plana 3/16" com pintura eletrostática e assento em madeira de lei com pintura em verniz, conforme projeto - fornecimento e instalação 302,00 und Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm 1315,73 m² Demolicao de piso em ladrilho com argamassa 10248,05 m² Brinquedo centopéia - 6 gangorra + Brinquedo balanço com 6 lugares + Brinquedo Dino com 4 escorregadores + Brinquedo caracol + Brinquedo escalada torcida + Brinquedo escada torcida - fornecimento e instalação 1,00 conj Limpeza final da obra 70270,21 m² Meio-fio de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. 2691,61 m Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 2,0cm com juntas plasticas de dilatacao e preparo manual da argamassa 2007,74 Engenheiro civil de obra Júnior (1 profissional) 6,00 meses Regularização e compactação de terreno com placa vibratória 22633,74 m² Retir. meio fio com empilhamento e s/ remoção. 12513,32 m Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distância

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
504977/2021
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

superiores a 4 km) 54991,46 m³xkm Vigia noturno (2 profissionais) 6,00 meses Mestre de obras (1 profissional) 6,00 meses Plantio de árvore pau pretinho/quaresmeira, altura igual ou maior que 2,00m, em cavas de 50x50x100cm 422,00 und Auxiliar Técnico - Segurança do Trabalho (1 profissional) 6,00 meses Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. Utilizacao de revolver (ar-comprimido). 2663,03 m² "Massa única, para recebimento de pintura e revestimento cerâmico, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. " 1091,36 m² Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 545,68 m² Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos 2007,74 m² Concreto ciclópico fck=10 Mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento 40,93 m³ Retirada de alambrado em tubo galvanizado Ø 2"x chapa 14 (2mm), com tela galvanizada malha 5x5 fio 12, emoldurada em cantoneira 1"x1/8"com acabamento em barra chata de 1/2"x 1/8". 1591,22 m² Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante 386,54 m² Pintura latex acrilica, para meio-fio, uma demão 1561,70 m² Instalação de Lixeira de coleta seletiva 50 litros com 2 cestos 156,00 und Corte e Destocamento de árvores D= 0,10 a 0,30m 199,00 und Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demão 1091,36 m² Lastro de areia media 146,83 m³ Apiloamento com maço de 30kg (fundo de vala / viga baldrame) 409,36 m² Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas maiores que 10m² sobre laje, não aderido, espessura 7cm, acabamento reforçado. Af_06/2014 166,00 m² Ladrilho Hidráulico de piso tátil, assentado com argamassa de cimento colante 70,78 m² Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo 84,87 m³ Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 272,84 m² Barracão de obra para alojamento/escritório/depósito, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias. Reaproveitado 5 vezes 16,00 m² Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura 542,26 m Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento 100,98 m³ Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³ 3956,22 m³ Sanitario com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 modulos e 4m2, paredes chapas de madeira compensada plastificada 10mm, telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, inclusive instalacao e aparelhos, reaproveitado 2 vezes 1,00 und Portão em alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm, inclusive guarnições 14,07 m² Conjunto para futebol de areia (par de traves oficial - 5,50x2,20m - em tubo de aço galv a fogo 3" com requadro e redes polietileno fio 4mm), fornecimento e instalação 1,00 und Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 5x. 95,52 m² Conjunto para futsal (par de traves oficial - 3,00x2,00m - em tubo de aço galv a fogo 3" com requadro e redes polietileno fio 4mm), fornecimento e instalação 1,00 und Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 16,20 m² Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) 55,29 m³ Concreto Fck=15Mpa, virado em betoneira, sem lançamento, com impermeabilizante 4,76 m³ Placa de obra em chapa de aço galvanizado 6,00 m² Par de tabelas de basquete em compensado naval de "1,80 x 1,20" m, com aro de metal e rede, fornecimento e instalação 2,00 und Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco galvanizado 3", h = "255" cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro fornecimento e instalação 1,00 und Luminária tipo Spot de aluminio injetado e pintura eletrostatica para piso, com lâmpada LED PAR 20 de 7W fornecimento e instalação 6,00 und Retirada de Bancos com sustentação em tubo de aço galvanizado chumbado em concreto 168,00 und "Ligações provisórias água / esgoto / elétrica / força Instalação/ligação provisória elétrica baixa tensão p/canteiro obra, m3-chave 100a carga 3kwh,20cv exclusive fornecimento de medidor" 1,00 und Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento 166,00 m² Placa inauguração em alumínio 0,40x0,60m fornecimento e colocação 1,00 und Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. 95,52 m² Eletroduto de PVC rigido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao 58,34 m Retirada de lixeira chumbado em concreto 84,00 und Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes 4,76 m³ Demolição de brinquedos em estrutura de madeira e metálica 12,00 und Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento 3,08 m³ Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 1,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalacao 116,03 m Remocao de pintura a oleo/esmalte sobre superficie metalica 6,86 m² Desativação de ponto hidráulico 1/2" ou 3/4" 16,00 und Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. Utilizacao de revolver (ar-comprimido). 3,43 m² Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 1000W fornecimento e instalação 1,00 und

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 287
Rúbrica

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 504977/2021
01/11/2021, 08:55
4cx60

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: 4cx60

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 05.943.030/0001-55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA BOA VISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 280 Rúbrica

ATESTADO DE SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO, atesta para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **Sávio Júlio Pereira Franco**, CREA 0907966128, acompanhou a execução da obra discriminada abaixo a nível de supervisão/fiscalização de obra pública no período de agosto/2015 a setembro/2017.

Processo: nº 061/2015 - SMOU - Portaria de Fiscalização nº 330/2015 de 17/08/2015 - Publicada no D.O.M. 3986 de 20/08/2015 - Objeto: Serviços de revitalização da Praça Ayrton Senna - 2ª e 3ª etapas, no município de Boa Vista-RR - sendo a 2ª etapa para recuperação de calçadas, recuperação de equipamentos recuperação de canteiros - **CT 1014.344-09/2013/MTUR e CT 1019.885-31/2013/MTUR / Concorrência nº 011/2015 / Contrato nº045/2015/SMOU / RR20150009191**

A Obra foi executada pela empresa **COEMA PAISAGISMO URBANIZAÇÃO & SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 04.236.920/0001-64, tendo como Responsável Técnico: **Eloy José dos Santos Júnior**, Eng. Civil CREA 5060506950/SP

2ª ETAPA - CONV. 1014.344-09/2013/MTUR/CAIXA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
I	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS - EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES INTERSINDICAIS		
1.1	Engenheiro civil de obra Júnior (1 profissional)	meses	6,00
1.2	Mestre de obras (1 profissional)	meses	6,00
1.3	Vigia noturno (2 profissionais)	meses	6,00
1.4	Auxiliar Técnico - Segurança do Trabalho (1 profissional)	meses	6,00
II	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
2.2	Barracão de obra para alojamento/escritório/depósito, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias. Reaproveitado 5 vezes	m²	16,00
2.3	Sanitario com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 modulos e 4m2, paredes chapas de madeira compensada plastificada 10mm, telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, inclusive instalacao e aparelhos. reaproveitado 2 vezes	und	1,00
2.4	Ligações provisórias água / esgoto / elétrica / força Instalação/ligação provisória elétrica baixa tensão p/canteiro obra, m3-chave 100a carga 3kwh,20cv exclusive fornecimento de medidor	und	1,00
2.5	Tapume OSB chapa 1,22x2,20x0,08 m -fornecimento e instalação	m²	5.779,40
III	DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
3.1	Retirada de meio fio com empilhamento e s/ remoção.	m	12.513,32
3.2	Demolicao de piso em ladrilho com argamassa	m²	10.248,05
3.3	Demolicao de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro	m²	22.876,15
3.4	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	m³	74,37
3.5	Desativação de ponto hidráulico 1/2" ou 3/4"	und	16,00
3.6	Retirada de Bancos com sustentação em tubo de aço galvanizado chumbado em concreto	und	168,00
3.7	Retirada de lixeira chumbado em concreto	und	84,00
3.8	Corte e Destocamento de árvores D= 0,10 a 0,30m	und	89,00
3.9	Demolição de brinquedos em estrutura de madeira e metálica	und	12,00
3.10	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	4.096,03
3.11	Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)	m³xkm	56.934,82
3.12	Demolição de Concreto simples	m³	13,31
IV	URBANIZAÇÃO		
4.1	Regularização e compactação de terreno com placa vibratória	m²	22.633,74
4.2	Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo	m³	447,21
4.3	Contrapiso em concreto 20MPa preparo mecânico, espessura de 5,0cm, com armação em tela soldada e junta plástica de dilatação	m²	10.246,79
4.4	Piso cimentado desempenado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso pigmentado e espessura de 3,0cm, preparo mecânico	m²	10.246,79
4.5	Fornecimento e fixação de piso intertravado tipo PAVER liso (10x20x6,0)cm, FCK=35MPa, com superfície lisa, sobre colchão de areia e=6cm.	m²	11.155,03

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 504977/2021, emitida em 01/11/2021

Certidão nº 504977/2021
02/05/2022, 23:12
Chave de Impressão: 4cx60

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2021 e contém 9 folhas

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 05.943.030/0001-55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA BOA VISTA

4.6	Meio-fio de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	2.691,61
4.7	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 10x10x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	6.837,07
4.8	Pintura latex acrilica, para meio-fio, uma demão	m²	726,74
4.9	Banco em chapa metálica plana 3/16" com pintura eletrostática e assento em madeira de lei com pintura em verniz, conforme projeto - fornecimento e instalação	und	302,00
4.10	Instalação de Lixeira de coleta seletiva 50 litros com 2 cestos	und	60,00
4.11	Grelha arvoreira, corpo em ferro fundido pintado na cor padrão cinza grafite, 1,00 x 1,00m. Circunferência interna da abertura 0,50m - fornecimento e colocação	und	422,00
4.12	Plantio de árvore para pretinho/quaresmeira, altura igual ou maior que 2,00m, em cavas de 50x50x100cm	und	422,00
4.13	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro (estacionamento)	m²	130,01
4.14	ATERRO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO	m³	724,31
4.15	FORNECIMENTO DE LIXEIRA DE COLETA SELETIVA 50 LITROS COM 2 CESTOS	und	60,00
V	**ACESSIBILIDADE**		
5.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro (simbolo de acessibilidade)	m²	16,20
5.2	Ladrilho Hidráulico de piso tátil, assentado com argamassa de cimento colante	m²	349,16
5.3	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 10x10x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	3.211,39
5.4	Pintura latex acrilica, para meio-fio, uma demão	m²	834,96
VI	**PLAYGROUND - 2° TRECHO**		
6.1	**BRINQUEDOS**		
6.1.1	Brinquedo centopéia - 6 gangorra + Brinquedo balanço com 6 lugares + Brinquedo Dino com 4 escorregadores + Brinquedo caracol + Brinquedo escalada torcida + Brinquedo escada torcida - fornecimento e instalação	conj	1,00
6.3	**PLAYGROUND - 2° TRECHO**		
6.3.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas maiores que 10m² sobre laje, não aderido, espessura 7cm, acabamento reforcado. Af_06/201-	m²	874,80
6.3.2	Piso Ecologico Duplo T EPDM 20mm, assentado com cola contato. Fornecimento e instalação.	m²	874,80
VII	**TÊNIS - 2° TRECHO**		
7.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
7.1.1	Retirada de alambrado em tubo galvanizado Ø 2"x chapa 14 (2mm), com tela galvânizada malha 5x5 fio 12, emoldurada em cantoneira 1"x1/8"com acabamento em barra chata de 1/2"x 1/8".	m²	181,08
7.1.2	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	18,10
7.1.3	Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)	m³xkm	251,59
7.2	**MOVIMENTO DE TERRA**		
7.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	6,84
7.2.2	Apilcamento com maço de 30kg (fundo de vala / viga baldrame)	m²	26,69
7.3	**INFRAESTRUTURA**		
7.3.1	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante	m²	21,41
7.3.2	Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 5x.	m²	10,56
7.3.4	Concreto Fck=15Mpa, virado em betoneira, sem lançamento, com impermeabilizante	m³	0,53
7.3.4	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m³	0,53
7.3.5	Concreto ciclópico fck=10 Mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento	m³	3,93
7.3.6	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demaos.	m²	10,56
7.4	**SISTEMAS DE VEDAÇÃO / REVESTIMENTOS/PINTURA**		
7.4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m²	39,30
7.4.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_05/2014	m²	78,60

Fls. 289
Rúbrica
PMUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 504977/2021, emitida em 01/11/2021

Certidão nº 504977/2021
02/05/2022 23:12
Chave de Impressão: 4cx60
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2021 e contém 9 folhas

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel. + 55 (95) 3623-6522 Fax. + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Impresso em: 02/05/2022, às 23:12

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 05.943.030/0001-55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

7.4.3	Massa única, para recebimento de pintura e revestimento cerâmico, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	78,60
7.4.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demão	m²	426,60
7.5	**ALAMBRADOS**		
7.5.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m²	135,24
7.5.2	Portão em alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm, inclusive guarnições	m²	2,61
7.5.3	Remocao de pintura a oleo/esmalte sobre superficie metalica	m²	233,17
7.5.4	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. Utilizacao de revolver (ar-comprimido).	m²	755,12
7.6	**PINTURA DO PISO**		
7.6.1	Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos	m²	1.591,65
7.6.2	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m	170,00
VIII	**LIMPEZA FINAL DE OBRA E DIVERSOS**		
8.1	Placa inauguração em alumínio 0,40x0,60m fornecimento e colocação	und	1,00
8.2	Limpeza final da obra	m²	70.270,21
8.3	**IRRIGAÇÃO 1° TRECHO**		
8.3.1	**Aspersores e válvulas**		
8.3.1.1	Bocal Rain Bird 10-HE-VAN	und	75,00
8.3.1.2	Bocal Rain Bird 12 HE-VAN	und	100,00
8.3.1.3	Bocal Rain Bird 15-SST	und	25,00
8.3.1.4	Bocal Rain Bird 15-HE-VAN	und	50,00
8.3.1.5	Bocal Rain Bird 15SST	und	50,00
8.3.1.6	Aspersor rotor Rain Bird 3504	und	80,00
8.3.1.7	Aspersor rotor Rain Bird 5004 Plus	und	254,00
8.3.1.8	Aspersor rotor Rain Bird 5004 Plus SAM	und	60,00
8.3.1.9	Aspersor spray esc. 4" p/ irrig. 1804	und	1.300,00
8.3.1.10	Aspersor spray esc. 4" p/ irrig. 1804 SAM c/ vál. Anti dreno	und	325,00
8.3.1.11	Bandeira p/ marc. Obra Rain Bird Verde	und	400,00
8.3.1.12	Bandeira p/ marc. Obra Rain Bird Amarela	und	130,00
8.3.1.13	Bandeira p/ marc. Obra Rain Bird Azul	und	200,00
8.3.1.14	Sistema p/ irrig. Raizes pequeno c/ borb. 1401 EWS para árvores	und	403,00
8.3.1.15	Rain Bird Válvula Hidraulica Rain Bird de 1" 100-DVF	und	7,00
8.3.1.16	Rain Bird Válvula Hidraulica Rain Bird de 1.1/2" 150-PGA Angle	und	35,00
8.3.1.17	Rain Bird Válvula Hidraulica Rain Bird de 2" 200-PGA Angle	und	6,00
8.3.1.18	Rain Bird CONTROLADOR P/ IRRIG/ ESPLXME 12 ESTAÇÕES 230 V	und	1,00
8.3.1.19	Rain Bird MODULO EXPANSÃO 12 ESTAÇÕES P/ CONTROL. ESP-LX M	und	1,00
8.3.1.20	Rain Bird MODULO EXPANSÃO 4 ESTAÇÕES P/ CONTROL. ESP-LX M	und	1,00
8.3.1.21	Rain Bird SENSOR DE CHUVA SEM FIO (INTERFACE + SENSOR) WR2RC	und	2,00
8.3.1.22	Conector SBA 075	und	1.400,00
8.3.1.23	Conector SBE 050	und	1.750,00
8.3.1.24	Conector SBE 075	und	1.650,00
8.3.1.25	CAIXA PARA VÁLVULA SOLENÓIDE DE 10" MOD VB10RND	und	46,00
8.3.1.26	CAIXA PARA VÁLVULA SOLENÓIDE DE 6" MOD. VB6RND	und	46,00
8.3.1.27	Conector Blindado mod. 3M 316 IR- p/ fio 1,5mm²	und	280,00
8.3.1.28	Tesoura p/ corte de tubo até 25mm mod. PCC 200x	und	4,00
8.3.1.29	Tubo flexivel Swing Pipe extra flexivel (bobina 30mts)	und	30,00
8.3.1.30	Regulador de pressão para válv. Sol. Mod. PRS-D	und	12,00
8.3.1.31	Boca Rain Bird 8-HE-VAN 180	und	1,00
8.3.1.32	Boca Rain Bird 9SST	und	13,00
8.3.1.33	Boca Rain Bird R1318 VAN	und	114,00
8.3.1.34	Boca Rain Bird R13-18F	und	38,00
8.3.1.35	Boca Rain Bird R13-18H	und	250,00
8.3.1.36	Boca Rain Bird R13-18Q	und	72,00
8.3.1.37	Boca Rain Bird R17-24 VAN	und	125,00
8.3.1.38	Boca Rain Bird R17-24F	und	43,00
8.3.1.39	Boca Rain Bird R17-24H	und	100,00
8.3.1.40	Boca Rain Bird R17-24Q	und	40,00

PREFEITURA BOA VISTA
Fls. 290
Rúbrica
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima vinculado à Certidão nº 504977/2021, emitida em 01/11/2021
Certidão nº 504977/2021
02/05/2022, 23:12
Chave de Impressão 4cx60
O documento nesta ato registrado foi emitido em 01/11/2021 e contém 9 folhas
Ateste a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Intern

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU -
Fls. 291
Rúbrica

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 05.943.030/0001-55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA BOA VISTA

8.3.1.41	Bocal Rain Bird U-10H	und	292,00
8.3.1.42	Bocal Rain Bird U-10Q	und	36,00
8.3.1.43	Bocal Rain Bird U-12F	und	2,00
8.3.1.44	Bocal Rain Bird U-12H	und	38,00
8.3.1.45	Bocal Rain Bird U-12Q	und	2,00
8.3.1.46	Bocal Rain Bird U-15H	und	4,00
8.3.1.47	Bocal Rain Bird U-15Q	und	3,00
8.3.1.48	Bocal Rain Bird U-8H	und	26,00
8.3.1.49	Bocal Rain Bird U-8Q	und	12,00
8.3.1.50	Bocal Rain Bird XFCN-180°	und	12,00
8.3.1.51	Marcador de vala com tinta spray 34"	und	3,00
8.3.1.52	Tinta de marcação a base de água	und	30,00
8.3.1.53	Selante branco oatey	und	5,00
8.3.1.54	Válvula de ar uma via 1" kinetic ARV-1-K-BSP	und	14,00
8.3.1.55	Válvula ventosa duplo efeitop 2" cepex (V51766)	und	4,00
8.3.1.56	Boca Rain Bird 8-HE-VAN	und	280,00
8.3.1.57	BOCAL P/ ASP. SPRAY 180 GRAUS 5H MPR	und	25,00
8.3.1.58	BOCAL P/ ASP. SPRAY 90 GRAUS 5Q MPR	und	25,00
8.3.1.59	BOCAL P/ ASP. SPRAY DE ÂNGULO AJUSTÁVEL (0-330) 6 VAN	und	25,00
8.3.1.60	Aspersor rotor Rain Bird 5012 Plus PRS/SAM	und	10,00
8.3.1.61	Aspersor spray esc. 4" p/ irrig. 1812	und	20,00
8.3.1.62	CONTROL. P/ IRRIG. MODULAR EXTERNO ESP-4ME 230V	und	1,00
8.3.1.63	MÓDULO EXPANSÃO 6 ESTAÇÕES P/ CONTROL. MODULAR ESP-ME	und	2,00
8.3.1.64	MÓDULO EXPANSÃO 3 ESTAÇÕES P/ CONTROL. MODULAR ESP-M	und	1,00
8.3.1.65	Conector para emenda SP100 SB-CPLG	und	100,00
8.3.1.66	FERRAMENTA LÂMINA REPOSIÇÃO TESOURA	und	1,00
8.3.1.67	FERRAMENTA PARA ASP/ SPRAY	und	2,00
8.3.2	**Bombeamento**		
8.3.2.1	BB SUB EBARA Mod. BHS 511-8 de 8cv 380v (Q = 18 m³/h e Amt=80mca)	und	1,00
8.3.2.2	Quadro de comando completo para BB Sub com variador de frequencia 8cv 380v.	und	1,00
8.3.2.3	Tubulação de sucção e recalque para BB sub. Inst. Vertical	und	2,00
8.3.2.4	Filtro Tela Auto Hidraulico 2" 200 mic 40m³/h	und	2,00
8.3.2.5	Válvula de Alivio 2" com pilot e manômetro	und	2,00
8.3.2.6	Cabos para ligação de comando de bomba	und	2,00
8.3.2.7	Sensor de Nivel (Eletrodo de nivel)	und	4,00
8.3.2.8	BB SUB EBARA Mod. BHS 511-7 de 7cv 380v (Q = 14 m³/h e Amt=75mca)	und	1,00
8.3.2.9	Quadro de comando compl. BB Sub Soft-star 7cv 380v.	und	1,00
8.3.3	**Tubulação**		
8.3.3.1	Tubo Agropec pbs pn 60 25 mm x 6mts	und	750,00
8.3.3.2	Tubo Agropec pbs pn 60 32 mm x 6mts	und	360,00
8.3.3.3	Tubo Agropec pbs pn 60 40 mm x 6mts	und	305,00
8.3.3.4	Tubo Irriga LF pbs 50mm PN80	und	200,00
8.3.3.5	Tubo Irriga LF pbs 75mm PN80	und	430,00
8.3.3.6	Adaptador Sold. Curto 50x 1-1/2"	und	72,00
8.3.3.7	Adaptador IRR 50mmx2"	und	22,00
8.3.3.8	Adaptador Sold 32 x 1"	und	20,00
8.3.4	**Cabeamento**		
8.3.4.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 1,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	9.100,00
8.3.4.2	Tubo Polietileno 3/4" com função eletroduto (Bobina 100mts)	und	14,50
8.3.4.3	Tubo Polietileno 1" com função eletroduto (Bobina 100mts)	und	3,00
8.3.4.4	Tubo Polietileno 1.1/4" com função eletroduto (Bobina 50mts)	und	9,00
8.3.5	**Mão de obra**		
8.3.5.1	Mão de obra de instalação do sistema de irrigação	und	1,81

VALOR DOS SERVIÇOS SUPERVISIONADOS/ AFERIDOS PELO FISCAL (2ª ETAPA): R$ 5.936.246,18 (cinco milhões, novecentos e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos).

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 504977/2021, emitida em 01/11/2021

Certidão nº 504977/2021
02/05/2022 23:12
Chave de Impressão 4cx60
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2021 e contém 9 folhas

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 05.943.030/0001-55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA BOA VISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 292
Rúbrica

3ª ETAPA - 1019.885-31/2014/MTUR/CAIXA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
IX	QUADRA BASQUET 2 TRECHO		
9.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
9.1.1	Retirada de alambrado em tubo galvanizado Ø 2"x chapa 14 (2mm), com tela galvanizada malha 5x5 fio 12, emoldurada em cantoneira 1"x1/8"com acabamento em barra chata de 1/2"x 1/8".	m²	274,00
9.1.2	Demolicao de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro	m³	1,26
9.1.4	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	29,92
9.1.5	Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)	m³xkm	415,89
9.2	MOVIMENTO DE TERRA		
9.2.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento	m²	166,00
9.3	MOVIMENTO DE TERRA		
9.3.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	2,85
9.3.2	Apiloamento com maço de 30kg (fundo de vala / viga baldrame)	m²	8,64
9.3.3	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m³	2,20
9.4	INFRAESTRUTURA		
9.4.1	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante	m²	2,16
9.4.2	Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 5x.	m²	12,96
9.4.3	Concreto Fck=15Mpa, virado em betoneira, sem lançamento, com impermeabilizante	m³	0,65
9.4.4	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m³	0,65
9.4.5	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m²	12,96
9.5	PAVIMENTAÇÃO		
9.5.1	Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo	m³	4,20
9.5.2	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante	m²	19,50
9.5.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas maiores que 10m² sobre laje, não aderido, espessura 7cm, acabamento reforçado. Af_06/2014	m²	19,50
9.5.4	Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 2,0cm com juntas plasticas de dilatacao e preparo manual da argamassa	m²	19,50
9.6	PINTURA DO PISO		
9.6.1	Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos	m²	665,31
9.6.2	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m	199,76
9.7	ACESSÓRIOS		
9.7.1	Par de tabelas de basquete em compensado naval de *1,80 x 1,20* m, com aro de metal e rede, fornecimento e instalação	und	1,00
9.7.2	Remocao de pintura a oleo/esmalte sobre superficie metalica	m²	3,43
9.7.3	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. Utilizacao de revolver (ar-comprimido).	m²	3,43
9.8	ALAMBRADOS		
9.8.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m²	333,15
9.8.2	Portão em alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm, inclusive guarnições	m²	2,90
9.8.3	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. Utilizacao de revolver (ar-comprimido).	m²	672,10
X	PISTA DE SKATE - 2º TRECHO		
10.1.1	Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 2,0cm com juntas plasticas de dilatacao e preparo manual da argamassa	m²	
10.1.2	Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos	m²	473,51
10.1.3	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m²	8,80
10.1.4	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_05/2014	m²	52,88
10.1.5	Massa única, para recebimento de pintura e revestimento cerâmico, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	52,88

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima vinculado à Certidão nº 504977/2021, emitida em 01/11/2021

Certidão nº 504977/2021
02/05/2022, 23:12
Chave de Impressão: 4cx60
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2021 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 462, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 293
Rúbrica

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 05.943.030/0001-55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA BOA VISTA

10.1 6	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demão	m²	52,88
10.1 7	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. Utilizacao de revolver (ar-comprimido).	m²	73,62
10.1 8	Demolicao de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro	m²	90,00
10.1 9	Contrapiso em Concreto FCK 15 Mpa traço 1:2,5:3 , espessura 7cm, preparo mecânico	m²	90,00
XI	**PLAYGROUND -2° TRECHO**		
11.1	**SERVICOS PRELIMINARES**		
11.1 1	Retirada de alambrado em tubo galvanizado Ø 2"x chapa 14 (2mm), com tela galvanizada malha 5x5 fio 12, emoldurada em cantoneira 1"x1/8"com acabamento em barra chata de 1/2"x 1/8".	m²	149,98
11.1 2	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	15,00
11.1 3	Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)	m³xkm	208,50
11.2	**MOVIMENTO DE TERRA**		
11.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	10,28
11.2.2	Apilcamento com maço de 30kg (fundo de vala / viga baldrame)	m²	40,24
11.2.3	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m³	3,51
11.3	**INFRAESTRUTURA**		
11.3 1	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante	m²	32,56
11.3 2	Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 5x.	m²	15,36
11.3 3	Concreto Fck=15Mpa, virado em betoneira, sem lançamento, com impermeabilizante	m³	0,77
11.3 4	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m³	0,77
11.3 5	Concreto ciclópico fck=10 Mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento	m³	6,00
11.3 6	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m²	15,36
11.4	**SISTEMAS DE VEDAÇÃO / REVESTIMENTOS/PINTURA**		
11.4 1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m²	60,00
11.4 2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	120,00
11.4 3	Massa única, para recebimento de pintura e revestimento cerâmico, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	120,00
11.4 4	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demão	m²	120,00
11.5	**ALAMBRADOS**		
11.5 1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m²	71,99
11.5 2	Portão em alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm, inclusive guarnições	m²	2,28
11.5 3	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. Utilizacao de revolver (ar-comprimido).	m²	148,54
11.6	**PAVIMENTAÇÃO**		
11.6 1	Lastro de areia media	m³	43,28
XII	**BICICROSS -2° TRECHO**		
12.1	**SERVICOS PRELIMINARES**		
12.1 1	Retirada de alambrado em tubo galvanizado Ø 2"x chapa 14 (2mm), com tela galvanizada malha 5x5 fio 12, emoldurada em cantoneira 1"x1/8"com acabamento em barra chata de 1/2"x 1/8".	m²	327,50
12.1 2	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	32,76
12.1 3	Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)	m³xkm	455,36
12.1 4	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	3.403,52
12.2	**MOVIMENTO DE TERRA**		
12.2 1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	21,54
12.2 2	Apilcamento com maço de 30kg (fundo de vala / viga baldrame)	m²	83,55
12.2 3	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m³	8,10
12.3	**INFRAESTRUTURA**		
12.3 1	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante	m²	64,99
12.3 2	Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 5x.	m²	27,84

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 5049772021, emitida em 01/11/2021

Certidão nº 5049772021
02/05/2022, 23:12
Chave de Impressão 4cx60
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2021 e contem 9 folhas

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 05.943.030/0001-55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA BOA VISTA

12.3.3	Concreto Fck=15Mpa, virado em betoneira, sem lançamento, com impermeabilizante	m³	1,37
12.3.4	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m³	1,37
12.3.5	Concreto ciclópico fck=10 Mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento	m³	12,07
12.3.6	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m²	27,84
12.4	**SISTEMAS DE VEDAÇÃO / REVESTIMENTOS/PINTURA**		
12.4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m²	120,70
12.4.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	279,71
12.4.3	Massa única, para recebimento de pintura e revestimento cerâmico, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	279,71
12.4.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demão	m²	279,71
12.5	**ALAMBRADOS**		
12.5.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m²	197,66
12.5.2	Portão em alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm, inclusive guarnições	m²	3,90
12.5.3	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. Utilizacao de revolver (ar-comprimido).	m²	410,92
12.6	**EQUIPAMENTOS**		
12.6.1	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m²	5,25
12.6.2	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. Utilizacao de revolver (ar-comprimido).	m²	41,47
12.7	**PAVIMENTAÇÃO**		
12.7.1	Contrapiso em Concreto FCK 15 Mpa traço 1:2,5:3 , espessura 7cm, preparo mecânico	m²	58,60
12.7.2	Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos	m²	58,60
XIII	**QUADRA POLIESPORTIVA - 3° TRECHO**		
13.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
13.1.1	Retirada de alambrado em tubo galvanizado Ø 2"x chapa 14 (2mm), com tela galvanizada malha 5x5 fio 12, emoldurada em cantoneira 1"x1/8"com acabamento em barra chata de 1/2"x 1/8".	m²	428,42
13.1.2	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	42,84
13.1.3	Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)	m³xkm	595,48
13.2	**MOVIMENTO DE TERRA**		
13.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	10,90
13.2.2	Apilcamento com maço de 30kg (fundo de vala / viga baldrame)	m²	42,84
13.2.3	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m³	3,65
13.3	**INFRAESTRUTURA**		
13.3.1	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante	m²	34,92
13.3.2	Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 5x.	m²	15,84
13.3.3	Concreto Fck=15Mpa, virado em betoneira, sem lançamento, com impermeabilizante	m³	0,79
13.3.4	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m³	0,79
13.3.5	Concreto ciclópico fck=10 Mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento	m³	6,46
13.3.6	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m²	15,84
13.4	**SISTEMAS DE VEDAÇÃO / REVESTIMENTOS/PINTURA**		
13.4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m²	149,76
13.4.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_05/2014	m²	299,52
13.4.3	Massa única, para recebimento de pintura e revestimento cerâmico, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	299,52
13.4.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demão	m²	299,52
13.	**ALAMBRADOS**		

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima vinculado à Certidão nº 504977/2021, emitida em 01/11/2021

Certidão nº 504977/2021
02/05/2022, 23:12
Chave de Impressão: 4cr60
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2021 e contém 9 folhas

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 05.943.030/0001-55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA BOA VISTA

13.5.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m²	341,12
13.5.2	Portão em alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm, inclusive guarnições	m²	2,61
13.5.3	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. Utilizacao de revolver (ar-comprimido).	m²	687,46
13.6	**PAVIMENTAÇÃO**		
13.6.1	Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 2,0cm com juntas plasticas de dilatacao e preparo manual da argamassa	m²	883,55
13.6.2	Demolicao de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro	m³	44,18
13.6.3	Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo	m³	176,71
13.6.4	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante	m²	883,55
13.6.5	Contrapiso em concreto 20MPa preparo mecânico, espessura de 5,0cm, com armação em tela soldada e junta plástica de dilatação	m²	883,55
13.7	**PINTURA DO PISO**		
13.7.1	Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos	m²	883,55
13.7.2	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m	342,50
13.8	**ACESSÓRIOS**		
13.8.1	Conjunto para futsal (par de traves oficial - 3,00x2,00m - em tubo de aço galv a fogo 3" com requadro e redes polietileno fio 4mm), fornecimento e instalação	und	1,00
13.8.2	Par de tabelas de basquete em compensado naval de *1,80 x 1,20* m, com aro de metal e rede, fornecimento e instalação	und	1,00
13.8.3	Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro - fornecimento e instalação	und	1,00
13.8.4	Remocao de pintura a oleo/esmalte sobre superficie metalica	m²	3,43
13.8.5	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. Utilizacao de revolver (ar-comprimido).	m²	3,43
XI	**FUTEBOL DE AREIA - 3º TRECHO**		
14.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
14.1.1	Retirada de alambrado em tubo galvanizado Ø 2"x chapa 14 (2mm), com tela galvanizada malha 5x5 fio 12, emoldurada em cantoneira 1"x1/8"com acabamento em barra chata de 1/2"x 1/8".	m²	462,55
14.1.2	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	46,26
14.1.3	Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)	m³xkm	643,01
14.2	**MOVIMENTO DE TERRA**		
14.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	25,00
14.2.2	Apilcamento com maço de 30kg (fundo de vala / viga baldrame)	m²	63,58
14.2.3	Reaterro compactacao manualmente (valas de fundações residenciais)	m³	14,24
14.3	**INFRAESTRUTURA**		
14.3.1	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante	m²	51,82
14.3.2	Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 5x.	m²	23,52
14.3.3	Concreto Fck=15Mpa, virado em betoneira, sem lançamento, com impermeabilizante	m³	1,18
14.3.4	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m³	1,18
14.3.5	Concreto ciclópico fck=10 Mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento	m³	9,58
14.3.6	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m²	23,52
14.4	**SISTEMAS DE VEDAÇÃO / REVESTIMENTOS/PINTURA**		
14.4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m²	215,22
14.4.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_05/2014	m²	430,44
14.4.3	Massa única, para recebimento de pintura e revestimento cerâmico, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	430,44
14.4.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demão	m²	430,44
14.5	**ALAMBRADOS**		

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima vinculado à Certidão nº 504977/2021, emitida em 01/11/2021

Certidão nº 504977/2021
02/05/2022 23:12
Chave de Impressão 4c960
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2021 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR

Impresso em: 02/05/2022 às 23:12

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 05.943.030/0001-55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA BOA VISTA

14.5	1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m²	469,54
14.5	2	Portão em alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm, inclusive guarnições	m²	2,38
14.5	3	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. Utilizacao de revolver (ar-comprimido).	m²	943,84
14.		**PAVIMENTAÇÃO**		
14.6	1	Lastro de areia media	m³	124,25
14.		**ACESSÓRIOS**		
14.7	1	Conjunto para futebol de areia (par de traves oficial - 5,50x2,20m - em tubo de aço galv a fogo 3" com requadro e redes polietileno fio 4mm), fornecimento e instalação	und	1,00
XV		**POÇO ARTESIANO**		
15.		**PERFURAÇÃO**		
15.1	1	Perfuração de poço artesiano com e revestimento com tubo geomecânico e vazão de 44.000 L/dia.	und	2,00
15.		**MURETA PADRÃO**		
15.2	1	Mureta padrão trifásica (1,00x1,80)m, em alvenaria, chapiscada, rebocada e pintada com tinta latex acrílico	und	2,00
15.		**CASA DE BOMBA**		
15.3	1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	0,70
15.3	2	Apilcamento com maço de 30kg (fundo de vala / viga baldrame)	m²	2,30
15.3	3	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante	m²	2,30
15.3	4	Forma tabua para concreto em fundação, c/ reeproveitamento 5x.	m²	5,52
15.3	5	Concreto Fck=15Mpa, virado em betoneira, sem lançamento, com impermeabilizante	m³	0,70
15.3	6	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m³	0,70
15.3	7	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m²	5,52
15.3	8	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m²	16,64
15.3	9	Contrapiso em concreto 20MPa preparo mecânico, espessura de 5,0cm, com armação em tela soldada e junta plástica de dilatação	m²	4,40
15.3	0	Piso cimentado desempenado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso pigmentado e espessura de 3,0cm, preparo mecânico	m²	4,40
15.3	1	Laje pré-moldada (inclusive capeamento esp.= 3cm e ferragem negativa) - (forma/desforma, armadura, preparo, lançamento e adensamento de concreto estrutural)	m²	9,34
15.3	2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_05/2014	m²	33,28
15.3	3	Massa única, para recebimento de pintura e revestimento cerâmico, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	33,28
15.3	4	Aplicação manual de pintura com tinta látex pvn em paredes, duas demão	m²	51,96
15.3	5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m²	2,00

VALOR DOS SERVIÇOS SUPERVISIONADOS/ AFERIDOS PELO FISCAL: R$ 601.605,07 (seiscentos e um mil, seiscentos e cinco reais e sete centavos).

Boa Vista-RR, 10 de agosto de 2020.

Jésus Eustáquio de Oliveira
Secretário Municipal de Obras – Adjunto
Engenheiro Civil CREA-MG 55014/D
CPF: 508.440.086-72

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

PMBV - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 296
Rúbrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima vinculado à Certidão nº 504977/2021, emitida em 01/11/2021

Certidão nº 504977/2021
02/05/2022, 23:12
Chave de Impressão: 4cx60
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2021 e contem 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

505037/2021

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo Técnico do profissional **SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA ... URAMUTÃ
fls. 297
Rubrica

Profissional: **SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO**
Registro: **1837D RR RR** RNP: **0907966128**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1000029993** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2014
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69000000
Contrato: Celebrado em: 09/09/2014
Valor do contrato: R$ 233.676,09 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - SMOU
Endereço da obra/serviço: RUA BAIRRO CENTENÁRIO RUA TURIM Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTENÁRIO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69300000
Data de início: 06/12/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 38 - ORÇAMENTO 1.00 metro quadrado;

Observações

ART DE REPROGRAMAÇÃO/ADEQUAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA COM ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS.DO CONTRATO 009/2012-SMOU.CONTRATADA: ALPHA ENGENHARIA. OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS NO BAIRRO CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR. CONVÊNIO N 348.961-87/2010 - FNAS, OS SERVIÇOS QUE FORAM REPROGRAMADOS E ADEQUADOS: RODAPÉ EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA 10CM (KORODUR); PEITORIL EM MARMORITE, LARGURA 18 CM; RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N18, LARGURA DE 30; CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N18, DESENVOLVIMENTO IGUAL A 80 CM; REBOCO TIPO PAULISTA NO RESPALDO DA ALVENARIA 79,77M; DIVISÓRIA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO, H=1,65 M; PORTA PARA DIVISÓRIA EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO, (0,60 X 1,60) M; PINTURA ACRÍLICA SEMIBRILHO, DUAS DEMÃOS (PORTAS); PINTURA ACRÍLICA SEMIBRILHO, TRÊS DEMÃOS, EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, VIGAS, LAJES E PILARES; PINTURA ACRÍLICA EM PISO, DUAS DEMÃOS (CALÇADAS); PINTURA DE LOGOMARCA GRANDE / PMBV; BANCADA DE GRANITO POLIDO, E=3,0 CM, LARGURA 45 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2X40W, COMPLETA, INCLUSIVE LÂMPADAS, REATORES E START S; PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2\" E CAIXA 4X2\" PONTO DE LUZ(CAIXA, ELETRODUTO E FIOS) VALOR INICIAL DA PROPOSTA: R$ 207.037,35 ? VALOR DOS SERVIÇOS ACRESCIDOS: R$ 40.137,59 ? VALOR DOS SERVIÇOS SUPRIMIDOS: R$ 13.498,85 ? VALOR DA DIFERENÇA= R$ 26.638,74 ? VALOR DO CONTRATO APÓS ADITIVO DE ADEQUAÇÃO/REPROGRAMAÇÃO: R$ 233.676,09 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS).

Número da ART: **RR20150001762** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/02/2015
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69000000
Contrato: Celebrado em: 09/09/2014
Valor do contrato: R$ 233.676,09 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - SMOU
Endereço da obra/serviço: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Data de início: 18/02/2015 Situação: atividade em andamento
Finalidade:

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

505037/2021

Atividade em andamento

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 298
Rubrica

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 17 - FISCALIZAÇÃO 1,00 metro quadrado;

Observações

ART DE REPROGRAMAÇÃO/ADEQUAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA COM ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS.DO CONTRATO 009/2012-SMOU,CONTRATADA: ALPHA ENGENHARIA. OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS NO BAIRRO CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR. CONVÊNIO N 348.961-87/2010 - FNAS. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 120 DIAS: INICIO 20/09/2014 TERMINO:18/01/2015. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RATIFICAÇÃO DO CONTRATO 32 DIAS: INICIO:17/01/2015 TERMINO:18/02/2015. DECIMO PRIMEIRO TERMO DO CONTRATO: 30 DIAS: INICIO: 18/02/2015 TERMINO:20/03/2015 DÉCIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: INICIO: OS SERVIÇOS QUE FORAM REPROGRAMADOS E ADEQUADOS: RODAPÉ EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA 10CM (KORODUR); PEITORIL EM MARMORITE, LARGURA 18 CM; RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N18, LARGURA DE 30; CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N18, DESENVOLVIMENTO IGUAL A 80 CM; REBOCO TIPO PAULISTA NO RESPALDO DA ALVENARIA 79,77M; DIVISÓRIA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO, H=1,65 M; PORTA PARA DIVISÓRIA EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO, (0,60 X 1,60) M; PINTURA ACRÍLICA SEMIBRILHO, DUAS DEMÃOS (PORTAS); PINTURA ACRÍLICA SEMIBRILHO, TRÊS DEMÃOS, EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, VIGAS, LAJES E PILARES; PINTURA ACRÍLICA EM PISO, DUAS DEMÃOS (CALÇADAS); PINTURA DE LOGOMARCA GRANDE / PMBV; BANCADA DE GRANITO POLIDO, E=3,0 CM, LARGURA 45 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2X40W, COMPLETA, INCLUSIVE LÂMPADAS, REATORES E START´S; PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2\" E CAIXA 4X2\" PONTO DE LUZ(CAIXA, ELETRODUTO E FIOS) VALOR INICIAL DA PROPOSTA: R$ 207.037,35 ? VALOR DOS SERVIÇOS ACRESCIDOS: R$ 40.137,59 ? VALOR DOS SERVIÇOS SUPRIMIDOS: R$ 13.498,85 ? VALOR DA DIFERENÇA= R$ 26.638,74 ? VALOR DO CONTRATO APÓS ADITIVO DE ADEQUAÇÃO/REPROGRAMAÇÃO: R$ 233.676,09 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS).

Informações Complementares

- Trata-se de acervo técnico parcial

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 505037/2021
16/12/2021, 21:35
ZWYaZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: ZWYaZ

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 05.943.030/0001-55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA BOA VISTA

Fls. 299
Rúbrica

ATESTADO DE SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO,** atesta para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **Sávio Júlio Pereira Franco,** CREA 0907966128, acompanhou a execução da obra discriminada abaixo a nível de supervisão/fiscalização de obra pública no período de abril/2015 a dezembro/2016.

Processo: nº 113/2014 - SMOU - Portaria de Fiscalização nº 148/2015 de 13/04/2015 - Publicada no D.O.M. 3905 de 17/04/2015 - **Objeto:** Serviços de demolição e construção de um restaurante na Orla Taumanan, no município de Boa Vista-RR - **RECURSOS PRÓPRIOS / TOMADA DE PREÇOS 013/2014 / Contrato nº 006/2015-SMOU / RR20150011122**

A Obra foi executada pela empresa **ARTESUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** , CNPJ 05.303.109/0001-11, tendo como Responsável Técnico: **Antonio Régis Neto,** Engenheiro Civil CREA 0406967105

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
I	**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES INTERSINDICAIS**	**(MÊS)**	
COMP. 001 EQUIPE + Encargos Complem. Intersindicais	Engenheiro de Obra Júnior + Encargos Complementares Intersindicais	meses	4.00
COMP. 002 EQUIPE + Encargos Complem. Intersindicais	Mestre de Obras + Encargos Complementares Intersindicais	meses	4.00
COMP. 003 EQUIPE + Encargos Complem. Intersindicais	Vigia Noturno + Encargos Complementares Intersindicais	meses	4.00
COMP. 004 EQUIPE + Encargos Complem. Intersindicais	PCMAT/PCMSO/PPRA	meses	4.00
IV	**CONSTRUÇÃO**		
4.5	**ALVENARIA E REVESTIMENTO**		
4.5.3	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	1.120.62
4.6	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.6.1	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	491.99
4.6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	m²	491.99
4.6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	337.68
4.7	**COBERTURA**		
4.7.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	527.59
4.7.2	COBERTURA COM TELHA TERMO ACÚSTICA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	m²	527.59
4.8	**PLATIBANDA**		
4.8.4	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	m	84.57
4.8.5	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	m	138.88
4.9	**ESQUADRIAS**		
4.9.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m²	13.74
4.9.2	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	m²	33.86
4.10	**PELE DE VIDRO E JANELAS**		

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima vinculado à Certidão nº 505037/2021, emitida em 16/12/2021

Certidão nº 505037/2021
05/07/2022, 14:56
Chave de Impressão ZVYaZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2021 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crea-rr.org.br

CREA-RR

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 05.943.030/0001-55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

4.10.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	97,64
4.10.2	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	m²	97,64
4.10.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	1,54
4.10.4	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	m²	1,54
4.10.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	0,98
4.10.6	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	m²	0,98
4.10.7	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	m²	38,51
4.11	**CALÇADA E JARDIM**		
4.11.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	76,30
4.11.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	115,64
4.11.3	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	m	57,57
4.12	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
4.12.1	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	un	1,00
4.12.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
4.12.3	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3.0M COM CONECTOR	un	3,00
4.12.4	MURETA PADRÃO TRIFÁSICA, EM ALVENARIA, CHAPISCADA, REBOCADA E PINTADA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, INCLUSIVE POSTE DE CONCRETO H=7,00 M. (MURETA DE 1,00X1,80M)	m²	1,80
4.13	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
4.13.1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	25,00
4.13.2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	16,00
4.13.3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	88,00
4.13.4	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
4.13.5	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO	un	2,00
4.13.6	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00
4.13.7	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
4.14	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**		
4.14.1	LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DETUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100X100MM E CURVA PVC 90GRAUS PARA REDE	un	3,00
4.14.2	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	24,15
4.14.3	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM	m²	3,20
4.14.4	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO	m	6,00
4.14.5	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	3,00
4.14.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	12,00
4.15	**RESERVATÓRIO**		
4.15.1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6,00
4.15.2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6,00

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 300
Rúbrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima vinculado à Certidão nº 5050037/2021, emitida em 16/12/2021

Certidão nº 5050037/2021
05/07/2022, 14:56
Chave de Impressão: ZWYaZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2021 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Impresso em: 05/07/2022, às 14:56.

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 05.943.030/0001-55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA BOA VISTA

4.15.3	RESERVATÓRIO DE ÁGUA, CAP=2000L COM ACESSÓRIOS	un	2,00
4.15.4	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
4.15.5	SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1	un	2,00
4.16	**PINTURA ÁREA EXTERNA**		
4.16.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	m²	1.326,72
4.16.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	1.326,72
4.16.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	1.326,72
4.16.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (escadaria)	m²	1.359,73
4.17	**DRENAGEM PLUVIAL**		
4.17.1	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	6,00
4.17.2	CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL	m	57,50
4.17.3	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	m²	34,50
4.17.4	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	24,00
4.17.5	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	91,00
4.17.6	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
4.17.7	CURVA DE PVC LONGA 90° ESGOTO DE 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
4.17.8	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	un	1,74
V	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
5.1	**LIMPEZA**		
5.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	540,48

VALOR DOS SERVIÇOS SUPERVISIONADOS/ AFERIDOS PELO FISCAL: R$ 890.161,73 (oitocentos e noventa mil, cento e sessenta e um reais e setenta e três centavos)

Boa Vista-RR, 10 de agosto de 2020.

Jésus Eustáquio de Oliveira
Secretário Municipal de Obras – Adjunto
Engenheiro Civil CREA-MG 55014/D
CPF: 508.440.086-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 301
Rúbrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505037/2021, emitida em 16/12/2021

Certidão nº 505037/2021
05/07/2022, 14:56
Chave de Impressão: ZWYaZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2021 e contem 3 folhas

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR

Impresso em: 05/07/2022, às 14:56.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

505038/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo Técnico do profissional **SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - Fls. 302 - Rúbrica

Profissional: **SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO**
Registro: **1837D RR RR** RNP: **0907966128**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **RR20180044074** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/06/2018 Baixada em: 16/07/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69000000
Contrato: 244/2018/SMO Celebrado em: 11/05/2018
Valor do contrato: R$ 7.791,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - SMOU
Endereço da obra/serviço: RUA RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69000000
Data de início: 11/05/2018 Conclusão efetiva: 06/01/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO** OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > #0623 - PLANIALTIMÉTRICO 17 - FISCALIZAÇÃO 278307.26 metro quadrado; **11 - SUPERVISÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRO COMPACTADO 17 - FISCALIZAÇÃO 145997.99 metro cúbico.

Observações

ART DE FISCALIZAÇÃO/SUPERVISÃO DE OBRA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS PA´S NOVA AMAZÔNIA E NOVA AMAZÔNIA I, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA – RR LOTE II- MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 031/2017. PROCESSO Nº 374/2017/SMO CONTRATO: 244/2018/SMO PRAZO CONTRATUAL. 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. PRAZO DE EXECUÇÃO:'180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇOS, INICIO: 11/05/2018 TERMINO:06/01/2019 Desmatamento e limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15m m² 537.886,80 Reconformação da plataforma há 8,19 Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide m² 278.307,26 Escavação, Carga e Transporte de Material com Dmt<50m m³ 89.876,36 Escavação e Carga de Material Laterítico de 1ª Categoria para aterro, inclusive aquisição m³ 92.621,13 Transporte local c/ basculante 10m3 rodovovia não pavimentada tonxkm 131.892,48 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 145.997,99 Regularização de sub-leito m² 196.427,00 Valetamento Lateral e Saidas D'água m 66.789,82 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento m³ 7.718,43 Aquisição de material de 1ª Cat. (piçarra) m³ 29.818,64 Transporte local c/ basculante 10m3 rodovovia não pavimentada tonxkm 450.781,42 Revestimento primário m³ 23.854,91 Corpo de BSTC Ø 0,60m sobre Berço de Concreto Ciclópico m 371,00 Corpo de BSTC Ø 0,80m sobre Berço de Concreto Ciclópico m 42,00 Corpo de BSTC Ø 1,00m sobre Berço de Concreto Ciclópico m 7,00 Boca de BSTC Ø 0,60m sobre Berço de Concreto Ciclópico und 106,00 Boca de BSTC Ø 0,80m sobre Berço de Concreto Ciclópico und 12,00 Boca de BSTC Ø 1,00m sobre Berço de Concreto Ciclópico und 2,00 Limpeza e desobstrução de bueiro und 10,00 Construção de Ponte de Madeira m 15,00 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ? 50 m) - Prenchimento da jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento m³ 7.718,43 Carga e descarga mecanizadas de entulho proveniente da limpeza lateral m³ 26.894,35 Transporte local c/ basculante 10m3 rodovovia não pavimentada tonxkm 32.273,22 Regularização de superfícies em terra com motoniveladora em áreas de empréstimo e jazidas m³ 26.894,35

Informações Complementares

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

505038/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 303
Rúbrica

Certidão de Acervo Técnico nº 505038/2021
07/07/2022, 06:27
9ZCBd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: 9ZCBd

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 05.943.030/0001-55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA BOA VISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 304
Rúbrica

ATESTADO DE SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO,** atesta para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **Sávio Júlio Pereira Franco,** CREA 0907966128, acompanhou a execução da obra discriminada abaixo a nível de supervisão/fiscalização de obra pública no período de maio/2018 a novembro/2018.

Processo: nº 374/2017 - SMO - Portaria de Fiscalização nº 262/2018 de 29/05/2018 - Publicada no D.O.M. 4654 de 04/06/2018 - Portaria de Destituição nº 736/2018 de 28/11/2018 - Publicada no D.O.M. 4775 de 04/12/2018. **Objeto:** Serviços de engenharia, para execução de obra de recuperação e complementação de estradas vicinais nos PA'S Nova Amazônia e Nova Amazônia I, localizados no município de Boa Vista – RR (Lote II) - **Convênio nº 008/2016/MDA/INCRA/PMBV / Concorrência nº 031/2017 / Contrato nº 244/2018/SMO / RR20180044074**

A Obra foi executada pela empresa **RPR ENGENHARIA LTDA - EPP,** CNPJ 34.802.090/0001-56, tendo como Responsável Técnico: **Robin Rivero Ribera,** Engenheiro Civil CREA 040755606-0 e **Pablo Rodrigo Rivero Villanueva,** Engenheiro Civil CREA 090004133-1

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
I	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos	UNID.	0.50
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (3,00 m x 2,00 m)	M²	6.00
1.3	Placa de identificação da Vicinal	M²	
1.4	Cavalete Metálico - Em chapa metálica nº 20, cantoneira 1/2"x1/8" e tubo industrial de 2"	UNID	6.00
1.5	Elaboração de estudos ambientais e apresentação do licenciamento ambiental para instalação da obra, expedido pelo órgão competente.	Km	39,76
1.6	Elaboração de projeto executivo de estradas vicinais	Km	40,96
1.6	**Canteiro de obras**		
1.6.1	Execução de escritório (padrão barracão de depósito) em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.	M²	8,01
1.6.2	Execução de Alojamento (padrão barracão de depósito) em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.	M²	21,30
1.6.3	Execução de almoxerifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras.	M²	12.93
1.6.4	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada.	M²	8.55
1.6.5	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016	M²	17.64
1.6.6	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.	M²	13.36
1.6.7	Instalação /ligação provisória elétrica baixa tensão p/canteiro obra, m3-chave 100a carga 3kwh,20cv exclusive fornecimento de medidor	UNID.	1.00
1.6.8	Instalação /ligação provisória de água e esgoto	UNID.	1.00
III	**TERRAPLENAGEM**		
3.1	Desmatamento e limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15m	M²	252.732,26
3.3	Serviços topográficos para pavimentacao, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m³	67.037,73
3.4	Escavação, Carga e Transporte de Material com Dmt<50m	m³	29.662,69
3.5	Escavação e Carga de Material Laterítico de 1ª Categoria para aterro, inclusive aquisição	m³	30.568,57
3.6	Transporte local c/ basculante 10m3 rodovovia não pavimentada	tonxkm	43.529,64
3.7	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m³	48.185,01
3.8	Regularização do sub-leito	m²	67.037,73
3.9	Valetamento Lateral e Saídas D'água	m	16.092,18
3.10	Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento	m³	2.547,38
IV	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
4.1	Aquisição de material de 1ª Cat. (piçarra)	m³	7.182,61
4.2	Transporte local c/ basculante 10m3 rodovovia não pavimentada	tonxkm	106.150,98
4.3	Revestimento primário	m³	5.746,09
V	**OBRAS DE ARTES CORRENTES (O.A.C.) E ESPECIAIS (O.A.E.)**		
5.1	Corpo de BSTC Ø 0,60m sobre Berço de Concreto Ciclópico	m	98,00
5.2	Corpo de BSTC Ø 0,80m sobre Berço de Concreto Ciclópico	m	7,00
5.3	Corpo de BSTC Ø 1,00m sobre Berço de Concreto Ciclópico	m	7,00
5.4	Boca de BSTC Ø 0,60m sobre Berço de Concreto Ciclópico	UND	28,00
5.5	Boca de BSTC Ø 0,80m sobre Berço de Concreto Ciclópico	UND	2,00
5.6	Boca de BSTC Ø 1,00m sobre Berço de Concreto Ciclópico	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505038/2021, emitida em 07/07/2022

Certidão nº 505038/2021
07/07/2022, 10:06
Chave de Impressão 9ZCBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2022 e contém 2 folhas

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 05.943.030/0001-55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA BOA VISTA

5.8	Construção de Ponte de Madeira	m	15,00
VI	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**		
6.2	Carga e descarga mecanizadas de entulho proveniente da limpeza lateral	m³	12.636,61
6.3	Transporte local c/ basculante 10m3 rodovovia não pavimentada	tonxkm	15.163,94

VALOR DOS SERVIÇOS SUPERVISIONADOS/ AFERIDOS PELO FISCAL.: R$ 1.442.986,43 (hum milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos).

Boa Vista-RR, 10 de agosto de 2020.

Jésus Eustáquio de Oliveira
Secretário Municipal de Obras – Adjunto
Engenheiro Civil CREA-MG 55014/D
CPF: 508.440.086-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 305
Rúbrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 505038/2021, emitida em 07/07/2022

Certidão nº 505038/2021
07/07/2022, 10:06
Chave de Impressão 9ZCBG
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2022 e contém 2 folhas

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR

Impresso em: 07/07/2022 às 10:06.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

507427/2022

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo Técnico do profissional **SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 300
Rúbrica

Profissional: **SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO**
Registro: **1837D RR RR** RNP: **0907966128**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **RR20220099367** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/04/2022 Baixada em: 09/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ** CPF/CNPJ: **01.612.681/0001-01**
Endereço do contratante: RUA CICI Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: UIRAMUTÃ UF: RR CEP: 69358970
Contrato: 060/2022 Celebrado em: 25/04/2022
Valor do contrato: R$ 328.840,02 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA CICI Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: UIRAMUTÃ UF: RR CEP: 69358970
Data de início: 25/04/2022 Conclusão efetiva: 24/07/2022
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ CPF/CNPJ: 01.612.681/0001-01

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 76.89 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRA, OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÓKO XIE MACUXI- COMUNIDADE CAMARARÉM- UIRAMUTÃ/RR, DE ACORDO COM AS QUANTITATIVAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO CONTRATO Nº 060/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONTRATO Nº:026/2021, RECURSO PRÓPRIO, PRAZO CONTRATUAL: 90 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIO:25/04/2022, TERMINO:24/07/2022. VALOR DA OBRA: 328.840,02 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E DOIS CENTAVOS).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 507427/2022
09/09/2022, 12:36
W341y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: W341y

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 307 Rúbrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBJETO
Construção da Escola Municipal Indígena Kôko Xie Macuxi – Comunidade Camararém - Uiramutã/RR

PRAZO CONTRATUAL: 90 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO

VALOR DA OBRA: 328.840,02 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E DOIS CENTAVOS)

Declaramos por meio deste e para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.
Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os projetos, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória, conforme contido nos autos do Processo Administrativo nº 0060/2022, na modalidade Carta Convite Contrato nº 026/2021, Recurso Próprio.

CONTRATANTE EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	CNPJ:	01.612.681/0001-01
ENDEREÇO:	RUA CICI MOTA, S/N, S/N, CENTRO, UIRAMUTÃ-RR, CEP 69.358-970.		

CONTRATO	
OBJETO:	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKO XIE MACUXI, COMUNIDADE CAMARAREM, UIRAMUTA/RR,
LOCAL:	COMUNIDADE CAMARAREM, UIRAMUTA/RR, CEP 69.358-970.
PERÍODO:	DATA DE INÍCIO: 25/04/2022 DATA DE TÉRMINO: 24/07/2022

CONTRATADO			
NOME/RAZÃO SOCIAL:	A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI	CNPJ:	37.170.148/0001-57
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ENG. CIVIL SAVIO JULIO PEREIRA FRANCO	CREA:	060786612-8
ART EXECUÇÃO:	RR20220099367		

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	90778	SINAPI	Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares	H	96,00
1.2	93572	SINAPI	Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares	MES	3,00
2			ALIMENTAÇÃO CANTEIRO		
2.1	3126	ORSE	Alimentação Para Trabalhador Por Dia (1 Refeição Diaria - Jantar)	un	1.182,00
3			DIVERSOS		
3.1	00010848	SINAPI	Placa De Inauguração Metálica 0,40 X 0,60m. Fornecimento E Colocação	UN	1,00
3.2	00010851	SINAPI	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	UN	6,00

Rua: Cici Mota s/nº - Uiramutã/RR, Centro - CEP: 69.358-015, CNPJ: 01.612.681/0001-01

Digitalizado com CamScanner

Atesto a Veracidade Deste documento Consulte Via Internet

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 507427/2022, emitida em 09/09/2022

Certidão nº 507427/2022
12/09/2022, 12:23
Chave de Impressão: W341y
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-8522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crea-rr.org.br

CREA-RR

Impresso em: 12/09/2022, às 12:23

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 306 Rúbrica

3.3	11397	ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metalon de 20x20cm, fornecida e instalada	un	1,00
3.4	00010527	SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	90,45
4			**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**		
4.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	3,60
4.2	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00
4.3	11125	ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00
4.4	62	ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias	un	1,00
4.5	99059	SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	35,00
4.6	98524	SINAPI	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	m²	2.500,00
4.7	9203	ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	11.391,75
4.8	100948	SINAPI	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade TXKM). Af_07/2020	TXKM	4.492,52
5			**INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES**		
5.1	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	9,80
5.2	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	7,00
5.3	92263	SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	16,20
5.4	92415	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	16,20
5.5	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e=5em preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	9,80
5.6	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	2,80
5.7	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	2,80
5.8	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	29,76
5.9	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	173,12
6			**INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME**		
6.1	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	0,66
6.2	96539	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	34,78
6.3	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e=5em preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	9,40
6.4	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,87
6.5	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	1,87
6.6	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	KG	52,97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 507427/2022, emitida em 09/09/2022

Certidão nº 507427/2022
12/09/2022, 12:23
Chave de Impressão: W341y
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 11 folhas.

Rua: Cici Mota s/nº - Uiramutã/RR, Centro - CEP: 69.309-015, CNPJ: 01.612.681/0001-01

Digitalizado com CamScanner

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 309 Rúbrica

6.7	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	118,70
6.8	87502	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	15,93
6.9	98557	SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	m²	43,65
7			**SUPERESTRUTURA - PILARES**		
7.1	92263	SINAPI	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	41,44
7.2	92415	SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	41,44
7.3	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,34
7.4	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,34
7.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	45,63
7.6	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	152,50
8			**SUPERESTRUTURA - VIGAS**		
8.1	92265	SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	28,88
8.2	92455	SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	28,88
8.3	94965	SINAPI	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	1,74
8.4	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,74
8.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	44,43
8.6	92776	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	74,19
9			**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**		
9.1	87515	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	176,32
9.2	93201	SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	55,83
9.3	93186	SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	13,00
9.4	93188	SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	6,00
9.5	93196	SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	13,00
10			**REVESTIMENTO**		
10.1	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	352,64
10.2	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	271,28

Rua: Cici Mota s/nº - Uiramutã/RR, Centro - CEP: 69.309-015, CNPJ: 01.612.681/0001-01

Digitalizado com CamScanner

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 507427/2022, emitida em 09/09/2022

Certidão nº 507427/2022
12/09/2022, 12:23
Chave de Impressão: W341y
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contem 11 folhas

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 310 Rúbrica

10.3	87528	SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de taliscа	m²	81,36
10.4	87268	SINAPI	Revestimento cerâmico de 25x35cm, aplicado em parede em ambientes com area menor que 5m²	m²	81,36
11			**PINTURA**		
11.1	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	352,64
11.2	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	m²	176,32
11.3	8624	ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrilica em paredes, duas demãos	m²	176,32
11.4	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos	m²	43,26
12			**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**		
12.1	87515	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	1,20
12.2	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	2,60
12.3	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	2,60
12.4	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	3,98
12.5	8624	ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrilica em paredes, duas demãos	m²	3,98
12.6	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	3,98
12.7	94965	SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	0,46
12.8	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	0,46
12.9	100701	SINAPI	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições Af_12/2019	m²	1,00
13			**COBERTURA**		
13.1	283	ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com composto de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	104,90
13.2	92540	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	104,90
13.3	94223	SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com composto de resina, incluso acessório de fixação e içamento	M	51,24
13.4	55960	SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	104,90
13.5	4449	ORSE	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e roda forro	m²	77,88
14			**PAVIMENTAÇÃO**		
14.1	96995	SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	26,23
14.2	87696	SINAPI	Contrapiso de concreto, não estrutural, e =5cm, preparo com betoneira	m²	65,61
14.3	87630	SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	65,61

Rua: Cici Mota s/nº - Uiramutã/RR, Centro - CEP: 69.389-015, CNPJ: 01.612.681/0001-01

Digitalizado com CamScanner

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 5074272022, emitida em 09/09/2022

Certidão nº 5074272022
12/09/2022, 12:23
Chave de Impressão: W341y
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 11 folhas

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 311 Rúbrica

10.3	87528	SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	m²	81,36
10.4	87268	SINAPI	Revestimento cerâmico de 25x35cm, aplicado em parede em ambientes com area menor que 5m²	m²	81,36
11			**PINTURA**		
11.1	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	352,64
11.2	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	m²	176,32
11.3	8624	ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrilica em paredes, duas demãos	m²	176,32
11.4	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	43,20
12			**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**		
12.1	87515	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	1,20
12.2	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	2,60
12.3	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	2,60
12.4	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	3,98
12.5	8624	ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrilica em paredes, duas demãos	m²	3,98
12.6	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	3,98
12.7	94965	SINAPI	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	0,46
12.8	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m²	0,46
12.9	100701	SINAPI	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. Af_12/2019	m²	1,00
13			**COBERTURA**		
13.1	283	ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	104,90
13.2	92540	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	104,90
13.3	94223	SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessório de fixação e içamento	M	51,24
13.4	55960	SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	104,90
13.5	4449	ORSE	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e roda forro	m²	77,68
14			**PAVIMENTAÇÃO**		
14.1	96995	SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	26,23
14.2	87690	SINAPI	Contrapiso de concreto, não estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	65,61
14.3	87630	SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	65,61

Rua: Cici Mota s/nº - Uiramutã/RR, Centro - CEP: 69.309-015, CNPJ: 01.612.681/0001-01

Digitalizado com CamScanner

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 507427/2022, emitida em 09/09/2022

Certidão nº 507427/2022
12/09/2022, 12:23
Chave de Impressão: W341y

O documento nesta ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 312
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRMUTÃ

14.4	87247	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês, classificação PEI IV, cor branca, assentamento com argamassa colante tipo AC-I	m²	65,61
15			**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**		
15.1	98689	SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	M	4,50
15.2	88648	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm	M	16,06
15.3	101965	SINAPI	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	M	9,80
16			**CALÇADA DE PROTEÇÃO**		
16.1	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	5,97
16.2	96995	SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	6,78
16.3	87502	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	19,99
16.4	94994	SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	62,84
16.5	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	25,92
16.6	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	25,92
17			**ESQUADRIAS**		
17.1	90823	SINAPI	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	5,00
17.2	94562	SINAPI	Janela de aço de correr com 4 folhas para vidro, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva, exclusive vidros, alizar e contramarco, fornecimento e instalação. af_12/2019	m²	9,40
17.3	94559	SINAPI	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva, exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco, fornecimento e instalação. af_12/2019	m²	0,48
18			**LOUÇAS E METAIS**		
18.1	2390	ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	un	2,00
18.2	8974	ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pes de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	un	2,00
18.3	95546	SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	UN	2,00
18.4	86931	SINAPI	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2,00
18.5	00000377	SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	UN	2,00
18.6	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	UN	3,00
18.7	2050	ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	un	2,00
18.8	2103	ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	un	1,00
18.9	2104	ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,40m com 01 cuba deslocada a direita, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7 cm, concretada e assentada	un	1,00
19			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		

Rua: Cici Mota s/nº - Uiramutã/RR, Centro - CEP: 69.309-015, CNPJ: 01.612.681/0001-01

Digitalizado com CamScanner

Atesto a Veracidade Deste documento Consulta via Internet

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 507427/2022, emitida em 09/09/2022

Certidão nº 507427/2022
12/09/2022 12:23
Chave de Impressão W341y
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contem 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 313
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRMUTÃ

19.1	93243	SINAPI	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saida, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	UN	1,00
19.2	89446	SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	M	28,00
19.3	89448	SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	M	16,10
19.4	90443	SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	14,35
19.5	89362	SINAPI	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	UN	8,40
19.6	89364	SINAPI	Curva 90° soldável 25 mm água fria	UN	2,00
19.7	90373	SINAPI	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	11,00
19.8	1144	ORSE	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	un	6,00
19.9	89497	SINAPI	Joelho 90° soldável 40mm água fria	UN	3,00
19.10	1466	ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	3,00
19.11	89383	SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	UN	14,00
19.12	1470	ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	1,00
19.13	89395	SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	6,00
19.14	89420	SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	1,00
19.15	89623	SINAPI	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	UN	5,00
19.16	3147	ORSE	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	1,00
19.17	94491	SINAPI	Registro de esfera soldável 40mm	UN	1,00
19.18	94489	SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	UN	1,00
19.19	74166/001	SINAPI	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao	UN	1,00
19.20	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,00
20			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**		
20.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	M	9,10
20.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	12,40
20.3	89714	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	28,00
20.4	90443	SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	8,40
20.5	89796	SINAPI	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	3,00
20.6	1588	ORSE	Tê sanitário em PVC rigido soldavel para esgoto prunario, dn 100 x 50 mm	un	1,00
20.7	89785	SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	1,00
20.8	1603	ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	un	15,00
20.9	1554	ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	un	10,00
20.10	89744	SINAPI	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	UN	4,00
20.11	89732	SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	UN	1,00
20.12	89726	SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	UN	2,00
20.13	89750	SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	2,00
20.14	89735	SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	2,00
20.15	89709	SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	3,00
20.16	89707	SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no mínimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	UN	3,00
20.17	1536	ORSE	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	2,00

Rua: Ciri Mota s/nº - Uiramutã/RR, Centro - CEP: 69.369-015, CNPJ: 01.612.681/0001-01

Digitalizado com CamScanner

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 507427/2022, emitida em 09/09/2022

Certidão nº 507427/2022
12/09/2022, 12:23
Chave de Impressão W341y
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 314
Rubrica
PMU

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRMUTÃ

20.18	98078	SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diametro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	1,00
20.19	98082	SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	1,00
20.20	2798	ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforçada, revestida internamente com barra lisa e fundo em concreto	un	6,00
21			**COMBATE A INCÊNDIO**		
21.1	101909	SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	2,00
21.2	10363	ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	2,00
21.3	11852	ORSE	Placa de sinalização padrão para saida de emergência 400x120mm	Un	1,00
22			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
22.1	91940	SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	46,00
22.2	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO	M	62,60
22.3	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: BRANCO.	M	76,60
22.3	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	52,60
22.4	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	142,20
22.5	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	142,20
22.6	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	82,60
22.7	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERDE.	M	188,30
-	-	-	-	-	-
22.8	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	153,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 507427/2022, emitida em 09/09/2022

Certidão nº 507427/2022
12/09/2022 12:23
Chave de Impressão: W341y
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 11 folhas

Rua: Cici Mota s/nº - Uiramutã/RR, Centro - CEP: 69.309-015, CNPJ: 01.612.681/0001-01

Digitalizado com CamScanner

Atesto a Veracidade Deste documento Consulte Via Internet

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel.: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR

Impresso em: 12/09/2022, às 12:23

PMUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 315
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRMUTÃ

20.18	98078	SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	1,00
20.19	98082	SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	1,00
20.20	2798	ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforçada, revestida internamente com barra lisa e fundo em concreto	un	6,00
21			**COMBATE A INCÊNDIO**		
21.1	101909	SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	2,00
21.2	10363	ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	2,00
21.3	11852	ORSE	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Un	1,00
22			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
22.1	91940	SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	46,00
22.2	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO	M	62,60
22.3	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: BRANCO.	M	76,60
22.5	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO	M	52,60
22.4	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	142,20
22.5	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	142,20
22.6	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	82,60
22.7	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERDE.	M	188,30
22.8	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	153,90

Rua: Cici Mota s/nº - Uiramutã/RR, Centro - CEP: 69.309-015, CNPJ: 01.612.681/0001-01

Digitalizado com CamScanner

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 507427/2022, emitida em 09/09/2022

Certidão nº 507427/2022
12/09/2022, 12:23
Chave de Impressão: W341y
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contem 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 316
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRMUTÃ

22.9	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	40,00	
22.10	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	40,00	
22.11	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERDE.	M	40,00	
22.12	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	40,00	
22.13	2794	ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	un	3,00	
22.14	91993	SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	UN	14,00	
22.15	91973	SINAPI	Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,00	
22.16	91957	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,00	
22.17	91969	SINAPI	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,00	
22.18	91953	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	2,00	
22.19	91959	SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	1,00	
22.20	12241	ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	
22.21	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	UN	8,00	
22.22	93662	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	UN	6,00	
22.23	10237	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	un	2,00	
22.24	91863	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	M	75,00	
22.25	91864	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	M	9,40	
22.26	91871	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	M	50,20	
22.27	91872	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	M	6,00	
22.28	91873	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	M	36,00	
22.29	90447	SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	M	57,80	

Rua: Cici Mota s/nº - Uiramutã/RR, Centro - CEP: 69.389-015, CNPJ: 01.612.681/0001-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 5074427/2022, emitida em 09/09/2022

Certidão nº 5074427/2022
12/09/2022, 12:23
Chave de Impressão: W341y
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 11 folhas

Digitalizado com CamScanner

Atesto a Veracidade Deste documento Forma Consulta Internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 317
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRMUTÃ

22.30	8324	ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 100W	un	18,00
22.31	97607	SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acrílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W	UN	5,00
22.32	97610	SINAPI	lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_ af_02/2020	UN	13,00
22.33	97599	SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	UN	3,00
22.34	96985	SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por eletrodeposição anódica e pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco, diâmetro de 5/8" e comprimento de 3,0m. Conforme as normas NBR 13571/96 e UL-467.	UN	3,00
22.35	96977	SINAPI	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR 5111.	M	10,00
22.36	4192	ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	un	2,00
22.37	4014	ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20 (vinte) metros de comprimento, conforme norma ABNT NBR NM 60454-3, tipo 5, Classe A, 90°C, espessura de 0,19mm e isolação para até 750V.	Un	3,00
22.38	4015	ORSE	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação, cor preta, espessura de 0,76mm, para isolação até 69kV. Rolos de 19mm de largura com 10 (dez) metros de comprimento	Un	3,00
22.39	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	4,50
22.40	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	4,50
22.41	101502	SINAPI	Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_p	UN	1,00
22.42	100619	SINAPI	Poste decorativo para jardim em aço tubular, h = *2,5* m, sem luminária - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	2,00

Era o que tínhamos a atestar.

Uiramutã-RR, 21 de maio de 2022

Engº Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA-RR nº 090504068
Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR
Portaria nº230, 01/07/2021

Silvano dos Santos
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR

Benisio Roberto De Sousa
Prefeito Municipal de Uiramutã

Rua: Cici Mota s/nº - Uiramutã/RR, Centro - CEP: 69.309-015, CNPJ: 01.612.681/0001-01

Digitalizado com CamScanner
Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 507427/2022, emitida em 09/09/2022
Certidão nº 507427/2022
12/09/2022, 12:23
Chave de Impressão: W341y
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contem 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 310
Rúbrica

ANEXO IV

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022 Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA.

CREDENCIAMENTO DE VISITA TÉCNICA

Prezados (as) Senhores (as),

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.170.418/0001-57, com sede situada em Boa Vista-RR, à Avenida Santos Dumont, Nº 2180, sala 01, Bairro: Trinta e Um de Março, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Anselmo Almeida Feitosa de Sousa**, portador da Carteira de Identidade nº 228.693 SSP/RR e inscrito no CPF nº 498.100.903-82, vem pela presente, informar a V. Sas. que o Engenheiro Civil, **SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO** , CREA/RR Nº 0907966128, é a pessoa designada para representar nossa empresa na visita técnica da Licitação acima referida.

Por ser verdade, firma o presente.

Boa Vista-RR, 24 de outubro de 2022.

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
RG228.693 SSP/RR
SÓCIO ADMINISTRADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 319
Rúbrica

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022 Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA.

VISITA TÉCNICA

O abaixo assinado, responsável legal pela empresa **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME** vem pela presente, informar a V. Sas. que o Responsável Técnico **SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO**, CREA Nº **0907966128,** é a pessoa designada para representar nossa empresa na visita técnica prevista no item 6.1.3, letra G do Edital, da Licitação acima referida.

Por ser verdade, firma o presente.

Boa Vista-RR, 24 de outubro de 2022.

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
RG 228.693 SSP/RR
SÓCIO ADMINISTRADOR

PMU - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 320
Rúbrica

ANEXO I

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022 Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA BÁSICA / DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE

Prezados (as) Senhores (as),

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.170.418/0001-57, com sede situada em Boa Vista-RR, à Avenida Santos Dumont, Nº 2180, sala 01, Bairro: Trinta e Um de Março, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Anselmo Almeida Feitosa de Sousa**, portador da Carteira de Identidade n° 228.693 SSP/RR e inscrito no CPF n° 498.100.903-82, declara ter disponibilidade de pessoal técnico especializado e compromete-se a compor a Equipe Técnica Básica aqui relacionada, caso o objeto da licitação venha a ser contratado com a mesma.

RELAÇÃO EQUIPE TÉCNICA	
NOME	**ESPECIALIZAÇÃO**
SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO	Engenheiro Civil CREA/RR Nº 0907966128

Por ser verdade, firma o presente.

Boa Vista-RR, 24 de outubro de 2022.

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
RG228.693 SSP/RR
SÓCIO ADMINISTRADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 321
Rúbrica

ANEXO II

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022 Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

Prezados (as) Senhores (as),

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.170.418/0001-57, com sede situada em Boa Vista-RR, à Avenida Santos Dumont, Nº 2180, sala 01, Bairro: Trinta e Um de Março, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Anselmo Almeida Feitosa de Sousa**, portador da Carteira de Identidade nº 228.693 SSP/RR e inscrito no CPF nº 498.100.903-82, declara ter disponibilidade de máquinas e equipamentos considerados essenciais para o adequado cumprimento do objeto da licitação e compromete-se a utilizá-los, caso o objeto venha a ser contratado com a mesma.

Por ser verdade, firma o presente.

Boa Vista-RR, 24 de outubro de 2022.

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
RG228.693 SSP/RR
SÓCIO ADMINISTRADOR

SOUSA & SOUSA
CONSTRUÇÕES

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc.Mun. 972928.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 327
Rúbrica

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA

Av. Santos Dumont, 2180, Sala. 01 - Bairro 31 de Março - CEP 69.305-340 - Boa Vista / RR
Telefone: (095) 99131-2944 | @sousasousaconstrucoes | E-mail:anselmosousa663@gmail.com

Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências

(Primeira e Segunda Instâncias)

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima CERTIFICA que, revendo os registros de Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências, nas comarcas deste Estado, até a presente data, NADA CONSTA contra:

NOME: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI
CPF/CNPJ: 37.170.418/0001-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 32
Rúbrica

OBSERVAÇÕES:
1) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Portaria Presidencial nº 493, do dia 09 de abril de 2014;
2) A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
3) A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;
4) As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça de Roraima, e, ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
5) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RR, pelo endereço http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa, informando o número de autenticidade abaixo.
6) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 2 (dois)anos após a sua expedição.

Número de Autenticidade: 020915984973
Emitida gratuitamente pela internet em: 06/10/2022 as 07:00
Data da última atualização da base de dados: 04/10/2022 as 00:26
Válida até o dia: 05/12/2022

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 324
Rúbrica

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA					
NIRE:	1420014859-3	CNPJ:	37.170.418/0001-57	NIRE Anterior:	1460001915-4
Nome Anterior:					
A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI					

Municipio:	BOA VISTA	UF:	RORAIMA
Inscrição	240404041	Inscrição Municipal:	9729283
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		18/05/2020	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	57
Data	16/05/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA	Administrador	
174.069.271-34	FELIX ALVES DE ARAUJO	Contador	000251

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Roraima
Junta Comercial do Estado de Roraima



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracteristicas abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20005185 em 17/05/2022. Assinado digitalmente por Fyama Maria Pimentel Barreiros. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/005.538-6	HXqC

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA
Nire:	
CNPJ:	37.170.418/0001-57
Município:	BOA VISTA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA		16/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Certificado Digital

174.069.271-34	FELIX ALVES DE ARAUJO	000251	16/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Certificado Digital

SRM

Documento assinado eletronicamente por Fyama Maria Pimentel Barreiros, Servidor(a) Público(a), em 17/05/2022, às 09:27.

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Roraima
Junta Comercial do Estado de Roraima

PMUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 328
Rúbrica

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Boa Vista. terça-feira, 17 de maio de 2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 22/005.538-6.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 327 Rúbrica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
14200148593	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Roraima

Nome: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RRE2200071236

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

BOA VISTA
Local

20 Maio 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 328
Rúbrica

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/005.796-6	RRE2200071236	20/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA	20/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
174.069.271-34	FELIX ALVES DE ARAUJO	20/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Empresa: **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA**
C.N.P.J.: 37.170.418/0001-57
Insc. Junta Comercial: 14200148593 Data: 23/11/2021
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 2180, SALA 1, TRINTA E UM DE MARCO, BOA VISTA/RR, CEP 69305-340
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanço encerrado em: 31/12/2021
Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 20005185 Data: 17/05/2021

Folha: 0001
Número: 0002

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RORAIMA
Fls. 329
Rúbrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**500.343,60D**
ATIVO CIRCULANTE	**500.343,60D**
DISPONÍVEL	**345.643,60D**
CAIXA	**325.910,09D**
CAIXA GERAL	325.910,09D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**19.733,51D**
BANCO DO BRASIL	19.733,51D
ESTOQUE	**154.700,00D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**154.700,00D**
MATÉRIA-PRIMA - OBRAS	154.700,00D
PASSIVO	**500.343,60C**
PASSIVO CIRCULANTE	**8.666,13C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**1.180,46C**
EMPRÉSTIMOS	**1.180,46C**
EMPRÉSTIMO BB - CAPITAL DE GIRO	1.180,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**7.485,67C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**7.485,67C**
SIMPLES A RECOLHER	7.485,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**491.677,47C**
CAPITAL SOCIAL	**200.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**200.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**291.677,47C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**291.677,47C**
LUCROS ACUMULADOS	186.035,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	105.642,10C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 500.343,60 (quinhentos mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0054 a 0056 do Livro Diário nº 0002, registrado na Junta Comercial do Estado RR sob nº 20005185, em 17/05/2022;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente

BOA VISTA-RR, 31 de Dezembro de 2021

ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 498.100.903-82

FELIX ALVES DE ARAUJO
Reg. no CRC - RR sob o No. 000251RR
CPF: 174.069.271-34

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 541694 em 20/05/2022 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 220057966 - 20/05/2022. Autenticação: 3B7F93C3FBE5158FCB8A7CF62E1A8EBEB31B2B4. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.796-6 e o código de segurança EqPK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

Empresa: **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA**
C.N.P.J.: 37.170.418/0001-57
Insc. Junta Comercial: 14200148593 Data: 23/11/2021
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 2180, SALA 1, TRINTA E UM DE MARCO, BOA VISTA/RR, CEP 69305-340
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0002

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 330
Rúbrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS	583.527,05	583.527,05	583.527,05
Deducoes			
(-) ISS	(13.223,59)		
(-) SIMPLES	(17.481,36)	(30.704,95)	(30.704,95)
Receita Liquida			552.822,10
Custos dos Serviços Prestados			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - OBRAS			
MATERIAIS DIRETOS	(286.608,90)	(286.608,90)	(286.608,90)
Lucro Bruto			266.213,20
Despesas Administrativas			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
TELEFONE	(1.624,83)		
SEGUROS	(76,50)		
ENERGIA ELÉTRICA	(5.373,76)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(49.900,00)	(56.975,09)	(56.975,09)
Despesas Tributarias			
IMPOSTOS DIVERSOS	(1.027,04)	(1.027,04)	(1.027,04)
Despesas Financeiras			
JUROS E MULTAS DE MORA	(744,89)		
TARIFAS	(1.451,72)	(2.196,61)	(2.196,61)
Outras Despesas Operacionais			
DESPESAS GERAIS	(90.037,95)		
TITULOS DIVERSOS	(10.334,41)	(100.372,36)	(100.372,36)
Resultado operacional líquido			105.642,10
Resultado Antes do IR			105.642,10
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			105.642,10

BOA VISTA-RR, 31 de Dezembro de 2021

ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 498.100.903-82

FELIX ALVES DE ARAUJO
Reg. no CRC - RR sob o No. 000251RR
CPF: 174.069.271-34

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 541694 em 20/05/2022 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA. CNPJ 37170418000157 e protocolo 220057966 - 20/05/2022. Autenticação: 3B7F93C3FBE5158FCB8A7CF62E4A8EBEB31B2B4. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.796-6 e o código de segurança EqPK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

Empresa: **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA**
Inscrição: 37.170.418/0001-57
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 2180, SALA 1, TRINTA E UM DE MARCO, BOA VISTA/RR, CEP 69305-340
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 14200148593 Data: 23/11/2021

Folha: 0000
Número Livro: 0002

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMOI - Fls. 33 Rúbrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	500.343,60 + 0,00	57,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.666,13 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	500.343,60	57,74
	Passivo Circulante	8.666,13	
Índice de Solvência Geral	Ativo	500.343,60	57,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.666,13 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.666,13 + 0,00	0,02
	Ativo	500.343,60	

ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 498.100.903-82

FELIX ALVES DE ARAUJO
Reg. no CRC - RR sob o No. 000251RR
CPF: 174.069.271-34

Atesto a Veracidade Deste documento Consulte Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 541694 em 20/05/2022 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 220057966 - 20/05/2022. Autenticação: 3B7F93C3FBE5158FCB8A7CF62E4A8EBEB31B2B4. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.796-6 e o código de segurança EqPK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 33
Rúbrica

NOTA EXPLICATIVA

RETIFICAR O PROCESSO 22/005614-1 DE REGISTRO SOB O N.º 541482 EM 17/05/2022,

PARA INCLUSÃO NO PROCESSO DE BALANÇO O ANEXO:

- INDICES DOS COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021.

ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 498.100.903-82

FELIX ALVES DE ARAUJO
Reg. no CRC - RR sob o No. 000251RR
CPF: 174.069.271-3

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 541694 em 20/05/2022 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 220057966 - 20/05/2022. Autenticação: 3B7F93C3FBE5158FCB8A7CF62E4A8EBEB31B2B4. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.796-6 e o código de segurança EqPK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 339
Rúbrica

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/005.796-6	RRE2200071236	20/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA	20/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
174.069.271-34	FELIX ALVES DE ARAUJO	20/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU - Fls. 334 Rúbrica

Eu, FELIX ALVES DE ARAUJO, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 26/11/1957, RG Nº 018469 SSP-MT, CPF 174.069.271-34, RUA ALFREDO CRUZ, Nº 78, BAIRRO CENTRO, CEP 69301-140, BOA VISTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 20 de maio de 2022.

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

FELIX ALVES DE ARAUJO
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 541694 em 20/05/2022 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 220057966 - 20/05/2022. Autenticação: 3B7F93C3FBE5158FCB8A7CF62E4A8EBEB31B2B4. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.796-6 e o código de segurança EqPK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU -
Fls. 335
Rúbrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA, de CNPJ 37.170.418/0001-57 e protocolado sob o número 22/005.796-6 em 20/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 541694, em 20/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ITALO IAGO REIS DE ARAÚJO.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, MARCOS DE MEIRA LINS FILHO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA	20/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
174.069.271-34	FELIX ALVES DE ARAUJO	20/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA	20/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
174.069.271-34	FELIX ALVES DE ARAUJO	20/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
174.069.271-34	FELIX ALVES DE ARAUJO	20/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de inicio dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/05/2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 22/005.796-6.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 336
Rúbrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por ITALO IAGO REIS DE ARAÚJO, Servidor(a) Público(a), em 20/05/2022, às 12:43.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 22/005.796-6.

Afesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PMUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 337
Rúbrica

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
664.933.154-68	MARCOS DE MEIRA LINS FILHO

Boa Vista. sexta-feira, 20 de maio de 2022

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 541694 em 20/05/2022 da Empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA, CNPJ 37170418000157 e protocolo 220057966 - 20/05/2022. Autenticação: 3B7F93C3FBE5158FCB8A7CF62E4A8EBEB31B2B4. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.796-6 e o código de segurança EqPK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 336
Rúbrica

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA					
NIRE:	1420014859-3	CNPJ:	37.170.418/0001-57	NIRE Anterior:	1460001915-4
Nome Anterior:					
Município:	BOA VISTA			UF:	RORAIMA
Inscrição	240404041		Inscrição Municipal:		9729283
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/05/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	16/05/2022
Quantidade de páginas:	57		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA	Administrador	
174.069.271-34	FELIX ALVES DE ARAUJO	Contador	000251

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 339
Rúbrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

Certidão n.º: RR/2022/00001515
Nome: FELIX ALVES DE ARAUJO CPF: 174.069.271-34
CRC/UF n.º RR-000251/O Categoria: CONTADOR
Validade: 09.01.2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **174.069.271-34** Controle : **8852.1735.2304.3873**

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Roraima
Junta Comercial do Estado de Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 340 Rúbrica

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1420014859-3	37.170.418/0001-57	18/05/2020	18/05/2020

Endereço Completo:

AVENIDA SANTOS DUMONT 2180 SALA 1 - BAIRRO 31 DE MARCO CEP 69305-340 - BOA VISTA/RR

Objeto Social:

OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE FUNDACOES, ADMINISTRACAO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORARIAS, OBRAS DE ALVENARIA, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Capital Social: R$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
498.100.903-82	ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA	xxxxxxx	R$ 200.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 20/05/2022 Número: 541694

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA	1410030157-8	14600019154	xx	TRANSFORMACAO
A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI	1460001915-4	14200148593	xx	TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCERR (http://www.jucerr.rr.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220000330983 e visualize a certidão)

22/011.706-3

Atesto a Veracidade Deste documento Conforme Consulta Via Internet

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Roraima
Junta Comercial do Estado de Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 341
Rúbrica

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Boa Vista, 11 de Outubro de 2022 10:00

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCERR (http://www.jucerr.rr.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220000330983 e visualize a certidão)

22/011.706-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 342
Rúbrica

SOUSA & SOUSA
CONSTRUÇÕES

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc.Mun. 972928.3

OUTROS DOCUMENTOS

Av. Santos Dumont, 2180, Sala. 01 - Bairro 31 de Março - CEP 69.305-340 - Boa Vista / RR
Telefone: (095) 99131-2944 | @sousasousaconstrucoes | E-mail:anselmosousa663@gmail.com

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC Nº 004/2022

VALIDADE: 07/03/2023

RAZÃO SOCIAL: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 37.170.418/0001-57 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 972928.3**

ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT NR 2180 SALA 1/ TRINTA E UM DE MARÇO / BOA VISTA / RR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 43.13-4-00 – Obras e terraplenagem.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: 41.20-4-00 – Construção de edifícios 42.12-0-00 – Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 – Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 – Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 – Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-03 – Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-99 – Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 – Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 – Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 – Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 – Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 – Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 – Obras de fundações

CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Rúbrica Fls. 343

43.99-1-01 – Administração de obras 43.99-1-02 – Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 – Obras de alvenaria 43.99-1-05 – Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 – Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 – Transporte escolar 71.11-1-00 – Serviços de arquitetura 71.12-0-00 – Serviços de engenharia 71.19-7-01 – Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 – Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-99 – Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.31-4-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 – Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 – Atividades paisagísticas 85.99-6-04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial .

Uiramutã/RR, 07 de março de 2022.

Sandro da Silva Mafra
Presidente da CPL
Portaria 02A/2022

Sandro da Silva Mafra
Presidente da CPL

CONFERE COM ORIGINAL
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

CERTIFICO QUE A EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA CPL DE UIRAMUTÃ/RORAIMA

ANEXO VI

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022 Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA.

DECLARAÇÃO DE TOTAL SUBMISSÃO AO EDITAL

Prezados (as) Senhores (as),

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.170.418/0001-57, com sede situada em Boa Vista-RR, à Avenida Santos Dumont, Nº 2180, sala 01, Bairro: Trinta e Um de Março, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Anselmo Almeida Feitosa de Sousa**, portador da Carteira de Identidade nº 228.693 SSP/RR e inscrito no CPF nº 498.100.903-82, Declaro para os devidos fins, a minha total submissão ao Edital Tomada de Preços 012/2022, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO-COMUNIDADE SÃO LUIZ /RR.**

Por ser verdade, firma o presente.

Boa Vista-RR, 24 de outubro de 2022.

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
RG 228.693 SSP/RR
SÓCIO ADMINISTRADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 345
Rúbrica

ANEXO VII

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022 Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Prezados (as) Senhores (as),

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.170.418/0001-57, com sede situada em Boa Vista-RR, à Avenida Santos Dumont, Nº 2180, sala 01, Bairro: Trinta e Um de Março, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Anselmo Almeida Feitosa de Sousa**, portador da Carteira de Identidade nº 228.693 SSP/RR e inscrito no CPF nº 498.100.903-82, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firma o presente.

Boa Vista-RR, 24 de outubro de 2022.

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
RG 228.693 SSP/RR
SÓCIO ADMINISTRADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 346
Rúbrica

ANEXO VIII

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022 Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Prezados (as) Senhores (as),

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.170.418/0001-57, com sede situada em Boa Vista-RR, à Avenida Santos Dumont, Nº 2180, sala 01, Bairro: Trinta e Um de Março, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Anselmo Almeida Feitosa de Sousa**, portador da Carteira de Identidade nº 228.693 SSP/RR e inscrito no CPF nº 498.100.903-82, DECLARA, sob as penas da lei, para surtir efeito junto à Prefeitura do Município de Uiramutã, no procedimento licitatório sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, que **não** incide na proibição contida no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.

Por ser verdade, firma o presente.

Boa Vista-RR, 24 de outubro de 2022.

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
RG 228.693 SSP/RR
SÓCIO ADMINISTRADOR

PMU - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 347
Rúbrica

ANEXO IX

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022 Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Prezados (as) Senhores (as),

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.170.418/0001-57, com sede situada em Boa Vista-RR, à Avenida Santos Dumont, Nº 2180, sala 01, Bairro: Trinta e Um de Março, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Anselmo Almeida Feitosa de Sousa**, portador da Carteira de Identidade n° 228.693 SSP/RR e inscrito no CPF n° 498.100.903-82, declara para os devidos fins que na presente data a mesma se encontra enquadrada nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 de 14/12/2006, que trata do Regime das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estando apta, portanto a sua participação no processo n ° 134/2022, tomada de preço n° 012/2022, junto ao Município de Uiramutã.

Por ser verdade, firma o presente.

Boa Vista-RR, 24 de outubro de 2022.

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
RG228.693 SSP/RR
SÓCIO ADMINISTRADOR

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 348
Rúbrica

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022 Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Prezados (as) Senhores (as),

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.170.418/0001-57, com sede situada em Boa Vista-RR, à Avenida Santos Dumont, Nº 2180, sala 01, Bairro: Trinta e Um de Março, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Anselmo Almeida Feitosa de Sousa**, portador da Carteira de Identidade nº 228.693 SSP/RR e inscrito no CPF nº 498.100.903-82, DECLARA em atendimento ao **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 012/2022**, que esta documentação de habilitação possui folhas numeradas de _____ a _____ incluindo este termo.

Por ser verdade, firma o presente.

Boa Vista-RR, 24 de outubro de 2022.

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
RG 228.693 SSP/RR
SÓCIO ADMINISTRADOR

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 348
Rubrica
PMU

MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR

PREFEITURA MUNICIPAL UIRAMUTÃ/RR.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 349
Rubrica

TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2022.

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.170.418/0001-57
Av: Santos Dumond, nº2180, sala 01, 31 de Março.
Boa Vista – Roraima – Brasil.

ABERTURA EM: 24/10/2022 às 08h30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 350
Rúbrica

ANEXO X

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022 Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados (as) Senhores (as),

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.170.418/0001-57, com sede situada em Boa Vista-RR, à Avenida Santos Dumont, Nº 2180, sala 01, Bairro: Trinta e Um de Março, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Anselmo Almeida Feitosa de Sousa**, portador da Carteira de Identidade nº 228.693 SSP/RR e inscrito no CPF nº 498.100.903-82, DECLARA que concorda e submete-se a todos os termos do edital da Tomada de Preço nº 012/2022 e vem, apresentar PROPOSTA DE PREÇOS conforme planilha em anexo com a discriminação dos quantitativos, valores unitários, valores de mão-de-obra e materiais, valor final de R$ 494.948,16 (quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos).

Nos preços apresentados já estão incluídos todos os encargos tributários, previdenciários, trabalhistas e todos os demais custos para a prestação dos serviços objeto da licitação.
O prazo máximo de execução é de 02 (dois) meses, observado o cronograma físico-financeiro da Prefeitura Municipal de Uiramutã.
A presente proposta tem prazo de validade de 60 dias a contar da data da entrega das propostas, excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

Por ser verdade, firma o presente.

Boa Vista-RR, 24 de outubro de 2022.

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
RG 228.693 SSP/RR
SÓCIO ADMINISTRADOR

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 35
Rúbrica

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022 Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Prezados (as) Senhores (as),

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.170.418/0001-57, com sede situada em Boa Vista-RR, à Avenida Santos Dumont, Nº 2180, sala 01, Bairro: Trinta e Um de Março, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Anselmo Almeida Feitosa de Sousa**, portador da Carteira de Identidade nº 228.693 SSP/RR e inscrito no CPF nº 498.100.903-82, DECLARA, sob as penas da lei, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME**, CNPJ/MF sob o nº 37.170.418/0001-57, e que o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
c) que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, no que diz respeito a participação ou não no presente certame;
d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto do referido certame;
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da CPL do município de Uiramutã-RR, antes da abertura oficial das propostas; e
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser verdade, firma o presente.

Boa Vista-RR, 24 de outubro de 2022.

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
RG 228.693 SSP/RR
SÓCIO ADMINISTRADOR

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 352
Rúbrica

SOUSA & SOUSA
CONSTRUÇÕES

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc.Mun. 972928.3

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022 Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA.

DECLARAÇÃO

Prezados (as) Senhores (as),

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.170.418/0001-57, com sede situada em Boa Vista-RR, à Avenida Santos Dumont, Nº 2180, sala 01, Bairro: Trinta e Um de Março, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Anselmo Almeida Feitosa de Sousa**, portador da Carteira de Identidade nº 228.693 SSP/RR e inscrito no CPF nº 498.100.903-82, DECLARA que os preços propostos correspondem a todas as despesas concernentes ao objeto da licitação, incluindo frete, impostos, taxas e outros encargos de qualquer natureza.

Por ser verdade, firma o presente.

Boa Vista-RR, 24 de outubro de 2022.

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
RG 228.693 SSP/RR
SÓCIO ADMINISTRADOR

EM BRANCO

PMU MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 353
Rúbrica

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI
CNPJ 37.170.148/0001-57

SOUSA & SOUSA

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha_ Município de Uiramutã/ RR

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Roraima
ORSE - 07/2022 - Sergipe

B.D.I.
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**21.819,22**	**4,41 %**
1.1	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	107,38	134,15	8.585,60	1,73 %
1.2	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	5.295,15	6.616,81	13.233,62	2,67 %
2		**ALIMENTAÇÃO CANTEIRO**					**20.673,18**	**4,18 %**
2.1	3126 ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	1.182,00	14,00	17,49	20.673,18	4,18 %
3		**DIVERSOS**					**14.924,32**	**3,02 %**
3.1	00010848 SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	UN	1,00	1.341,68	1.676,56	1.676,56	0,34 %
3.2	00010851 SINAPI	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	UN	6,00	70,83	88,50	531,00	0,11 %
3.3	11397 ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	un	1,00	750,00	937,20	937,20	0,19 %
3.4	00010527 SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	90,45	13,20	16,49	1.491,52	0,30 %
3.5	2412 ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	un	8,00	783,36	978,88	7.831,04	1,58 %
3.6	2450 ORSE	Limpeza geral (final da obra)	m²	900,00	2,19	2,73	2.457,00	0,50 %
4		**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**					**45.418,89**	**9,18 %**
4.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	3,60	550,87	688,35	2.478,09	0,50 %
4.2	6096 ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	613,28	766,35	766,35	0,15 %
4.3	11125 ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	2.205,77	2.756,33	2.756,33	0,56 %
4.4	62 ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em	un	1,00	14.992,56	18.734,70	18.734,70	3,79 %
4.5	99059 SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento.	M	35,00	42,57	53,19	1.861,65	0,38 %
4.6	98524 SINAPI	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m²	900,00	2,60	3,24	2.916,00	0,59 %
4.7	9203 ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	15.729,81	0,50	0,62	9.752,48	1,97 %
4.8	100948 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.397,63	0,92	1,14	6.153,29	1,24 %
5		**INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES**					**22.718,58**	**4,59 %**
5.1	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	7,80	68,75	85,91	670,09	0,14 %
5.2	96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	2,00	41,68	52,08	104,16	0,02 %
5.3	92263 SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	26,20	147,28	184,04	4.821,84	0,97 %
5.4	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	26,20	119,45	149,26	3.910,61	0,79 %
5.5	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lançamento e adensamento	m²	14,80	37,80	47,23	699,00	0,14 %
5.6	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,80	726,75	908,14	4.359,07	0,88 %
5.7	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,80	191,34	239,09	1.147,63	0,23 %
5.8	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	39,76	21,73	27,15	1.079,48	0,22 %
5.9	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	273,12	17,37	21,70	5.926,70	1,20 %
6		**INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME**					**24.532,96**	**4,96 %**
6.1	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	1,66	68,75	85,91	142,61	0,03 %
6.2	96539 SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	36,78	111,41	139,21	5.120,14	1,03 %
6.3	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lançamento e adensamento	m²	13,40	37,80	47,23	632,88	0,13 %
6.4	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,87	726,75	908,14	4.422,64	0,89 %
6.5	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,87	191,34	239,09	1.164,36	0,24 %
6.6	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	62,97	21,73	27,15	1.709,53	0,35 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 354
Rúbrica

6.7	92777 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 8.0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	148,70	19,41	24,25	3.605,97	0,73 %
6.8	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	25,93	160,45	200,49	5.198,70	1,05 %
6.9	98557 SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	m²	53,65	37,83	47,27	2.536,03	0,51 %
7		**SUPERESTRUTURA - PILARES**					**30.051,78**	**6,07 %**
7.1	92263 SINAPI	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44	147,28	184,04	11.307,41	2,28 %
7.2	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44	119,45	149,26	9.170,53	1,85 %
7.3	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	3,34	726,75	908,14	3.033,18	0,61 %
7.4	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,34	191,34	239,09	798,56	0,16 %
7.5	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5.0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	65,63	21,73	27,15	1.781,85	0,36 %
7.6	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10.0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	182,50	17,37	21,70	3.960,25	0,80 %
8		**SUPERESTRUTURA - VIGAS**					**21.246,57**	**4,29 %**
8.1	92265 SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	38,88	117,63	146,99	5.714,97	1,15 %
8.2	92455 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	38,88	128,86	161,02	6.260,45	1,26 %
8.3	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	3,74	726,75	908,14	3.396,44	0,69 %
8.4	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,74	191,34	239,09	894,19	0,18 %
8.5	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5.0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	65,43	21,73	27,15	1.776,42	0,36 %
8.6	92776 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6.3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	124,19	20,65	25,80	3.204,10	0,65 %
9		**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**					**35.019,46**	**7,08 %**
9.1	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de	m²	203,04	116,45	145,51	29.544,35	5,97 %
9.2	93201 SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal	M	55,83	6,24	7,79	434,91	0,09 %
9.3	93186 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	23,00	66,32	82,87	1.908,01	0,39 %
9.4	93188 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	22,00	57,57	71,93	1.582,46	0,32 %
9.5	93196 SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros	M	19,00	65,36	81,67	1.551,73	0,31 %
10		**REVESTIMENTO**					**41.475,24**	**8,38 %**
10.1	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3	m²	406,08	7,65	9,55	3.878,06	0,78 %
10.2	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante	m²	406,08	36,80	45,98	18.671,55	3,77 %
10.3	87528 SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor	m²	111,36	43,62	54,50	6.069,12	1,23 %
10.4	87274 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	m²	111,36	92,39	115,45	12.856,51	2,60 %
11		**PINTURA**					**16.190,39**	**3,27 %**
11.1	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	406,08	2,30	2,87	1.165,44	0,24 %
11.2	88497 SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	m²	203,04	14,27	17,83	3.620,20	0,73 %
11.3	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	203,04	17,44	21,79	4.424,24	0,89 %
11.4	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta acetinada em paredes, duas demãos.	m²	406,08	13,76	17,19	6.980,51	1,41 %
12		**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**					**2.896,19**	**0,59 %**
12.1	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de	m²	1,20	116,45	145,51	174,61	0,04 %
12.2	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	2,60	7,65	9,55	24,83	0,01 %
12.3	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	2,60	36,80	45,98	119,54	0,02 %
12.4	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	3,98	2,30	2,87	11,42	0,00 %
12.5	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	3,98	17,44	21,79	86,72	0,02 %
12.6	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	3,98	13,76	17,19	68,41	0,01 %
12.7	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	1,46	726,75	908,14	1.325,88	0,27 %
12.8	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,46	191,34	239,09	349,07	0,07 %
12.9	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICÕES, AF 12/2019	m²	1,00	588,76	735,71	735,71	0,15 %
13		**COBERTURA**					**42.002,35**	**8,49 %**
13.1	283 ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com composito de resina, 2,30x 0,88	m²	185,13	61,23	76,51	14.164,29	2,86 %
13.2	92540 SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	185,13	54,03	67,51	12.498,12	2,53 %
13.3	94223 SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e icamento	M	32,24	111,49	139,31	4.491,35	0,91 %
13.4	55960 SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	185,13	6,03	7,53	1.394,02	0,28 %
13.5	4449 ORSE	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro.	m²	130,57	57,95	72,41	9.454,57	1,91 %
14		**PAVIMENTAÇÃO**					**42.873,37**	**8,66 %**
14.1	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com	m³	19,57	41,68	52,08	1.019,20	0,21 %
14.2	87690 SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	130,57	58,26	72,80	9.505,49	1,92 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 353
Rúbrica

14.3	87630 SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3.0cm, preparo mecânico	m²	130,57	46,39	57,96	7.567,53	1,53 %
14.4	87255 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	130,57	137,82	172,21	22.485,45	4,54 %
14.5	88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	92,00	19,97	24,95	2.295,40	0,46 %
15		**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**					**4.705,55**	**0,95 %**
15.1	98689 SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm, AF 06/2018	M	4,50	112,21	140,21	630,94	0,13 %
15.2	88648 SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grés de dimensões 35x35cm.	M	96,06	8,95	11,18	1.073,95	0,22 %
15.3	101965 SINAPI	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	M	18,80	127,73	159,61	3.000,66	0,61 %
16		**CALÇADA DE PROTEÇÃO**					**18.594,36**	**3,76 %**
16.1	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	3,97	68,75	85,91	341,06	0,07 %
16.2	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	2,78	41,68	52,08	144,78	0,03 %
16.3	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	19,90	160,45	200,49	3.989,75	0,81 %
16.4	94994 SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	72,77	139,44	174,24	12.679,44	2,56 %
16.5	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	25,92	7,65	9,55	247,53	0,05 %
16.6	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante	m²	25,92	36,80	45,98	1.191,80	0,24 %
17		**ESQUADRIAS**					**20.005,04**	**4,04 %**
17.1	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	310,43	387,91	1.939,55	0,39 %
17.2	94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18,00	781,55	976,62	17.579,16	3,55 %
17.3	94559 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E	m²	0,48	810,82	1.013,20	486,33	0,10 %
18		**LOUÇAS E METAIS**					**8.620,67**	**1,74 %**
18.1	2390 ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=80cm e D= 38,1mm	un	2,00	188,30	235,29	470,58	0,10 %
18.2	8974 ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	un	2,00	1.065,16	1.331,02	2.662,04	0,54 %
18.3	95546 SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	UN	2,00	141,76	177,14	354,28	0,07 %
18.4	86931 SINAPI	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2,00	452,91	565,95	1.131,90	0,23 %
18.5	00000377 SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	UN	2,00	35,25	44,04	88,08	0,02 %
18.6	86943 SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e	UN	3,00	209,09	261,27	783,81	0,16 %
18.7	2050 ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	un	2,00	25,21	31,50	63,00	0,01 %
18.8	2103 ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	un	1,00	823,50	1.029,04	1.029,04	0,21 %
18.9	2093 ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	un	1,00	1.630,88	2.037,94	2.037,94	0,41 %
19		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**12.244,54**	**2,47 %**
19.1	93243 SINAPI	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saída, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	UN	1,00	6.872,09	8.587,36	8.587,36	1,74 %
19.2	89446 SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	M	28,90	5,76	7,19	207,79	0,04 %
19.3	89448 SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	M	30,10	17,32	21,64	651,36	0,13 %
19.4	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	19,75	12,41	15,50	306,12	0,06 %
19.5	89362 SINAPI	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	UN	8,00	8,20	10,24	81,92	0,02 %
19.6	89364 SINAPI	Curva 90° soldável 25 mm água fria	UN	2,00	11,16	13,94	27,88	0,01 %
19.7	90373 SINAPI	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	11,00	14,02	17,51	192,61	0,04 %
19.8	1144 ORSE	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	un	8,00	13,26	16,56	99,36	0,02 %
19.9	89497 SINAPI	Joelho 90° soldável 40mm água fria	UN	3,00	12,29	15,35	46,05	0,01 %
19.10	1466 ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	3,00	102,73	128,37	385,11	0,08 %
19.11	89383 SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	UN	14,00	5,81	7,26	101,64	0,02 %
19.12	1470 ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	1,00	80,52	100,61	100,61	0,02 %
19.13	89395 SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	6,00	11,40	14,24	85,44	0,02 %
19.14	89420 SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	1,00	9,31	11,63	11,63	0,00 %
19.15	89623 SINAPI	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	UN	5,00	19,33	24,15	120,75	0,02 %
19.16	3147 ORSE	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	1,00	19,02	23,76	23,76	0,00 %
19.17	94491 SINAPI	Registro de esfera soldável 40mm	UN	1,00	43,62	54,50	54,50	0,01 %
19.18	94489 SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	UN	1,00	21,79	27,22	27,22	0,01 %
19.19	74166/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM	UN	1,00	752,69	940,56	940,56	0,19 %
19.20	2062 ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,00	51,45	64,29	192,87	0,04 %
20		**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**19.461,49**	**3,93 %**
20.1	89711 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e	M	9,10	18,38	22,96	208,93	0,04 %

EM BRANCO

PMUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 350
Rúbrica

20.2	89712 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	12,40	26,93	33,65	417,26	0,08 %
20.3	89714 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	28,00	51,65	64,54	1.807,12	0,37 %
20.4	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	8,40	12,41	15,50	130,20	0,03 %
20.5	89796 SINAPI	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	3,00	37,24	46,53	139,59	0,03 %
20.6	1588 ORSE	Tê sanitário em PVC rigido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	un	1,00	48,25	60,29	60,29	0,01 %
20.7	89785 SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	1,00	19,93	24,90	24,90	0,01 %
20.8	1603 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	un	10,00	11,22	14,02	140,20	0,03 %
20.9	1554 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	un	10,00	10,84	13,54	135,40	0,03 %
20.10	89744 SINAPI	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	UN	4,00	22,56	28,19	112,76	0,02 %
20.11	89732 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	UN	1,00	10,64	13,29	13,29	0,00 %
20.12	89726 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	UN	2,00	6,51	8,13	16,26	0,00 %
20.13	89750 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	2,00	59,30	74,10	148,20	0,03 %
20.14	89735 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	2,00	18,05	22,55	45,10	0,01 %
20.15	89709 SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	3,00	9,98	12,47	37,41	0,01 %
20.16	89707 SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no minimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	UN	3,00	27,35	34,17	102,51	0,02 %
20.17	1536 ORSE	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	2,00	18,57	23,20	46,40	0,01 %
20.18	98078 SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	1,00	4.377,10	5.469,62	5.469,62	1,11 %
20.19	98082 SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	1,00	4.060,16	5.073,57	5.073,57	1,03 %
20.20	2798 ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforcada, revestida internamente com barra lisa e fundo em	un	8,00	533,42	666,56	5.332,48	1,08 %
21		**COMBATE A INCÊNDIO**					**641,21**	**0,13 %**
21.1	101909 SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	2,00	215,71	269,55	539,10	0,11 %
21.2	10363 ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	2,00	24,97	31,20	62,40	0,01 %
21.3	11852 ORSE	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Un	1,00	31,76	39,71	39,71	0,01 %
22		**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**28.832,80**	**5,83 %**
22.1	91940 SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	46,00	14,35	17,93	824,78	0,17 %
22.2	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem	M	62,60	2,81	3,51	219,72	0,04 %
22.3	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem	M	76,60	2,81	3,51	268,86	0,05 %
22.4	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem	M	52,60	2,81	3,51	184,62	0,04 %
22.5	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem	M	142,20	2,81	3,51	499,12	0,10 %
22.6	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem	M	142,20	4,13	5,16	733,75	0,15 %
22.7	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem	M	82,60	4,13	5,16	426,21	0,09 %
22.8	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem	M	188,30	4,13	5,16	971,62	0,20 %
22.9	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem	M	153,90	4,13	5,16	794,12	0,16 %
22.10	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem	M	40,00	25,10	31,36	1.254,40	0,25 %
22.11	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem	M	40,00	25,10	31,36	1.254,40	0,25 %
22.12	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem	M	40,00	25,10	31,36	1.254,40	0,25 %
22.13	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem	M	40,00	25,10	31,36	1.254,40	0,25 %
22.14	2794 ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	un	3,00	274,28	342,74	1.028,22	0,21 %
22.15	91993 SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	UN	14,00	38,99	48,72	682,08	0,14 %
22.16	91973 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	81,59	101,95	203,90	0,04 %
22.17	91957 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	43,47	54,32	108,64	0,02 %
22.18	91969 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE	UN	2,00	68,66	85,79	171,58	0,03 %
22.19	91953 SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	2,00	23,95	29,92	59,84	0,01 %
22.20	91959 SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	1,00	37,84	47,28	47,28	0,01 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 357
Rúbrica

22.21	12241 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	275,71	344,52	344,52	0,07 %
22.22	10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	un	2,00	122,14	152,62	305,24	0,06 %
22.23	93662 SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	UN	6,00	55,41	69,24	415,44	0,08 %
22.24	93655 SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	UN	8,00	12,28	15,34	122,72	0,02 %
22.25	91863 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	M	75,00	11,60	14,49	1.086,75	0,22 %
22.26	91864 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	M	9,40	15,35	19,18	180,29	0,04 %
22.27	91871 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	M	50,30	12,29	15,35	772,10	0,16 %
22.28	91872 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	M	6,00	16,03	20,03	120,18	0,02 %
22.29	91873 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	M	36,00	19,71	24,62	886,32	0,18 %
22.30	90447 SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	M	57,80	6,19	7,73	446,79	0,09 %
22.31	8324 ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 100W.	un	29,00	9,67	12,08	350,32	0,07 %
22.32	97607 SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W.	UN	5,00	137,10	171,32	856,60	0,17 %
22.33	11857 ORSE	Lâmpada tubular led T8, 16w, bivolt	un	31,00	27,49	34,35	1.064,85	0,22 %
22.34	97599 SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	UN	3,00	26,61	33,25	99,75	0,02 %
22.35	96985 SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por eletrodeposição anódica e pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco	UN	3,00	81,94	102,39	307,17	0,06 %
22.36	96977 SINAPI	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e	M	10,00	59,24	74,02	740,20	0,15 %
22.37	4192 ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	un	2,00	11,95	14,93	29,86	0,01 %
22.38	4014 ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão, Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20 (vinte) metros de comprimento, conforme norma ABNT NBR NM 60454-3, tipo	Un	3,00	8,78	10,97	32,91	0,01 %
22.39	4015 ORSE	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação.	Un	3,00	12,60	15,74	47,22	0,01 %
22.40	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	4,50	68,75	85,91	386,59	0,08 %
22.41	96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	3,50	41,68	52,08	182,28	0,04 %
22.42	101502 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O	UN	1,00	1.728,29	2.159,67	2.159,67	0,44 %
22.43	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5 M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	585,13	731,17	1.462,34	0,30 %
22.44	12628 ORSE	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,00	3.353,68	4.190,75	4.190,75	0,85 %

Tipo de Licitação	Convite	**Total sem BDI**	**396.229,78**
Abertura da Licitação		**Total do BDI**	**98.718,38**
Número do Processo Licitatório	Processo Administrativo nº	**Total Geral**	**494.948,16**

Sávio Júlio Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA-RR 0607966128

Engenheiro Civil Sávio Júlio Pereira Franco
CREA-RR nº 0607966128
Responsável Técnico

EM BRANCO

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI
CNPJ 37.170.148/0001-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 356
Rúbrica

SOUSA E SOUSA

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha_ Município de Uiramutã/ RR	SINAPI - 07/2022 - Roraima ORSE - 07/2022 - Sergipe	24,96%	Não Desonerado: Horista: 114,78% Mensalista: 70,64%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.819,22	4,41 %
2	ALIMENTAÇÃO CANTEIRO	20.673,18	4,18 %
3	DIVERSOS	14.924,32	3,02 %
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	45.418,89	9,18 %
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	22.718,58	4,59 %
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	24.532,96	4,96 %
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	30.051,78	6,07 %
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	21.246,57	4,29 %
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	35.019,46	7,08 %
10	REVESTIMENTO	41.475,24	8,38 %
11	PINTURA	16.190,39	3,27 %
12	ABRIGO DO GÁS DE COZINHA	2.896,19	0,59 %
13	COBERTURA	42.002,35	8,49 %
14	PAVIMENTAÇÃO	42.873,37	8,66 %
15	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	4.705,55	0,95 %
16	CALÇADA DE PROTEÇÃO	18.594,36	3,76 %
17	ESQUADRIAS	20.005,04	4,04 %
18	LOUÇAS E METAIS	8.620,67	1,74 %
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	12.244,54	2,47 %
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	19.461,49	3,93 %
21	COMBATE A INCÊNDIO	641,21	0,13 %
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	28.832,80	5,83 %

Tipo de Licitação	Convite	**Total sem BDI**	396.229,78
Abertura da Licitação		**Total do BDI**	98.718,38
Número do Processo Licitatório	Processo Administrativo n°	**Total Geral**	494.948,16

Stivio Júlio Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA-RR nº 090766138

Engenheiro Civil Stivio Júlio Pereira Franco
CREA-RR nº 090766138
Responsável Técnico

Av. Santos Dumont, 2180, Sala. 01 - Bairro 31 de Março - CEP 69.305-340 - Boa Vista / RR
Telefone: (095) 99131-2944 | @sousasousaconstrucoes | E-mail:anselmosousa663@gmail.com

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 359
Rúbrica

OBJETO:
Construção da Escola Municipal Indigena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha_ Município de Uiramutã/ RR

LOCAL: MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ/RR

Banco
SINAPI 07/22 RR
ORSE 07/22 SE

Encargos Sociais (Não Desonerado):
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

B.D.I. 24,96%

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A -	**ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	20,00%	20,00%
A2	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1,50%	1,50%
A3	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	1,00%	1,00%
A4	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA	0,20%	0,20%
A5	SERVIÇO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALARIO - EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8,00%	8,00%
A9	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO - SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ÍTEM "A"	**36,80%**	**36,80%**
B -	**ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DE "A"**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,07%	Não incide
B2	FERIADOS	5,08%	Não incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13° SALÁRIO	10,91%	8,33%
B5	LICENÇA À PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,49%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,50%	6,49%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
	TOTAL DO ÍTEM "B"	**45,90%**	**16,25%**
C -	**ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,14%	3,93%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3	5,20%	3,97%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,84%	2,94%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43%	0,33%
	TOTAL DO ÍTEM "C"	**14,73%**	**11,26%**
D -	**TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REICIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**	**% SOBRE OS SALÁRIOS**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE GRUPO "B"	16,89%	5,98%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
	TOTAL DO ÍTEM "D"	**17,35%**	**6,33%**
	PERCENTUAL TOTAL	**114,78%**	**70,64%**

*OBS.: * Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto.*
FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVAS - INMET

Sávio Júlio Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA 0907966128

Engenheiro Civil Sávio Julio Pereira Franco - CREA-RR nº 0907966128
Responsável Técnico

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 360
Rúbrica

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI
CNPJ 37.170.148/0001-57

SOUSA & SOUSA

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Construção da Escola Municipal Indigena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha_ Município de Uiramutã/ RR	SINAPI 07/22 RR ORSE 07/22 SE	24,96%	Não Desonerado: Horista: 114,78% Mensalista: 70,64%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		21.819,22	5.454,81	5.454,81	5.454,81	5.454,81
2	ALIMENTAÇÃO CANTEIRO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		20.673,18	5.168,30	5.168,30	5.168,30	5.168,30
3	DIVERSOS	100,00%	100,00%			
		14.924,32	14.924,32			
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	100,00%	100,00%			
		45.418,89	45.418,89			
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	100,00%	100,00%			
		22.718,58	22.718,58			
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	100,00%		100,00%		
		24.532,96		24.532,96		
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	100,00%		25,00%	75,00%	
		30.051,78		7.512,95	22.538,84	
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	100,00%			60,00%	40,00%
		21.246,57			12.747,94	8.498,63
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	100,00%				100,00%
		35.019,46				35.019,46
10	REVESTIMENTO	100,00%				100,00%
		41.475,24				41.475,24
11	PINTURA	100,00%			20,00%	80,00%
		16.190,39			3.238,08	12.952,31
12	ABRIGO DO GÁS DE COZINHA	100,00%			75,00%	25,00%
		2.896,19			2.172,14	724,05
13	COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%		
		42.002,35	21.001,18	21.001,18		
14	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		25,00%	75,00%	
		42.873,37		10.718,34	32.155,03	
15	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	100,00%			100,00%	
		4.705,55			4.705,55	
16	CALÇADA DE PROTEÇÃO	100,00%		50,00%	50,00%	
		18.594,36		9.297,18	9.297,18	
17	ESQUADRIAS	100,00%			100,00%	
		20.005,04			20.005,04	
18	LOUÇAS E METAIS	100,00%			50,00%	50,00%
		8.620,67			4.310,34	4.310,34
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%		15,00%	45,00%	40,00%
		12.244,54		1.836,68	5.510,04	4.897,82
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%		15,00%	45,00%	40,00%
		19.461,49		2.919,22	8.757,67	7.784,60
21	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%				100,00%
		641,21				641,21
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%		15,00%	45,00%	40,00%
		28.832,80		4.324,92	12.974,76	11.533,12
Porcentagem			23,17%	18,74%	30,11%	27,97%
Custo			114.686,07	92.766,53	149.035,70	138.459,86
Porcentagem Acumulado			23,17%	41,91%	72,03%	100,0%
Custo Acumulado			114.686,06	207.452,59	356.488,29	494.948,16

Sávio Júlio Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA 0907966128

Engenheiro Civil Sávio Julio Pereira Franco
CREA-RR nº 0907966128
Responsável Técnico

Av. Santos Dumont, 2180, Sala. 01 - Bairro 31 de Março - CEP 69.305-340 - Boa Vista / RR
Telefone: (095) 99131-2944 | @sousasousaconstrucoes | E-mail:anselmosousa663@gmail.com

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 361
Rúbrica

SOUSA & SOUSA
CONSTRUÇÕES

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc.Mun. 972928.3

OBJETO:
Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha_ Município de Uiramutã/ RR

LOCAL: **MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ/RR**

Bancos
SINAPI - 06/2021 - RR
ORSE - 06/2021 - SE

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

BDI **24,96%**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

ITENS PASSÍVEIS DE ACEITAÇÃO NO BDI		Índices mínimo	Índices médio	Índices máximo	ÍNDICE ADOTADO
X	Administração Central	3,000%	4,000%	5,500%	4,000%
	Garantia	0,800%	0,800%	1,000%	0,800%
	Risco	0,970%	1,270%	1,270%	0,970%
	Total				**5,770%**
Y	Despesas Financeiras	0,590%	1,230%	1,390%	0,595%
	Total				**0,595%**
Z	Lucro	3,000%	7,400%	8,960%	7,285%
	Total				**7,285%**
I	**Tributos (totais)**				
	COFINS	3,000%	3,000%	3,000%	3,000%
	PIS	0,650%	0,650%	0,650%	0,650%
	ISS	5,000%	3,000%	3,000%	5,000%
	Total				**8,650%**
	% DE BDI A SER UTILIZADO =				**24,96%**

LEGENDA	
X =	Despesas indiretas (exceto tributos e despesas
Y =	Despesas financeiras
Z =	Lucro
I =	Taxa representativa da incidência de impostos

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1+X) \quad x \quad (1+Y) \quad x \quad (1+Z)}{(1 - I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1 + 0{,}04770) \times (1 + 0{,}00590) \times (1 + 0{,}07285)}{(1 - 0{,}08650)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1{,}04770) \times (1{,}00590) \times (1{,}00960)}{(0{,}91350)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1{,}06400)}{(0{,}91350)} - 1$$

BDI= 1,1647 - 1

BDI= 24,96%

Obs: Os valores máximos e mínimos adotados conforme orientação "acórdão 2622/2013-TCU'
****Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI***

Sávio Júlio Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA 0907966128

Engenheiro Civil Sávio Julio Pereira Franco - CREA-RR nº 0907966128
Responsável Técnico

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 362
Rúbrica

SOUSA & SOUSA

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha_
Município de Uiramutã/ RR

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Roraima
ORSE - 07/2022 - Sergipe

B.D.I.
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Planilha Orçamentária Analítica

1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						21.819,22
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,00	107,36	107,36
Composição Auxiliar	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,00	1,25	1,25
Insumo	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra		H	1,00	104,62	104,62
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,00	0,66	0,66
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,00	0,81	0,81
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,00	0,01	0,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,00	0,01	0,01
			MO sem LS =>	49,29	LS =>	56,58	MO com LS =>	105,87
					Quant. =>	64,00	Preço Total =>	8.585,60

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,00	5.295,15	5.295,15
Composição Auxiliar	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,00	63,63	63,63
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	1,00	4.857,64	4.857,64
Insumo	00043499 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,00	202,94	202,94
Insumo	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,00	18,58	18,58
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material		MES	1,00	152,35	152,35
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material		MES	1,00	0,01	0,01
			MO sem LS =>	2.291,31	LS =>	2.629,96	MO com LS =>	4.921,27
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	13.233,62

2		ALIMENTAÇÃO CANTEIRO						20.673,18
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3126 ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	Alimentação		un	1,00	14,00	14,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	1,00	14,00	14,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Quant. =>	1.182,00	Preço Total =>	20.673,18

3		DIVERSOS						14.924,32
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010848 SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	Material		UN	1,00	1.341,68	1.341,68
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.676,56

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010851 SINAPI	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida,	Material		UN	1,00	70,83	70,83
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	531,00

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11397 ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metalon de 20x20cm, fornecida e instalada	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização		un	1,00	750,00	750,00
Insumo	12325 ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon	Material		un	1,00	750,00	750,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	937,20

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010527 SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	Equipamento		MXMES	1,00	13,20	13,20
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Quant. =>	90,45	Preço Total =>	1.491,52

3.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2412 ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	Mobiliário		un	1,00	783,36	783,36
Insumo	2509 ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm, natural (sem verniz) un	0		un	1,00	783,36	783,36
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	195,52			Valor com BDI =>	978,88
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>	7.831,04

3.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2450 ORSE	Limpeza geral (final da obra)	Limpeza		m²	1,00	2,19	2,19
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,10	3,74	0,37
Insumo	1997 ORSE	Sabão em pó kg	0		kg	0,01	9,45	0,04
Insumo	2414 ORSE	Vassoura piaçava un	0		un	0,05	11,80	0,59
			MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,64	MO com LS =>	1,19
			Valor do BDI =>	0,54			Valor com BDI =>	2,73
					Quant. =>	900,00	Preço Total =>	2.457,00

4		MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO						43.557,47
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

Fls. 369
Rúbrica

Composição	51 ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1.50m x 2,40m)	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,00	550,87		550,87
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,00	3,74		7,48
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,00	3,63		3,63
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	4,00	10,99		43,96
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,00	3,89		3,89
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,00	19,81		19,81
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N 22* ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,00	445,00		445,00
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,15	21,22		3,18
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,00	11,96		23,92
			MO sem LS =>	20,36	LS =>	23,37	MO com LS =>	43,73
			Valor do BDI =>	137,49			Valor com BDI =>	688,36
					Quant. =>	3,60	Preço Total =>	2.478,09

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6096 ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro. Rede DN 50mm	Conversão InfoWOrca	UN	1,00	613,28	613,28
Composição Auxiliar	26 ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	Demolições / Remoções	m³	0,02	15,70	0,32
Composição Auxiliar	76 ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,33	15,70	20,81
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,35	47,10	63,44
Composição Auxiliar	6083 ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	Conversão InfoWOrca	un	1,00	260,64	260,64
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,00	3,65	3,65
Insumo	980 ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	Material	m	20,00	0,22	4,40
Insumo	2260 ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Torneira plastica p/jardim d= 1/2" (herc - ref. 1128 ou similar)	Material	un	1,00	2,13	2,13
Insumo	2360 ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	Material	un	2,00	8,06	16,12
Insumo	5161 ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	Material	un	2,00	5,00	10,00
Insumo	5240 ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saida roscável de = 60mm x 1/2"	Material	un	1,00	12,29	12,29
Insumo	6313 ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	Material	UN	1,00	0,83	0,83
Insumo	00002695 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	1,00	19,81	19,81
Insumo	00004895 SINAPI	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00	0,69	0,69
Insumo	00006036 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	Material	UN	1,00	11,49	11,49
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,00	11,96	11,96
Insumo	00007098 SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	3,90	3,90
Insumo	00009813 SINAPI	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	Material	M	6,00	5,71	34,26
Insumo	00009856 SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	1,00	8,95	8,95
Insumo	00012773 SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2"	Material	UN	1,00	123,85	123,85
			MO sem LS =>	65,27	LS =>	74,92	MO com LS =>	140,19
			Valor do BDI =>	153,07			Valor com BDI =>	766,35
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	766,35

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11125 ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia	Entrada em Baixa Tensão	un	1,00	2.205,77	2.205,77
Composição Auxiliar	338 ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em nori	Entrada em Baixa Tensão	un	1,00	491,52	491,52
Composição Auxiliar	353 ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,50	12,71	19,06
Composição Auxiliar	354 ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	6,00	16,25	97,50
Composição Auxiliar	363 ORSE	Curva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	2,00	9,66	19,32
Composição Auxiliar	372 ORSE	Luva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	4,00	3,77	15,08
Composição Auxiliar	681 ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	Pontos de Suprimento de Telefone	un	1,00	6,16	6,16
Composição Auxiliar	2892 ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e	un	1,00	5,01	5,01
Composição Auxiliar	4005 ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	20,00	12,50	250,00
Composição Auxiliar	4429 ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos	un	1,00	160,63	160,63
Composição Auxiliar	7925 ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	4,00	2,30	9,20
Composição Auxiliar	7995 ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,00	71,54	71,54
Composição Auxiliar	9163 ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão InfoWOrca	un	1,00	998,49	998,49
Composição Auxiliar	9379 ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	Conversão InfoWOrca	un	1,00	41,31	41,31
Composição Auxiliar	12370 ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	Pára-raios	kg	0,18	113,86	20,95
			MO sem LS =>	206,83	LS =>	237,40	MO com LS =>	444,23
			Valor do BDI =>	550,56			Valor com BDI =>	2.756,33
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.756,33

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	62 ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,00	14.992,56	14.992,56
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos	m³	1,30	712,60	926,38
Composição Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	2,80	1.085,87	3.040,43
Composição Auxiliar	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	52,92	36,33	1.922,58
Composição Auxiliar	641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	2,00	223,87	447,74
Composição Auxiliar	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	2,00	20,34	40,68
Composição Auxiliar	3297 ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	1,00	264,06	264,06

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 364
Rúbrica

Composição Auxiliar	3644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas		m²	56,00	15,66	876,96
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	16,00	3,74	59,84
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	16,00	3,63	58,08
Insumo	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material		un	2,00	25,40	50,80
Insumo	629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material		m²	77,00	36,36	2.799,72
Insumo	848 ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material		un	4,00	3,60	14,40
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material		m	87,00	10,99	956,13
Insumo	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Material		un	2,00	8,00	16,00
Insumo	1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material		kg	1,20	25,07	30,08
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	16,00	19,81	316,96
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	16,00	11,96	191,36
			MO sem LS =>	1.452,41	LS =>	1.667,07	MO com LS =>	3.119,48
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	18.734,70

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059 SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		M	1,00	42,57	42,57
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,00	28,29	0,11
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,02	27,33	0,45
Composição Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,00	576,22	2,65
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,36	18,28	6,51
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,71	25,21	17,96
Insumo	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,41	11,40	4,70
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,11	21,22	2,35
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,74	3,17	2,36
Insumo	00010567 SINAPI	TÁBUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	0,55	3,10	1,70
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,03	14,45	0,36
			Valor do BDI =>	10,62			Valor com BDI =>	53,19
					Quant. =>	35,00	Preço Total =>	1.861,65

4.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524 SINAPI	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO		m²	1,00	2,60	2,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,38	1,24
			MO sem LS =>	0,86	LS =>	0,99	MO com LS =>	1,85
			Valor do BDI =>	0,64			Valor com BDI =>	3,24
					Quant. =>	900,00	Preço Total =>	2.916,00

4.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9203 ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Conversão InfoWOrca		tkm	1,00	0,50	0,50
Insumo	9483 ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Equipamento		tkm	1,00	0,50	0,50
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,62
					Quant. =>	14.391,75	Preço Total =>	8.922,88

4.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100948 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS		TXKM	1,00	0,92	0,92
Composição Auxiliar	5826 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,00	47,25	0,07
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
			Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,14
					Quant. =>	4.492,52	Preço Total =>	5.121,47

5		INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES						22.718,58
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,00	68,75	68,75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,96	17,38	68,75
			MO sem LS =>	22,40	LS =>	25,70	MO com LS =>	46,10
			Valor do BDI =>	17,16			Valor com BDI =>	85,91
					Quant. =>	7,80	Preço Total =>	670,09
Composição	96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,00	41,68	41,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,40	17,38	41,68
			MO sem LS =>	13,58	LS =>	15,58	MO com LS =>	29,16
			Valor do BDI =>	10,40			Valor com BDI =>	52,08
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	104,16

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263 SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	147,28	147,28
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,26	27,33	6,96
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	18,28	4,57
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,18	25,21	29,74
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE "2,2 X 1,1" M, E = 17 MM	Material		m²	1,34	63,36	84,64
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,31	2,74	6,32
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,21	21,22	4,41
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	9,24	0,96	8,86
			MO sem LS =>	15,89	LS =>	18,24	MO com LS =>	34,13
			Valor do BDI =>	36,76			Valor com BDI =>	184,04

EM BRANCO

Fls. 365
Rúbrica
PMU - DE UIRAMUTÃ

					Quant. =>	26,20	Preço Total =>	4.821,84
5.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	0,53	147,28	77,32
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,21	18,28	3,76
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,13	25,21	28,36
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,01	7,10	0,07
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento		MES	0,20	8,58	1,68
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento		MES	0,79	3,30	2,59
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2	Equipamento		MES	0,39	13,20	5,18
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,02	26,19	0,49
			MO sem LS =>	20,06	LS =>	23,02	MO com LS =>	43,08
			Valor do BDI =>	29,81			Valor com BDI =>	149,26
5.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	37,80	37,80
Composição Auxiliar	94966 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,06	523,95	29,60
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,27	25,49	6,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,38	1,28
			MO sem LS =>	4,21	LS =>	4,83	MO com LS =>	9,04
			Valor do BDI =>	9,43			Valor com BDI =>	47,23
					Quant. =>	14,80	Preço Total =>	699,00
5.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,75	1,67	1,25
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,72	52,14	37,69
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,66	1,36	493,21
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,59	208,90	123,96
			MO sem LS =>	24,22	LS =>	27,80	MO com LS =>	52,02
			Valor do BDI =>	181,39			Valor com BDI =>	908,14
5.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,21	46,63
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,49	47,05
			MO sem LS =>	65,85	LS =>	75,58	MO com LS =>	141,43
			Valor do BDI =>	47,75			Valor com BDI =>	209,09
					Quant. =>	4,80	Preço Total =>	1.147,63
5.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	21,73	21,73
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	14,49	14,49
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,04	17,17	0,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,22	25,33	5,68
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	1,19	0,22	0,26
			MO sem LS =>	3,05	LS =>	3,51	MO com LS =>	6,56
			Valor do BDI =>	5,42			Valor com BDI =>	27,15
					Quant. =>	39,76	Preço Total =>	1.079,48
5.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	13,91	13,91
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	17,17	0,26
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	25,33	2,42
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,54	0,22	0,11
			MO sem LS =>	1,09	LS =>	1,26	MO com LS =>	2,35
			Valor do BDI =>	4,33			Valor com BDI =>	21,70
					Quant. =>	273,12	Preço Total =>	5.926,70
6		INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME						24.532,96
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,00	68,75	68,75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,96	17,38	68,75
			MO sem LS =>	22,40	LS =>	25,70	MO com LS =>	48,10
			Valor do BDI =>	17,16			Valor com BDI =>	85,91
					Quant. =>	1,66	Preço Total =>	142,61

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 368
Rúbrica

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	96539	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	111,41		111,41
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,03	28,29		0,73
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,06	27,33		1,50
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,94	25,21		48,85
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material		m²	0,59	63,36		37,57
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,01	7,10		0,07
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,29	2,74		6,28
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,01	26,19		0,26
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,01	23,48		0,16
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,04	21,63		0,75
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,36	0,96		1,30
				MO sem LS =>	23,54	LS =>	27,01	MO com LS =>		50,55
				Valor do BDI =>	27,80			Valor com BDI =>		139,21

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	37,80		37,80
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,06	523,95		29,60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,27	25,49		6,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,38		1,28
				MO sem LS =>	4,21	LS =>	4,83	MO com LS =>		9,04
				Valor do BDI =>	9,43			Valor com BDI =>		47,23
						Quant. =>	13,40	Preço Total =>		632,88

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo	FUES - FUNDAÇÕES E [illegible]		m³	1,00	726,75		726,75
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,71	0,42		0,29
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,75	1,67		1,25
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,46	20,62		30,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,31	17,38		40,17
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,72	52,14		37,69
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	382,66	1,36		493,21
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,59	208,90		123,96
				MO sem LS =>	24,22	LS =>	27,80	MO com LS =>		52,02
				Valor do BDI =>	181,39			Valor com BDI =>		908,14
						Quant. =>	4,87	Preço Total =>		4.422,64

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,00	191,34		191,34
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,67	1,29		0,86
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,17	0,56		0,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,21		46,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,49		47,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,54	17,38		96,25
				MO sem LS =>	65,85	LS =>	75,58	MO com LS =>		141,43
				Valor do BDI =>	47,75			Valor com BDI =>		239,09
						Quant. =>	4,87	Preço Total =>		1.164,36

6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	21,73		21,73
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	14,49		14,49
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,04	17,17		0,63
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,22	25,33		5,68
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,03	27,00		0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,19	0,22		0,26
				MO sem LS =>	3,05	LS =>	3,51	MO com LS =>		6,56
				Valor do BDI =>	5,42			Valor com BDI =>		27,15
						Quant. =>	62,97	Preço Total =>		1.709,63

6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	19,41		19,41
Composição Auxiliar	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	15,00		15,00
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	17,17		0,35
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	25,33		3,23
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,03	27,00		0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,74	0,22		0,16
				MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,74	MO com LS =>		3,26

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls 367
Rubrica

			Valor do BDI =>	4.84			Valor com BDI =>	34.25
					Quant. =>	148,70	Preço Total =>	3.605,97
6.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,01	669,88	9,04
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,00	25,49	76,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,50	17,38	26,05
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	55,85	0,68	37,97
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,04	40,33	1,46
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material		M	1,51	6,31	9,52
			MO sem LS =>	37,45	LS =>	42,99	MO com LS =>	80,44
			Valor do BDI =>	40,04			Valor com BDI =>	200,49
					Quant. =>	25,93	Preço Total =>	5.198,70
6.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557 SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,00	37,83	37,83
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,09	18,49	1,57
Composição Auxiliar	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,42	25,73	10,85
Insumo	00000626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material		KG	1,50	16,94	25,41
			MO sem LS =>	4,53	LS =>	5,19	MO com LS =>	9,72
			Valor do BDI =>	9,44			Valor com BDI =>	47,27
					Quant. =>	53,65	Preço Total =>	2.536,03
7		SUPERESTRUTURA - PILARES						30.051,78
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263 SINAPI	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	147,28	147,28
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,06	28,29	1,78
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,26	27,33	6,96
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	18,28	4,57
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,18	25,21	29,74
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,31	2,74	6,32
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,21	21,22	4,41
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	9,24	0,96	8,86
			MO sem LS =>	15,89	LS =>	18,24	MO com LS =>	34,13
			Valor do BDI =>	36,76			Valor com BDI =>	184,04
					Quant. =>	61,44	Preço Total =>	11.307,41
7.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,00	119,45	119,45
Composição Auxiliar	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	0,53	147,28	77,32
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,13	25,21	28,36
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,01	7,10	0,07
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento		MES	0,20	8,58	1,68
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento		MES	0,79	3,30	2,59
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2	Equipamento		MES	0,39	13,20	5,18
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,02	26,19	0,49
			MO sem LS =>	20,06	LS =>	23,02	MO com LS =>	43,08
			Valor do BDI =>	29,81			Valor com BDI =>	149,26
					Quant. =>	61,44	Preço Total =>	9.170,53
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1): preparo	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,75	1,67	1,25
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,72	52,14	37,69
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,66	1,36	493,21
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,59	208,90	123,96
			MO sem LS =>	24,22	LS =>	27,80	MO com LS =>	52,02
			Valor do BDI =>	181,39			Valor com BDI =>	908,14
7.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,21	46,53
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,49	47,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,54	17,38	96,25
			MO sem LS =>	65,85	LS =>	75,58	MO com LS =>	141,43
			Valor do BDI =>	47,75			Valor com BDI =>	239,09

EM BRANCO

PREFEITURA DE IRAMUTA - PMUI
Fls. 366
Rúbrica

					Quant. =>	3,34	Preço Total =>	798,56
7.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	21,73	21,73
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,04	17,17	0,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,22	25,33	5,68
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	1,19	0,22	0,26
			MO sem LS =>	3,05	LS =>	3,51	MO com LS =>	6,56
			Valor do BDI =>	5,42			Valor com BDI =>	27,15
					Quant. =>	65,63	Preço Total =>	1.781,85
7.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	17,37	17,37
Composição Auxiliar	92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,00	13,91	13,91
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	17,17	0,26
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,54	0,22	0,11
			MO sem LS =>	1,09	LS =>	1,26	MO com LS =>	2,35
			Valor do BDI =>	4,33			Valor com BDI =>	21,70
					Quant. =>	182,50	Preço Total =>	3.960,25
8		SUPERESTRUTURA - VIGAS						21.246,57
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92265 SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	117,63	117,63
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,05	28,29	1,41
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,24	27,33	6,47
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,20	18,28	3,69
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,91	25,21	22,96
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE "2,2 X 1,1" M, E = 17 MM	Material		m²	1,15	63,36	72,61
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,17	2,74	0,45
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,16	21,22	3,37
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	6,95	0,96	6,67
			MO sem LS =>	12,77	LS =>	14,65	MO com LS =>	27,42
			Valor do BDI =>	29,36			Valor com BDI =>	146,99
					Quant. =>	38,88	Preço Total =>	5.714,97
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92455 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	128,86	128,86
Composição Auxiliar	92272 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA, AF 09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		M	1,73	26,94	46,57
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,19	18,28	3,47
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,04	25,21	26,09
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,01	7,10	0,07
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,05	26,19	1,28
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,33	8,23	2,69
			MO sem LS =>	19,75	LS =>	22,67	MO com LS =>	42,42
			Valor do BDI =>	32,16			Valor com BDI =>	161,02
					Quant. =>	38,88	Preço Total =>	6.260,45
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,75	1,67	1,25
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,72	52,14	37,69
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,66	1,36	493,21
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,59	208,90	123,96
			MO sem LS =>	24,22	LS =>	27,80	MO com LS =>	52,02
			Valor do BDI =>	161,39			Valor com BDI =>	908,14
					Quant. =>	3,74	Preço Total =>	3.396,44
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,21	46,53
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,49	47,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,54	17,38	96,25
			MO sem LS =>	65,85	LS =>	75,58	MO com LS =>	141,43
			Valor do BDI =>	47,75			Valor com BDI =>	239,09
					Quant. =>	3,74	Preço Total =>	894,19
8.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	21,73	21,73

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 3604
Rúbrica

Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00			14,49
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,17		0,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	25,33		5,68
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00		0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,22		0,26
			MO sem LS => 3,05	LS =>	3,51	MO com LS =>		6,56
			Valor do BDI => 5,42			Valor com BDI =>		27,15
				Quant. =>	65,43	Preço Total =>		1.776,42

8.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92776 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	20,65	20,65
Composição Auxiliar	92792 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	14,96	14,96
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	17,17	0,48
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	25,33	4,33
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,97	0,22	0,21
			MO sem LS => 2,16	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,64
				Quant. =>	124,19	Preço Total =>	3.204,10

9		ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO					35.019,46
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00	116,45	116,45
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	581,25	6,16
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,33	25,49	59,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,17	17,38	20,28
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,74	0,68	25,66
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,01	40,33	0,52
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	1,09	3,99	4,34
			MO sem LS => 28,86	LS =>	33,13	MO com LS =>	61,99
			Valor do BDI => 29,06			Valor com BDI =>	145,51

9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93201 SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	6,24	6,24
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	543,88	1,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	25,49	3,82
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	17,38	0,52
			MO sem LS => 1,69	LS =>	1,93	MO com LS =>	3,62
			Valor do BDI => 1,55			Valor com BDI =>	7,79
				Quant. =>	55,83	Preço Total =>	434,91

9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93186 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E	M	1,00	66,32	66,32
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,49	14,66	7,18
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,35	91,15	31,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	25,49	9,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	17,38	3,26
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	7,10	0,04
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,22	1,32
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,35	2,74	0,96
			MO sem LS => 9,12	LS =>	10,46	MO com LS =>	19,58
			Valor do BDI => 16,55			Valor com BDI =>	82,87
				Quant. =>	23,00	Preço Total =>	1.906,01

9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93188 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	57,57	57,57
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,01	671,35	6,05
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,30	91,15	27,34
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,39	25,49	9,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	17,38	3,35
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	7,10	0,03
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,22	1,32
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,22	2,74	3,34
			MO sem LS => 8,57	LS =>	9,84	MO com LS =>	18,41
			Valor do BDI => 14,36			Valor com BDI =>	71,93

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls 376
Rubrica
PMU

9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93196	SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	65,36	65,36
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,49	14,66	7,18
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,02	671,35	12,08
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,35	91,15	31,90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	25,49	9,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	17,38	3,26
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	7,10	0,04
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,22	1,32
				MO sem LS => 9,12	LS =>	10,46	MO com LS =>	19,58
				Valor do BDI => 16,31			Valor com BDI =>	81,67
					Quant. =>	19,00	Preço Total =>	1.551,73

10			REVESTIMENTO					41.475,24
10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	7,65	7,65
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	25,49	3,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	17,38	1,07
				MO sem LS => 1,77	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,80
				Valor do BDI => 1,90			Valor com BDI =>	9,55
					Quant. =>	406,08	Preço Total =>	3.878,06

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	36,80	36,80
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	581,25	21,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47	25,49	11,98
				MO sem LS => 6,66	LS =>	7,64	MO com LS =>	14,30
				Valor do BDI => 9,18			Valor com BDI =>	45,98
					Quant. =>	406,08	Preço Total =>	18.671,55

10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87528	SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m²	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	43,62	43,62
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	669,88	25,18
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,58	25,49	14,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	17,38	3,66
				Valor do BDI => 10,88			Valor com BDI =>	54,50
					Quant. =>	111,36	Preço Total =>	6.069,12

10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	92,39	92,39
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,02	29,15	29,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,50	17,38	8,69
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,14	1,25	7,67
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,22	7,34	1,61
				MO sem LS => 14,14	LS =>	16,22	MO com LS =>	30,36
				Valor do BDI => 23,06			Valor com BDI =>	115,45
					Quant. =>	111,36	Preço Total =>	12.856,51

11			PINTURA					16.190,39
11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	PINT - PINTURAS	m²	1,00	2,30	2,30
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	26,53	1,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01	17,38	0,24
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	0,16	6,49	1,03
				MO sem LS => 0,44	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
					Quant. =>	406,08	Preço Total =>	1.165,44

11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS	m²	1,00	14,27	14,27
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31	26,53	8,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11	17,38	1,98
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR	Material	UN	0,10	0,86	0,08
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,56	2,54	3,94
				Valor do BDI => 3,56			Valor com BDI =>	17,83
					Quant. =>	203,04	Preço Total =>	3.620,20

11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8624	ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	Latex PVA	m²	1,00	17,44	17,44
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,25	3,74	0,93
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,35	3,81	1,33
Insumo	1602	ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material	l	0,72	6,72	4,83
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,50	0,86	0,43
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,35	19,81	6,93

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 371
Rúbrica

Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,25		2,99
			Valor do BDI =>	4,35			Valor com BDI =>	21,79
					Quant. =>	203,04	Preço Total =>	4.424,24

11.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta acetinada em paredes, duas demãos.	PINT - PINTURAS		m²	1,00	13,76	13,76
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	26,53	3,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,05	17,38	0,83
Insumo	00007345 SINAPI	'EM PROCESSO DE DESATIVACAO' TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material		L	0,33	28,76	9,49
			MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,70	MO com LS =>	3,18
			Valor do BDI =>	3,43			Valor com BDI =>	17,19

12		ABRIGO DO GÁS DE COZINHA						2.896,19
12.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,00	116,45	116,45
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,01	581,25	6,16
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,33	25,49	59,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,17	17,38	20,28
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	37,74	0,68	25,66
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	1,09	3,98	4,34
			MO sem LS =>	28,86	LS =>	33,13	MO com LS =>	61,99
			Valor do BDI =>	29,06			Valor com BDI =>	145,51
					Quant. =>	1,20	Preço Total =>	174,61

12.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,00	7,65	7,65
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,00	815,94	3,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,06	17,38	1,07
			MO sem LS =>	1,77	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,80
			Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI =>	9,55
					Quant. =>	2,60	Preço Total =>	24,83

12.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2.0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,00	36,80	36,80
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,04	581,25	21,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,47	25,49	11,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	17,38	2,97
			MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,64	MO com LS =>	14,30
			Valor do BDI =>	9,18			Valor com BDI =>	45,98
					Quant. =>	2,60	Preço Total =>	119,54

12.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	PINT - PINTURAS		m²	1,00	2,30	2,30
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,04	26,53	1,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,01	17,38	0,24
			MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
			Valor do BDI =>	0,57			Valor com BDI =>	2,87
					Quant. =>	3,98	Preço Total =>	11,42

12.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	Latex PVA		m²	1,00	17,44	17,44
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,25	3,74	0,93
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios		h	0,35	3,81	1,33
Insumo	1602 ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material		l	0,72	6,72	4,83
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR	Material		UN	0,50	0,86	0,43
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra		H	0,35	19,81	6,93
			MO sem LS =>	4,62	LS =>	5,30	MO com LS =>	9,92
			Valor do BDI =>	4,35			Valor com BDI =>	21,79
					Quant. =>	3,98	Preço Total =>	86,72

12.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS		m²	1,00	13,76	13,76
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	26,53	3,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,05	17,38	0,83
			MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,70	MO com LS =>	3,18
			Valor do BDI =>	3,43			Valor com BDI =>	17,19
					Quant. =>	3,98	Preço Total =>	68,41

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 372
Rubrica

12.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira (Laje do abrigo)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,67	1,25
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,72	52,14	37,69
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,36	493,21
			MO sem LS => 24,22	LS => 27,80	MO com LS =>		52,02
			Valor do BDI => 181,39		Valor com BDI =>		908,14
				Quant. =>	1,46	Preço Total =>	1.325,88

12.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,21	46,63
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,49	47,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	17,38	96,25
			MO sem LS => 65,85	LS => 75,58	MO com LS =>		141,43
			Valor do BDI => 47,75		Valor com BDI =>		239,09
				Quant. =>	1,46	Preço Total =>	349,07

12.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,00	588,76	588,76
Composição Auxiliar	88627 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	742,05	8,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	25,49	11,64
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23	17,38	3,96
Insumo	00004930 SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	m²	1,00	564,24	564,24
			Valor do BDI => 146,95		Valor com BDI =>		735,71
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	735,71

13		COBERTURA					42.002,35
13.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	283 ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	Telhamento	m²	1,00	61,23	61,23
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,22	3,74	0,82
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,22	3,63	0,79
Insumo	667 ORSE	Kit de fixação (prego/anilha) para telhas onduline (20 pregos e 20 anilhas)	Material	un	0,50	8,69	4,34
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,22	19,81	4,35
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,22	11,96	2,63
			MO sem LS => 3,25	LS => 3,73	MO com LS =>		6,98
			Valor do BDI => 15,28		Valor com BDI =>		76,51
				Quant. =>	185,13	Preço Total =>	14.164,29

13.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92540 SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	COBE - COBERTURA	m²	1,00	54,03	54,03
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,06	22,30	1,34
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,04	23,11	1,00
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,48	18,28	8,84
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,64	25,21	16,15
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,07	23,49	1,64
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,05	21,20	1,06
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,03	21,38	0,64
Insumo	00004408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,31	1,11	3,67
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,66	12,33	8,17
			MO sem LS => 9,75	LS => 11,20	MO com LS =>		20,95
			Valor do BDI => 13,48		Valor com BDI =>		67,51
				Quant. =>	185,13	Preço Total =>	12.496,12

13.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94223 SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com composito de resina, incluso acessorio de fixação e icamento	COBE - COBERTURA	M	1,00	111,49	111,49
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00	23,11	0,04
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00	22,30	0,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,38	1,26
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	24,97	1,49
Insumo	00007219 SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	1,03	89,72	92,32

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls. 373
Rúbrica
- PMU -

Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material		UN	4.20	3.65	15.33
			MO sem LS =>	0.99	LS =>	1.14	MO com LS =>	2.13
			Valor do BDI =>	27.82			Valor com BDI =>	139.31
					Quant. =>	32,24	Preço Total =>	4.491,35

13.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	55960 SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	COBE - COBERTURA		m²	1.00	6.03	6.03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.20	17.38	3.47
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material		L	0.10	25.61	2.56
			MO sem LS =>	1.13	LS =>	1.30	MO com LS =>	2.43
			Valor do BDI =>	1.50			Valor com BDI =>	7.53

13.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4449 ORSE	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro	Forros		m²	1.00	57.95	57.95
Insumo	1019 ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref Araforros ou similar	Material		m²	1.00	57.95	57.95
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	14.46			Valor com BDI =>	72.41
					Quant. =>	130,57	Preço Total =>	9.454,57

14		PAVIMENTAÇÃO						42.873,37
14.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1.00	41.68	41.68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,40	17,38	41.68
			MO sem LS =>	13.58	LS =>	15.58	MO com LS =>	29.16
			Valor do BDI =>	10.40			Valor com BDI =>	52.08
					Quant. =>	19,57	Preço Total =>	1.019,20

14.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87690 SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	PISO - PISOS		m²	1,00	58,26	58,26
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,06	799,74	48,54
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,29	25,49	7,26
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,14	17,38	2,46
			MO sem LS =>	5,71	LS =>	6,55	MO com LS =>	12,26
					Quant. =>	130,57	Preço Total =>	9.505,49

14.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87630 SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	PISO - PISOS		m²	1,00	46,39	46,39
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,04	799,74	34,46
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	25,49	6,24
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,12	17,38	2,13
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material		L	0,21	13,72	2,88
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,50	1,36	0,68
			MO sem LS =>	4,58	LS =>	5,25	MO com LS =>	9,83
					Quant. =>	130,57	Preço Total =>	7.567,83

14.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87255 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	PISO - PISOS		m²	1,00	137,82	137,82
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,93	29,15	27,10
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,34	17,38	5,90
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	8,62	1,25	10,77
Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material		m²	1,12	83,07	93,03
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,14	7,34	1,02
			MO sem LS =>	12,23	LS =>	14,04	MO com LS =>	26,27
					Quant. =>	130,57	Preço Total =>	22.485,45

14.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	PISO - PISOS		M	1,00	19,97	19,97
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,09	29,15	2,47
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	17,38	0,53
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	0,60	1,25	0,75
Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material		m²	0,19	83,07	15,61
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,08	7,34	0,61
			MO sem LS =>	1,11	LS =>	1,28	MO com LS =>	2,39
					Quant. =>	92,00	Preço Total =>	2.295,40

15		SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL						4.705,55
15.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls 374
Rubrica
PMU

Composição	98689 SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	PISO - PISOS	M				12.21
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,35	26,63		14.56
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27	17,38		4.74
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,29	3,84		4.95
Insumo	00020232 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/	Material	M	1,00	87,96		87.96
			MO sem LS => 6,96	LS =>	7,99	MO com LS =>		14.95
				Quant. =>	4,50	Preço Total =>		630,94

15.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88648 SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	PISO - PISOS	M	1,00	8,95	8.95
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	29,15	2.04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	17,38	0.53
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,60	1,25	0.75
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,09	7,34	0.62
			MO sem LS => 0,95	LS =>	1,08	MO com LS =>	2.03
			Valor do BDI => 2,23			Valor com BDI =>	11.18
				Quant. =>	96,06	Preço Total =>	1.073,95

15.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,02	28,29	0.59
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,40	27,33	10.87
Composição Auxiliar	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	544,86	3.26
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42	26,63	11.15
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	17,38	3.63
Insumo	00034747 SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0" CM COM PINGADEIRA	Material	M	1,04	94,46	98.23
			MO sem LS => 10,01	LS =>	11,49	MO com LS =>	21.50
			Valor do BDI => 31,88			Valor com BDI =>	159.61
				Quant. =>	18,80	Preço Total =>	3.000,66

16		CALÇADA DE PROTEÇÃO					18.594,36
16.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	68,75	68.75
			MO sem LS => 22,40	LS =>	25,70	MO com LS =>	48.10
			Valor do BDI => 17,15			Valor com BDI =>	85.91
				Quant. =>	3,97	Preço Total =>	341,06

16.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	41,68	41.68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	17,38	41.68
			MO sem LS => 13,58	LS =>	15,58	MO com LS =>	29.16
				Quant. =>	2,78	Preço Total =>	144,78

16.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00	160,45	160.45
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	669,88	9.04
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,00	25,49	76.41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	17,38	26.05
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	55,85	0,68	37.97
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 12" CM	Material	M	1,51	6,31	9.52
			MO sem LS => 37,45	LS =>	42,99	MO com LS =>	80.44
			Valor do BDI => 40,04			Valor com BDI =>	200.49
				Quant. =>	19,90	Preço Total =>	3.989,75

16.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94994 SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	PISO - PISOS	m²	1,00	139,44	139.44
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	680,09	65.96
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	25,21	4.55
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,28	25,49	7.05
Insumo	00003777 SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1,13	1,90	2.14
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,20	0,96	0.19
Insumo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,25	4,11	1.02
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,12	45,08	50.59
			MO sem LS => 9,42	LS =>	10,82	MO com LS =>	20.24
			Valor do BDI => 34,80			Valor com BDI =>	174.24
				Quant. =>	72,77	Preço Total =>	12.679,44

16.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	7,65	7.65

EM BRANCO

Fls. 375
Rubrica

Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,00	815,94	3,42
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,12	25,49	3,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,06	17,38	1,07
			MO sem LS =>	1,77	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,80
			Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI =>	9,55
					Quant. =>	25,92	Preço Total =>	247,53

16.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,00	36,80	36,80
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	0,04	581,25	21,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,47	25,49	11,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	17,38	2,97
			MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,64	MO com LS =>	14,30
			Valor do BDI =>	9,18			Valor com BDI =>	45,98
					Quant. =>	25,92	Preço Total =>	1.191,80

17		ESQUADRIAS						20.005,04
17.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),	ESQV -		UN	1,00	310,43	310,43
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,68	24,08	40,40
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material		UN	3,00	16,06	48,18
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material		UN	19,80	0,07	1,38
Insumo	00010556 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO)	Material		UN	1,00	205,89	205,89
			MO sem LS =>	19,48	LS =>	22,36	MO com LS =>	41,84
			Valor do BDI =>	77,48			Valor com BDI =>	387,91
					Quant. =>	5,00	Preço Total =>	1.939,55

Composição	94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	1,00	781,55	781,55
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,01	861,54	6,89
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,10	25,49	53,50
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,05	17,38	18,23
Insumo	00011199 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ., PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS. 120 X 150 CM (A X L)	Material		UN	0,56	1.264,72	702,93
			MO sem LS =>	26,01	LS =>	29,86	MO com LS =>	55,87
			Valor do BDI =>	195,07			Valor com BDI =>	976,62
					Quant. =>	18,00	Preço Total =>	17.579,16

17.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,02	861,54	18,09
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,58	25,49	116,76
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,29	17,38	39,81
Insumo	00011190 SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material		UN	2,78	229,00	636,16
			MO sem LS =>	56,96	LS =>	65,37	MO com LS =>	122,33
			Valor do BDI =>	202,38			Valor com BDI =>	1.013,20
					Quant. =>	0,48	Preço Total =>	486,33

18		LOUÇAS E METAIS						8.620,67
18.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2390 ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	Alambrados e Gradis		un	1,00	188,30	188,30
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,30	3,60	1,08
Insumo	2063 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2" - Jackwal ou similar	Material		un	1,00	181,28	181,28
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,30	19,81	5,94
			MO sem LS =>	2,77	LS =>	3,17	MO com LS =>	5,94
			Valor do BDI =>	46,99			Valor com BDI =>	235,29
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	470,58

Composição	8974 ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação	Louças e Metais Sanitários		un	1,00	1.065,16	1.065,16
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,03	734,10	22,02
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,30	3,60	1,08
Insumo	9262 ORSE	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) - em placa sólida de fórmica, sistema de travamento na vertical e ferragens em latão	Material		un	1,00	1.036,12	1.036,12
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,30	19,81	5,94
			MO sem LS =>	3,43	LS =>	3,94	MO com LS =>	7,37
			Valor do BDI =>	265,86			Valor com BDI =>	1.331,02
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	2.662,04

18.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95546 SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,00	141,76	141,76
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,90	24,86	47,15
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,60	17,38	10,38
Insumo	00039398 SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Material		UN	1,00	84,23	84,23

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls. 376
Rúbrica

			MO sem LS =>	21.12	LS =>	24.25	MO com LS =>	45.37
			Valor do BDI =>	35.38			Valor com BDI =>	177.14
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	354,28

18.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.00	442.00	442,00
Composição Auxiliar	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.00	10.91	10,91
			MO sem LS =>	11.46	LS =>	13.16	MO com LS =>	24.62
			Valor do BDI =>	113.04			Valor com BDI =>	565.95
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.131,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000377	SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	Material	UN	1.00	35.25	35,25
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	8.79			Valor com BDI =>	44,04
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	88,08

18.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.00	209.09	209,09
Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1.00	134.17	134,17
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.00	49.32	49,32
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.00	6.69	6,69
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.00	8.27	8,27
			MO sem LS =>	9.74	LS =>	11.19	MO com LS =>	20.93
			Valor do BDI =>	52.18			Valor com BDI =>	261.27
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	783,81

Composição	2050	ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	Louças e Metais Sanitários	un	1.00	25.21	25,21
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0.40	3.65	1,46
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0.40	19.81	7,92
Insumo	00007608	SINAPI	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 " AGUA FRIA	Material	UN	1.00	6.49	6,49
Insumo	00011680	SINAPI	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	Material	UN	1.00	9.34	9,34
			MO sem LS =>	3.69	LS =>	4.23	MO com LS =>	7.92
			Valor do BDI =>	6.29			Valor com BDI =>	31.50
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	63,00

Composição	2103	ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão	Louças e Metais Sanitários	un	1.00	823.50	823,50
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0.04	762.70	27,45
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	2.88	14.07	40,52
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2.00	3.74	7,48
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2.00	3.60	7,20
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2.00	3.65	7,30
Insumo	245	ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	Material	un	1.00	188.88	188,88
Insumo	9964	ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	1.20	19.61	23,53
Insumo	14004	ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar) un	0	un	1.00	186.45	186,45
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	2.00	19.81	39,62
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2.00	19.81	39,62
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2.00	11.96	23,92
Insumo	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Material	UN	1.00	52.93	52,93
			MO sem LS =>	52.82	LS =>	60.62	MO com LS =>	113.44
			Valor do BDI =>	205.54			Valor com BDI =>	1.029,04
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.029,04

18.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0.05	762.70	45,76
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	4.80	14.07	67,53
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4.00	3.74	14,96
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	4.00	3.60	14,40
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	4.00	3.65	14,60
Insumo	245	ORSE	Pia de cozinha em aço inox 2,00x0,60m c/ 2 cubas, sem valvula (padrão comercial) un	0	un	1.00	407.82	407,82
Insumo	2016	ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar	Material	un	2.00	178.60	357,20
Insumo	9964	ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	1.20	19.61	23,53
Insumo	14004	ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar) un	0	un	2.00	186.45	372,90
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	4.00	19.81	79,24
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	4.00	19.81	79,24
Insumo	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Material	UN	2.00	52.93	105,86
			MO sem LS =>	104.04	LS =>	119.41	MO com LS =>	223.45
			Valor do BDI =>	407.06			Valor com BDI =>	2.037,94
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.037,94

19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		12.244,54

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 337
Rúbrica

19.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93243 SINAPI	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saida, sisquiro, extravasor	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	6.872,09	6.872,09
Composição Auxiliar	98462 SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS, AF_05/2018_P	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	5.470,89	5.470,89
Composição Auxiliar	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	3,00	7,50	22,50
Composição Auxiliar	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	20,00	10,57	211,40
Composição Auxiliar	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,00	21,17	21,17
Composição Auxiliar	89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	42,72	42,72
Composição Auxiliar	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	34,02	34,02
Insumo	00034640 SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,00	1.049,41	1.049,41
			MO sem LS => 196,64	LS =>	225,70	MO com LS =>	422,34
			Valor do BDI => 1.715,27			Valor com BDI =>	8.587,36
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	8.587,36

19.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89446 SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,00	5,76	5,76
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,86	0,34
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	24,86	0,48
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,05	4,70	4,93
			MO sem LS => 0,30	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,64
			Valor do BDI => 1,43			Valor com BDI =>	7,19
				Quant. =>	28,90	Preço Total =>	207,79

19.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89448 SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	17,32	17,32
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	17,86	0,50
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	24,86	0,70
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01	2,30	0,01
Insumo	00009874 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,05	15,36	16,11
			Valor do BDI => 4,32			Valor com BDI =>	21,64
				Quant. =>	30,10	Preço Total =>	651,36

19.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	12,41	12,41
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,86	1,25
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,45	24,86	11,16
			MO sem LS => 4,62	LS =>	5,31	MO com LS =>	9,93
			Valor do BDI => 3,09			Valor com BDI =>	15,50
				Quant. =>	19,75	Preço Total =>	306,12

Composição	89362 SINAPI	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,00	8,20	8,20
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	17,86	2,71
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	24,86	3,77
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08	0,32
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	0,93	0,93
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03	2,30	0,07
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	51,08	0,40
			MO sem LS => 2,34	LS =>	2,69	MO com LS =>	5,03
			Valor do BDI => 2,04			Valor com BDI =>	10,24
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>	81,92

Composição	89364 SINAPI	Curva 90° soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,00	11,16	11,16
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	17,86	2,71
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	24,86	3,77
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08	0,32
Insumo	00001956 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00	3,89	3,89
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	51,08	0,40
			MO sem LS => 2,34	LS =>	2,69	MO com LS =>	5,03
			Valor do BDI => 2,78			Valor com BDI =>	13,94
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	27,88

19.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373 SINAPI	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	14,02	14,02
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	17,86	2,34
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	24,86	3,26
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08	0,26

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 376
Rúbrica

Insumo	00020147 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,00	7,74	7,74
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,35
			MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,32	MO com LS =>	4,34
			Valor do BDI =>	3,49			Valor com BDI =>	17,51
					Quant. =>	11,00	Preço Total =>	192,61

19.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1144 ORSE	Joelho de redução 90º soldável 40 x 25mm água fria	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável		un	1,00	13,26	13,26
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,18	3,74	0,67
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,18	3,65	0,65
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,01	81,38	0,48
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,01	78,37	0,78
Insumo	00003538 SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA	Material		UN	1,00	4,97	4,97
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,18	11,96	2,15
			MO sem LS =>	2,66	LS =>	3,05	MO com LS =>	5,71
			Valor do BDI =>	3,30			Valor com BDI =>	16,56
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	99,36

19.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89497 SINAPI	Joelho 90º soldável 40mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	12,29	12,29
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	17,86	1,86
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	24,86	2,60
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,53
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,02	2,30	0,03
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,71
			MO sem LS =>	1,62	LS =>	1,85	MO com LS =>	3,47
			Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	15,35
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	46,05

19.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1466 ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	Registros e Válvulas		un	1,00	102,73	102,73
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,61	3,74	2,28
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,61	3,65	2,22
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	1,20	0,22	0,26
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,61	19,81	12,08
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,61	11,96	7,29
			MO sem LS =>	9,02	LS =>	10,35	MO com LS =>	19,37
			Valor do BDI =>	25,64			Valor com BDI =>	128,37
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	385,11

19.11	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383 SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	5,81	5,81
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,09	17,86	1,68
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,09	24,86	2,34
Insumo	00000065 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",	Material		UN	1,00	1,11	1,11
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,26
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,35
			MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,67	MO com LS =>	3,12
			Valor do BDI =>	1,45			Valor com BDI =>	7,26
					Quant. =>	14,00	Preço Total =>	101,64

19.12	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1470 ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	Registros e Válvulas		un	1,00	80,52	80,52
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,61	3,74	2,28
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,61	3,65	2,22
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,94	0,22	0,20
Insumo	1966 ORSE	Registro pressão 3/4" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	Material		un	1,00	56,45	56,45
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,61	11,96	7,29
			MO sem LS =>	9,02	LS =>	10,35	MO com LS =>	19,37
			Valor do BDI =>	20,09			Valor com BDI =>	100,61
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	100,61

19.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 379
Rúbrica
- PMU -

Composição	89395 SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	11,40		11,40
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	17,86		3,61
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	24,86		5,03
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08		0,47
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,05	2,30		0,11
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	51,08		0,61
			MO sem LS =>	3,13	LS =>	3,59	MO com LS =>	6,72
			Valor do BDI =>	2,84			Valor com BDI =>	14,24
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	85,44

19.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89420 SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	9,31	9,31
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	17,86	0,92
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	24,86	1,29
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08	0,27
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03	2,30	0,05
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	51,08	0,30
			MO sem LS => 0,80	LS =>	0,92	MO com LS =>	1,72
			Valor do BDI => 2,32			Valor com BDI =>	11,63
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	11,63

19.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89623 SINAPI	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	19,33	19,33
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	17,86	2,50
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	24,86	3,48
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,02	45,08	0,79
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02	2,30	0,05
Insumo	00007141 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	Material	UN	1,00	11,44	11,44
			MO sem LS => 2,16	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,64
			Valor do BDI => 4,82			Valor com BDI =>	24,15
				Quant. =>	5,00	Preço Total =>	120,75

19.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3147 ORSE	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	Conversão InfoWOrca	un	1,00	19,02	19,02
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,30	3,74	1,12
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,30	3,65	1,09
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,01	81,38	1,13
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,02	78,37	1,56
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,30	19,81	5,94
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,30	11,96	3,58
			MO sem LS => 4,43	LS =>	5,09	MO com LS =>	9,52
			Valor do BDI => 4,74			Valor com BDI =>	23,76
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	23,76

19.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11	17,86	2,02
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11	24,86	2,81
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,07	14,71	1,05
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01	2,30	0,02
Insumo	00011676 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,00	36,81	36,81
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02	51,08	0,91
			MO sem LS => 1,75	LS =>	2,00	MO com LS =>	3,75
			Valor do BDI => 10,86			Valor com BDI =>	54,50
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	54,50

Composição	94489 SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	21,79		21,79
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08	17,86		1,41
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08	24,86		1,97
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,04	14,71		0,58
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01	2,30		0,01
Insumo	00011674 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,00	17,34		17,34
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	51,08		0,48
			MO sem LS =>	1,22	LS =>	1,41	MO com LS =>	2,63
			Valor do BDI =>	5,43			Valor com BDI =>	27,22

EM BRANCO

PREFEITURA ... PMUI ... Fls. 380 Rúbrica

					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	27,22
19.19	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,00	17,86	17,86
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,00	24,86	24,86
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,50	25,49	38,23
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,50	17,38	26,07
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,00	52,14	0,10
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	2,00	1,36	2,72
Insumo	00003279 SINAPI	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60" CM, H= 60" CM	Material		UN	2,92	220,42	642,85
			MO sem LS =>	38,01	LS =>	43,63	MO com LS =>	81,64
			Valor do BDI =>	187,87			Valor com BDI =>	940,56
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	940,56
19.20	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2082 ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários		un	1,00	51,45	51,45
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,34	3,74	1,27
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,34	3,65	1,24
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,30	0,22	0,06
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,34	19,81	6,73
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,34	11,96	4,06
Insumo	00011762 SINAPI	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4	Material		UN	1,00	38,09	38,09
			MO sem LS =>	5,02	LS =>	5,77	MO com LS =>	10,79
			Valor do BDI =>	12,84			Valor com BDI =>	64,29
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	192,87
20.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	18,38	18,38
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,30	17,86	5,35
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,30	24,86	7,45
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,10	2,30	0,23
Insumo	00009835 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,05	5,10	5,35
			MO sem LS =>	4,63	LS =>	5,31	MO com LS =>	9,94
			Valor do BDI =>	4,58			Valor com BDI =>	22,96
					Quant. =>	9,10	Preço Total =>	208,93
20.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	26,93	26,93
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,38	24,86	9,44
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,48
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,13	2,30	0,29
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,02	51,08	0,83
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,05	8,68	9,11
			MO sem LS =>	5,87	LS =>	6,73	MO com LS =>	12,60
			Valor do BDI =>	6,72			Valor com BDI =>	33,65
					Quant. =>	12,40	Preço Total =>	417,26
20.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,74	17,86	13,21
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,74	24,86	18,39
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,04	45,08	1,63
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,25	2,30	0,56
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,06	51,08	3,02
Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,05	14,14	14,84
			MO sem LS =>	11,43	LS =>	13,11	MO com LS =>	24,54
			Valor do BDI =>	12,89			Valor com BDI =>	64,54
					Quant. =>	28,00	Preço Total =>	1.807,12
Composição	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,00	12,41	12,41
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,86	1,25
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,45	24,86	11,16
			MO sem LS =>	4,62	LS =>	5,31	MO com LS =>	9,93
			Valor do BDI =>	3,09			Valor com BDI =>	15,50
					Quant. =>	8,40	Preço Total =>	130,20
20.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89796 SINAPI	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,00	37,24	37,24
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,33	17,86	5,89
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,33	24,86	8,20
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	Material		UN	0,09	18,61	1,71
Insumo	00007091 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	15,44	15,44
			MO sem LS =>	5,09	LS =>	5,84	MO com LS =>	10,93

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 301
Rúbrica

			Valor do BDI =>	9,29			Valor com BDI =>	46,53
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	139,59

20.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1588	ORSE	Té sanitário em PVC rígido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,00	48,25	48,25
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,46	3,74	1,72
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,46	3,65	1,67
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,12	78,37	9,40
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,46	19,81	9,11
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,45	11,96	5,50
Insumo	00011655	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	14,75	14,75
				MO sem LS =>	6,80	LS =>	7,81 MO com LS =>	14,61
				Valor do BDI =>	12,04		Valor com BDI =>	60,29
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	60,29

20.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89785	SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	19,93	19,93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	24,86	4,22
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,00	1,69	3,38
Insumo	00003662	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	8,56	8,56
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) / DE *400* G)	Material	UN	0,04	18,61	0,74
				MO sem LS =>	2,62	LS =>	3,01 MO com LS =>	5,63
				Valor do BDI =>	4,97		Valor com BDI =>	24,90
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	24,90

20.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1603	ORSE	Joelho 90º de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,00	11,22	11,22
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,12	3,74	0,44
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,12	3,65	0,43
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,02	81,38	1,30
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,02	78,37	1,72
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,12	19,81	2,37
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	3,53	3,53
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,12	11,96	1,43
				MO sem LS =>	1,77	LS =>	2,03 MO com LS =>	3,80
				Valor do BDI =>	2,80		Valor com BDI =>	14,02
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>	140,20

20.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1554	ORSE	Joelho 90º de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,00	10,84	10,84
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,14	3,74	0,52
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,14	3,65	0,51
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,02	78,37	1,72
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,14	19,81	2,77
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	2,43	2,43
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,14	11,96	1,67
				MO sem LS =>	2,07	LS =>	2,37 MO com LS =>	4,44
				Valor do BDI =>	2,70		Valor com BDI =>	13,54
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>	135,40

20.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744	SINAPI	Joelho 90º de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,00	22,56	22,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	17,86	4,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	24,86	6,21
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO	Material	UN	1,00	8,04	8,04
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) / DE *400* G)	Material	UN	0,05	18,61	0,85
				MO sem LS =>	3,86	LS =>	4,43 MO com LS =>	8,29
				Valor do BDI =>	5,63		Valor com BDI =>	28,19
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	112,76

20.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732	SINAPI	Joelho 45º de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	10,64	10,64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	17,86	2,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	24,86	3,23
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00	1,69	1,69
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	3,03	3,03
				MO sem LS =>	2,01	LS =>	2,30 MO com LS =>	4,31
				Valor do BDI =>	2,65		Valor com BDI =>	13,29
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	13,29

20.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 382
Rúbrica

Composição	89726 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	[illegible]		6,51
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	17,86		1,78
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	24,86		2,48
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08		0,44
Insumo	00003516 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	1,01		1,01
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02	2,30		0,04
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02	51,08		0,76
			MO sem LS => 1,54	LS =>	1,76	MO com LS =>		3,30
			Valor do BDI => 1,62			Valor com BDI =>		8,13
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>		16,26

20.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89750 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	59,30	59,30
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	17,86	4,46
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	24,86	6,21
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00	3,00	3,00
Insumo	00001970 SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	44,78	44,78
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	Material	UN	0,05	18,61	0,85
			MO sem LS => 3,86	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,29
			Valor do BDI => 14,80			Valor com BDI =>	74,10
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	148,20

20.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89735 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	18,05	18,05
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	17,86	2,32
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	24,86	3,23
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00	1,69	1,69
Insumo	00001968 SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	10,44	10,44
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,02	18,61	0,37
			MO sem LS => 2,01	LS =>	2,30	MO com LS =>	4,31
			Valor do BDI => 4,50			Valor com BDI =>	22,55
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	45,10

20.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89709 SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS [illegible]	UN	1,00	9,98	9,98
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,86	1,25
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	24,86	1,74
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,00	45,08	0,22
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02	2,30	0,03
Insumo	00011741 SINAPI	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,00	6,36	6,36
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	51,08	0,38
			MO sem LS => 1,08	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,31
			Valor do BDI => 2,49			Valor com BDI =>	12,47

20.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707 SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no mínimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	27,35	27,35
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	17,86	4,46
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	24,86	6,21
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00	1,69	1,69
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08	0,66
Insumo	00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA	Material	UN	1,00	12,68	12,68
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,06	2,30	0,14
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02	51,08	1,14
			MO sem LS => 3,86	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,29
			Valor do BDI => 6,82			Valor com BDI =>	34,17
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	102,51

20.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,12	3,74	0,44
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,12	3,65	0,43
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,03	81,38	2,03
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,04	78,37	3,13
Insumo	00001200 SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	8,74	8,74
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,12	19,81	2,37
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,12	11,96	1,43
			MO sem LS => 1,77	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,80
			Valor do BDI => 4,63			Valor com BDI =>	23,20
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	46,40

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 387
Rubrica

20.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98078 SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2.00m e altura de 2.50m, com tampa de concreto armado dn 1.60m e e=10cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.00	4.377,10	4.377,10
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,24	54,71	13,30
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,12	151,78	18,12
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	1.285,17	133,65
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,21	14,01	44,94
Composição Auxiliar	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,04	54,19	56,35
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,13	2.675,67	337,13
Composição Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,03	3.113,31	78,45
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,02	940,90	959,81
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,15	25,49	793,90
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,47	17,38	425,31
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,37	241,18	89,14
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	2.198,02	0,64	1.406,73
			MO sem LS => 571,22	LS =>	655,64	MO com LS =>	1.226,86
			Valor do BDI => 1.092,52			Valor com BDI =>	5.469,62
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	5.469,62

Composição	98082 SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2.30x1.80x1.70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	4.060,16	4.060,16
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,14	54,71	7,66
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,07	151,78	10,70
Composição Auxiliar	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	1.317,88	137,85
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	1.285,17	134,42
Composição Auxiliar	89996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,46	14,48	50,03
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,75	671,35	506,13
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,20	14,01	58,78
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	20,01	19,23	384,80
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,24	2.675,67	629,31
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,09	620,01	54,68
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,47	786,56	373,38
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,99	25,49	560,63
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	17,28	17,38	300,34
Insumo	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR	Material	UN	106,89	5,71	610,36
Insumo	00000660 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	35,70	3,54	126,37
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material	M	0,42	2,74	1,15
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,04	21,63	0,96
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,50	0,96	0,48
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,57	8,23	12,94
			MO sem LS => 527,69	LS =>	605,68	MO com LS =>	1.133,37
			Valor do BDI => 1.013,41			Valor com BDI =>	5.073,57
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	5.073,57

20.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2798 ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforçada, revestida internamente com barra lisa e fundo em	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,00	533,42	533,42
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,11	762,70	83,13
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	3,20	15,06	48,19
Composição Auxiliar	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	2,24	101,14	226,55
Composição Auxiliar	1908 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1,92	34,25	65,76
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,58	47,10	27,12
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,92	7,57	14,53
			MO sem LS => 100,32	LS =>	115,14	MO com LS =>	215,46
			Valor do BDI => 133,14			Valor com BDI =>	666,56
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>	5.332,48

21		COMBATE A INCÊNDIO					641,21
21.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101909 SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00	215,71	215,71
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	17,86	8,16
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	24,66	11,37
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES	Material	UN	2,00	0,59	1,18
Insumo	00010892 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,00	195,00	195,00
			MO sem LS => 7,06	LS =>	8,10	MO com LS =>	15,16
			Valor do BDI => 53,84			Valor com BDI =>	269,55

21.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 384
Rúbrica

Composição	10363 ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	Sinalização Vertical		un	1,00	24,97	24,97
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	0,25	3,63	0,90
Insumo	2682 ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	Material		un	4,00	0,14	0,56
Insumo	11143 ORSE	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	Material		un	1,00	18,56	18,56
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	0,25	19,81	4,95
			MO sem LS =>	2,30	LS =>	2,65	MO com LS =>	4,95
			Valor do BDI =>	6,23			Valor com BDI =>	31,20
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	62,40

21.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11852 ORSE	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Sinalização Vertical		Un	1,00	31,78	31,78
Insumo	00037559 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-	Material		UN	1,00	31,78	31,78
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	7,93			Valor com BDI =>	39,71
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	39,71

22		INSTALAÇÃO ELÉTRICA						28.832,80
22.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940 SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,00	14,35	14,35
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,00	861,54	0,77
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	18,65	4,60
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	25,76	6,36
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material		UN	1,00	2,62	2,62
			MO sem LS =>	3,91	LS =>	4,49	MO com LS =>	8,40
			Valor do BDI =>	3,58			Valor com BDI =>	17,93
					Quant. =>	46,00	Preço Total =>	824,78

22.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,00	2,81	2,81
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	18,65	0,44
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	25,76	0,61
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,19	1,47	1,74
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,79
			Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,51
					Quant. =>	62,60	Preço Total =>	219,72
Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,00	2,81	2,81
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	18,65	0,44
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	25,76	0,61
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,19	1,47	1,74
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,79
			Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,51
					Quant. =>	76,60	Preço Total =>	268,86
Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,00	2,81	2,81
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	18,65	0,44
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	25,76	0,61
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,19	1,47	1,74
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,79
			Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,51
					Quant. =>	52,60	Preço Total =>	184,62
Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,00	2,81	2,81
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	18,65	0,44
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	25,76	0,61
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,19	1,47	1,74
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,79
			Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,51
					Quant. =>	142,20	Preço Total =>	499,12
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,00	4,13	4,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,65	0,55

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 389
Rúbrica

Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	25,76	0,77
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,19	2,35	2,79
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,00
			Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>	5,16
					Quant. =>	142,20	Preço Total =>	733,75
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,00	4,13	4,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,65	0,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	25,76	0,77
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,19	2,35	2,79
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,00
			Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>	5,16
					Quant. =>	82,60	Preço Total =>	426,21
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,00	4,13	4,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,65	0,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	25,76	0,77
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,19	2,35	2,79
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,00
			Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>	5,16
					Quant. =>	188,30	Preço Total =>	971,62
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,00	4,13	4,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,65	0,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	25,76	0,77
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,19	2,35	2,79
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,00
			Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>	5,16
					Quant. =>	153,90	Preço Total =>	794,12

22.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,00	25,10	25,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,12	18,65	2,14
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,19	16,79	19,98
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS =>	1,80	LS =>	2,06	MO com LS =>	3,86
			Valor do BDI =>	6,26			Valor com BDI =>	31,36
					Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.254,40

22.11	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,12	18,65	2,14
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,12	25,76	2,96
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material		M	1,19	16,79	19,98
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS =>	1,80	LS =>	2,06	MO com LS =>	3,86
			Valor do BDI =>	6,26			Valor com BDI =>	31,36
					Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.254,40

22.12	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	25,10	25,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,12	18,65	2,14
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,12	25,76	2,96
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material		M	1,19	16,79	19,98
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS =>	1,80	LS =>	2,06	MO com LS =>	3,86
					Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.254,40

EM BRANCO

PREFEITURA ... DE UIRAMUTA - PMU
Fls. 386
Rúbrica

22.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	25,10	25,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,65	2,14
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	25,76	2,96
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	Material	M	1,19	16,79	19,98
			MO sem LS => 1,80	LS =>	2,06	MO com LS =>	3,86
			Valor do BDI => 6,26			Valor com BDI =>	31,36
				Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.254,40

22.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2794 ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	Caixas de Passagem em alvenaria	un	1,00	274,28	274,28
Composição Auxiliar	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,44	87,37	38,79
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de	Armaduras Convencionais	kg	1,29	14,07	18,20
Composição Auxiliar	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,20	101,14	121,36
Composição Auxiliar	1908 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	0,96	34,25	32,88
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,25	47,10	11,86
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,96	7,57	7,26
			MO sem LS => 51,86	LS =>	59,52	MO com LS =>	111,38
			Valor do BDI => 68,46			Valor com BDI =>	342,74

22.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993 SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	38,99	38,99
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	7,41	7,41
Composição Auxiliar	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	31,58	31,58
			MO sem LS => 8,95	LS =>	10,27	MO com LS =>	19,22
			Valor do BDI => 9,73			Valor com BDI =>	48,72

22.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91973 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	81,59	81,59
Composição Auxiliar	91950 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	11,77	11,77
Composição Auxiliar	91972 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	69,82	69,82
			MO sem LS => 15,37	LS =>	17,64	MO com LS =>	33,01
			Valor do BDI => 20,36			Valor com BDI =>	101,95
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	203,90

Composição	91957 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,00	43,47	43,47
Composição Auxiliar	91956 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	36,06	36,06
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	7,41	7,41
			MO sem LS => 8,57	LS =>	9,84	MO com LS =>	18,41
			Valor do BDI => 10,85			Valor com BDI =>	54,32
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	108,64

22.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91969 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	68,66	68,66
Composição Auxiliar	91968 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,00	61,25	61,25
			MO sem LS => 13,75	LS =>	15,78	MO com LS =>	29,53
			Valor do BDI => 17,13			Valor com BDI =>	85,79
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	171,58

22.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953 SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,00	23,95	23,95
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,00	7,41	7,41
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	16,54	16,54
			Valor do BDI => 5,97			Valor com BDI =>	29,92
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	59,84

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAMUTA
Fls. 387
Rúbrica

22.20	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959 SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E		UN	1,00	37,84	37,84
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	7,41	7,41
Composição Auxiliar	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,00	30,43	30,43
			MO sem LS =>	7,29	LS =>	8,36	MO com LS =>	15,65
			Valor do BDI =>	9,44			Valor com BDI =>	47,28

22.21	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12241 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca		un	1,00	275,71	275,71
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	4,80	3,59	17,23
Insumo	558 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN. Tigre ou similar	Material		un	1,00	163,40	163,40
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	4,80	19,81	95,08
			MO sem LS =>	44,27	LS =>	50,81	MO com LS =>	95,08
			Valor do BDI =>	68,81			Valor com BDI =>	344,52
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	344,52

22.22	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo	Fusíveis, Disjuntores e Chaves		un	1,00	122,14	122,14
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,60	3,74	2,24
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	0,60	3,59	2,15
Insumo	3692 ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	Material		un	1,00	98,70	98,70
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,60	19,81	11,88
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,60	11,96	7,17
			MO sem LS =>	8,87	LS =>	10,18	MO com LS =>	19,05
			Valor do BDI =>	30,48			Valor com BDI =>	152,62

22.23	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93662 SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E		UN	1,00	55,41	55,41
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	18,65	2,47
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	25,76	3,41
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,00	47,35	47,35
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	2,00	1,09	2,18
			MO sem LS =>	2,08	LS =>	2,38	MO com LS =>	4,46
			Valor do BDI =>	13,83			Valor com BDI =>	69,24
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	415,44

22.24	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93655 SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E		UN	1,00	12,28	12,28
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	18,65	1,23
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	25,76	1,70
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,00	8,26	8,26
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	1,00	1,09	1,09
			MO sem LS =>	1,04	LS =>	1,19	MO com LS =>	2,23
			Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	15,34
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>	122,72

Composição	91863 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,00	11,60	11,60
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	3,22	3,22
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,08	18,65	1,52
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,08	25,76	2,11
Insumo	00002674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material		M	1,02	4,68	4,75
			MO sem LS =>	1,98	LS =>	2,28	MO com LS =>	4,26
			Valor do BDI =>	2,89			Valor com BDI =>	14,49
					Quant. =>	75,00	Preço Total =>	1.086,75

22.26	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,00	3,22	3,22
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,11	18,65	1,97
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,11	25,76	2,73
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material		M	1,02	7,21	7,43
			MO sem LS =>	2,36	LS =>	2,71	MO com LS =>	5,07
			Valor do BDI =>	3,83			Valor com BDI =>	19,18
					Quant. =>	9,40	Preço Total =>	180,29

22.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91871 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,00	12,29	12,29

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 388
Rúbrica

Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	25,76		4,37
Insumo	00002674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,02	4,66		4,75
			MO sem LS => 2,66		LS => 3,05	MO com LS =>		5,71
			Valor do BDI => 3,06			Valor com BDI =>		15,35
				Quant. =>	50,30	Preço Total =>		772,10

22.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,00	16,03	16,03
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	18,65	3,61
Insumo	00002585 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,02	7,31	7,43
			MO sem LS => 3,04		LS => 3,48	MO com LS =>	6,52
			Valor do BDI => 4,00			Valor com BDI =>	29,03
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>	120,18

22.29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91873 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,00	19,71	19,71
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	18,65	4,12
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	25,76	5,69
			MO sem LS => 3,46		LS => 3,97	MO com LS =>	7,43
			Valor do BDI => 4,91			Valor com BDI =>	24,62
				Quant. =>	36,00	Preço Total =>	886,32

22.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447 SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmetro menor ou igual a 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	6,19	6,19
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,65	0,63
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	25,76	5,56
			Valor do BDI => 1,54			Valor com BDI =>	7,73
				Quant. =>	57,80	Preço Total =>	446,79

22.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8324 ORSE	Plafon em prolipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma	Luminárias Internas	un	1,00	9,67	9,67
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,20	3,59	0,71
Insumo	8518 ORSE	Plafon plastico branco com soquete E-27	Material	un	1,00	5,00	5,00
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,20	19,81	3,96
			Valor do BDI => 2,41			Valor com BDI =>	12,08
				Quant. =>	29,00	Preço Total =>	350,32

22.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97607 SINAPI	Luminaria tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acrílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	137,10	137,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23	18,65	4,28
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,55	25,76	14,21
Insumo	00038193 SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,00	7,12	7,12
			MO sem LS => 6,66		LS => 7,64	MO com LS =>	14,30
			Valor do BDI => 34,22			Valor com BDI =>	171,32
				Quant. =>	5,00	Preço Total =>	856,60

22.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11857 ORSE	Lâmpada tubular led T8, 16w, bivolt	Luminárias Internas	un	1,00	27,49	27,49
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,15	3,59	0,53
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,15	19,81	2,97
			MO sem LS => 1,38		LS => 1,59	MO com LS =>	2,97
			Valor do BDI => 6,86			Valor com BDI =>	34,35
				Quant. =>	31,00	Preço Total =>	1.064,85

22.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97599 SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,00	26,61	26,61
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	18,65	1,39
Insumo	00038774 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,00	20,60	20,60
			MO sem LS => 2,17		LS => 2,48	MO com LS =>	4,65
			Valor do BDI => 6,64			Valor com BDI =>	33,25
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	99,75

22.35	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985 SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por eletrodeposição anódica e pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco, diâmetro de 5/8" e comprimento de 3,0m. Conforme as normas NBR 13571/96 e UL-467.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	81,94	81,94
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	18,65	4,72
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	25,76	6,51
			MO sem LS => 3,97		LS => 4,55	MO com LS =>	6,52

EM BRANCO

PREFEITURA ... Fls. 389 ... Rúbrica ... PMUI

			Valor do BDI => 20.45			Valor com BDI =>	102.39
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	307,17

22.36	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96977 SINAPI	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,00	59,24	59,24
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,65	0,62
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	25,76	0,86
Insumo	00000867 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,10	52,51	57,76
			Valor do BDI => 14,78			Valor com BDI =>	74,02
				Quant. =>	10,00	Preço Total =>	740,20

22.37	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4192 ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	Subestação Transformadora em Poste	un	1,00	11,95	11,95
Insumo	00011862 SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	Material	UN	1,00	11,95	11,95
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 2,98			Valor com BDI =>	14,93
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	29,86

22.38	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4014 ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20 (vinte) metros de comprimento, conforme norma ABNT NBR NM 60454-3, tipo 5	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	Un	1,00	8,78	8,78
Insumo	00020111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	1,00	8,78	8,78
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 2,19			Valor com BDI =>	10,97
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	32,91

22.39	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2643 ORSE	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	Material	un	1,00	12,60	12,60
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 3,14			Valor com BDI =>	15,74
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	47,22

22.40	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	68,75	68,75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	17,38	68,75
			Valor do BDI => 17,16			Valor com BDI =>	85,91
				Quant. =>	4,50	Preço Total =>	386,59

22.41	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	41,68	41,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	17,38	41,68
			MO sem LS => 13,58	LS =>	15,58	MO com LS =>	29,16
			Valor do BDI => 10,40			Valor com BDI =>	52,08

22.42	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101502 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	1.728,29	1.728,29
Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,05	16,03	96,98
Composição Auxiliar	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,00	9,91	9,91
Composição Auxiliar	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	16,72	16,72
Composição Auxiliar	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	16,65	25,10	417,91
Composição Auxiliar	93666 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	66,74	66,74
Composição Auxiliar	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	488,96	488,96
Composição Auxiliar	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,95	59,24	115,51
Composição Auxiliar	96956 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,00	122,17	122,17
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,02	717,74	11,91
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,91	25,76	74,96
Insumo	00001094 SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,00	27,21	27,21
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA	Material	UN	2,00	1,11	2,22
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	Material	UN	1,00	23,07	23,07
Insumo	00039809 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO /	Material	UN	1,00	164,11	164,11
Insumo	00011864 SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	1,00	26,97	26,97
Insumo	00003398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	1,00	5,01	5,01
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO	Material	UN	3,00	9,42	28,26
Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,00	0,28	0,56
Insumo	00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	0,17	5,07	0,84
			MO sem LS => 149,98	LS =>	172,14	MO com LS =>	322,12
			Valor do BDI => 431,38			Valor com BDI =>	2.159,67
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.159,67

22.43	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	585,13	585,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,06	18,65	19,73
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,44	25,76	88,53
Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	2,00	37,70	75,40
Insumo	00011975 SINAPI	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	Material	UN	4,00	21,83	87,32
Insumo	00012388 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = "2,5" M	Material	UN	1,00	314,15	314,15
			MO sem LS => 39,19	LS =>	44,98	MO com LS =>	84,17

EM BRANCO

			Valor do BDI =>	146.04			Valor com BDI =>	731.17
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.462,34
Composição	12628 ORSE	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças		un	1,00	3.353,68	3.353,68
Composição Auxiliar	80 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm. 02 usos	Formas para Fundações		m²	3,70	101,99	377,36
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana		m³	0,70	47,10	32,97
Composição Auxiliar	10603 ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios		h	1,00	4,20	4,20
Composição Auxiliar	102487 SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,51	733,13	1.107,02
Insumo	8904 ORSE	Máquina de solda elétrica	Equipamento		h	0,85	3,86	3,28
Insumo	00006160 SINAPI	SOLDADOR	Mão de Obra		H	1,00	21,65	21,65
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material		KG	0,85	22,08	18,76
Insumo	00021012 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material		M	6,60	68,64	453,02
Insumo	00021013 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	Material		M	13,20	89,58	1.182,45
			MO sem LS =>	212,40	LS =>	243,80	MO com LS =>	456,20
			Valor do BDI =>	837,07			Valor com BDI =>	4.190,75

Tipo de Licitação Convite

Abertura da Licitação

Numero do Processo Licitatório Processo Administrativo n°

Total sem BDI	394.728,05
Total do BDI	98.358,69
Total Geral	493.086,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 390
Rubrica
PMU

Engenheiro Civil Sávio Julio Pereira Franco
CREA-RR n° 0907966128
Responsável Técnico

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 391
Rúbrica

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI
CNPJ 37.170.148/0001-57

SOUSA & SOUSA

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha_
Município de Uiramutã/ RR

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Roraima
ORSE - 07/2022 - Sergipe

B.D.I.
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Planilha Orçamentária Analitica

1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						21.819,22
1.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,00	107,36	107,36
Composição Auxiliar	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,00	1,25	1,25
Insumo	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra		H	1,00	104,62	104,62
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,00	0,66	0,66
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,00	0,81	0,81
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,00	0,01	0,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,00	0,01	0,01
			MO sem LS =>	49,29	LS =>	56,58	MO com LS =>	105,87
					Quant. =>	64,00	Preço Total =>	8.585,60

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,00	5.295,15	5.295,15
Composição Auxiliar	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,00	63,63	63,63
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	1,00	4.857,64	4.857,64
Insumo	00043499 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,00	202,94	202,94
Insumo	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,00	18,58	18,58
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material		MES	1,00	152,35	152,35
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material		MES	1,00	0,01	0,01
			MO sem LS =>	2.291,31	LS =>	2.629,96	MO com LS =>	4.921,27
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	13.233,62

2		ALIMENTAÇÃO CANTEIRO						20.673,18
2.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	9126 ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diana - jantar)	Alimentação		un	1,00	14,00	14,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	1,00	14,00	14,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Quant. =>	1.182,00	Preço Total =>	20.673,18

3		DIVERSOS						14.924,32
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00010848 SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	Material		UN	1,00	1.341,68	1.341,68
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.676,56

	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00010851 SINAPI	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas	Material		UN	1,00	70,83	70,83
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	531,00

3.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	11397 ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metalon de 20x20cm, fornecida e instalada	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização		un	1,00	750,00	750,00
Insumo	12325 ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em	Material		un	1,00	750,00	750,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	937,20

	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00010527 SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	Equipamento		MXMES	1,00	13,20	13,20
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Quant. =>	90,45	Preço Total =>	1.491,52

3.5	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	2412 ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	Mobiliário		un	1,00	783,36	783,36
Insumo	2509 ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm, natural (sem verniz) un	0		un	1,00	783,36	783,36
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	195,52			Valor com BDI =>	978,88
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>	7.831,04

3.6	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	2450 ORSE	Limpeza geral (final da obra)	Limpeza		m²	1,00	2,19	2,19
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,10	3,74	0,37
Insumo	1997 ORSE	Sabão em pó kg	0		kg	0,01	9,45	0,04
Insumo	2414 ORSE	Vassoura piaçava un	0		un	0,05	11,80	0,59
			MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,64	MO com LS =>	1,19
			Valor do BDI =>	0,54			Valor com BDI =>	2,73
					Quant. =>	900,00	Preço Total =>	2.457,00

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 392
Rúbrica

4		MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					43.557,47
4.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	51 ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,00	550,87	550,87
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,00	3,74	7,48
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,00	3,63	3,63
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	4,00	10,99	43,96
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,00	3,89	3,89
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,00	19,81	19,81
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,00	445,00	445,00
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,15	21,22	3,18
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,00	11,96	23,92
			MO sem LS => 20,36	LS =>	23,37	MO com LS =>	43,73
			Valor do BDI => 137,49			Valor com BDI =>	688,36
				Quant. =>	3,60	Preço Total =>	2.478,09

4.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	6096 ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto: Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro. Rede DN 50mm	Conversão InfoWOrca	UN	1,00	613,28	613,28
Composição Auxiliar	26 ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	Demolições / Remoções	m³	0,02	15,70	0,32
Composição Auxiliar	76 ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,33	15,70	20,81
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade	Escavação Manual em Área	m³	1,35	47,10	63,44
Composição Auxiliar	6083 ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	Conversão InfoWOrca	un	1,00	260,64	260,64
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,00	3,65	3,65
Insumo	980 ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	Material	m	20,00	0,22	4,40
Insumo	2260 ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Torneira plastica p/jardim d= 1/2" (herc - ref. 1128 ou similar)	Material	un	1,00	2,13	2,13
Insumo	2360 ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	Material	un	2,00	8,06	16,12
Insumo	5161 ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	Material	un	2,00	5,00	10,00
Insumo	5240 ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saida roscável de = 60mm x 1/2"	Material	un	1,00	12,29	12,29
Insumo	6313 ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	Material	UN	1,00	0,83	0,83
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	1,00	19,81	19,81
Insumo	00004895 SINAPI	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00	0,69	0,69
Insumo	00006036 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	Material	UN	1,00	11,49	11,49
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,00	11,96	11,96
Insumo	00007096 SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	3,90	3,90
Insumo	00009813 SINAPI	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	Material	M	6,00	5,71	34,26
Insumo	00009856 SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	1,00	8,95	8,95
Insumo	00012773 SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2"	Material	UN	1,00	123,85	123,85
			MO sem LS => 65,27	LS =>	74,92	MO com LS =>	140,19
			Valor do BDI => 153,07			Valor com BDI =>	766,35
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	766,35

4.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	11125 ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia	Entrada em Baixa Tensão	un	1,00	2.205,77	2.205,77
Composição Auxiliar	338 ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em nori	Entrada em Baixa Tensão	un	1,00	491,52	491,52
Composição Auxiliar	353 ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,50	12,71	19,06
Composição Auxiliar	354 ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	6,00	16,25	97,50
Composição Auxiliar	363 ORSE	Curva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	2,00	9,66	19,32
Composição Auxiliar	372 ORSE	Luva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	4,00	3,77	15,08
Composição Auxiliar	681 ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	Pontos de Suprimento de Telefone	un	1,00	6,16	6,16
Composição Auxiliar	2892 ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e	un	1,00	5,01	5,01
Composição Auxiliar	4005 ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	20,00	12,50	250,00
Composição Auxiliar	4429 ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos	un	1,00	160,63	160,63
Composição Auxiliar	7925 ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	4,00	2,30	9,20
Composição Auxiliar	7995 ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,00	71,54	71,54
Composição Auxiliar	9163 ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão InfoWOrca	un	1,00	998,49	998,49
Composição Auxiliar	9379 ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	Conversão InfoWOrca	un	1,00	41,31	41,31
Composição Auxiliar	12370 ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	Pára-raios	kg	0,18	113,86	20,95
			MO sem LS => 206,83	LS =>	237,40	MO com LS =>	444,23
			Valor do BDI => 550,56			Valor com BDI =>	2.756,33
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.756,33

4.4	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	62 ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,00	14.992,56	14.992,56
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos	m³	1,30	712,60	926,38

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 393
Rúbrica

Composição Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	2,80	1.085,87	3.040,43
Composição Auxiliar	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	52,92	36,33	1.922,58
Composição Auxiliar	641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	2,00	223,87	447,74
Composição Auxiliar	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	2,00	20,34	40,68
Composição Auxiliar	3297 ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	1,00	264,06	264,06
Composição Auxiliar	3644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	56,00	15,63	875,28
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	16,00	3,74	59,84
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	16,00	3,63	58,08
Insumo	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	2,00	25,40	50,80
Insumo	629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	77,00	36,36	2.799,72
Insumo	848 ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	4,00	3,60	14,40
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 8cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	87,00	10,99	956,13
Insumo	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	2,00	8,00	16,00
Insumo	1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,20	25,07	30,08
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	16,00	19,81	316,96
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	16,00	11,96	191,36
			MO sem LS => 1.452,41		LS =>	1.667,07	MO com LS => 3.119,48
					Quant. =>	1,00	Preço Total => 18.734,70

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059 SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,00	42,57	42,57
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00	28,29	0,11
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,02	27,33	0,45
Composição Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,00	576,22	2,65
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36	18,28	6,51
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,71	25,21	17,96
Insumo	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,41	11,40	4,70
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,11	21,22	2,35
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,74	3,17	2,36
Insumo	00010567 SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	0,55	3,10	1,70
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,03	14,45	0,36
			Valor do BDI => 10,62				Valor com BDI => 53,19
					Quant. =>	35,00	Preço Total => 1.861,65

4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524 SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,00	2,60	2,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,38	1,24
			MO sem LS => 0,86		LS => 0,99		MO com LS => 1,85
			Valor do BDI => 0,64				Valor com BDI => 3,24
					Quant. =>	900,00	Preço Total => 2.916,00

4.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9203 ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Conversão InfoWOrca	tkm	1,00	0,50	0,50
Insumo	9483 ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Equipamento	tkm	1,00	0,50	0,50
			MO sem LS => 0,00		LS => 0,00		MO com LS => 0,00
			Valor do BDI => 0,12				Valor com BDI => 0,62
					Quant. =>	14.391,75	Preço Total => 8.922,88

4.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100948 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,00	0,92	0,92
Composição Auxiliar	5926 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00	47,25	0,07
			MO sem LS => 0,04		LS => 0,04		MO com LS => 0,08
			Valor do BDI => 0,22				Valor com BDI => 1,14
					Quant. =>	4.492,52	Preço Total => 5.121,47

5		INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES					22.718,58
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	68,75	68,75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	17,38	68,75
			MO sem LS => 22,40		LS => 25,70		MO com LS => 48,10
			Valor do BDI => 17,16				Valor com BDI => 85,91
					Quant. =>	7,80	Preço Total => 670,09
Composição	96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	41,68	41,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	17,38	41,68
			MO sem LS => 13,58		LS => 15,58		MO com LS => 29,16
			Valor do BDI => 10,40				Valor com BDI => 52,08
					Quant. =>	2,00	Preço Total => 104,16

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 394
Rúbrica

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263 SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compensanada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	147,28	147,28
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,25	27,33	6,96
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	18,28	4,57
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,18	25,21	29,74
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m²	1,34	63,36	84,64
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,31	2,74	6,32
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,21	21,22	4,41
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,24	0,96	8,86
			MO sem LS => 15,89		LS => 18,24	MO com LS =>	34,13
			Valor do BDI => 36,76			Valor com BDI =>	184,04
					Quant. => 26,20	Preço Total =>	4.821,84

5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,53	147,28	77,32
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	18,28	3,76
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,13	25,21	28,36
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	7,10	0,07
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,20	8,58	1,68
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,79	3,30	2,59
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,39	13,20	5,16
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,02	26,19	0,49
			MO sem LS => 20,06		LS => 23,02	MO com LS =>	43,08
			Valor do BDI => 29,81			Valor com BDI =>	145,26

5.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	37,80	37,80
Composição Auxiliar	94966 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,06	523,95	29,60
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27	25,49	6,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,38	1,28
			MO sem LS => 4,21		LS => 4,83	MO com LS =>	9,04
			Valor do BDI => 9,43			Valor com BDI =>	47,23
					Quant. => 14,80	Preço Total =>	699,00

5.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,67	1,25
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	52,14	37,69
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,36	493,21
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	208,80	123,96
			MO sem LS => 24,22		LS => 27,80	MO com LS =>	52,02
			Valor do BDI => 181,39			Valor com BDI =>	905,14

5.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,21	46,53
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,49	47,05
			MO sem LS => 65,85		LS => 75,58	MO com LS =>	141,43
			Valor do BDI => 47,75			Valor com BDI =>	239,09
					Quant. => 4,80	Preço Total =>	1.147,63

5.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	21,73	21,73
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	14,49	14,49
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,17	0,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	25,33	5,68
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,22	0,26
			MO sem LS => 3,05		LS => 3,51	MO com LS =>	6,56
			Valor do BDI => 5,42			Valor com BDI =>	27,15
					Quant. => 39,76	Preço Total =>	1.079,48

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 399
Rúbrica

5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	13,91	13,91
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	17,17	0,26
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	25,33	2,42
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,54	0,22	0,11
				MO sem LS =>	1,09	LS =>	1,25	MO com LS =>	2,35
				Valor do BDI =>	4,33			Valor com BDI =>	21,70
						Quant. =>	273,12	Preço Total =>	5.926,70
6			INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME						24.532,96
6.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,00	68,75	68,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,96	17,38	68,75
				MO sem LS =>	22,40	LS =>	25,70	MO com LS =>	48,10
				Valor do BDI =>	17,16			Valor com BDI =>	85,91
						Quant. =>	1,66	Preço Total =>	142,61
6.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96539	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	111,41	111,41
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,03	26,29	0,73
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,06	27,33	1,50
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,94	25,21	48,86
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material		m²	0,59	63,36	37,57
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,01	7,10	0,07
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,29	2,74	6,28
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,01	26,19	0,26
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,01	23,49	0,16
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,04	21,63	0,75
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,36	0,96	1,30
				MO sem LS =>	23,54	LS =>	27,01	MO com LS =>	50,55
				Valor do BDI =>	27,80			Valor com BDI =>	139,21
6.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	37,80	37,80
Composição Auxiliar	94966	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,06	523,95	29,60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,27	25,49	6,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,38	1,26
				MO sem LS =>	4,21	LS =>	4,83	MO com LS =>	9,04
				Valor do BDI =>	9,43			Valor com BDI =>	47,23
						Quant. =>	13,40	Preço Total =>	632,88
6.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,75	1,67	1,25
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,72	52,14	37,69
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	382,66	1,36	493,21
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,59	208,90	123,96
				MO sem LS =>	24,22	LS =>	27,80	MO com LS =>	52,02
				Valor do BDI =>	181,39			Valor com BDI =>	908,14
						Quant. =>	4,87	Preço Total =>	4.422,64
6.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,21	46,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,49	47,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,54	17,38	96,25
				MO sem LS =>	65,85	LS =>	75,58	MO com LS =>	141,43
				Valor do BDI =>	47,75			Valor com BDI =>	239,09
						Quant. =>	4,87	Preço Total =>	1.164,36
6.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	21,73	21,73

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 396
Rúbrica

Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	14,49	14,49
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,04	17,17	0,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,22	25,33	5,68
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,19	0,22	0,26
			MO sem LS =>	3,05	LS =>	3,51	MO com LS =>	6,56
			Valor do BDI =>	5,42			Valor com BDI =>	27,15
					Quant. =>	62,97	Preço Total =>	1.709,63

6.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92777 SINAPI	Armação de aço CA-50, diâmetro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	19,41	19,41
Composição Auxiliar	92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	15,00	15,00
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	17,17	0,35
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	25,33	3,23
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,74	0,22	0,16
			MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,26
			Valor do BDI =>	4,84			Valor com BDI =>	24,25
					Quant. =>	148,70	Preço Total =>	3.605,97

6.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,01	669,88	9,04
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,00	25,49	76,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,50	17,38	26,05
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	55,85	0,68	37,97
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,04	40,33	1,46
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material		M	1,51	6,31	9,52
			MO sem LS =>	37,45	LS =>	42,99	MO com LS =>	80,44
			Valor do BDI =>	40,04			Valor com BDI =>	200,49
					Quant. =>	25,93	Preço Total =>	5.198,70

6.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557 SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,00	37,83	37,83
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,09	18,49	1,57
Composição Auxiliar	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,42	25,73	10,85
Insumo	00000626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material		KG	1,50	16,94	25,41
			MO sem LS =>	4,53	LS =>	5,19	MO com LS =>	9,72
			Valor do BDI =>	9,44			Valor com BDI =>	47,27
					Quant. =>	53,65	Preço Total =>	2.536,03

7		SUPERESTRUTURA - PILARES						30.051,78
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263 SINAPI	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	147,28	147,28
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,06	28,29	1,78
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,26	27,33	6,96
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	18,28	4,57
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,18	25,21	29,74
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,31	2,74	6,33
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,21	21,22	4,41
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	9,24	0,96	8,86
			MO sem LS =>	15,89	LS =>	18,24	MO com LS =>	34,13
			Valor do BDI =>	36,76			Valor com BDI =>	184,04
					Quant. =>	61,44	Preço Total =>	11.307,41

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,00	119,45	119,45
Composição Auxiliar	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	0,53	147,28	77,32
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,13	25,21	28,36
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,01	7,10	0,07
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento		MES	0,20	8,58	1,68
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento		MES	0,79	3,30	2,59
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento		MES	0,39	13,20	5,18
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,02	26,19	0,49
			MO sem LS =>	20,06	LS =>	23,02	MO com LS =>	43,08
			Valor do BDI =>	29,81			Valor com BDI =>	148,26
					Quant. =>	61,44	Preço Total =>	9.170,53

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 397
Rúbrica

Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1): preparo	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,67	1,25
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	52,14	37,69
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,36	493,21
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	208,90	123,96
			MO sem LS => 24,22		LS => 27,80	MO com LS =>	52,02
			Valor do BDI => 181,39			Valor com BDI =>	938,14

7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,21	46,63
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,49	47,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	17,38	96,25
			MO sem LS => 65,85		LS => 75,58	MO com LS =>	141,43
			Valor do BDI => 47,75			Valor com BDI =>	239,09
				Quant. =>	3,34	Preço Total =>	798,56

7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	21,73	21,73
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,17	0,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	25,33	5,68
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,22	0,26
			MO sem LS => 3,05		LS => 3,51	MO com LS =>	6,56
			Valor do BDI => 5,42			Valor com BDI =>	27,15
				Quant. =>	65,63	Preço Total =>	1.781,85

7.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	17,37	17,37
Composição Auxiliar	92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,00	13,91	13,91
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,17	0,25
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,54	0,22	0,11
			MO sem LS => 1,09		LS => 1,26	MO com LS =>	2,35
			Valor do BDI => 4,33			Valor com BDI =>	21,70
				Quant. =>	182,50	Preço Total =>	3.960,25

8		SUPERESTRUTURA - VIGAS					21.246,57
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92265 SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	117,63	117,63
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,05	28,29	1,41
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,24	27,33	6,47
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	18,25	3,69
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,91	25,21	22,96
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m²	1,15	63,35	72,61
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,17	2,74	0,45
Insumo	00005066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,16	21,22	3,37
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,95	0,96	6,67
			MO sem LS => 12,77		LS => 14,65	MO com LS =>	27,42
			Valor do BDI => 29,36			Valor com BDI =>	148,99
				Quant. =>	38,88	Preço Total =>	5.714,97

8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92455 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	128,86	128,86
Composição Auxiliar	92272 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,73	26,94	46,67
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	18,28	3,47
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,04	25,21	26,09
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	7,10	0,07
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,05	26,19	1,29
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,33	8,23	2,69
			MO sem LS => 19,75		LS => 22,67	MO com LS =>	42,42
			Valor do BDI => 32,16			Valor com BDI =>	161,02
				Quant. =>	38,88	Preço Total =>	6.260,45

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 394
Rúbrica

Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) , preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,67	1,25
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	52,14	37,69
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,36	493,21
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	208,90	123,96
			MO sem LS => 24,22	LS =>	27,80	MO com LS =>	52,02
			Valor do BDI => 181,39			Valor com BDI =>	906,14
				Quant. =>	3,74	Preço Total =>	3.396,44

8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,21	46,53
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,49	47,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	17,38	96,25
			MO sem LS => 65,85	LS =>	75,58	MO com LS =>	141,43
			Valor do BDI => 47,75			Valor com BDI =>	239,09
				Quant. =>	3,74	Preço Total =>	894,19

8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	21,73	21,73
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	14,49	14,49
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,17	0,62
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	25,33	5,68
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,22	0,26
			MO sem LS => 3,05	LS =>	3,51	MO com LS =>	6,56
			Valor do BDI => 5,42			Valor com BDI =>	27,15
				Quant. =>	65,43	Preço Total =>	1.776,42

8.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92776 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	20,65	20,65
Composição Auxiliar	92792 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	14,96	14,96
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	17,17	0,48
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	25,33	4,33
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,97	0,22	0,21
			MO sem LS => 2,16	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,64
				Quant. =>	124,19	Preço Total =>	3.204,10

9		ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO					35.019,46
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (es= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00	116,45	116,45
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	581,25	6,16
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,33	25,49	59,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,17	17,38	20,28
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,74	0,68	25,66
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,01	40,33	0,52
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	1,09	3,99	4,34
			MO sem LS => 28,86	LS =>	32,13	MO com LS =>	61,99
			Valor do BDI => 29,06			Valor com BDI =>	145,51

9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93201 SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	6,24	6,24
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	543,88	1,90

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 399
Rubrica
PMU

Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		25.49			3.82
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	17.38			0.52
			MO sem LS =>	1.68	LS =>	1,93	MO com LS =>		3.62
			Valor do BDI =>	1.55			Valor com BDI =>		7.79
					Quant. =>	55,83	Preço Total =>		434,91

9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93186 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E	M	1,00	88,32	88,32
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,49	14,66	7,18
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,35	91,15	31,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	25,49	9,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	17,38	3,29
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	7,10	0,04
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,22	1,32
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,35	2,74	0,96
			MO sem LS =>	9,12	LS =>	10,46	MO com LS =>		19,58
			Valor do BDI =>	16,55			Valor com BDI =>		82,87
					Quant. =>	23,00	Preço Total =>		1.906,01

9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93188 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	57,57	57,57
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,01	671,35	8,05
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,30	91,15	27,34
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	25,49	9,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	17,38	3,35
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	7,10	0,03
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,22	1,32
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,22	2,74	3,34
			MO sem LS =>	8,57	LS =>	9,84	MO com LS =>		18,41
			Valor do BDI =>	14,36			Valor com BDI =>		71,93

9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93196 SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	65,36	65,36
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,49	14,66	7,18
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,02	671,35	12,08
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,35	91,15	31,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	25,49	9,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	17,38	3,26
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	7,10	0,04
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,22	1,32
			MO sem LS =>	9,12	LS =>	10,46	MO com LS =>		19,58
			Valor do BDI =>	16,31			Valor com BDI =>		81,87
					Quant. =>	19,00	Preço Total =>		1.551,73

10		REVESTIMENTO						41.475,24
10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	7,65		7,65
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	25,49		3,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	17,38		1,07
			MO sem LS =>	1,77	LS =>	2,03	MO com LS =>		3,80
			Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI =>		9,55
					Quant. =>	406,08	Preço Total =>		3.878,06

10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	36,80	36,80
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	581,25	21,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47	25,49	11,98
			MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,64	MO com LS =>		14,30
			Valor do BDI =>	9,18			Valor com BDI =>		45,98
					Quant. =>	406,08	Preço Total =>		18.671,55

10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87528 SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes para ambientes com area menor	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	43,62	43,62
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	669,88	25,18
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,58	25,49	14,78
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	17,38	3,66
			Valor do BDI =>	10,88			Valor com BDI =>		54,50
					Quant. =>	111,36	Preço Total =>		6.069,12

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU - Fls. 400 Rúbrica

10.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87274 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1.00	92.39	92.39
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1.02	28.15	29.73
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.50	17.38	8.69
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	6.14	1.25	7.67
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0.22	7.34	1.61
			MO sem LS =>	14.14	LS =>	16.22	MO com LS =>	30.36
			Valor do BDI =>	23.06			Valor com BDI =>	115.45
					Quant. =>	111.36	Preço Total =>	12.856,51

11		PINTURA						16.190,39
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	PINT - PINTURAS		m²	1.00	2.30	2.30
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.04	26.53	1.03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.01	17.38	0.24
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material		L	0.16	6.49	1.03
			MO sem LS =>	0.44	LS =>	0.51	MO com LS =>	0.95
					Quant. =>	406.08	Preço Total =>	1.165,44

11.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497 SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS		m²	1.00	14.27	14.27
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.31	26.53	8.27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.11	17.38	1.98
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR	Material		UN	0.10	0.86	0.08
Insumo	00043626 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material		KG	1.56	2.54	3.94
			Valor do BDI =>	3.56			Valor com BDI =>	17.83
					Quant. =>	203.04	Preço Total =>	3.620,20

11.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	Latex PVA		m²	1.00	17.44	17.44
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,25	3.74	0.93
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios		h	0,35	3.81	1.33
Insumo	1602 ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material		l	0.72	6.72	4.83
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material		UN	0.50	0.86	0.43
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra		H	0.35	19.81	6.93
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0.25	11.96	2.99
			Valor do BDI =>	4.35			Valor com BDI =>	21.79
					Quant. =>	203.04	Preço Total =>	4.424,24

11.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta acetinada em paredes, duas demãos.	PINT - PINTURAS		m²	1.00	13.76	13.76
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.13	26.53	3.44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.05	17.38	0.83
Insumo	00007345 SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material		L	0.33	28.75	9.40
			MO sem LS =>	1.48	LS =>	1.70	MO com LS =>	3.18
			Valor do BDI =>	3.43			Valor com BDI =>	17.19

12		ABRIGO DO GÁS DE COZINHA						2.896,19
12.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1.00	116.45	116.45
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.01	581.25	6.16
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2.33	25.49	59.49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1.17	17.38	20.28
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	37.74	0.68	25.66
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	1.09	3.99	4.34
			MO sem LS =>	28.86	LS =>	33.13	MO com LS =>	61.99
			Valor do BDI =>	29.06			Valor com BDI =>	145.51
					Quant. =>	1,20	Preço Total =>	174,61

12.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1.00	7.65	7.65
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.00	815.94	3.42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,06	17.38	1.07
			MO sem LS =>	1.77	LS =>	2.03	MO com LS =>	3.80
			Valor do BDI =>	1.90			Valor com BDI =>	9.55
					Quant. =>	2,60	Preço Total =>	24,83

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 401
Rúbrica

12.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	36,80	36,80
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	581,25	21,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47	25,49	11,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	17,38	2,97
			MO sem LS => 6,66	LS =>	7,64	MO com LS =>	14,30
			Valor do BDI => 9,18			Valor com BDI =>	45,98
				Quant. =>	2,60	Preço Total =>	119,54

12.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador látex pva em paredes 1 demão	PINT - PINTURAS	m²	1,00	2,30	2,30
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	26,53	1,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01	17,38	0,24
			MO sem LS => 0,44	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
			Valor do BDI => 0,57			Valor com BDI =>	2,87
				Quant. =>	3,98	Preço Total =>	11,42

12.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8624 ORSE	Aplicação e fixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	Latex PVA	m²	1,00	17,44	17,44
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,25	3,74	0,93
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,35	3,81	1,33
Insumo	1602 ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material	l	0,72	6,72	4,83
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR	Material	UN	0,50	0,86	0,43
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,35	19,81	6,93
			MO sem LS => 4,62	LS =>	5,30	MO com LS =>	9,92
			Valor do BDI => 4,35			Valor com BDI =>	21,79
				Quant. =>	3,98	Preço Total =>	86,72

12.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	PINT - PINTURAS	m²	1,00	13,76	13,76
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	26,53	3,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	17,38	0,83
			MO sem LS => 1,48	LS =>	1,70	MO com LS =>	3,18
			Valor do BDI => 3,43			Valor com BDI =>	17,19
				Quant. =>	3,98	Preço Total =>	68,41

12.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1): preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,67	1,25
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	20,62	30,10
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,72	52,14	37,63
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	382,66	1,36	493,21
			MO sem LS => 24,22	LS =>	27,80	MO com LS =>	52,02
			Valor do BDI => 181,39			Valor com BDI =>	908,14
				Quant. =>	1,46	Preço Total =>	1.325,88

12.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,21	46,63
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,49	47,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	17,38	96,25
			MO sem LS => 65,85	LS =>	75,58	MO com LS =>	141,43
			Valor do BDI => 47,75			Valor com BDI =>	239,09
				Quant. =>	1,46	Preço Total =>	349,07

12.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,00	588,76	588,76
Composição Auxiliar	88627 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	742,05	8,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	25,49	11,64

EM BRANCO

Fls.402
Rúbrica

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.23	17.36	3.96
Insumo	00004930 SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	m²	1.00	564.24	564.24
			Valor do BDI => 146.95			Valor com BDI =>	735.71
				Quant. =>	1.00	Preço Total =>	735.71

13		COBERTURA					42.002,35
13.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	283 ORSE	Telhamento com telha PVC colonial, feitas com composto de resina, 2.30x 0.88 x 0.028 m	Telhamento	m²	1.00	61.23	61.23
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.22	3.74	0.82
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0.22	3.63	0.79
Insumo	667 ORSE	Kit de fixação (prego/anilha) para telhas onduline (20 pregos e 20 anilhas)	Material	un	0.50	8.69	4.34
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0.22	19.81	4.35
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0.22	11.96	2.63
			MO sem LS => 3.25	LS =>	3.73	MO com LS =>	8.98
			Valor do BDI => 15.28			Valor com BDI =>	76.51
				Quant. =>	185.13	Preço Total =>	14.164,29

13.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92540 SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	COBE - COBERTURA	m²	1.00	54.03	54.03
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.06	22.30	1.34
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.04	23.11	1.00
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.48	18.28	8.84
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.64	25.21	16.15
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0.07	23.49	1.64
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0.05	21.20	1.06
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0.03	21.38	0.64
Insumo	00004408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3.21	1.11	3.57
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA, "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.66	12.30	8.12
			MO sem LS => 9.75	LS =>	11.20	MO com LS =>	20.95
			Valor do BDI => 13.48			Valor com BDI =>	67.51
				Quant. =>	185.13	Preço Total =>	12.498,12

13.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94223 SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial, feitas com composto de resina, inclusa acessorio de fixação e içamento	COBE - COBERTURA	M	1.00	111.49	111.49
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.00	23.11	0.04
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.00	22.30	0.05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.07	17.36	1.26
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.06	24.97	1.49
Insumo	00007219 SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	1.03	89.72	92.12
Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	4.20	3.65	15.33
			MO sem LS => 0.89	LS =>	1.14	MO com LS =>	3.11
			Valor do BDI => 27.82			Valor com BDI =>	139.31
				Quant. =>	32.24	Preço Total =>	4.491,35

13.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	55960 SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	COBE - COBERTURA	m²	1.00	6.03	6.03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.20	17.36	3.47
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0.10	25.61	2.56
			MO sem LS => 1.13	LS =>	1.30	MO com LS =>	3.43
			Valor do BDI => 1.50			Valor com BDI =>	7.53

13.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4449 ORSE	Forro em .de PVC 100mm - inclusive Estrutura de Metalon e rocaforro	Forros	m²	1.00	57.95	57.95
Insumo	1019 ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref Araforros ou similar	Material	m²	1.00	57.95	57.95
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 14.46			Valor com BDI =>	72.41
				Quant. =>	130.57	Preço Total =>	9.454,57

14		PAVIMENTAÇÃO					42.873,37
14.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) com apiloamento manual/mecânico com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.00	41.68	41.68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.40	17.36	41.68
			MO sem LS => 12.58	LS =>	15.96	MO com LS =>	29.16

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 403
Rúbrica

			Valor do BDI =>	10.40			Valor com BDI =>	52.08
					Quant. =>	19,57	Preço Total =>	1.019,20

14.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87690 SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	PISO - PISOS		m²	1.00	58.26	58.26
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	0.06	799.74	48.54
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.29	25.49	7.26
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.14	17.38	2.46
			MO sem LS =>	5.71	LS =>	6.55	MO com LS =>	12.26
					Quant. =>	130,57	Preço Total =>	9.505,49

14.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87630 SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3.0cm, preparo mecânico	PISO - PISOS		m²	1.00	46.39	46.39
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	0.04	799.74	34.46
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.25	25.49	6.24
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.12	17.38	2.13
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material		L	0.21	13.72	2.88
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0.50	1.36	0.68
			MO sem LS =>	4.58	LS =>	5.25	MO com LS =>	9.83
					Quant. =>	130,57	Preço Total =>	7.567,83

14.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87255 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	PISO - PISOS		m²	1.00	137.82	137.82
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.93	29.15	27.10
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.34	17.38	5.90
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	8.62	1.25	10.77
Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material		m²	1.12	83.07	93.03
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0.14	7.34	1.02
			MO sem LS =>	12.23	LS =>	14.04	MO com LS =>	26.27
					Quant. =>	130,57	Preço Total =>	22.485,45

14.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	PISO - PISOS		M	1.00	19.97	19.97
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.09	29.15	2.47
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.03	17.38	0.53
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	0.60	1.25	0.75
Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material		m²	0.19	83.07	15.61
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0.08	7.34	0.61
			MO sem LS =>	1.11	LS =>	1.28	MO com LS =>	2.39
					Quant. =>	92,00	Preço Total =>	2.295,40

15		SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL						4.705,55
15.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98689 SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	PISO - PISOS		M	1.00	112.21	112.21
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.55	26.63	14.65
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.27	17.38	4.74
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	1.29	3.84	4.95
Insumo	00020232 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/	Material		M	1.00	87.96	87.96
			MO sem LS =>	6.96	LS =>	7.99	MO com LS =>	14.95
					Quant. =>	4,50	Preço Total =>	630,94

15.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88648 SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grés de dimensões 35x35cm	PISO - PISOS		M	1.00	8.95	8.95
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.07	29.15	2.04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.03	17.38	0.53
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	0.60	1.25	0.75
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0.09	7.34	0.62
			MO sem LS =>	0.95	LS =>	1.08	MO com LS =>	2.03
			Valor do BDI =>	2.23			Valor com BDI =>	11.15
					Quant. =>	96,06	Preço Total =>	1.073,95

15.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE [illegible]	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE [illegible]	CHP	0.02	26.29	0.59
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.40	27.33	10.87

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 404
Rubrica
PMUI

Composição Auxiliar	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.01	334	3.26
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.42	26	11.15
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0	17.38	3.63
Insumo	00034747 SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material		M	1.00	98.46	98.23
			MO sem LS =>	10.01	LS =>	11.49	MO com LS =>	21.50
			Valor do BDI =>	31.88			Valor com BDI =>	159.61
					Quant. =>	18,80	Preço Total =>	3.000,65

16		CALÇADA DE PROTEÇÃO						18.594,36
16.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1.00	68.75	68.75
			MO sem LS =>	22.40	LS =>	25.70	MO com LS =>	48.10
			Valor do BDI =>	17.16			Valor com BDI =>	85.91
					Quant. =>	3,97	Preço Total =>	341,06

16.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1.00	41.68	41.68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2.40	17.38	41.68
			MO sem LS =>	13.58	LS =>	15.58	MO com LS =>	29.16
					Quant. =>	2,78	Preço Total =>	144,78

16.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1.00	160.45	160.45
Composição Auxiliar	87389 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.01	669.88	9.04
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3.00	25.49	76.41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1.50	17.38	26.05
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	55.85	0.68	37.97
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material		M	1.51	6.31	9.52
			MO sem LS =>	37.45	LS =>	42.99	MO com LS =>	80.44
			Valor do BDI =>	40.04			Valor com BDI =>	200.49
					Quant. =>	19,90	Preço Total =>	3.989,75

16.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94994 SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	PISO - PISOS		m²	1.00	139.44	139.44
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0.10	680.09	65.96
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.18	25.21	4.55
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.28	25.49	7.05
Insumo	00003777 SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material		m²	1.13	1.90	2.14
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0.20	0.96	0.19
Insumo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0.25	4.11	1.02
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material		m²	1.12	45.08	50.59
			MO sem LS =>	9.42	LS =>	10.82	MO com LS =>	20.24
			Valor do BDI =>	34.80			Valor com BDI =>	174.24
					Quant. =>	72,77	Preço Total =>	12.679,44

16.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1.00	7.65	7.65
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.00	815.94	3.42
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.12	25.49	3.16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,06	17.38	1.07
			MO sem LS =>	1.77	LS =>	2.03	MO com LS =>	3.90
			Valor do BDI =>	1.90			Valor com BDI =>	9.55
					Quant. =>	25,92	Preço Total =>	247,53

16.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1.00	36.80	36.80
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.04	581.25	21.85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.47	25.49	11.98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.17	17.38	2.97
			MO sem LS =>	6.66	LS =>	7.64	MO com LS =>	14.30
			Valor do BDI =>	9.18			Valor com BDI =>	45.98
					Quant. =>	25,92	Preço Total =>	1.191,80

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 405
Rúbrica

17		ESQUADRIAS						20.005,04
17.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA)	ESQV -		UN	1,00	310,43	310,43
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,68	24,08	40,46
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material		UN	3,00	15,06	45,18
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material		UN	19,80	0,07	1,38
Insumo	00010556 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO)	Material		UN	1,00	205,89	205,89
			MO sem LS =>	19,48	LS =>	22,36	MO com LS =>	41,84
			Valor do BDI =>	77,48			Valor com BDI =>	387,81
					Quant. =>	5,00	Preço Total =>	1.939,55
Composição	94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	1,00	781,55	781,55
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,01	861,54	6,89
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,10	25,49	53,50
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,05	17,36	18,23
Insumo	00011199 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Material		UN	0,56	1.264,72	702,90
			MO sem LS =>	26,01	LS =>	29,86	MO com LS =>	55,87
			Valor do BDI =>	195,07			Valor com BDI =>	976,62
					Quant. =>	18,00	Preço Total =>	17.579,16
17.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,02	861,54	18,09
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,58	25,49	116,76
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,29	17,36	39,81
Insumo	00011190 SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material		UN	2,78	229,00	636,62
			MO sem LS =>	56,96	LS =>	65,37	MO com LS =>	122,33
			Valor do BDI =>	202,38			Valor com BDI =>	1.013,20
					Quant. =>	0,48	Preço Total =>	486,33
18		LOUÇAS E METAIS						8.620,67
18.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	2390 ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	Alambrados e Gradis		un	1,00	168,30	168,30
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,30	3,60	1,08
Insumo	2083 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2" - Jackwal ou similar	Material		un	1,00	181,28	181,28
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,30	19,81	5,94
			MO sem LS =>	2,77	LS =>	3,17	MO com LS =>	5,94
			Valor do BDI =>	46,99			Valor com BDI =>	235,29
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	470,58
Composição	8974 ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de	Louças e Metais Sanitários		un	1,00	1.065,16	1.065,16
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,03	734,10	22,02
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,30	3,60	1,08
Insumo	9282 ORSE	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (pídeficientes) - em placa sólida de fórmica, sistema de travamento na vertical e ferragens em latão	Material		un	1,00	1.036,12	1.036,12
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,30	19,81	5,94
			MO sem LS =>	3,43	LS =>	3,94	MO com LS =>	7,37
			Valor do BDI =>	265,86			Valor com BDI =>	1.331,02
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	2.662,04
18.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95546 SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,00	141,76	141,76
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,90	24,85	47,15
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,60	17,36	10,38
Insumo	00039396 SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Material		UN	1,00	84,23	84,23
			MO sem LS =>	21,12	LS =>	24,25	MO com LS =>	45,37
			Valor do BDI =>	35,38			Valor com BDI =>	177,14
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	354,28
18.4	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição Auxiliar	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	442,00	442,00
Composição Auxiliar	86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	10,91	10,91
			MO sem LS =>	11,46	LS =>	13,16	MO com LS =>	24,62
			Valor do BDI =>	113,04			Valor com BDI =>	565,55
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.131,90
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00000377 SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	Material		UN	1,00	35,25	35,25
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	8,79			Valor com BDI =>	44,04
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	88,08

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 406
Rúbrica

18.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86943 SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	209,09	209,09
Composição Auxiliar	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, [illegible]	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS [illegible]	UN	1,00	134,17	134,17
Composição Auxiliar	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	49,32	49,32
Composição Auxiliar	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	6,69	6,69
Composição Auxiliar	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	8,27	8,27
			MO sem LS => 9,74	LS => 11,19	MO com LS =>		20,93
			Valor do BDI => 52,18			Valor com BDI =>	261,27
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	783,81
Composição	2050 ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	Louças e Metais Sanitários	un	1,00	25,21	25,21
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,40	3,65	1,46
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,40	19,81	7,92
Insumo	00007608 SINAPI	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 " AGUA FRIA	Material	UN	1,00	6,49	6,49
Insumo	00011680 SINAPI	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	Material	UN	1,00	9,34	9,34
			MO sem LS => 3,69	LS => 4,23	MO com LS =>		7,92
			Valor do BDI => 6,29			Valor com BDI =>	31,50
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	63,00
Composição	2103 ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão	Louças e Metais Sanitários	un	1,00	823,50	823,50
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,04	762,70	27,45
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	2,88	14,07	40,52
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,00	3,74	7,48
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,00	3,60	7,20
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,00	3,65	7,30
Insumo	245 ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	Material	un	1,00	188,88	188,88
Insumo	9964 ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	1,20	19,61	23,53
Insumo	14004 ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1158-C34 ou similar) un	0	un	1,00	186,45	186,45
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	2,00	19,81	39,62
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,00	19,81	39,62
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,00	11,96	23,92
Insumo	00006157 SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Material	UN	1,00	52,93	52,93
			MO sem LS => 52,82	LS => 60,62	MO com LS =>		113,44
			Valor do BDI => 205,54			Valor com BDI =>	1.029,04
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.029,04

18.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,06	762,70	45,76
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	4,80	14,07	67,53
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,00	3,74	14,96
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	4,00	3,60	14,40
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	4,00	3,65	14,60
Insumo	246 ORSE	Pia de cozinha em aço inox 2,00x0,60m c/ 2 cubas, sem valvula (padrão comercial) un	0	un	1,00	407,82	407,82
Insumo	2016 ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C.112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	Material	un	2,00	178,60	357,20
Insumo	9964 ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	1,20	19,61	23,53
Insumo	14004 ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1158-C34 ou similar) un	0	un	2,00	186,45	372,90
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	4,00	19,81	79,24
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	4,00	19,81	79,24
Insumo	00006157 SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Material	UN	2,00	52,93	105,86
			MO sem LS => 104,04	LS => 119,41	MO com LS =>		223,45
			Valor do BDI => 407,06			Valor com BDI =>	2.037,94
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.037,94

19		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					12.244,54
19.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93243 SINAPI	Execução de reservatório elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saída, suspiro, extravasor.	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	6.872,09	6.872,09
Composição Auxiliar	98462 SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	5.470,89	5.470,89
Composição Auxiliar	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	3,00	7,50	22,50
Composição Auxiliar	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	20,00	10,57	211,40
Composição Auxiliar	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,00	21,17	21,17
Composição Auxiliar	89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	42,72	42,72

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL - PMUI - RAMOTA
Fls. 407
Rubrica

Composição Auxiliar	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	34,02	34,02
Insumo	00034640 SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,00	1.049,41	1.049,41
			MO sem LS => 196,64	LS =>	225,70	MO com LS =>	422,34
			Valor do BDI => 1.715,27			Valor com BDI =>	8.587,36
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	8.587,36

19.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89446 SINAPI	Tubo de PVC rígido soldável marrom para água fria Ø 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,00	5,76	5,76
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,86	0,34
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	24,86	0,48
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,05	4,70	4,93
			MO sem LS => 0,30	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,54
			Valor do BDI => 1,43			Valor com BDI =>	7,19
				Quant. =>	28,90	Preço Total =>	207,79

19.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89448 SINAPI	Tubo de PVC rígido soldável marrom para água fria Ø 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	17,32	17,32
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	17,86	0,60
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	24,86	0,70
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01	2,30	0,01
Insumo	00009874 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,05	15,36	16,11
			Valor do BDI => 4,32			Valor com BDI =>	21,64
				Quant. =>	30,10	Preço Total =>	651,36

19.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	12,41	12,41
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,86	1,25
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,45	24,86	11,18
			MO sem LS => 4,62	LS =>	5,31	MO com LS =>	9,93
			Valor do BDI => 3,09			Valor com BDI =>	15,30
				Quant. =>	19,75	Preço Total =>	306,12

Composição	89362 SINAPI	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	8,20	8,20
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	17,86	2,71
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	24,86	3,77
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08	0,32
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	0,93	0,93
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03	2,30	0,07
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	51,08	0,40
			MO sem LS => 2,34	LS =>	2,69	MO com LS =>	5,03
			Valor do BDI => 2,04			Valor com BDI =>	10,24
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>	81,92

Composição	89364 SINAPI	Curva 90° soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	11,16	11,16
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	17,86	2,71
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	24,86	3,77
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08	0,32
Insumo	00001956 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00	3,89	3,89
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	51,08	0,40
			MO sem LS => 2,34	LS =>	2,69	MO com LS =>	5,03
			Valor do BDI => 2,78			Valor com BDI =>	13,94
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	27,88

19.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373 SINAPI	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	14,02	14,02
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	17,86	2,34
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	24,86	3,26
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08	0,26
Insumo	00020147 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	7,74	7,74
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	51,08	0,35

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 408
Rúbrica

		MO sem LS =>	2.02	LS =>	2.32	MO com LS =>	4.34
		Valor do BDI =>	3.49			Valor com BDI =>	17.21
				Quant. =>	11,00	Preço Total =>	192,61

19.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1144	ORSE	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1.00	13.26	13.26
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.18	3.74	0.67
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0.18	3.65	0.65
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0.01	81.38	0.48
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0.01	78.37	0.78
Insumo	00003538	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA	Material	UN	1.00	4.97	4.97
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0.18	11.96	2.15
			MO sem LS =>	2.66	LS =>	3.05	MO com LS =>	5.71
			Valor do BDI =>	3.30			Valor com BDI =>	16.56
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	99,36

19.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89497	SINAPI	Joelho 90° soldável 40mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.00	12.29	12.29
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.10	17.86	1.86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.10	24.86	2.60
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0.01	45.08	0.53
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.02	2.30	0.03
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.01	51.08	0.71
			MO sem LS =>	1.62	LS =>	1.85	MO com LS =>	3.47
			Valor do BDI =>	3.05			Valor com BDI =>	15.35
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	46,05

19.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1466	ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	Registros e Válvulas	un	1.00	102.73	102.73
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.61	3.74	2.28
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0.61	3.65	2.22
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	1.20	0.22	0.26
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0.61	19.81	12.08
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0.61	11.96	7.29
			MO sem LS =>	9.02	LS =>	10.35	MO com LS =>	19.37
			Valor do BDI =>	25.64			Valor com BDI =>	128.37
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	385,11

19.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383	SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.00	5.81	5.81
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.09	17.86	1.68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.09	24.86	2.34
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",	Material	UN	1.00	1.11	1.11
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0.01	45.08	0.26
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.01	51.08	0.35
			MO sem LS =>	1.45	LS =>	1.67	MO com LS =>	3.12
			Valor do BDI =>	1.45			Valor com BDI =>	7.26
					Quant. =>	14,00	Preço Total =>	101,64

19.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1470	ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	Registros e Válvulas	un	1.00	80.52	80.52
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.61	3.74	2.28
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0.61	3.65	2.22
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0.94	0.22	0.20
Insumo	1966	ORSE	Registro pressão 3/4" c/canopla acab.crom.simples linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	Material	un	1.00	56.45	56.45
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0.61	11.96	7.29
			MO sem LS =>	9.02	LS =>	10.35	MO com LS =>	19.37
			Valor do BDI =>	20.09			Valor com BDI =>	100.51
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	100,51

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 409
Rúbrica

19.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395 SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	11,40	11,40
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	17,86	3,61
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	24,86	5,03
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08	0,47
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,05	2,30	0,11
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	51,08	0,51
			MO sem LS => 3,13		LS => 3,59	MO com LS =>	6,72
			Valor do BDI => 2,84			Valor com BDI =>	14,24
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>	85,44

19.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89420 SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	9,31	9,31
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	17,86	0,92
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	24,86	1,29
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08	0,27
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03	2,30	0,05
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	51,08	0,30
			MO sem LS => 0,80		LS => 0,92	MO com LS =>	1,72
			Valor do BDI => 2,32			Valor com BDI =>	11,63
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	11,63

19.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89823 SINAPI	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	19,33	19,33
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	17,86	2,50
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	24,86	3,48
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,02	45,08	0,79
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02	2,30	0,05
Insumo	00007141 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	Material	UN	1,00	11,44	11,44
			MO sem LS => 2,16		LS => 2,48	MO com LS =>	4,64
			Valor do BDI => 4,82			Valor com BDI =>	24,15
				Quant. =>	5,00	Preço Total =>	120,75

19.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3147 ORSE	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	Conversão InfoWOrca	un	1,00	19,02	19,02
Composição Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,30	3,74	1,12
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,30	3,65	1,09
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,01	81,35	1,13
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,02	78,37	1,56
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,30	19,81	5,94
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,30	11,95	3,58
			MO sem LS => 4,43		LS => 5,09	MO com LS =>	9,52
			Valor do BDI => 4,74			Valor com BDI =>	23,76
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	23,76

19.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11	17,86	2,02
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11	24,86	2,81
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,07	14,71	1,05
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01	2,30	0,02
Insumo	00011676 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,00	36,81	36,81
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02	51,08	0,91
			MO sem LS => 1,75		LS => 2,00	MO com LS =>	3,75
			Valor do BDI => 10,88			Valor com BDI =>	54,50
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	54,50

Composição	94489 SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	21,79	21,79
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08	17,86	1,41
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	24,86	1,97
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,04	14,71	0,58

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 410
Rúbrica

Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,01	2,30	0,01
Insumo	00011674 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material		UN	1,00	17,34	17,34
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,48
			MO sem LS =>	1,22	LS =>	1,41	MO com LS =>	2,63
			Valor do BDI =>	5,43			Valor com BDI =>	27,22
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	27,22

19.19	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,00	17,86	17,86
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,00	24,86	24,86
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,50	25,49	38,23
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,50	17,38	26,07
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,00	52,14	0,10
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	2,00	1,36	2,72
Insumo	00003279 SINAPI	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60" CM, H= 60" CM	Material		UN	2,92	220,42	642,63
			MO sem LS =>	38,01	LS =>	43,63	MO com LS =>	81,64
			Valor do BDI =>	187,87			Valor com BDI =>	940,56
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	940,56

19.20	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2082 ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39. 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários		un	1,00	51,45	51,45
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,34	3,74	1,27
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,34	3,65	1,24
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,30	0,22	0,06
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,34	19,81	6,73
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,34	11,96	4,06
Insumo	00011762 SINAPI	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4	Material		UN	1,00	38,09	38,09
			MO sem LS =>	5,02	LS =>	5,77	MO com LS =>	10,79
			Valor do BDI =>	12,84			Valor com BDI =>	64,29
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	192,87

20.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	18,38	18,38
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,30	17,86	5,35
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,30	24,86	7,45
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,10	2,30	0,23
Insumo	00009835 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,05	5,10	5,35
			MO sem LS =>	4,63	LS =>	5,31	MO com LS =>	9,94
			Valor do BDI =>	4,58			Valor com BDI =>	22,96
					Quant. =>	9,10	Preço Total =>	208,93

20.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	26,93	26,93
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,38	24,86	9,44
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,46
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,13	2,30	0,29
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,02	51,08	0,81
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,05	8,68	9,11
			MO sem LS =>	5,87	LS =>	6,73	MO com LS =>	12,60
			Valor do BDI =>	6,72			Valor com BDI =>	33,53
					Quant. =>	12,40	Preço Total =>	417,26

20.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,74	17,86	13,21
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,74	24,86	18,39
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,04	45,08	1,63
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,25	2,30	0,56
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,06	51,08	3,02
Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,05	14,14	14,84
			MO sem LS =>	11,43	LS =>	13,11	MO com LS =>	24,54
			Valor do BDI =>	12,89			Valor com BDI =>	64,54
					Quant. =>	28,00	Preço Total =>	1.807,12

Composição	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	12,41	12,41
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,86	1,25
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,45	24,86	11,18
			MO sem LS =>	4,62	LS =>	5,31	MO com LS =>	9,93
			Valor do BDI =>	3,09			Valor com BDI =>	15,50

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls 411
Rubrica
PMU

Quant. => 8,00 Preço Total => 130,20

20.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89796 SINAPI	Té de PVC de esgoto predial dn 100mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,00	37,24	37,24
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	17,86	5,89
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	24,86	8,20
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	Material	UN	0,09	18,61	1,71
Insumo	00007091 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	15,44	15,44
			MO sem LS => 5,09		LS => 5,84	MO com LS =>	10,93
			Valor do BDI => 9,29			Valor com BDI =>	46,53
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	139,59

20.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1588 ORSE	Té sanitário em PVC rígido soldável para esgoto primário, dn 100 x 50 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,00	48,20	48,20
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,46	3,74	1,72
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,46	3,65	1,67
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,12	78,37	9,40
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,46	19,81	9,11
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,46	11,96	5,50
Insumo	00011655 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	14,75	14,75
			MO sem LS => 6,80		LS => 7,81	MO com LS =>	14,61
			Valor do BDI => 12,04			Valor com BDI =>	60,29
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	60,29

20.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89785 SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	19,93	19,93
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	24,86	4,22
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,00	1,69	3,38
Insumo	00003662 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	8,56	8,56
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE "400" G)	Material	UN	0,04	18,61	0,74
			MO sem LS => 2,62		LS => 3,01	MO com LS =>	5,63
			Valor do BDI => 4,97			Valor com BDI =>	24,90
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	24,90

20.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1603 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,00	11,22	11,22
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,12	3,74	0,44
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,12	3,65	0,43
Insumo	136 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,02	81,38	1,30
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,02	78,37	1,72
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,12	19,81	2,37
Insumo	00003517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	3,53	3,53
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,12	11,96	1,43
			MO sem LS => 1,77		LS => 2,03	MO com LS =>	3,80
			Valor do BDI => 2,80			Valor com BDI =>	14,02
				Quant. =>	10,00	Preço Total =>	140,20

20.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1554 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,00	10,64	10,64
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,14	3,74	0,52
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,14	3,65	0,51
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,02	78,37	1,72
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,14	19,81	2,77
Insumo	00003526 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	2,43	2,43
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,14	11,96	1,67
			MO sem LS => 2,07		LS => 2,37	MO com LS =>	4,44
			Valor do BDI => 2,70			Valor com BDI =>	13,54
				Quant. =>	10,00	Preço Total =>	135,40

20.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744 SINAPI	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,00	22,56	22,56
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	17,86	4,46
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	24,86	6,21
Insumo	00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	8,04	8,04
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE "400" G)	Material	UN	0,05	18,61	0,85
			MO sem LS => 3,86		LS => 4,43	MO com LS =>	8,29
			Valor do BDI => 5,63			Valor com BDI =>	28,19
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	112,76

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 412
Rúbrica

20.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732	SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	10,64	10,64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	17,86	2,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	24,86	3,23
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,00	1,69	1,69
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	3,03	3,03
				MO sem LS =>	2,01	LS =>	2,30	MO com LS =>	4,31
				Valor do BDI =>	2,65			Valor com BDI =>	13,29
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	13,29

20.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89726	SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	6,51	6,51
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	17,86	1,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	24,86	2,48
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,44
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	1,01	1,01
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,02	2,30	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,02	51,08	0,78
				MO sem LS =>	1,54	LS =>	1,76	MO com LS =>	3,30
				Valor do BDI =>	1,62			Valor com BDI =>	8,13
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	16,26

20.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89750	SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	59,30	59,30
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	17,86	4,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	24,86	6,21
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,00	3,00	3,00
Insumo	00001970	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	44,78	44,78
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	Material		UN	0,05	18,61	0,85
				MO sem LS =>	3,86	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,29
				Valor do BDI =>	14,80			Valor com BDI =>	74,10
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	148,20

20.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89735	SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	18,05	18,05
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	17,86	2,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	24,86	3,23
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,00	1,69	1,69
Insumo	00001968	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	10,44	10,44
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,02	18,61	0,37
				MO sem LS =>	2,01	LS =>	2,30	MO com LS =>	4,31
				Valor do BDI =>	4,50			Valor com BDI =>	27,55
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	45,10

20.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89709	SINAPI	Ralo sifonado de PVC, quadrado de 100 x 40 mm com grelha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	9,98	9,98
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,86	1,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	24,86	1,74
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,00	45,08	0,22
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,02	2,30	0,03
Insumo	00011741	SINAPI	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material		UN	1,00	6,36	6,36
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,38
				MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,31
				Valor do BDI =>	2,49			Valor com BDI =>	12,47

20.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707	SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no mínimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	27,35	27,35
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	17,86	4,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	24,86	6,21
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00	1,69	1,69
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08	0,66
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA	Material	UN	1,00	12,68	12,68
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,05	2,30	0,14
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02	51,08	1,14

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 413
Rubrica
PMU

			MO sem LS =>	3,86	LS =>	4,43	MO com LS => 8,29
			Valor do BDI =>	6,82			Valor com BDI => 34,17
					Quant. =>	3,00	Preço Total => 102,51

20.17	Codigo Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,12	3,74	0,44
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,12	3,65	0,43
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,03	81,38	2,03
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,04	78,37	3,13
Insumo	00001200 SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	8,74	8,74
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,12	19,81	2,37
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,12	11,96	1,43
			MO sem LS =>	1,77	LS =>	2,03	MO com LS => 3,80
			Valor do BDI =>	4,63			Valor com BDI => 23,20
					Quant. =>	2,00	Preço Total => 46,40

20.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98078 SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	4.377,10	4.377,10
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,24	54,71	13,36
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,12	151,78	18,12
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	1.285,17	133,65
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,21	14,01	44,94
Composição Auxiliar	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,04	54,19	56,35
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,13	2.675,67	337,13
Composição Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,03	3.113,31	78,45
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,02	940,90	959,61
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,15	25,49	793,90
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,47	17,38	425,31
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,37	241,18	89,14
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	2.198,02	0,64	1.406,73
			MO sem LS =>	571,22	LS =>	655,64	MO com LS => 1.226,86
			Valor do BDI =>	1.092,52			Valor com BDI => 5.469,62
					Quant. =>	1,00	Preço Total => 5.469,62

Composição	98082 SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	4.060,16	4.060,16
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,14	54,71	7,66
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,07	151,78	10,70
Composição Auxiliar	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	1.317,88	137,85
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	1.285,17	134,42
Composição Auxiliar	89996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,46	14,46	50,03
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,75	671,35	506,13
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,20	14,01	58,78
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	20,01	19,23	384,83
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,24	2.675,67	629,31
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,09	620,01	54,68
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,47	786,56	373,38
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,99	25,49	560,63
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	17,28	17,38	300,34
Insumo	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR	Material	UN	106,86	5,71	610,06
Insumo	00000660 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	35,70	3,54	126,37
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material	M	0,42	2,74	1,15
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,04	21,63	0,96
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,50	0,96	0,48
Insumo	00005193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,57	8,23	12,94
			MO sem LS =>	527,69	LS =>	605,68	MO com LS => 1.133,37
			Valor do BDI =>	1.013,41			Valor com BDI => 5.073,57
					Quant. =>	1,00	Preço Total => 5.073,57

20.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2798 ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforçada, revestida internamente com barra lisa e fundo em	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,00	533,42	533,42
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,11	762,70	83,13
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	3,20	15,06	48,19
Composição Auxiliar	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	2,24	101,14	226,55

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 414
Rúbrica

Composição Auxiliar	1308 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas		m²	1.92	34.25	65.76
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana		m³	0.58	47.10	27.12
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 06/2015	Conversão InfoWOrca		m²	1.92	7.57	14.53
			MO sem LS =>	100.32	LS =>	115.14	MO com LS =>	215.46
			Valor do BDI =>	133.14			Valor com BDI =>	668.56
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>	5.332,48
21		COMBATE A INCÊNDIO						641.21
21.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101909 SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1.00	215.71	215.71
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.46	17.66	8.16
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.46	24.86	11.37
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	Material		UN	2.00	0.59	1.18
Insumo	00010892 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material		UN	1.00	195.00	195.00
			MO sem LS =>	7.06	LS =>	8.10	MO com LS =>	15.16
			Valor do BDI =>	53.84			Valor com BDI =>	269.50
21.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10383 ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	Sinalização Vertical		un	1.00	24.97	24.97
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	0.25	3.63	0.90
Insumo	2682 ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	Material		un	4.00	0.14	0.56
Insumo	11143 ORSE	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	Material		un	1.00	18.56	18.56
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	0.25	19.81	4.95
			MO sem LS =>	2.30	LS =>	2.55	MO com LS =>	4.95
			Valor do BDI =>	6.23			Valor com BDI =>	31.20
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	62,40
21.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11852 ORSE	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Sinalização Vertical		Un	1.00	31.78	31.78
Insumo	00037559 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-	Material		UN	1.00	31.78	31.78
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	7.93			Valor com BDI =>	39.71
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	39,71
22		INSTALAÇÃO ELÉTRICA						28.832,80
22.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940 SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.00	14.35	14.35
Composição Auxiliar	88626 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.00	861.54	0.77
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.25	18.65	4.60
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.25	25.76	6.36
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1.00	2.62	2.62
			MO sem LS =>	3.91	LS =>	4.49	MO com LS =>	8.40
			Valor do BDI =>	3.58			Valor com BDI =>	17.93
					Quant. =>	46,00	Preço Total =>	824,78
22.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível, isolação de PVC 450/750V, fios de cobre	INEL - INSTALAÇÃO		M	1.00	2.81	2.81
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.02	18.65	0.44
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.02	25.76	0.61
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1.19	1.47	1.74
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0.01	3.32	0.02
			MO sem LS =>	0.37	LS =>	0.42	MO com LS =>	0.79
			Valor do BDI =>	0.70			Valor com BDI =>	3.51
					Quant. =>	62,60	Preço Total =>	219,72
Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível, isolação de PVC 450/750V, fios de cobre	INEL - INSTALAÇÃO		M	1.00	2.81	2.81
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.02	18.65	0.44
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.02	25.76	0.61
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1.19	1.47	1.74
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0.01	3.32	0.02
			MO sem LS =>	0.37	LS =>	0.42	MO com LS =>	0.79
			Valor do BDI =>	0.70			Valor com BDI =>	3.51
					Quant. =>	76,60	Preço Total =>	268,86
Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível, isolação de PVC 450/750V, fios de cobre	INEL - INSTALAÇÃO		M	1.00	2.81	2.81

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 415
Rúbrica

Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	18,65		0,44
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	25,76		0,61
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,19	1,47		1,74
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32		0,02
			MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,42	MO com LS =>		0,79
			Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>		3,51
					Quant. =>	52,60	Preço Total =>		184,62
Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,00	2,81		2,81
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	18,65		0,44
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	25,76		0,61
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,19	1,47		1,74
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32		0,02
			MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,42	MO com LS =>		0,79
			Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>		3,51
					Quant. =>	142,20	Preço Total =>		499,12
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,00	4,13		4,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,65		0,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	25,76		0,77
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,19	2,35		2,79
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32		0,02
			MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,53	MO com LS =>		1,00
			Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>		5,16
					Quant. =>	142,20	Preço Total =>		733,75
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,00	4,13		4,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,65		0,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	25,76		0,77
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,19	2,35		2,79
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32		0,02
			MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,53	MO com LS =>		1,00
			Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>		5,16
					Quant. =>	82,60	Preço Total =>		426,21
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,00	4,13		4,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,65		0,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	25,76		0,77
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,19	2,35		2,79
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32		0,02
			MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,53	MO com LS =>		1,00
			Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>		5,16
					Quant. =>	188,30	Preço Total =>		971,62
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,00	4,13		4,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,65		0,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	25,76		0,77
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,19	2,35		2,79
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32		0,02
			MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,53	MO com LS =>		1,00
			Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>		5,16
					Quant. =>	153,90	Preço Total =>		794,12

22.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,00	25,10		25,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,12	18,65		2,14
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,19	16,79		19,98

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 416
Rúbrica

Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0.01	3.32	0.02
			MO sem LS =>	1.80	LS =>	2.06	MO com LS =>	3.86
			Valor do BDI =>	6.26			Valor com BDI =>	31.36
					Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.254,40

22.11	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.12	18.65	2.14
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.12	25.76	2.96
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material		M	1.19	16.79	19.98
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0.01	3.32	0.02
			MO sem LS =>	1.80	LS =>	2.06	MO com LS =>	3.86
			Valor do BDI =>	6.26			Valor com BDI =>	31.36
					Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.254,40

22.12	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível, isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1.00	23.10	23.10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.12	18.65	2.14
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.12	25.76	2.96
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material		M	1.19	16.79	19.98
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0.01	3.32	0.02
			MO sem LS =>	1.80	LS =>	2.06	MO com LS =>	3.86
					Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.254,40

22.13	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível, isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1.00	23.10	23.10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.12	18.65	2.14
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.12	25.76	2.96
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	Material		M	1.19	16.79	19.98
			MO sem LS =>	1.80	LS =>	2.06	MO com LS =>	3.86
			Valor do BDI =>	6.26			Valor com BDI =>	31.36
					Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.254,40

22.14	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2794 ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	Caixas de Passagem em alvenaria		un	1.00	274.28	274.28
Composição Auxiliar	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações		m²	0.44	87.37	38.79
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao	Armaduras Convencionais		kg	1.29	14.07	18.20
Composição Auxiliar	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação		m²	1.20	101.14	121.36
Composição Auxiliar	1908 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas		m²	0.96	34.25	32.88
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana		m³	0.25	47.10	11.86
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca		m²	0.96	7.57	7.26
			MO sem LS =>	51.86	LS =>	59.52	MO com LS =>	111.38
			Valor do BDI =>	68.46			Valor com BDI =>	342.74

22.15	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993 SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1.00	38.99	38.99
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1.00	7.41	7.41
Composição Auxiliar	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1.00	31.58	31.58
			MO sem LS =>	8.95	LS =>	10.27	MO com LS =>	19.22
			Valor do BDI =>	9.73			Valor com BDI =>	48.72

22.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 417
Rúbrica

Composição	91973 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	61,59	61,59
Composição Auxiliar	91950 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	11,77	11,77
Composição Auxiliar	91972 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	69,82	69,82
			MO sem LS => 15,37	LS =>	17,64	MO com LS =>	33,01
			Valor do BDI => 20,36			Valor com BDI =>	101,95
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	203,90

Composição	91957 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,00	43,47	43,47
Composição Auxiliar	91956 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	36,06	36,06
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	7,41	7,41
			MO sem LS => 8,57	LS =>	9,84	MO com LS =>	18,41
			Valor do BDI => 10,85			Valor com BDI =>	54,32
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	108,64

22.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91969 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	68,66	68,66
Composição Auxiliar	91968 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,00	61,25	61,25
			MO sem LS => 13,75	LS =>	15,78	MO com LS =>	29,53
			Valor do BDI => 17,13			Valor com BDI =>	83,79
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	171,58

22.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953 SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,00	23,95	23,95
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,00	7,41	7,41
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	16,54	16,54
			Valor do BDI => 5,97			Valor com BDI =>	29,92
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	59,84

22.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959 SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	37,84	37,84
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	7,41	7,41
Composição Auxiliar	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	30,43	30,43
			MO sem LS => 7,29	LS =>	8,36	MO com LS =>	15,65
			Valor do BDI => 9,44			Valor com BDI =>	47,26

22.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12241 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	1,00	275,71	275,71
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,80	3,59	17,23
Insumo	558 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN. Tigre ou similar	Material	un	1,00	163,40	163,40
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,80	19,81	95,08
			MO sem LS => 44,27	LS =>	50,81	MO com LS =>	95,08
			Valor do BDI => 66,81			Valor com BDI =>	344,52
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	344,52

22.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,00	122,14	122,14
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,60	3,74	2,24
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,60	3,59	2,15
Insumo	3692 ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref. Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	1,00	98,70	98,70
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,60	19,81	11,88
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,60	11,96	7,17
			MO sem LS => 8,87	LS =>	10,18	MO com LS =>	19,05
			Valor do BDI => 30,48			Valor com BDI =>	152,62

22.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93662 SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	55,41	55,41
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	18,65	2,47
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	25,76	3,41

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls. 418
Rúbrica

Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A	Material		UN	1,00	47,35	47,35
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	2,00	1,09	2,18
			MO sem LS =>	2,08	LS =>	2,38	MO com LS =>	4,46
			Valor do BDI =>	13,83			Valor com BDI =>	69,24
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	415,44

22.24	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93655 SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,00	12,28	12,28
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	18,65	1,23
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	25,76	1,70
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATÉ 32A	Material		UN	1,00	8,26	8,26
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	1,00	1,09	1,09
			MO sem LS =>	1,04	LS =>	1,19	MO com LS =>	2,23
			Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	15,34
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>	122,72

Composição	91883 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		M	1,00	11,60	11,60
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	3,22	3,22
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,08	18,65	1,52
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,08	25,76	2,11
Insumo	00002674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material		M	1,02	4,68	4,75
			MO sem LS =>	1,98	LS =>	2,28	MO com LS =>	4,26
			Valor do BDI =>	2,89			Valor com BDI =>	14,49
					Quant. =>	75,00	Preço Total =>	1.086,75

22.26	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,00	3,22	3,22
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,11	18,65	1,97
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,11	25,76	2,73
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material		M	1,02	7,31	7,43
			MO sem LS =>	2,36	LS =>	2,71	MO com LS =>	5,07
			Valor do BDI =>	3,83			Valor com BDI =>	19,18
					Quant. =>	9,40	Preço Total =>	180,29

22.27	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91871 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		M	1,00	12,29	12,29
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	25,76	4,37
Insumo	00002674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material		M	1,02	4,68	4,75
			MO sem LS =>	2,66	LS =>	3,05	MO com LS =>	5,71
			Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	15,35
					Quant. =>	50,30	Preço Total =>	772,10

22.28	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,00	16,03	16,03
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,19	18,65	3,61
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material		M	1,02	7,31	7,43
			MO sem LS =>	3,04	LS =>	3,48	MO com LS =>	6,52
			Valor do BDI =>	4,00			Valor com BDI =>	20,03
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	120,18

22.29	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91873 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,00	19,71	19,71
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,22	18,65	4,12
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,22	25,76	5,69
			MO sem LS =>	3,46	LS =>	3,97	MO com LS =>	7,43
			Valor do BDI =>	4,91			Valor com BDI =>	24,62
					Quant. =>	36,00	Preço Total =>	886,32

22.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447 SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmetro menor ou igual a 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	6,19	6,19
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,65	0,63

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA - PMU -
Fls. 419
Rúbrica

Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	25,76	5,56	
			Valor do BDI =>	1,54			Valor com BDI =>	7,71
					Quant. =>	57,80	Preço Total =>	446,79

22.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6324 ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma	Luminárias Internas	un	1,00	9,67	9,67
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,20	3,59	0,71
Insumo	6518 ORSE	Plafon plastico branco com soquete E-27	Material	un	1,00	5,00	5,00
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,20	19,81	3,96
			Valor do BDI =>	2,41			Valor com BDI =>	12,08
					Quant. =>	29,00	Preço Total =>	350,32

22.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97607 SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acrílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	137,10	137,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23	18,65	4,29
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,55	25,76	14,21
Insumo	00038193 SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,00	7,12	7,12
			MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,64	MO com LS =>	14,30
			Valor do BDI =>	34,22			Valor com BDI =>	171,32
					Quant. =>	5,00	Preço Total =>	856,60

22.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11857 ORSE	Lâmpada tubular led T8, 16w, bivolt	Luminárias Internas	un	1,00	27,49	27,49
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,15	3,59	0,53
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,15	19,81	2,97
			MO sem LS =>	1,38	LS =>	1,59	MO com LS =>	2,97
			Valor do BDI =>	6,86			Valor com BDI =>	34,35
					Quant. =>	31,00	Preço Total =>	1.064,85

22.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97598 SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,00	26,61	26,61
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	18,65	1,39
Insumo	00038774 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,00	20,60	20,60
			MO sem LS =>	2,17	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,65
			Valor do BDI =>	6,64			Valor com BDI =>	33,25
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	99,75

22.35	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985 SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por eletrodeposição anódica e pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco, diâmetro de 5/8" e comprimento de 3,0m. Conforme as normas NBR 13571/96 e UL-467.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	81,94	81,94
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	18,65	4,72
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	25,76	6,51
			MO sem LS =>	3,97	LS =>	4,55	MO com LS =>	8,52
			Valor do BDI =>	20,45			Valor com BDI =>	102,39
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	307,17

22.36	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96977 SINAPI	Cabo de cobre nu 50mm² de bitola, têmpera mole duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,00	59,24	59,24
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,65	0,62
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	25,76	0,86
Insumo	00000867 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,10	52,51	57,76
			Valor do BDI =>	14,78			Valor com BDI =>	74,02
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>	740,20

22.37	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4192 ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	Subestação Transformadora em Poste	un	1,00	11,95	11,95
Insumo	00011862 SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	Material	UN	1,00	11,95	11,95
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,98			Valor com BDI =>	14,93
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	29,86

22.38	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4014 ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20 (vinte) metros de comprimento, conforme norma ABNT NBR NM 60454-3, tipo 5.	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	Un	1,00	8,78	8,78
Insumo	00020111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	1,00	8,78	8,78
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,19			Valor com BDI =>	10,97
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	32,91

22.39	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2643 ORSE	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	Material	un	1,00	12,60	12,60
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	3,14			Valor com BDI =>	15,74
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	47,22

22.40	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 420
Rúbrica

Composição	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	68,75	68,75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	17,38	68,75
			Valor do BDI => 17,16			Valor com BDI =>	85,91
				Quant. =>	4,50	Preço Total =>	386,59

22.41	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	41,68	41,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	17,38	41,68
			MO sem LS => 13,56	LS =>	15,55	MO com LS =>	29,19
			Valor do BDI => 10,40			Valor com BDI =>	52,08

22.42	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101502 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	1.728,29	1.728,29
Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,05	16,03	96,98
Composição Auxiliar	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,00	9,91	9,91
Composição Auxiliar	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	16,72	16,72
Composição Auxiliar	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	16,65	25,10	417,91
Composição Auxiliar	93665 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	66,74	66,74
Composição Auxiliar	100576 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	488,86	488,86
Composição Auxiliar	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,95	59,24	115,51
Composição Auxiliar	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,00	122,17	122,17
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,02	717,74	11,91
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,91	25,76	74,96
Insumo	00001094 SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,00	27,21	27,21
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA	Material	UN	2,00	1,11	2,22
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	Material	UN	1,00	23,07	23,07
Insumo	00039809 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO /	Material	UN	1,00	164,11	164,11
Insumo	00011864 SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	1,00	26,97	26,97
Insumo	00003398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	1,00	5,01	5,01
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO	Material	UN	3,00	9,42	28,26
Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,00	0,28	0,56
Insumo	00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	0,17	5,07	0,84
			MO sem LS => 149,98	LS =>	172,14	MO com LS =>	322,12
			Valor do BDI => 431,38			Valor com BDI =>	2.159,67
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.159,67

22.43	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100615 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	585,13	585,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,06	18,65	19,73
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,44	25,76	88,53
Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	2,00	37,70	75,40
Insumo	00011975 SINAPI	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	Material	UN	4,00	21,83	87,32
Insumo	00012388 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	Material	UN	1,00	314,15	314,15
			MO sem LS => 39,19	LS =>	44,98	MO com LS =>	84,17
			Valor do BDI => 146,04			Valor com BDI =>	731,17
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.462,34

Composição	12628 ORSE	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,00	3.353,68	3.353,68
Composição Auxiliar	80 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	3,70	101,99	377,36
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,70	47,10	32,97
Composição Auxiliar	10603 ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios	h	1,00	4,20	4,20
Composição Auxiliar	102487 SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,51	733,13	1.107,02
Insumo	8904 ORSE	Máquina de solda elétrica	Equipamento	h	0,85	3,86	3,28
Insumo	00006160 SINAPI	SOLDADOR	Mão de Obra	H	1,00	21,65	21,65
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,85	22,06	18,75
Insumo	00021012 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	6,60	68,64	453,02
Insumo	00021013 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	Material	M	13,20	89,58	1.182,45
			MO sem LS => 212,40	LS =>	243,80	MO com LS =>	456,20
			Valor do BDI => 837,07			Valor com BDI =>	4.190,75

Tipo de Licitação	Convite	Total sem BDI	394.728,05
Abertura da Licitação		Total do BDI	98.358,69
Número do Processo Licitatório	Processo Administrativo nº	Total Geral	493.086,74

Sílvio Júlio Pereira Franco
Engenheiro Civil
090796812S

Engenheiro Civil Sílvio Júlio Pereira Franco
CREA-RR nº 090796812S
Responsável Técnico

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 42
Rúbrica

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 012/2022 Processo Licitatório nº 134/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Prezados (as) Senhores (as),

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.170.418/0001-57, com sede situada em Boa Vista-RR, à Avenida Santos Dumont, Nº 2180, sala 01, Bairro: Trinta e Um de Março, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Anselmo Almeida Feitosa de Sousa**, portador da Carteira de Identidade nº 228.693 SSP/RR e inscrito no CPF nº 498.100.903-82, DECLARA em atendimento ao **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 012/2022**, que esta documentação de proposta de preços possui folhas numeradas de _____ a _____ incluindo este termo.

Por ser verdade, firma o presente.

Boa Vista-RR, 24 de outubro de 2022.

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
RG 228.693 SSP/RR
SÓCIO ADMINISTRADOR

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 422
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

ATA DE CREDENCIAMENTO, HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO 012/2022. PROCESSO Nº 134/2022

Na data de 24 (vinte e quatro) de outubro de 2022, às 08h:30, reuniu-se na Sala de Reuniões da CPL, a Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 003-A/2022, com a seguinte composição: Presidente da Comissão Permanente de Licitação – SANDRO DA SILVA MAFRA, Membros da Comissão Permanente de Licitação: JULIANA SOUZA DA SILVA; CLEICIANE PINHO DE ASSIS, e Engenheiro: MARCOS DOMINGOS DA SILVA com a finalidade de proceder a abertura do processo licitatórioTomada de Preço Nº 012/2022, tendo como objeto: **" CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARREIRINHA- UIRAMUTÃ/RR,** conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital T.P. nº 012/2022". Para credenciamento da empresa presente, nos termos do Edital e abertura dos envelopes n° 1, e do envelope n° 2. Aberta a sessão pelo Presidente da CPL, o representante da licitante presente na sessão foi identificado, credenciado e colhida sua assinatura. Compareceu à sessão: **Anselmo Almeida Feitosa de Sousa** brasileiro, CPF n° 498.100.903-82, RG n°228.693 SSP/RR credenciado legal da empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME CNPJ n° 37.170.418/0001-57. Seguidamente, o presidente da CPL, dando continuidade aos trabalhos da Comissão passa a análise dos documentos de habilitação da empresa participante, nos termos do art. 43 da Lei 8666/93, quanto a habilitação da empresa participante da licitação em epígrafe. Pois bem, quanto a habilitação jurídica, a empresa licitante apresentou as cédulas de identidade de seus representantes e o comprovante de registro comercial. Referente a regularidade fiscal e trabalhista as licitantes foram avaliadas, e, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, sendo considerada apta também neste quesito.Quanto à análise da qualificação técnica e aos documentos de qualificação econômica e financeira, foi considerado que a empresa comprovou a qualificação técnica solicitada no instrumento convocatório bem como a comprovou a qualificação econômica e financeira. Por esta razão, esta Comissão Permanente de Licitação delibera de forma unânime pela habilitação da empresa: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME CNPJ n° 37.170.418/0001-57. Questionado sobre a intenção de interpor recurso quanto a fase de habilitação nos termos do artigo 109 da lei 8.666/93, o representante da licitante renunciou expressamente o direito. Dessa forma, dando continuidade, foi realizado a abertura do envelope de Proposta de Preço, tendo a empresa A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME CNPJ n° 37.170.418/0001-57, apresentado o valor de R$494.948,16 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos). Após a análise da proposta pelo Engenheiro: MARCOS DOMINGOS DA SILVA, foi considerada classificada. Questionado sobre a intenção de interpor recurso quanto a fase de classificação da proposta nos termos do artigo 109 da lei 8.666/93, o representante da licitante renunciou expressamente o direito.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 423
Rúbrica

Diante do exposto, a CPL considera vencedora do certame a licitante **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME CNPJ n° 37.170.418/0001-57,** que apresentou proposta de preço no valor de **R$494.948,16 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos).**
Dessa forma a Comissão publicará o resultado por meio dos sites oficiais. Assim nada mais havendo a tratar o Presidente declarou encerrada a sessão. Determinou a lavratura da presente Ata, que lida e achada conforme foi aprovada e assinado pela comissão.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da C.P.L.

JULIANA SOUZA DA SILVA
Membro da C.P.L.

CLEICIANE PINHO DE ASSIS
Membro da C.P.L.

MARCOS DOMINGOS DA SILVA
Engenheiro

LICITANTE:

A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME CNPJ n° 37.170.418/0001-57

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 424
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ao: Engenheiro Marcos Domingos da Silva

Remetemos aos autos para análise e emissão do Parecer do Engenheiro para procedimento da parte técnica.

Uiramutã – RR, 24 de outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ Fls. 425 Rúbrica

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 134/2022 E DISPENSA N°012/2022

Este relatório trata da análise técnica referente às propostas da dispensa de licitação, processo nº 134/2022, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia responsável para da **CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA.**
Após a entrega dos envelopes 'Proposta de Preços" das empresas convidadas, realizou-se a análise técnica conforme segue.

1. Valor das Propostas

EMPRESAS (em ordem alfabética)	VALOR DAS PROPOSTAS (R$)	DESCONTO (%)	VALOR DO DESCONTO (R$)
A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI	**494.948,16**	0,0%	0,00

Todas as propostas estão com valor global igual ou abaixo do valor estimado pelo órgão, que é de R$ **494.948,16** (quatrocentos e noventa e quatro mil novecentos quarenta oito reais e dezesseis centavos). Conforme art. 48 § 1°, alínea "b" da Lei 8.666/93, não há proposta inferior a 70 % do valor orçado pela Administração.

2. Planilha de Composição do BDI

EMPRESAS (em ordem alfabética)	BDI (%)
A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI	24,96%

A empresa A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI apresentou em sua composição de BDI os tributos referentes aos TRIBUTOS conforme tabela abaixo.

PIS	**0,65%**
COFINS	**3,00%**
ISS	**3,00%**

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 426
Rúbrica

3. Planilhas Orçamentárias, composição unitária de preços e declarações complementares

Foram analisadas as planilhas apresentadas pelas empresas, e segue abaixo análise quanto às especificações do Edital.

3.1 A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI

Com relação aos quantitativos apresentados na planilha orçamentária, os itens estão em conformidade. Todos os preços de serviços, das etapas e preço global estão abaixo do preço orçado pelo valor de ref. do SINAPI

4. Conclusão

Diante da análise técnica, conclui-se que todas as propostas estão abaixo do valor global estimado pelo órgão e em conformidade com o art. 48 § 1º, alínea "b" da Lei 8.666/93. Todos os valores unitários dos serviços apresentados pelas Licitantes encontram-se com os preços abaixo do valor orçado pela Administração, estando classificadas conforme quadro a seguir:

EMPRESAS (CLASSIFICADAS PELO PREÇO)	VALOR DAS PROPOSTAS (R$)	DESCONTO (%)	VALOR DO DESCONTO (R$)	CLASSIFICAÇÃO
A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI	**494.948,16**	0,0%	0,00	1ª Classificada

Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022

Engº Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA-RR nº 0905404068
Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 427
Rúbrica

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 012/2022, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARREIRINHA- UIRAMUTÃ/RR,** conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: **A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME, CNPJ n° 37.170.418/0001-57,** totalizando o valor de **R$494.948,16 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos).**

Uiramutã/RR, 25 de outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

CPL/PMUI/RR
Publicação Mural Nº __/__
UIRAMUTÃ/RR 25/10/22

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO – CPL /PMUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 428
Rubrica
PMUI

AO
CONTROLE INTERNO

Remetemos aos autos para análise e emissão de parecer do controle interno quanto a regularidade dos procedimentos licitatórios.

UIRAMUTÃ / RR, 24 de Outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls 429
Rúbrica

PARECER CONTROLE INTERNO

ORIGEM: Processo de Licitação nº 0134/2022– Tomada de Preço nº 012/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARRERINHA, NO MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ.

EMENTA: O Processo em análise por esse controle é referente a abertura do procedimento licitatório realizado na modalidade de Tomada de Preço, do tipo "menor preço", objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARRERINHA, NO MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ.**

O Procedimento ocorreu dentro das formalidades legais, conforme detalhado no processo, baseado na Lei 8.666/1993.

É o relatório.

DO CONTROLE INTERNO:

Os Artigos 31, 70 e 74 da CF/88, determinam as competências do controle interno na administração pública municipal, surgiu da necessidade de assegurar aos gestores o cumprimento das leis, normas e políticas vigentes, através do estabelecimento de mecanismos de controle que possibilitem informações à sociedade, impedindo a ocorrência de fraudes e desperdícios, servindo de instrumento que visa garantir a efetividade, a produtividade, a economicidade e a rapidez na prestação do serviço público.

O controle interno é fundamental para se atingir resultados favoráveis em qualquer organização. Na gestão pública os mecanismos de controle existentes previnem o erro, a fraude e odesperdício, trazendo benefícios à população.

DA MODALIDADE ADOTADA

Conforme o Art. 22, Inc II, § 2º da Lei nº 8.666/93, Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls 430
Rúbrica

DA ANÁLISE PROCEDIMENTAL

Em exame, quanto aos atos procedimentais na fase interna verificou-se que:

1. Consta nos autos a solicitação que motivação e gerou a despesa com seus devidos anexos,planilhas e cronogramas;
2. O Senhor Prefeito declarou que há adequação orçamentaria e autorizou abertura do processo administrativo de Licitação;
3. Consta o Decreto n.º 003A/2022 e 351A/2022-GAB que nomeia os membros da Comissão de Licitação;
4. O Presidente da Comissão de Licitação Autuou o processo administrativo nº 0134/2022;
5. Consta o despacho enviando as minutas do Edital e seus Anexos e Minuta do Contrato paraanálise do parecer jurídico;
6. Consta o parecer Jurídico, dando ciência que foram analisadas as minutas do Edital e seusAnexos, e Minuta do Contrato, quanto as suas legalidades previstas na Lei;
7. O edital está composto das cláusulas e anexos, concernentes ao que prever a legislação emvigor, visto que atende os requisitos legais e regimentais desta lei;
8. Documentos de Hbalitaçã e proposta de Preço;
9. Ata de Credenciamento, Habilitação e Julgamento;
10. Parecer da engenharia.

Não obstante, observo que a Comissão de Licitação adotou as seguintes Leis:

Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações; Lei Complementar n ° 123 de 14 de dezembro de 2006; Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; Instrução Normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Instrução Normativa nº 5 de 25 de maio de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Instrução Normativa nº 6 de 6 de julho de 2018 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão demais normas complementares, bem como pelas condições constantes do presente Edital.

DA PUBLICAÇÃO E DOS PRAZOS

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls 431
Rúbrica

Consta a publicação do Aviso da Licitação, no Diário do Oficial do Estado de Roraima, Imprensa Oficial da União, Diário Oficial dos Municípios de Roraima e Jornal de grande circulação, conforme estabelece a legislação em vigor; Com relação aos prazos que se refere à modalidade adotada, entre a publicação do aviso e aberturado certame foi cumprido o prazo estabelecido é de no mínimo 15 dias, para recebimentos dos envelopes de documentos de Habilitação e Proposta de Preços;

DOS FATOS

O Controle Interno, em suas considerações, faz saber que, após exames detalhados dos atos procedimentais pela Comissão de Licitação, conclui-se, que nenhuma irregularidade foi levantada, entendo que o procedimento realizado está de acordo com a legislação vigente, opto para que sejadado prosseguimento as demais etapas subsequentes, evidenciando a presença efetiva de publicidade de todos os atos realizados.

CONCLUSÃO

A Comissão de Licitação atendeu os requisitos das leis nas atividades realizadas, e sem nenhuma anormalidade, nota-se, que o procedimento licitatório cumpriu seu objetivo, tendo alcançado seu êxito.

É o parecer,

Uiramutã/RR, 25 de outubro de 2022.

CNPJ. 01.612.681/0001-01
Rua Cici Mota, s/n, Centro – Uiramutã –Roraima
cpluiramuta@gmail.com

EM BRANCO

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 011/2022, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO MARIA – COMUNIDADE SÃO MATEUS - UIRAMUTÃ/RR,** conforme o projeto **básico. O** certame teve como vencedora a empresa: **A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME, CNPJ nº 37.170.418/0001-57,** totalizando o valor de **R$493.086,74 (Quatrocentos e noventa e três mil e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos).**

Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:C8644230

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 012/2022, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARREIRINHA- UIRAMUTÃ/RR,** conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: **A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME, CNPJ nº 37.170.418/0001-57,** totalizando o valor de **R$494.948,16 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos).**

Uiramutã/RR, 25 de outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:A00DB5AF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP SRP 005/2021. Processo Administrativo nº 030/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 005/2021, Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UIRAMUTÃ, CNPJ 28.157.916/0001-79. Objeto: contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Em virtude da alteração na dotação orçamentária objeto do presente termo, serão consignadas nas seguintes dotações orçamentárias: Exercício 2022. Atividade 08.244.5100.1027.0000. Manutenção do Centro de Referência e Assistência CRAS. Classificação econômica 3.3.90.30.07 Material de consumo, no valor de R$ 29.757,45 (vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Fundamentação Legal: Art. 65, § 8 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

GUIDO YANO RODRIGUES OLIVEIRA BARRETO.
Secretário Municipal de Assistência Social – SEMAS.

Uiramutã/RR, 27 de outubro de 2022.

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:5C174DAA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR

PORTARIA Nº530/2022

Dispõe sobre a autorização de deslocamento de servidor em serviço e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "g", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR o deslocamento e afastamento da sede do Município de Uiramutã – RR, o (a) servidor (a) Claúdio da Silva Barbosa, ocupante do cargo de Motorista da Secretaria, para viajar com destino a Boa Vista – RR, no período de 26 /10a 29/10/2022, deslocamento para da assistência com o transporte a Secretária de Educação do Município nas participações de reuniões Administrativos.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito de Uiramutã-RR, 27 de Outubro de 2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:
Eloiza Cavalcante de Lima
Código Identificador:6493BB42

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR

PORTARIA Nº531/2022

Dispõe sobre a autorização de deslocamento de servidor em serviço e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "g", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.
RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR o deslocamento e afastamento da sede do Município de Uiramutã – RR, o (a) servidor (a) **Luciane Melquior Messias,**ocupante do cargo de**Coordenadora de Divisão de Ensino**, para viajar com destino a Boa Vista – RR, no período de 31/10a 07/11/2022, deslocamento para tratar de assuntos referentes a Estrutura Organizacional da Feira de Ciência das Escolas Municipais que ocorrerá no mês de Novembro deste Ano.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito, Uiramutã-RR, 27de Outubrode 2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito do Município de Uiramutã

Publicado por:
Eloiza Cavalcante de Lima
Código Identificador:31C65A50

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR

PORTARIA Nº532/2022

Dispõe sobre a autorização de deslocamento de servidor em serviço e dá outras providências.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU - Fls. 433 Rubrica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022-CPL/PMC
REPETIÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 050/2022-SEMEC/PMC

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ-RR por intermédio da Comissão Permanente de Licitação -CPL/PMC torna público aos interessados, que realizará Processo Licitatório na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA N º 026/2022, do MENOR PREÇO POR GRUPO, para Registro de Preços para eventual Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE APOIO ADMINISTRATIVO EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANTÁ/RR. REABERTURA DA LICITAÇÃO: Às 10h00min (horário de Brasília) do dia 16/11/2022, por meio do site: https://www.gov.br/compras/pt-br - UASG 980028, O Edital encontra-se a disposição dos interessados, para retirada no mesmo endereço a partir do dia 03/11/2022 (quinta-feira).

Cantá-RR, 1º de novembro de 2022.
BRUNNO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA
Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação - CPL/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 083/2022. Nº Processo: 017/2022.Pregão Presencial SRP Nº 006/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE PACARAIMA- RR. Contratado: 18.344.733/0001-09 - PRRIME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE KIT DE UTENSÍLIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUSIVE UNIDADES EDUCACIONAIS EM ÁREAS INDÍGENAS. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: 26/10/2022 a 26/04/2023. Fonte de Recurso: FUNDEB. Valor Total: R$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais). Data de Assinatura: 26/10/2022. Juliano Torquato dos Santos. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

EXTRATO DO CONTRATO

A Prefeitura Municipal de São Luiz/RR, CNPJ n° 04.056.230/0001-23, em cumprimento ao disposto na Lei federal n° 8.666/93 de junho de 1993. Torna público aos interessados o Extrato de Contrato n° 005/2022-TP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ - ESTADO DE RORAIMA, conforme Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físicos Financeiro, Memória de Cálculo, Curva ABC, Memórias Descritivos, Composição Analítica do BDI, Composição de Preços Unitários, Relatório Fotográfico, ART e Projetos Técnicos de Engenharia, oriundo do Processo Administrativo n° 071/2022, Tomada de Preços n° 005/2022 e Convênio nº 81/2022/ESTADO DE RORAIMA/SEINF/MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ com o valor estimado de R$ 1.146.685,44 (Um Milhões, Cento e quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos) . Entre a PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO LUIZ e a empresa ATENAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n° 19.028.541/0001-56, com vigência de 120 (cento e vinte) dias. Esta publicação entrara em vigor na data de sua publicação.

AVISODE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 5/2022

PROCESSO N ° 071/2022 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ - ESTADO DE RORAIMA

O Prefeito Municipal de São Luiz, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, bem como na legislação vigente aplicada ao caso e, no interesse da Administração, DECIDIU HOMOLOGAR E ADJUDICAR o Processo Licitatório n° 071/2022. Edital de Tomada de Preços n° 005/2022 , tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ - ESTADO DE RORAIMA ,conforme Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físicos Financeiro, Memória de Cálculo, Curva ABC, Memórias Descritivos, Composição Analítica do BDI, Composição de Preços Unitários, Relatório Fotográfico, ART e Projetos Técnicos de Engenharia, em favor da empresa ATENAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , (CNPJ n° 19.028.541/0001-56), por ter apresentado proposta no valor de R$ 1.146.68544 (Hum Milhão, Cento e Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos). DETERMINO a adoção das medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.

São Luiz/RR, 27 de setembro de 2022.
JAMES MOREIRA BATISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 10/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 010/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ARTHUR NABUCO DE ARAÚJO - COMUNIDADE MARACANÃ I - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: E. DA S. CASTOLDI LTDA, CNPJ n° 17.759.716/0001-70, totalizando o valor de R$512.328,16 (Quinhentos e doze mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos).

Uiramutã-RR, 24 de outubro de 2022.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 008/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO ÁGUIDA KASA WAI - COMUNIDADE WILLIMOM - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ n°38.080.939/0001-86, totalizando o valor de R$ 490.706,74 (Quatrocentos e noventa mil setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos).

Uiramutã-RR, 24 de outubro de 2022.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 011/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO MARIA - COMUNIDADE SÃO MATEUS - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME, CNPJ n° 37.170.418/0001-57, totalizando o valor de R$493.086,74 (Quatrocentos e noventa e três mil e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Uiramutã-RR, 24 de outubro de 2022.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 012/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA-UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME, CNPJ n° 37.170.418/0001-57, totalizando o valor de R$494.948,16 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos).

Uiramutã-RR, 25 de outubro de 2022.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 007/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO JOAQUIM DE LIMA - COMUNIDADE MATURUCA - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n°13.808.507/0001-18, totalizando o valor R$ 498.048,16 (Quatrocentos e noventa e oito mil, quarenta e oito reais e dezesseis centavos).

Uiramutã-RR, 24 de outubro de 2022.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 009/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO - COMUNIDADE SÃO LUIZ - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME, CNPJ n°37.170.418/0001-57, totalizando o valor de R$493.917,96 (Quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e dezessete reais e noventa e seis centavos).

Uiramutã-RR, 24 de outubro de 2022.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 013/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA - COMUNIDADE CARAPARÚ I - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ n° 38.080.939/0001-86, totalizando o valor de R$516.468,16 (Quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos).

Uiramutã-RR, 25 de outubro de 2022.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 57/2022

PROCESSO LICITATORIO N° 80/2022

Registro de preço para aquisição parcelada de pedra ardósia para o município de Agronômica. Maiores informações (47) 3542-0166 ou no e-mail: licitacao@agronomica.sc.gov.br.

Agronômica, SC, 1º de novembro de 2022
CÉSAR LUIZ CUNHA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ

AVISO DE CREDENCIAMENTO

LICITAÇÃO Nº 38/2022 - SAÚDE

O prefeito municipal comunica aos interessados abertura de credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde na especialidade de laboratório clínico, para atendimento aos usuários do SUS - Sistema único de Saúde, nos termos das condições estabelecidas no presente instrumento de chamamento. Os interessados deverão apresentar a documentação exigida no edital, no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Araranguá, sito à Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200, centro. Abertura 1ª sessão de analise de credenciados: A sessão para abertura dos envelopes contendo a documentação será as 09h00 do dia 23 de novembro de 2022, na sala de reuniões do de Licitação da Prefeitura Municipal de Araranguá. EDITAL COMPLETO E INFORMAÇÕES: Está à disposição dos interessados no horário de expediente na Prefeitura, no endereço eletrônico; www.ararangua.sc.gov.br, e afixado no mural, localizado no hall de entrada da sala do Departamento de Licitações da Prefeitura. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 0XX48 3521-0929 ou pelo e-mail: licitacao@ararangua.sc.gov.br.

Araranguá - SC, 1º de novembro de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito

EM BRANCO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 008/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO ÁGUIDA KASAWAI – COMUNIDADE WILLIMOM - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ n°38.080.939/0001-86, totalizando o valor de R$ 490.706,74 (Quatrocentos e noventa mil setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos). Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 009/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO – COMUNIDADE SÃO LUIZ - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME, CNPJ n°37.170.418/0001-57, totalizando o valor de R$493.917,96 (Quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e dezessete reais e noventa e seis centavos). Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 010/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ARTHUR NABUCO DE ARAÚJO – COMUNIDADE MARACANÃ I - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: E. DA S. CASTOLDI LTDA, CNPJ nº 17.759.716/0001-70, totalizando o valor de R$512.328,16 (Quinhentos e doze mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos). Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 011/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO MARIA – COMUNIDADE SÃO MATEUS UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME, CNPJ nº 37.170.418/0001-57, totalizando o valor de R$493.086,74 (Quatrocentos e noventa e três mil e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 012/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARREIRINHA-UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME, CNPJ nº 37.170.418/0001-57, totalizando o valor de R$494.948,16 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos). Uiramutã/RR, 25 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 013/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ I - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ nº 38.080.939/0001-86, totalizando o valor de R$516.468,16 (Quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos). Uiramutã/RR, 25 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

OUTRAS PUBLICAÇÕES

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE RORAIMA - FEMARH

LICENÇA DE OPERAÇÃO **LO N.° 135/2021/DLGA**

A Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Estadual n ° 001. Art.46. Inciso III e Art.02 de 26 de janeiro de 1991, e regulamentada pela Lei Delegada nº 04 de 16 de janeiro de 2003 e da Lei Estadual nº 815 de 07 de Julho de 2011, de acordo com o Sistema de Licenciamento de Atividades Potencialmente Poluidoras, instituído através da Lei Complementar nº 007 de 26 de Agosto de 1994 concede a presente **LICENÇA DE OPERAÇÃO**, referente ao Processo **Nº PR-00464-01/2021**, Parecer Técnico do Controle Interno Nº **PAR-00234-01/2022**, registrada na **FEMARH-RR** sob o código **E-02-02** ao Empreendedor.

NOME: AZULÃO GERAÇÃO DE ENERGIA S.A (RORAIMA)

CPF/CNPJ: 30.185.130/0003-79

ENDEREÇO: RODOVIA BR-174, S/N, GLEBA MURUPU, BAIRRO SAID SALOMÃO.

MUNICÍPIO: BOA VISTA - RR

ATIVIDADE: USINA TERMELÉTRICA A GÁS NATURAL, COM CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA DE 140,83 MW, EM CICLO COMBINADO; LINHA DE TRANSMISSÃO (LT) EM 230 KV LIGANDO A UTE JAGUATIRICA II À S.E. BOA VISTA II, QUE SERÁ CONECTADA AO SISTEMA ISOLADO DE RORAIMA.

Endereço do Empreendimento: GLEBA MURUPU, REGIÃO DO BOM INTENTO, FAZENDA CAROLINA- REMANESCENTE (GLEBA C) - BOA VISTA/RR.

VALIDADE: 26/11/2026

Esta licença e válida somente para a atividade supracitada, dentro do período de validade e observada as condições deste documento e seus anexos que embora não transcritos, são partes integrantes do mesmo. Qualquer alteração deverá ser comunicada imediatamente à **FEMARH-RR**.

Boa Vista, RR. 26/11/2021

GLICÉRIO MARCOS FERNANDES PEREIRA - Presidente da FEMARH.

WAGNER SEVERO NOGUEIRA - Diretor da DLGA/FEMARH-PR

FEMARH

Avenida Ville Roy, 4935 São Pedro - Boa Vista - RR

CEP 69.306-040

TELEFAX: 095 2121-9190

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 435
Rúbrica

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR, sediada na Av. Perimetral Norte, s/n – Centro – São João da Baliza/RR, torna público aos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão, em sua forma Presencial, oriunda do Processo Administrativo nº 204/2022, tendo por objeto a Aquisição de Combustíveis, de forma parcelada, para atender as necessidades da frota de veículos oficiais que atende a Secretaria Municipal de Educação e o Fundo Municipal de Educação junto as Escolas Municipais do Município de São João da Baliza – RR", nos termos da Lei 10.520/2002 e subsidiariamente Lei n. 8.666/93.
Abertura das Propostas: 16/11/2022 às 09:00 horas. O Edital na integra encontra-se a disposição dos interessadas no endereço supra, horário: 8:00 às 13:30 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação localizada na sede da Prefeitura Municipal de São João da Baliza/RR.

São João da Baliza/RR, 31 de outubro de 2022.

DAVI ALEXANDRE FERREIRA DOS REIS
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR, sediada na Av. Perimetral Norte, s/n – Centro – São João da Baliza/RR, torna público aos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão, em sua forma Presencial, oriunda do Processo Administrativo nº 292/2022, tendo por objeto a "contratação de empresa para prestação de serviços de TRANSPORTE ESCOLAR para as escolas da rede municipal de ensino localizadas na sede e zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED", nos termos da Lei 10.520/2002 e subsidiariamente Lei n. 8.666/93.
Abertura das Propostas: 11/11/2022 às 09:00 horas. O Edital na integra encontra-se a disposição dos interessados no endereço supra, horário: 8:00 às 13:30 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação localizada na sede da Prefeitura Municipal de São João da Baliza/RR.

São João da Baliza/RR, 31 de outubro de 2022.

DAVI ALEXANDRE FERREIRA DOS REIS
Pregoeiro

CAER
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA – CAER
COORDENADORIA DE CONTRATO – COC

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 092/2021 - 1º Aditivo
PROCESSO Nº: 278/2021
CONTRATANTE: Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER – CNPJ: 05.939.467/0001-15
CONTRATADA: RECHE GALDEANO E CIA LTDA **CNPJ:** 08.713.403/0001-90
OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 meses e promover o reajuste contratual em 6,1634%
DATA DA ASSINATURA: 21.10.2022
ASSINAM: Pela CONTRATANTE, James da Silva Serrador, presidente da CAER e pela CONTRATADA, Sidnei Reche Galdeano Filho, Representantes legais.

Boa Vista – RR, 31 de Outubro de 2022.

Márcio Eduardo Brito de Lima
Coordenador de Contratos – COC

CAER
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA – CAER
COORDENADORIA DE CONTRATO – COC

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 093/2018 - 4º Aditivo
PROCESSO Nº: 216A/2018
CONTRATANTE: Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER – CNPJ: 05.939.467/0001-15
CONTRATADA: ITAÚ UNIBANCO S/A **CNPJ:** 60.701.190/0001-04
OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 meses e promover o reequilíbrio econômico e financeiro
DATA DA ASSINATURA: 26.10.2022
ASSINAM: Pela CONTRATANTE, James da Silva Serrador, presidente da CAER e pela CONTRATADA, Vinicius Paulo Ferreira Van Riemsdijk e Valter Teiles do Nascimento, Representantes legais.

Boa Vista – RR, 31 de Outubro de 2022.

Márcio Eduardo Brito de Lima
Coordenador de Contratos – COC

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 - CPL. PROCESSO Nº030/2022-SEMSA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ-RR, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. XIII, inciso VI, Decreto nº 10.024/2019 e art. 43, VI, da Lei 8.666/93 e demais disposições que regulam a matéria, bem como a ata de realização oriunda pela Comissão Permanente de Licitação, e de acordo com o Parecer da Assessoria Jurídica e Controle Interno desta Prefeitura, de que trata o Pregão Eletrônico nº 009/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ALTERNATIVA com intuito de atender as unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de CANTÁ/RR, foi em toda sua tramitação atendida à legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO os itens do Processo Licitatório nº 030/2022 Pregão Eletrônico nº 009/2022, em favor da Empresa: FATOR EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.003.732/0001-48, sendo como vencedora do Item I (8 unidade), com valor unitário R$ 6.475,00 (seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), valor total do Item I R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil, oitocentos reais), Item 2 (1 unidade), valor de R$ 64.700,00 (sessenta e quatro mil, setecentos reais), tendo como valor total dos itens I e II R$ 116.500,00 (cento e dezesseis mil, quinhentos reais). Publique-se e dê-se ciência.

CANTÁ - RR, 31 de outubro de 2022.

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
Prefeito Municipal.

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

Síntese da Ata de Registro de Preços nº 017/2022. Processo Licitatório nº 055/2022-SEMED/PMC Modalidade: Pregão Presencial - SRP nº 016/2022. Tipo: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM. Órgão Demandante: Secretaria Municipal de Educação. Objeto de Contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MECÂNICA DE VEÍCULOS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS da frota pertencentes a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de CANTÁ/RR. Empresa Vencedora: FRANCISCO SOUZA MIRANDA - ME, CNPJ Nº 07.947.246/0001-07, Lote I: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO 10,00% (dez por cento) para peças e serviços; valor total estimado do LOTE I: R$ 666.375,00 (seiscentos e sessenta mil e quinhentos e setenta e cinco reais); Lote II: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO 10,00% (dez por cento) para peças e serviços; valor total estimado dos lote I + lote II: o valor total estimado para contratação dos serviços e aquisição de peças e manutenção preventiva e corretiva é de R$ 1.175.754,00 (um milhão cento e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais); valor estimado de peças de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), valor estimado para serviços de R$ 875.754,00 (oitocentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais). A Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contados da data da publicação desta síntese. Fundamentação Legal: Lei n.º 10.520/2002 e Lei n.º 8.666/1993.

Cantá-RR, 31 de outubro de 2022.

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
Prefeito Municipal.

Governo do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 029/2022
PROCESSO Nº 19602.000048/2022.81 – PMRR

Objeto: **Eventual contratação de serviço em telecomunicações de voz e dados, na modalidade de telefonia móvel pessoal (SMP) mensal continuade com fornecimento de Sim Cards (Chip) com franquia mínima de 10 GB.**
DATA DE ABERTURA: **17/11/2022** HORA: **09h30** (horário de Brasília)
O edital se encontrará à disposição dos interessados nos sites www.comprasnet.gov.br e http://www.cpl.rr.gov.br, bem como no Protocolo dotra **CPL/RR**, localizada na Av. Nossa Senhora da Conceição, nº 472 – Centro; CEP: 69.301-011; Boa Vista/RR, em horário normal de expediente, a partir do dia **01/11/2022**. Código da UASG nº **930001**.

Boa Vista – RR, 31 de outubro de 2022.

PAULO SÉRGIO DA SILVA MAIA
Pregoeiro da CPL/RR

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO GERAL DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EDITAL DE CITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 17101.005880/2021-34, instaurado pela Portaria nº 7512/SEGAD/CGSPAD, de 26 de setembro de 2022 , do Exmo. Sra. Secretária Adjunta de Estado da Secretaria da Gestão Estratégica e Administração, publicada no Diário Oficial do Estado de Roraima nº 4305, de 14 de outubro de 2022, no uso de suas atribuições e nos termos do disposto no artigo 127 da Lei Complementar 053, de 31 de dezembro de 2001, CITA, pelo presente Edital, o servidor Hélton Lopes dos Santos, ocupante de serviços gerais, matrícula funcional nº 04000/1358, lotado na Secretaria de Educação e Desporto – SEED, por se encontrar em local incerto e não sabido, para apresentar defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da última publicação do Edital, na sede da Coordenação de Processo administrativo e Sindicância – CGSPAD, situada na Rua Francisco Paulino da Silva, 215/Sala 19, Caçari, Boa Vista – RR, CEP 69.307-670, sob pena de revelia, sendo-lhe assegurado vista dos autos neste local, em dias úteis, no horário das 07:30 hs. às 13:30 hs.

Boa Vista/RR, 25 de outubro de 2022.

(Assinatura Eletrônica)
YAN JORGE DO REGO MACEDO
Presidente da comissão
PORTARIA Nº 7512/SEGAD/CGSPAD

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO GERAL DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EDITAL DE CITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 17101.004460/2021.54, instaurado pela Portaria nº 7515/SEGAD/CGSPAD, de 28 de setembro de 2022 , do Exmo. Sra. Secretária Adjunta de Estado da Secretaria da Gestão Estratégica e Administração, publicada no Diário Oficial do Estado de Roraima nº 4298, de 06 de outubro de 2022, no uso de suas atribuições e nos termos do disposto no artigo 157 da Lei Complementar 053, de 31 de dezembro de 2001, CITA, pelo presente Edital, o servidor José Ferreira da Costa Júnior, Professor I, matrícula funcional nº 40021156, lotado na Secretaria de Educação e Desporto – SEED – Normanha –, por se encontrar em local incerto e não sabido, para apresentar defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da última publicação do Edital, na sede da Coordenação de Processo administrativo e Sindicância – CGSPAD, situada na Rua Francisco Paulino da Silva, 215/Sala 19, Caçari, Boa Vista – RR, CEP 69.307-670, sob pena de revelia, sendo-lhe assegurado vista dos autos neste local, em dias úteis, no horário das 07:30 hs. às 13:30 hs.

Boa Vista/RR, 26 de outubro de 2022.

(Assinatura Eletrônica)
YAN JORGE DO REGO MACEDO
Presidente da comissão
PORTARIA Nº 7515/SEGAD/CGSPAD

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 008/2022, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO ÁGUIDA KASA WAI – COMUNIDADE WILLIMOM - UIRAMUTÃ/RR,** conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME. CNPJ nº38.080.939/0001-86,** totalizando o valor de **R$ 490.706,74 (Quatrocentos e noventa mil setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos)**

Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 009/2022, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO – COMUNIDADE SÃO LUIZ - UIRAMUTÃ/RR,** conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: **A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME. CNPJ nº37.170.418/0001-57,** totalizando o valor de **R$493.917,96 (Quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e dezessete reais e noventa e seis centavos)**

Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 010/2022, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ARTHUR NABUCO DE ARAÚJO – COMUNIDADE MARACANÃ I - UIRAMUTÃ/RR,** conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: **E. DA S. CASTOLDI LTDA, CNPJ nº 17.759.716/0001-70,** totalizando o valor de **R$512.328,16 (Quinhentos e doze mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos)**

Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 011/2022, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO MARIA – COMUNIDADE SÃO MATEUS - UIRAMUTÃ/RR,** conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: **A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME, CNPJ nº 37.170.418/0001-57,** totalizando o valor de **R$493.086,74 (Quatrocentos e noventa e três mil e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos).**

Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 012/2022, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARREIRINHA-UIRAMUTÃ/RR,** conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: **A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME, CNPJ nº 37.170.418/0001-57,** totalizando o valor de **R$494.948,16 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos).**

Uiramutã/RR, 25 de outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 013/2022, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ I - UIRAMUTÃ/RR,** conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ nº 38.080.939/0001-86,** totalizando o valor de **R$516.468,16 (Quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos).**

Uiramutã/RR, 25 de outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 436
Rubrica
PMUI

TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DE PROCESSO Nº 134/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS Nº 012/2022

O **PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA –** RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO do Procedimento Licitatório - **PROCESSO Nº 134/2022 – TOMADA DE PRECOS Nº 012/2022 conforme a seguir:**

EMPRESA: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – MR
CNPJ Nº: 37.170.418/0001-57
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO –Comunidade BARREIRINHA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ –RR.
VALOR: 494.948,16 (quatrocentos e noventa quatro mil novecentos e quarenta oito reais e dezesseis centavos).
Publique-se/

UIRAMUTÃ – RR, 31 de Outubro de 2022.

Benisio Roberto de Souza
Prefeito do Município de Uiramuta- RR

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE UIRAMUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA - RR
Fls. 437
Rúbrica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DE PROCESSO Nº 134/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022

O **PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA** – RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO do Procedimento Licitatório - **PROCESSO Nº 134/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022 conforme a seguir:**

EMPRESA: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – MR
CNPJ Nº: 37.170.418/0001-57
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO –Comunidade BARREIRINHA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ –RR.
VALOR: 494.948,16 (quatrocentos e noventa quatro mil novecentos e noventa oito reais e dezesseis centavos).

Publique-se/

UIRAMUTÃ – RR, 31 de Outubro de 2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito do Município de Uiramuta- RR

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:E14485E1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima no dia 08/11/2022. Edição 1765
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amr/

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE URAMUTÃ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO Nº 131/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ – RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentais praticados, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentais praticados, faço a ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do Procedimento Licitatório - **PROCESSO Nº 131/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 conforme a seguir:**

EMPRESA: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME
CNPJ Nº: 37.170.418/0001-57
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA CIDIAS RIBEIRO – COMUNIDADE SÃO LUIZ, NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ –RR.
VALOR: (duzentos e noventa mil novecentos e dezenove reais e oitenta centavos).
Publique-se/

URAMUTÃ – RR, 31 de Outubro de 2022.

Renisio Roberto de Souza
Prefeito do Município de Uramutã-RR

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE URAMUTÃ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO Nº 130/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ – RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentais praticados, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentais praticados, faço a ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do Procedimento Licitatório - **PROCESSO Nº 130/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 conforme a seguir:**

EMPRESA: L. M. S. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ Nº: 37.170.418/0001-57
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ELIO BALDIA VIGA – WAI-COMUNIDADE HELENA, NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ – RR.
VALOR: (duzentos e noventa mil novecentos e dezenove reais e noventa centavos).
Publique-se/

URAMUTÃ – RR, 31 de Outubro de 2022.

Renisio Roberto de Souza
Prefeito do Município de Uramutã-RR

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES DO ESTADO DE RORAIMA - SINTECT/RR
Filiado: FENTECT

COMISSÃO ELEITORAL
ELEIÇÕES DE DIRETORIA – TRIÊNIO 2022/2025
RELAÇÃO NOMINAL DE CHAPAS INSCRITAS

A Comissão Eleitoral das eleições do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Similares do Estado de Roraima – SINTECT/RR – para o triênio 2022/2025, em cumprimento ao Artigo 20, Parágrafo Quarto, do Capítulo IV do Estatuto Social da Entidade, vem a público informar que no dia 04 de novembro de 2022, às 17h (dezessete horas), se deu o encerramento do prazo de registro de chapas para o referido pleito, sendo inscrita 01 (uma) chapa, denominada: Chapa 01 – RESISTÊNCIA E LUTA, com a seguinte composição: Presidente: Arsanio Rodrigues de Sousa, Secretário Geral: Andrelina Pereira da Silva, Secretário de Finanças: Raimundo Alves Pereira, Secretário de Saúde e Assuntos Culturais: Antonio Alderir Rodrigues, Secretário de Formação Político-Sindical e Questões Jurídicas: Arionar Fatiso de Lima; Suplentes da Diretoria Executiva: Daywson Gacpalves Almeida Silva, Camila Antonio Miguel, Geovanicio de Almeida Santos, Célio Cunha da Silva Moreira e Rosa Laura dos Santos Oliveira. A quem interessar informa que o prazo para impugnação da Chapa com candidato(s) será até dias 09 e 10 de novembro de 2022, no horário das 8h às 17h.

Boa Vista-RR, 08 de novembro de 2022.

Francisco Souza Lima Junior
Presidente da Comissão Eleitoral

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE URAMUTÃ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO Nº 132/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ – RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentais praticados, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentais praticados, faço a ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do Procedimento Licitatório - **PROCESSO Nº 132/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 conforme a seguir:**

EMPRESA: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME
CNPJ Nº: 37.170.418/0001-57
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO MATEUS, NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ –RR.
VALOR: (quatrocentos e noventa mil duzentos e noventa reais e quatro centavos).
Publique-se/

URAMUTÃ – RR, 31 de Outubro de 2022.

Renisio Roberto de Souza
Prefeito do Município de Uramutã-RR

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE URAMUTÃ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO Nº 133/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ – RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentais praticados, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentais praticados, faço a ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do Procedimento Licitatório - **PROCESSO Nº 133/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 conforme a seguir:**

EMPRESA: L. DA S. CASTORO LTDA
CNPJ Nº: 37.206.716/0001-70
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ARTHUR MARCIO DE ARAUJO –COMUNIDADE DE MARICANÃ I, NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ –RR.
VALOR: (quatrocentos e dois mil cento e seis reais e dezessete centavos).
Publique-se/

URAMUTÃ – RR, 31 de Outubro de 2022.

Renisio Roberto de Souza
Prefeito do Município de Uramutã-RR

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE URAMUTÃ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO Nº 134/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ – RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentais praticados, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentais praticados, faço a ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do Procedimento Licitatório - **PROCESSO Nº 134/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022 conforme a seguir:**

EMPRESA: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME
CNPJ Nº: 37.170.418/0001-57
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ANICONO POSENO –Comunidade SAMUMUMA, NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ –RR.
VALOR: (quatrocentos e noventa mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos).
Publique-se/

URAMUTÃ – RR, 31 de Outubro de 2022.

Renisio Roberto de Souza
Prefeito do Município de Uramutã-RR

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE URAMUTÃ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO Nº 135/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ – RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentais praticados, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentais praticados, faço a ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do Procedimento Licitatório - **PROCESSO Nº 135/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 conforme a seguir:**

EMPRESA: L. M. S. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ Nº: 37.206.709/0001-60
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA Ilza TERESA DA SILVA – COMUNIDADE CUMAPARU I NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ –RR.
VALOR: (quatrocentos e noventa mil quinhentos e oitenta reais e dezessete centavos).
Publique-se/

URAMUTÃ – RR, 31 de Outubro de 2022.

Renisio Roberto de Souza
Prefeito do Município de Uramutã-RR

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE URAMUTÃ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO Nº 129/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ – RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentais praticados, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentais praticados, faço a ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do Procedimento Licitatório - **PROCESSO Nº 129/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 conforme a seguir:**

EMPRESA: EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 12.808.569/0001-08
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ANICONO JOAQUIM DE LIMA – COMUNIDADE MATAMUCA, NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ –RR.
VALOR: (oitocentos e noventa até no duzentos alta mais e duzentos centavos).
Publique-se/

URAMUTÃ – RR, 31 de Outubro de 2022.

Renisio Roberto de Souza
Prefeito do Município de Uramutã-RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ-RR
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Mucajaí/RR, através da CPL, torna pública a TP nº 07/2022 - Processo nº 0470/2022, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DE UBS TIPO I LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ (UBS SABINO PAULO DA SILVA - VILA SAMAÚMA), data da apresentação da Documentação e Proposta 23/11/2022 – 08h00min. EDITAL E ANEXOS: Retirar na CPL da Prefeitura Municipal de Mucajaí, situada na Av. Nossa Senhora de Fátima, n. 32W - Centro, no horário das 08h00mins 12h00min, mediante carimbo com CNPJ.

Mucajaí-RR, 07 de novembro de 2022
JEAN CLEBER FREITAS DE LIMA
Presidente da CPL

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ-RR
RESULTADO DE JULGAMENTO

A Prefeitura Municipal de Mucajaí, por intermédio da Comissão de Licitação CPL/PMM, torna público a quem possa interessar, o resultado do certame do PREGÃO PRESENCIAL N.º 37/2022 – PROC. ADM. Nº. 464/2022, em que a empresa INOVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº. 43.295.796/0001-60, foi vencedora com o valor de R$ 719.500,00 (Setecentos e dezenove mil e quinhentos reais), cujo o objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Áudio visual (filmagens, fotos, layouts, produções de áudio e vídeos publicitário) de caráter institucional, locação de barracas, tendas, cadeiras e mesas, serviço de sonorização e iluminação para atender a Administração Municipal de Mucajaí - RR.

Mucajaí-RR, 07 de novembro de 2022
Jean Cleber Freitas de Lima
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ-RR

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Pelo Presente, homologo o resultado de julgamento de licitação do PREGÃO PRESENCIAL N.º 37/2022 – PROC. ADM. Nº. 464/2022, bem como a Adjudicação de seu Objeto, à empresa INOVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº. 43.295.796/0001-60, à luz dos documentos contidos no processo Licitatório, e autorizo a emissão do empenho no valor de R$ 719.500,00 (Setecentos e dezenove mil e quinhentos reais).

Mucajaí – RR, 07 de novembro de 2022
ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita do Município de Mucajaí/RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 207/2022 – Registro de Preços
Processo nº 0176/2022 – SMSA

Objeto: Eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de oxigênio de Gás Medicinal Hospitalar e concessão gratuita dos equipamentos, para atender as necessidades do Hospital da Criança Santo Antônio – HCSA.
Retirada dos Processos: a partir de 08/11/2022 às 8h (horário de Brasília) no site www.compraspmbv.com.br
Prazo de Entrega: 23/11/2022 às 10h (horário de Brasília) – site supracitado.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados, no site www.compraspmbv.com.br, no portal http://transparencia.boavista.rr.gov.br/editais-em-andamento/ ou mediante solicitação por e-mail: pregaopmbv@gmail.com, juntamente com as Notas Explicativas (ou Notas) que serão prestadas mencionado. Os esclarecimentos e as retificações necessárias aos licitantes serão prestados pela CPL, nos dias e horários de expediente.

Rosana de Oliveira Borges Vieira
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 208/2022 – Registro de Preços
Processo nº 0180/2022 – SMSA

Objeto: Eventual contratação de empresa especializada para locação de ventiladores pulmonares, para atender as necessidades do Hospital da Criança Santo Antônio – HCSA.
Retirada dos Processos: a partir de 08/11/2022 às 8h (horário de Brasília) no site www.compraspmbv.com.br
Prazo de Entrega: 24/11/2022 às 10h (horário de Brasília) – site supracitado.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados, no site www.compraspmbv.com.br, no portal http://transparencia.boavista.rr.gov.br/editais-em-andamento/ ou mediante solicitação por e-mail: pregaopmbv@gmail.com, juntamente com as Notas Explicativas (ou Notas) que serão prestadas mencionado. Os esclarecimentos e as retificações necessárias aos licitantes serão prestados pela CPL, nos dias e horários de expediente.

Rosana de Oliveira Borges Vieira
Pregoeira





EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma do artigo 25, inciso V e parágrafo único, e do artigo 38, do Estatuto do SINTEVITRAVER, **CONVOCAR** a realização de **Assembleia Extraordinária**, que ocorrerá em **24/11/2022 às 19:30h**, no endereço localizado na **Av: São Joaquim Nº 1014 Bitro: Doutar Silvio Leite.**

Ressaltamos ainda que, os moldes do art. 38, do Estatuto, a segunda convocação **ocorrerá às 20h.**

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 439
Rúbrica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ-RR, informa que na publicação do dia 08/11/2022, D.O.M., EDIÇÃO Nº 1765, PÁGINA 06; Código Identificador: E14485E1, referente ao **"EXTRATO DE CONTRATO", onde se lê:** "Valor: R$ 494.948,16 (quatrocentos e noventa quatro mil novecentos e oito reais e dezesseis centavos, **Leia-se:** "Valor: R$ 494.948,16 (quatrocentos e noventa quatro mil novecentos e quarenta oito reais e dezesseis centavos).

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE UIRAMUTA

Fls. 440
Rúbrica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ-RR, informa que na publicação do dia 08/11/2022, D.O.M., EDIÇÃO Nº 1765, PÁGINA 06; Código Identificador: E14485E1, referente ao **"TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DE PROCESSO", onde se lê:** "Valor: R$ 494.948,16 (quatrocentos e noventa quatro mil novecentos e oito reais e dezesseis centavos, **Leia-se:** "Valor: R$ 494.948,16 (quatrocentos e noventa quatro mil novecentos e quarenta oito reais e dezesseis centavos).

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:3B1669C1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima no dia 10/11/2022. Edição 1767
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amr/

EM BRANCO

Fls. 441
Rúbrica

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 134/2022.

PROCESSO Nº 134/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito CNPJ: 01.612.681/0001-01, com sede neste Município, situada na rua Cici Mota, s/nº – Centro, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, **Benisio Roberto de Souza**, brasileiro, CPF: 988.006.632-49, tendo como representante da **Secretária Municipal de Educação Cultura e Desporto**, a Sra. **VARDERLANE JAMES LIMA,** inscrita no CPF sob o nº 961.227.812-15, RG nº 307709-8 SSP/RR, denominada doravante CONTRATANTE e a empresa **A. ALMDEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME**, cadastrada no CNPJ **sob o n° 37.170.418/0001-57**,sediada na AV. Santos Dumont, 2180, sala 01, bairro: 31 de Marco, nesta cidade Boas Vista - RR, telefone: 95- 99131- 2944, representada por Sr. **ANSELMO ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA,** brasileiro, empresário, solteiro, portador do CPF/MF sob nº 498.100.903-82, residente e domiciliado na Capital de Boa Vista-RR,denominada CONTRATADA, de conformidade com a Tomada de Preços 012/2022, medianteas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.O presente contrato tem como objeto a execução da obra de **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO –Comunidade BARREIRINHA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ –RR,** as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor inicial deste contrato é de **R$ 494.948,16 (quatrocentos e noventa quatro mil novecentos e quarenta oito reais e dezesseis centavos),** correspondente à proposta ofertada pela CONTRATADA, aplicada às quantidades estimadas nas planilhas de orçamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA A EXECUÇÃO

3.1. Como garantia de execução deste contrato a CONTRATADA apresentou antes de sua assinatura, comprovante de garantia na modalidade, na importância de R$ 24.747,40 (vinte quatro mil setecentos e quarenta sete reais e quarenta centavos), (Guia de Recolhimento acostada ao Processo nº 134/2022 – Tomada de Preços nº 012/2022, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual.

3.2. A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações estipuladas neste Contrato.

3.3. No caso de alteração do valor deste contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

3.3.1. Ocorrendo alteração, dentro dos limites legais, dos valores constantes do contrato ou prorrogação do prazo de execução da obra ou, ainda, qualquer outra causa que impeça a entrega do objeto no prazo avençado, a CONTRATADA deverá providenciar a complementação ou prorrogação, conforme o caso, da garantia prestada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do respectivo termo.

3.4. A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à contratada, podendo ser retida para a satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão dolosa ou culposa da contratada.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 442
Rúbrica

3.5. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
3.5.1. Na notificação devem constar as razões da utilização da garantia, com referência ao documento em que a contratada foi cientificada das correções que deveria providenciar e do valor das mesmas.
3.6. Após a execução deste contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída no prazo máximo de 30 (trinta) dias da solicitação da contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DA GESTÃO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

4.1. A gestão e execução do presente contrato será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .
4.2. A fiscalização do objeto da presente contratação pela Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, será exercida mediante portaria, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas coma execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
4.2.1. É permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
4.2.2. É permitida a substituição do servidor designado neste item sempre que a Administração julgar necessário, devendo a CONTRATADA ser cientificada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
4.3. Além das atividades neste contrato, no edital que originou esse contrato, bem como em seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:
4.3.1. Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;
4.3.2. Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos que envolvem a obra: projetos, licitação, contrato, medições, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como Construído (As Built), termos de recebimento provisório e definitivo e devolução de cauções, etc.
4.3.3. Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra;
4.3.4. Aferir as medições dos serviços executados que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo;
4.3.5. Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;
4.3.6. Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.
4.3.7. Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execução de cada serviço/etapa será aferida, em cada medição, consoante CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, previamente aprovado e que a aferição dos prazos se dará mediante a comparação entre o valor total da etapa prevista no cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise.

BRS

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 443
Rúbrica

4.4. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
4.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou.

CLÁUSULA QUINTA – DA MEDIÇÃO E DOS PAGAMENTOS

5.1. As medições serão formalizadas e datadas no último dia de cada mês e serão pagas até 30 (trinta) dias da data de sua aceitação, de acordo com o cronograma físico financeiro, pelo valor nominal nela expresso.
5.2. A Prefeitura Municipal de Uiramutã terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da medição para aceitá-la ou não;
5.3. Acompanhando a primeira fatura deverá ser apresentada a "anotação de responsabilidade técnica" - ART no CREA.
5.4. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR até o 10º (décimo) dia útil após aprovada a medição pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos , mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, sendo efetuada a retenção de tributos sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a legislação vigente.
5.4. O pagamento está condicionado à apresentação de:
5.4.1. A comprovação de sua situação regular perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho (CNDT), extrato do Simples Nacional, quando for o caso, bem como quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços.
5.4.2. Deverão ser apresentados também o comprovante de pagamento dos tributos relativos à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) vencidos até a data da nota fiscal – guia recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) de todos os empregados alocados na execução do contrato.
5.4.3. GFIP tendo como tomador a Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, relativo ao CEI da obra.
5.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta tenha comprovado, por antecipação, a matrícula da obra junto ao INSS, ou antes, de paga ou relevada à multa que lhe tenha sido aplicada.
5.6. A última parcela só será paga mediante execução integral da obra, comprovada por relatório, assinado pelo Responsável Técnico pela fiscalização da obra.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

6.1. Durante a vigência do Contrato os preços serão fixos e passíveis de recomposição e reajuste, desde que comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65, bem como, parágrafo 8º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, respectivamente, ou de redução dos preços praticados no Mercado.
6.2. Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, a Contratada poderá solicitar a atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao Município de Uiramutã, instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido.
6.3. Mesmo comprovada às ocorrências das hipóteses previstas na alínea "d" do inciso II do artigo 65, bem como, parágrafo 8º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro Processo Licitatório.
6.4. Comprovada a redução dos preços praticados no Mercado nas mesmas condições do contrato e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, a Contratada será convocada pelo Município de Uiramutã para a alteração, por aditamento, do

BRS

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 444
Rúbrica

preço contratado, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA SETIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO

7.1. O prazo da presente execução de obras e prestação de serviços é de 60 **(sessenta) dias**, contados da data da "Ordem de Serviço" que autorizar o início das atividades.

CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato terá vigência de 90 **(noventa) dias**, a partir da data de sua assinatura, com termo final em 09 de Janeiro de 2023, podendo ser prorrogado, caso ocorraalgumas das hipóteses elencadas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.3400.1020.0000
Elemento de Despesa: 44.90.51.00
Fonte de Recurso: 1540 - FUNDEB.

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES

10.1. São Obrigações da contratada:

10.1.1. Apresentar-se ao Município de Uiramutã/rr – Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a ordem de serviço inicial, o seguinte:

a) Apresentar cronograma fisico – financeiro compatível com a planilha vencedora;
b) Anotações de Responsabilidade Técnica- ART, no CREA/CAU, em nome do Engenheiro Responsável Técnico pela obra ou serviço;
c) Abertura de Certificado de Matrícula da obra/serviço – CEI INSS junto com a primeira medição;
d) Visto junto ao CREA/CAU/RR, para as empresas que possuírem CRPJ de outros Estados da Federação.
e) Plano de Segurança específico da Obra, elaborado conforme as normas regulamentares da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e alterações posteriores;
f) Plano de sinalização diurna e noturna, aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
g) Apresentar cronograma de utilização da equipe técnica, de acordo com o prazo de execução de cada obra/serviço, observada a mesma ordem e quantidade da relação de que trata o subitem 6.1.3.3, Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 012/2022, devendo ser aprovado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .
h) Apresentar cronograma de utilização de equipamentos e instalações, de acordo com o prazo de execução da obra/serviço, observada a necessidade de cada projeto, devendo ser aprovado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .

10.1.2. Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas.

8.1.3. Assegurar, durante a execução das obras/serviços, a proteção e a conservação dos serviços realizados.

10.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

10.1.5. Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão do Municipio de Uiramutã/ RR – Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos a inspeção das obras em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 445
Rúbrica

10.1.6. Providenciar as placas da obra com seus dados indicativos, conforme modelo apresentado pela fiscalização, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados à partir da ordem de serviço.
10.1.7. Obedecer ao plano de segurança das obras, conforme as Normas de Segurança do Trabalho.
10.1.8. Participar à fiscalização ou à supervisão do Município de Uiramutã aocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão da obra, no todo o em parte, de acordo com o cronograma da mesma, indicando as medidas para corrigir talsituação.
10.1.9. Executar, conforme a melhor técnica, as obras contratadas, obedecendo rigorosamente às normas ABNT, bem como as instruções, especificações e os detalhes fornecidos ou editados pela Administração.
10.1.10. Manter atualizado "Diário de Obras", nele registrando todas as ocorrências que afetem o prazo de execução ou orçamento das obras.
10.1.11. Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e as posturas municipais sobre a execução de obras em locais públicos.
10.1.12. Manter à frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta ou a que venha a ser aprovada pela Administração, sempre liderada por engenheiro qualificado com capacidade e poderes bastantes para representá-la perante a Fiscalização e resolver problemas referentes às obras em execução.
10.1.13. Manter na obra em bom estado todo o equipamento necessário à perfeita execução dos serviços contratados, objetivando atender ao cronograma físico, à qualidade e às especificações técnicas.
10.1.14. Manter equipe para o acompanhamento topográfico da obra, adequada e compatível com as exigências e qualidades técnicas pertinentes.
10.1.15. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.2. Constitui obrigação do Município:
10.2.1 Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, recebendo seu objeto, conforme especificações constantes dos itens 10 e 11 do presente edital.
10.2.2. Realizar o pagamento conforme cláusula terceira deste contrato.
10.2.3. Notificar a empresa a ser contratada da ocorrência de qualquer descumprimento dos termos do edital da TOMADA DE PREÇOS nº 012/2022 e deste instrumento.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS

11.1. A CONTRATADA será responsável pelos seguintes encargos:
11.1.1. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, as responsabilidades advindas deste Contrato. A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE, desde que não afetem a boa execução do presente instrumento;
11.1.2. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais, e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;
11.1.3. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas relacionados com o objeto deste contrato;
11.1.4. Assumir a responsabilidade exclusiva por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência de falhas decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA.

BRS

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL UIRAMUTÃ
Fls. 446
Rúbrica

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES

12.1. A prática de ato ilícito na licitação ou na execução do contrato e o descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão as sanções previstas nos artis. 81 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei Estadual n° 14.184, de 31 de Janeiro de 2002,e nos arts. 19 a 22 do Decreto Estadual n° 44.431, de 29 de dezembro de 2006.

12.2. A ADJUDICATÁRIA perderá em favor da ADJUDICANTE a garantia a que se refere o item 8.1, no caso de recusa injustificada em assinar o contrato.

12.3. Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo as multas nos seguintes percentuais:

12.3.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia, até o trigésimo dia, de atraso, sobre valor dos serviços previstos no cronograma fisico não executados;

12.3.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

12.3.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços previstos no Cronograma Físico não executados, no caso de atraso superior a 30(trinta) dias;

12.3.4. 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.

12.3.5. As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes, ressalvada a situação descrita nos itens **12.3.6** e **12.3.7**.

12.3.6. O atraso no cumprimento do Cronograma Físico- Financeiro previsto para execução dos serviços será verificado nas medições mensais, a partir do qual incidirá a multa prevista no item **12.3.1**.

12.3.7. Verificando o atraso, na forma do item anterior, a CONTRATADA será notificada, por escrito, para sanar a irregularidade.

12.3.8. Persistindo a irregularidade prevista no item **12.3.6**, até a medição mensal subsequente, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento da multa prevista no item **12.3.3**, que substituirá aquela constante do item **12.3.1**.

12.4. Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição pela Prefeitura Municipal de Ordens de Início, Reinício ou Paralisação de Serviços.

12.5. As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de idoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a de multa, assegurando-se ao interessado o direito de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de idoneidade, em prazo será de 10 (dez) dias.

12.5.1. Para aplicação das sanções referidas no item anterior, deverá ser instaurado processo administrativo punitivo, seguindo de notificação para defesa, em conformidade com o disposto nos arts. 19 a 22 do Decreto Estadual n° 44.431/06, submetida a aplicação das sanções à decisão do Secretário Municipal, salvo na hipótese de aplicação de sanção de declaração de inidoneidade, de competência exclusiva do Prefeito Municipal, ou de autoridade a ele equivalente, nos termosda lei.

12.6. As multas deverão ser recolhidas no Departamento de Fazenda do município de Uiramutã, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contado à partir da decisão definitiva na esfera administrativa.

12.7. Se a multa aplicada for de valor superior ao da garantia prestada, além da sua perda responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda quando for o caso, cobrada judicialmente.

12.8. Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações compensatórias expressamente concedidas pela CONTRATANTE ou resultante de fato superveniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade da CONTRATADA, tais como o

EM BRANCO

Fls. 447
Rúbrica

estado de calamidade pública, guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas características.

12.9. As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente fundamentadas através de registro no Diário de Obras realizado pela FISCALIZAÇÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1. Operar-se-á de pleno direito a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 012/2022, quando ocorrerem as hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ABSTENÇÃO

14.1. A abstenção pelo CONTRATANTE do uso dos direitos que lhe são assegurados neste contrato não será considerada novação ou renúncia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

15.1. Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93, sempre através de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES

16.1. O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei 8.666/93 e suas modificações supervenientes, complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais constantes da TOMADA DE PREÇOS nº 012/2022 e seus anexos, bem como a proposta de preços, planilha orçamentária e cronograma fisico financeiro, apresentados pela CONTRATADA, que fazem parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pacaraima/RR para dirimir as dúvidasoriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo, para os fins de direito.

Uiramutã/ RR 08 de Novembro de 2022.

BRS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Benísio Roberto de Souza
CPF: 988.006.632-49

VANDERLANE JAMES LIMA
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto
PORTARIA Nº 459/2022

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 448
Rúbrica

A. ALMDEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME
ANSELMO ALMEIDA DE SOUSA
CPF: 498.100.903-82
(Representante Legal)

TESTEMUNHAS:

1-_____DOC.:_____

2-_____DOC.: _____

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 449
Rubrica
PMU

PORTARIA Nº 341A/2022.

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista o que consta do Processo nº 088/2022;

CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre a execução dos contratos firmados por esta Municipalidade relacionados a serviços de obras e Engenharia Civil e tendo em vista os princípios da legalidade, moralidade e eficiência;

CONSIDERANDO ainda, que as atribuições da Fiscalização de Obras complementam as do Gestor do Contrato;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Profissional abaixo mencionado para o exercício da função de Fiscal de Contratos firmados por esta Municipalidade relacionados a serviços de obras e Engenharia Civil :

Engenheiro Civil MARCOS DOMINGOS DA SILVA, CREA – 090540406-8 CREA/RR

Art. 2º. Estabelecer que, para a consecução do objetivo proposto neste ato, o Profissional ora designado deverá:

I - Providenciar, junto ao CREA, a anotação de responsabilidade técnica pelo cumprimento do objeto deste ajuste, fornecendo comprovante à contratante;

II- Fiscalizar e supervisionar a execução das obras, verificando todos os serviços, o emprego de materiais que atendam às exigências contidas nas normas técnicas da ABNT, das concessionárias de serviço público, do Decreto nº. 92.100/85, ISO 9002, IPT, INMETRO e dos fabricantes, tudo de acordo com os projetos e especificações pertinentes, responsabilizando-se inteiramente pela indicação das falhas e descumprimentos dos projetos e seus anexos, mediante anotação, nos respectivos Diários de Obras, de todas as ocorrências relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos;

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 450
Rubrica
PMU

III- Analisar e aprovar ou não as atualizações a serem feitas pelas construtoras nos cronogramas físico-financeiro de acordo com os recursos e prazos disponíveis para cada obra;

IV- Analisar a pertinência e conveniência das propostas de alterações de projeto e/ou especificações que venham a ser feitas pelas construtoras contratadas, emitindo parecer técnico e submetendo-as à aprovação da contratante;

V- Cumprir as decisões tomadas pela contratante com relação às alterações que venham a ser propostas e que serão registradas nos respectivos Diários de Obras;

VI- Anotar todas as modificações aprovadas e efetivamente executadas nas obras para posterior encaminhamento às construtoras contratadas para que acrescente ao projeto "as built", que deverão ser apresentados após a conclusão das respectivas obras;

VII- Promover as avaliações e medições das etapas executadas, observado o disposto nos cronogramas físico-financeiro vigente e na proposta apresentada pela contratada;

VIII- Encaminhar mensalmente à contratante, as informações relativas às medições, acompanhadas de relatórios, expondo o andamento das obras de acordo com os cronogramas e quaisquer descumprimentos contratuais porventura detectados, inclusive com fotografias que demonstrem a evolução das obras em andamento no período;

IX- Atestar ou não os documentos das construtoras contratadas referentes à conclusão de cada etapa das respectivas obras, nos termos contratados, para efeito de pagamento, solicitando a correção das informações quando for o caso;

X- Exercer a fiscalização no interesse da contratante, o que não exclui e nem reduz a responsabilidade das construtoras contratadas, inclusive perante terceiros;

XI- Sugerir a aplicação de penalidades por eventuais descumprimentos contratuais das construtoras, em suas respectivas obras, quando for o caso;

XII- Emitir parecer sobre prorrogações de prazos, contendo os subsídios necessários e indispensáveis à tomada de decisões pela contratante;

XIII- Aprovar ou não a aplicação dos materiais a serem utilizados nas respectivas obras, mediante análise de amostras, controlando a entrada de materiais nos canteiros, aceitando-os ou recusando-os, nos termos das especificações;

XIV- Analisar os pedidos das construtoras contratadas de substituição de materiais por similares, de acordo com o conceito de similaridade estabelecido pelos editais de licitação das respectivas obras em andamento;

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 451
Rubrica
PMU

XV- Acompanhar a instalação de equipamentos de obra, aceitando-os ou não, e controlar a qualidade de seu funcionamento visando segurança e funcionalidade dos respectivos canteiros;

XVI- Fazer cumprir todas as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho acerca da Medicine, Higiene e Segurança do Trabalho, no sentido de evitar qualquer acidente;

XVII- Exigir que as construtoras contratadas mantenham permanentemente nos locais das obras, até sua conclusão de cada uma delas, com fácil acesso à fiscalização, os "Diários de Obras, onde serão anotadas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formal, solicitações e informações diversas, enfim, tudo o que, a critério das partes, deva ser objeto de registro;

XVIII- Ao término das obras, a fiscalização da contratante deverá:

A) Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação;

B) Arcar com eventuais prejuízos que causar à Administração ou a terceiros durante a execução de seus serviços, quando for o caso.

C) Realizar viagens ao interior do município de Uiramutã, quando necessário, a fim de fiscalizar, avaliar, realizar medições e elaborar relatório técnico referente a qualquer obra ou terreno da Prefeitura Municipal de Uiramutã.

Art. 4° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito, Uiramutã-RR, 20 de junho de 2022.

BRS

BENISIO ROBERTO DE SOUZA

Prefeito de Uiramutã

EM BRANCO

Fls. 452

Rúbrica

FUNDEB

30.776.317/0001-85

GL - Global

000095

GL - Global 95	FICHA: 214	DATA: 08/11/2022	PEDIDO Nº:

Licitação: OBRA TOMADA | Nº Licitação: 000026/22 | Proc. Licit. 0012/22 | PROCESSO: 134/2022

Nome: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI | CPF/CNPJ:37.170.418/0001-57 | Código: 1086

Endereço: AV SANTOS DUMONT | Cidade: BOA VISTA

CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária	020702	FUNDO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%
Cat. Econômica	4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
Funcional	12.361.3400.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS
Cód.Aplicação	240. 005	CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 30%
Fonte Iduso	1	Recursos do Exercício Corrente
Fonte Grupo	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Fonte Codigo	1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.320.146,14	2.816.927,68	494.948,16	8.270,30

VALOR EM R$

494.948,16 quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO -COMUNIDADE BARREIRINHA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

08 de novembro de 2022.

VALOR TOTAL DOS ITENS 494.948,16

VANDERLANE JAMES LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO

Autorizo

Benisio Roberto de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 453
Rubrica
PMUI

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ-RR

Processo nº: 134/2022
Número de Contrato: 134/2022/PMUI
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO –Comunidade BARREIRINHA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ –RR.
Empresa Contratada: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA -ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR.
CNPJ: 30.776.317/0001-85
Valor: **R$** 494.948,16 (quatrocentos e noventa quatro mil novecentos e quarenta oito reais e dezesseis centavos).
Data da Assinatura: 08/11/2022.

BRS
BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 454
Rubrica

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
Assessoria de Licitações

Pregão (Eletrônico) n.º 66/2022 UASG: 070028

Aviso de Licitação – EDITAL DE ABERTURA

Objeto: **SRP - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para futura e eventual Contratação de extensão de garantia CISCO, na modalidade 8 x 5 x Next Business Day, nível de serviço SNT (SmartNet) ou PSS (Partner Support Service), assim como renovação de licenças pelo prazo de 05 (três) anos para equipamentos Cisco de propriedade do TRE-RR, conforme especificações e obrigações constantes do Termo de Referência.**

Abertura das propostas: **A partir das 10h00 (horário de Brasília) do dia 29.11.2022 no site: www.comprasnet.gov.br.**

Edital disponível: nos sites *www.comprasnet.gov.br* e *www.tre-rr.jus.br* no menu **"Transparência/Licitações" ou, ainda, na Assessoria de Licitações da Secretaria de Administração do TRE/RR, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, n.º 543 – São Pedro – Boa Vista/RR, das 08h00 às 14h00 (horário local).**

Boa Vista – RR, 09 de novembro de 2022.

Ademarcio da Silva
Assessor de Licitações - TRE/RR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA

Subsecretaria de Aquisições, Licitações e Credenciamentos

AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO PRESENCIAL

Procedimento Administrativo nº 0017611-40.2022.8.23.8000
ASSUNTO: Contratação de Permissão de uso oneroso do espaço destinado à instalação de uma Cafeteria no prédio do Centro Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Roraima, a ser implantado na área da Casa 1, do Conjunto dos Desembargadores, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

O Tribunal de Justiça comunica aos interessados que a sessão pública do **Pregão Presencial nº 68/2022**, inicialmente prevista para ocorrer em 14/11/2022, foi adiada para ocorrer em 17/11/2022.

Boa Vista/RR 30 de novembro de 2022.

Manoel Martins da Silva Neto
Subsecretário de Aquisições, Licitações e Credenciamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA

Subsecretaria de Aquisições, Licitações e Credenciamentos

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima torna público aos interessados a realização do **Pregão Eletrônico n.º 62/2022** (Proc. Adm. Nº 0019686-52.2022.8.23.8000).

OBJETO: O objeto do presente certame é a formação do sistema de registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, sob demanda, para o Poder Judiciário do Estado de Roraima, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

ENTREGA DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO: a partir 10/11/2022, às 08h30min.
SESSÃO PÚBLICA: 24/11/2022, às 10h00min (horário de Brasília).

Todas as operações serão realizadas no Horário de Brasília/DF, no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br/, pelo código UASG n.º 925480.

O Edital poderá ser obtido no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br/ e pelo site cpl@tjrr.jus.br a partir de dia 10/11/2022 às 08h00min (horário local).

Boa Vista/RR 30 de novembro de 2022.

Manoel Martins da Silva Neto
Subsecretário de Aquisições, Licitações e Credenciamentos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
Assessoria de Licitações

Pregão (Eletrônico) n.º 53/2022 UASG: 070028

Aviso de alteração da Licitação

O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, por meio da Assessoria de Licitações, torna público a todos os interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022, que estava agendado anteriormente para o dia 10/11/2022 às 10:00 horas (horário da Brasília), fica **REAGENDADO** para o dia 25/11/2022 às 10:00 horas (horário de Brasília).

Objeto: **A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de solução de backup em disco com capacidade mínima de armazenamento nativo em disco de 50 TB (cinquenta terabytes) úteis para dados, instalados e licenciados, com instalação.**

MOTIVO: **Alteração do edital e do termo de referência**

Edital disponível: nos sites *www.comprasnet.gov.br* e *www.tre-rr.jus.br* no menu **"Transparência/Licitações" ou, ainda, na Assessoria de Licitações da Secretaria de Administração do TRE/RR, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, n.º 543 – São Pedro – Boa Vista/RR, das 08h00 às 15h00 (horário local).**

Ademarcio da Silva
Assessor de Licitações

UIRAMUTÃ — SEMICS - URAMUTÃ

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ-RR

Processo nº: 129/2022
Número de Contrato: 129/2022/PMUI
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO JOAQUIM DE LIMA – COMUNIDADE MATURUCA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ –RR.
Empresa Contratada: EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 13.808.507/0001-18
Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR.
CNPJ: 30.776.317/0001-85
Valor: RS 498.048,16 (quatrocentos e noventa oito mil quarenta oito reais e dezesseis centavos).
Data da Assinatura: 08/11/2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR

UIRAMUTÃ — SEMICS - URAMUTÃ

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ-RR

Processo nº: 130/2022
Número de Contrato: 130/2022/PMUI
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KO'KO AGUIDA KASA – WAI-COMUNIDADE WILLIMON, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ –RR
Empresa Contratada: L. M. B. EMPREEDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ: 38.080.939/0001-86
Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR.
CNPJ: 30.776.317/0001-85
Valor: R$ 499.706,74 (quatrocentos e noventa mil setecentos e seis reais e setenta quatro centavos).
Data da Assinatura: 08/11/2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR

UIRAMUTÃ — SEMICS - URAMUTÃ

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ-RR

Processo nº: 133/2022
Número de Contrato: 133/2022/PMUI
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KÓ MARIA – COMUNIDADE SÃO MATEUS, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ –RR.
Empresa Contratada: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA -ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR.
CNPJ: 30.776.317/0001-85
Valor: R$ 493.086,74 (quatrocentos e noventa três mil oitenta seis reais e setenta quatro centavos).
Data da Assinatura: 08/11/2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR

UIRAMUTÃ — SEMICS - URAMUTÃ

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ-RR

Processo nº: 132/2022
Número de Contrato: 132/2022/PMUI
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ARTHUR NABUCO DE ARAUJO – COMUNIDADE DE MARACANÃ I, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ –RR
Empresa Contratada: E. DA S. CASTOLDI LTDA
CNPJ Nº: 17.759.716/0001-70
Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR.
CNPJ: 30.776.317/0001-85
Valor: R$ 512.321,16 (quinhentos e doze mil trezentos e vinte oito reais e dezesseis centavos).
Data da Assinatura: 08/11/2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR

UIRAMUTÃ — SEMICS - URAMUTÃ

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ-RR

Processo nº: 131/2022
Número de Contrato: 131/2022/PMUI
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO – COMUNIDADE SÃO LUIZ/RR, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ –RR.
Empresa Contratada: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA -ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR.
CNPJ: 30.776.317/0001-85
Valor: R$ 493.917,86 (quatrocentos e noventa três mil novecentos dezessete reais e oitenta seis centavos).
Data da Assinatura: 08/11/2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR

UIRAMUTÃ — SEMICS - URAMUTÃ

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ-RR

Processo nº: 134/2022
Número de Contrato: 134/2022/PMUI
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – Comunidade BARREIRINHA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ –RR.
Empresa Contratada: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA -ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR.
CNPJ: 30.776.317/0001-85
Valor: R$ 494.948,16 (quatrocentos e noventa quatro mil novecentos e quarenta oito reais e dezesseis centavos).
Data da Assinatura: 08/11/2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR

UIRAMUTÃ — SEMICS - URAMUTÃ

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ-RR

Processo nº: 135/2022
Número de Contrato: 135/2022/PMUI
Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA Ko'Ko TERESA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPANÃ I NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ –RR.
Empresa Contratada: L. M. B. EMPREEDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ: 38.080.939/0001-86
Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR.
CNPJ: 30.776.317/0001-85
Valor: R$ 516.468,16 (quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e sessenta oito reais e dezesseis centavos).
Data da Assinatura: 08/11/2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR

ESTADO DE RORAIMA
AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2022
PROCESSO: 24.00.4917/21-2022.19 - SESAU
SEM REGISTRO DE PREÇO

O Pregoeiro da Comissão Setorial de Licitação – CSL, da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Roraima (SESAU/RR), torna público a conclusão do certame licitatório, referente ao pregão supracitado, cujo objeto é a **Eventual aquisição de MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS (do GRUPO I), atendendo as demandas de Coagulopatias Especializada do ambulatório Farmacêutico (TFAF) para o exercício de 2022,** destinados a atender as Unidades de Saúde do Estado de Roraima de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes do **TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I do Edital)**.

CNPJ	EMPRESAS VENCEDORAS / ARREMATADAS	ITENS	VALOR TOTAL DOS ITENS
01.706.499/0001-39	DRUGFARMA COMERCIO LTDA	12	R$ 19.305,28
03.353.907/0001-08	OBTUMED LTDA	15	R$ 74.396,80
03.049.432/0001-00	COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA	16	R$ 403.115,34
12.439.766/0001-79	ERIFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	17 e 18	R$ 27.660,40
20.918.468/0001-20	MEDICINALL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	11, 23, 24, 39, 41, 46 e 47	R$ 719.479,40
34.325.157/0001-14	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3, 5, 8, 19, 20 e 44	R$ 1.804.496,35
40.432.869/0001-01	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	1, 2 e 35	R$ 352.849,00
45.231.935/0001-02	MEDICINALL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10	R$ 77.886,00
———	DESERTOS	4, 6, 7, 9, 12, 14, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 43 e 45.	———
———	FRACASSADOS	———	———

Valor Total: R$ 3.147.187,57 (três milhões, cento e quarenta e sete mil duzentos e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Demais informações encontram-se disponíveis no site www.comprasnet.gov.br, Aviso Licit – Comissão – Aviso de Pregão – Código da UASG nº 450401.

Boa Vista – RR, 09 de novembro de 2022.

assinado eletronicamente
RICARDO DE SOUZA CONCEIÇÃO
Pregoeiro da Comissão Setorial de Licitações – CSL/SESAU-RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 293/2022 - Registro de Preços
Processo nº 024706/2021 - SMSA

Objeto: Eventual aquisição de Material Médico para Eletrocardiograma e Eletroencefalograma, para atendimento anual – exercício 2022, das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde – SMSA, para pleno atendimento aos municípios, usuários do atendimento básico e especializado.
Entrega das Propostas: a partir de 10/11/2022 às 8h (Horário de Brasília) no site www.comprasnet.gov.br.
Início da Disputa: 24/11/2022 às 10h (Horário de Brasília) no site supracitado.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados, no site www.comprasnet.gov.br, no portal http://transparencia.boavista.rr.gov.br/licitacoes ou mediante solicitação por e-mail: progpa.perb@gmail.com, juntamente com os dados cadastrais do (a) licitante, desde que seja no prazo acima já mencionado. Os esclarecimentos e as informações necessários aos licitantes serão prestados pela CPL, nos dias e horários de expediente.

Joana Dêrc Rabelo
Pregoeira



EM BRANCO

PREFEITURA DE UIRAMUTÃ

SEMECD UIRAMUTÃ

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 455 Rúbrica

ORDEM DE SERVICO

PROCESSO Nº: 134/2022 SMECD
EMPENHO Nº 095 **/2022.**

CONTRATADA: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME
CNPJ Nº: 37.170.418/0001-57

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO –Comunidade BARREIRINHA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ –RR

- Considerando sua proposta de preço, de acordo com as quantidades e condições aqui especificadas, pedimos iniciar a realização dos serviços contratados.

- Prazo de execução dos serviços: 60 (sessenta) dias.

- Condições de pagamento: Conforme contrato Assinado.

- A presente autorização tem a importância de **R$ 494.948,16 (quatrocentos e noventa quatro mil novecentos e quarenta oito reais e dezesseis centavos).**

UIRAMUTÃ – RR, 10 de Novembro de 2022.

Silvanio Alves dos Santos

SILVANIO ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

BBS

Benisio Roberto de Souza
Prefeito do Município de Uiramuta- RR

Recebido do Profissional: data: 10 / 11 /2022.

EM BRANCO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 008/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO´KO ÁGUIDA KASA WAI – COMUNIDADE WILLIMOM - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ n°38.080.939/0001-86, totalizando o valor de R$ 490.706,74 (Quatrocentos e noventa mil setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos). Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 009/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO – COMUNIDADE SÃO LUIZ - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME, CNPJ n°37.170.418/0001-57, totalizando o valor de R$493.917,96 (Quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e dezessete reais e noventa e seis centavos). Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 010/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ARTHUR NABUCO DE ARAÚJO – COMUNIDADE MARACANÃ I - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: E. DA S. CASTOLDI LTDA, CNPJ nº 17.759.716/0001-70, totalizando o valor de R$512.328,16 (Quinhentos e doze mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos). Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 011/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO´KO MARIA – COMUNIDADE SÃO MATEUS - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME, CNPJ nº 37.170.418/0001-57, totalizando o valor de R$493.086,74 (Quatrocentos e noventa e três mil e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Uiramutã/RR, de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 012/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARREIRINHA-UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME, CNPJ nº 37.170.418/0001-57, totalizando o valor de R$494.948,16 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos). Uiramutã/RR, 25 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 013/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO´KO TEREZA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ I - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ nº 38.080.939/0001-86, totalizando o valor de R$516.468,16 (Quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos). Uiramutã/RR, 25 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 456 Rúbrica

OUTRAS PUBLICAÇÕES

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE RORAIMA - FEMARH

LICENÇA DE OPERAÇÃO **LO N.° 135/2021/DLGA**

A Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Estadual n ° 001. Art.46. Inciso III e Art.02 de 26 de janeiro de 1991, e regulamentada pela Lei Delegada n° 04 de 16 de janeiro de 2003 e da Lei Estadual n° 815 de 07 de Julho de 2011, de acordo com o Sistema de Licenciamento de Atividades Potencialmente Poluidoras, instituído através da Lei Complementar n° 007 de 26 de Agosto de 1994 concede a presente **LICENÇA DE OPERAÇÃO**, referente ao Processo **N° PR-00464-01/2021**, Parecer Técnico do Controle Interno N° **PAR-00234-01/2022**, registrada na **FEMARH-RR** sob o código **E-02-02** ao Empreendedor.

NOME: AZULÃO GERAÇÃO DE ENERGIA S.A (RORAIMA)

CPF/CNPJ: 30.185.130/0003-79

ENDEREÇO: RODOVIA BR-174, S/N, GLEBA MURUPU, BAIRRO SAID SALOMÃO.

MUNICÍPIO: BOA VISTA - RR

ATIVIDADE: USINA TERMELÉTRICA A GÁS NATURAL, COM CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA DE 140,83 MW, EM CICLO COMBINADO; LINHA DE TRANSMISSÃO (LT) EM 230 KV LIGANDO A UTE JAGUATIRICA II À S.E. BOA VISTA II, QUE SERÁ CONECTADA AO SISTEMA ISOLADO DE RORAIMA.

Endereço do Empreendimento: GLEBA MURUPU, REGIÃO DO BOM INTENTO, FAZENDA CAROLINA- REMANESCENTE (GLEBA C) - BOA VISTA/RR.

VALIDADE: 26/11/2026

Esta licença e válida somente para a atividade supracitada, dentro do período de validade e observada as condições deste documento e seus anexos que embora não transcritos, são partes integrantes do mesmo. Qualquer alteração deverá ser comunicada imediatamente à **FEMARH-RR**.

Boa Vista, RR. 26/11/2021

GLICÉRIO MARCOS FERNANDES PEREIRA - Presidente da FEMARH.

WAGNER SEVERO NOGUEIRA - Diretor da DLGA/FEMARH-PR

FEMARH

Avenida Ville Roy, 4935 São Pedro - Boa Vista - RR

CEP 69.306-040

TELEFAX: 095 2121-9190

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ-RR Fls. 454 Rúbrica

EXTRATO DE CONTRATO TP Nº 9/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ-RR. Processo nº: 131/2022. Número de Contrato: 131/2022/PMUI. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO - COMUNIDADE SÃO LUIZ/RR, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR. Empresa Contratada: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA -ME. CNPJ: 37.170.418/0001-57. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR. CNPJ: 30.776.317/0001-85. Valor: R$ 493.917,86 (quatrocentos e noventa três mil novecentos dezessete reais e oitenta seis centavos).

EXTRATO DE CONTRATO TP Nº 7/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ-RR. Processo nº: 129/2022. Número de Contrato: 129/2022/PMUI. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO JOAQUIM DE LIMA - COMUNIDADE MATURUCA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR. Empresa Contratada: EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 13.808.507/0001-18. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR. CNPJ: 30.776.317/0001-85. Valor: R$ 498.048,16 (quatrocentos e noventa oito mil quarenta oito reais e dezesseis centavos).

EXTRATO DE CONTRATO TP Nº 12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ-RR. Processo nº: 134/2022. Número de Contrato: 134/2022/PMUI. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO -Comunidade BARREIRINHA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR. Empresa Contratada: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA -ME. CNPJ: 37.170.418/0001-57. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR. CNPJ: 30.776.317/0001-85. Valor: R$ 494.948,16 (quatrocentos e noventa quatro mil novecentos e quarenta oito reais e dezesseis centavos).

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022

PROCESSO Nº 134/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA - RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO do Procedimento Licitatório - PROCESSO Nº 134/2022 - TOMADA DE PRECOS Nº 012/2022 conforme a seguir: EMPRESA: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - MR. CNPJ Nº: 37.170.418/0001-57. OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO -Comunidade BARREIRINHA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR. VALOR: 494.948,16 (quatrocentos e noventa quatro mil novecentos e noventa oito reais e dezesseis centavos).

Uiramutã-RR, 31 de outubro de 2022.
BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022

PROCESSO Nº 132/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA - RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO do Procedimento Licitatório - PROCESSO Nº 132/2022 - TOMADA DE PRECOS Nº 010/2022 conforme a seguir, EMPRESA: E. DA S. CASTOLDI LTDA. CNPJ Nº: 17.759.716/0001-70. OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ARTHUR NABUCO DE ARAUJO -COMUNIDADE DE MARACANÃ I, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR. VALOR: 512.328,16 (quinhentos e doze mil trezentos e vinte oito reais e dezesseis centavos).

Uiramutã-RR, 31 de outubro de 2022.
BENISIO ROBERTO DE SOUZA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PRECOS Nº 11/2022

PROCESSO Nº 133/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA - RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO do Procedimento Licitatório - PROCESSO Nº 133/2022 - TOMADA DE PRECOS Nº 011/2022 conforme a seguir, EMPRESA: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME. CNPJ Nº: 37.170.418/0001-57. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO MARIA - COMUNIDADE SÃO MATEUS, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR. VALOR: 493.086,74 (quatrocentos e noventa três mil oitenta seis reais e setenta quatro centavos).

Uiramutã-RR, 31 de outubro de 2022.
BENISIO ROBERTO DE SOUZA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022

PROCESSO Nº 135/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA - RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO do Procedimento Licitatório - PROCESSO Nº 135/2022 - TOMADA DE PRECOS Nº 013/2022 conforme a seguir: EMPRESA: L. M. B. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME. CNPJ Nº: 38.080.939/0001-86. OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA Ko'Ko TERESA DA SILVA - COMUNIDADE CARAPARÚ I NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR. VALOR: 516.468,16 (quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e sessenta oito reais e dezesseis centavos).

Uiramutã-RR, 31 de outubro de 2022.
BENISIO ROBERTO DE SOUZA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2022

PROCESSO Nº 131/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA - RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO do Procedimento Licitatório - PROCESSO Nº 131/2022 - TOMADA DE PRECOS Nº 009/2022 conforme a seguir, EMPRESA: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME. CNPJ Nº: 37.170.418/0001-57. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO - COMUNIDADE SÃO LUIZ, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR. VALOR: 493.917,86 (quatrocentos e noventa três mil novecentos e dezessete reais e oitenta seis centavos).

Uiramutã-RR, 31 de outubro de 2022.
BENISIO ROBERTO DE SOUZA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2022

PROCESSO Nº 129/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA - RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO do Procedimento Licitatório - PROCESSO Nº 129/2022 - TOMADA DE PRECOS Nº 007/2022 conforme a seguir: EMPRESA: EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ Nº: 13.808.507/0001-18. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO JOAQUIM DE LIMA - COMUNIDADE MATURUCA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR. VALOR: 498.048,16 (quatrocentos e noventa oito mil quarenta oito reais e dezesseis centavos).

Uiramutã-RR, 31 de outubro de 2022.
BENISIO ROBERTO DE SOUZA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2022

PROCESSO Nº 130/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA - RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO do Procedimento Licitatório - PROCESSO Nº 130/2022 - TOMADA DE PRECOS Nº 008/2022 conforme a seguir, EMPRESA: L. M. B. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME. CNPJ Nº: 38.080.939/0001-86. OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KO'KO ÀGUIDA KASA - WAI- COMUNIDADE WILLIMON, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR. VALOR: 490.706,74 (quatrocentos e noventa mil setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos).

Uiramutã-RR, 31 de outubro de 2022.
BENISIO ROBERTO DE SOUZA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÚNA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 131/2022

PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA BÁSICA SUBIDA / APIÚNA SC.

O Município de Apiúna, SC, torna público para conhecimento dos interessados que até às 09:00 horas do dia 28/11/2022, estará recebendo envelopes para selecionar a melhor proposta para o objeto acima identificado. Local da Abertura: Prefeitura de Apiúna, 1° andar, sala nº 12, Rua Quintino Bocaiúva, 204, Centro, Apiúna/SC. Abertura da sessão a partir das 09:10 horas do dia 28/11/2022.

Maiores Informações: Fone 47 3353 2000 ou nos e-mails: licita@apiuna.sc.gov.br/licitacao@apiuna.sc.gov.br. Edital completo no site www.apiuna.sc.gov.br.

Em 4 de novembro de 2022
MARCELO DOUTEL DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022 - PMBC - UASG: 988039

COMPRASNET Nº 156/2022. Com base no § 2º, art. 24 do Decreto Municipal 10.540/2021, o Edital de licitação acima epigrafado, publicado neste mesmo diário e no site www.bc.sc.gov.br, cujo objeto trata do Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios pereciveis (carne de frango), pelo período de 12 (doze) meses, segundo as conveniências da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, ficará suspenso para análise e parecer de impugnação.

Balneário Camboriú, 10 de novembro de 2022
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022 - SSSM

COMPRASNET Nº 185/2022

Com base no art. 25 do Decreto Municipal 10.540/2021, o Edital de licitação acima epigrafado, publicado neste mesmo diário em 07 de Novembro de 2022, Seção 3, Página n°328, no Portal COMPRASNET e no site: www.bc.sc.gov.br, cujo objeto trata da Aquisição de Material Ambulatorial, sofrerá retificação na publicação na data de abertura: Onde se lê: Data e local da sessão pública: Dia 18/11/2022. Horário: Às 09h00min, no Portal de Compras do Governo Federal - Código UASG: 988039.Leia-se: Data e local da sessão pública: Dia 21/11/2022. Horário: Às 09h00min, no Portal de Compras do Governo Federal - Código UASG: 988039.

Considerando que o edital disponibilizado no Sitio Municipal e no Portal COMPRASNET está com a Data de Abertura Correta, ficam mantidas as demais Condições Estabelecidas.

Balneário Camboriú - SC, 10 de Novembro de 2022.
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras

EM BRANCO

MUNICIPIO DE UIRAMUTA
Rua Cici Mota, s/n
01612681/0001-01 Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
Fls 458
Rubrica
PMUI

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00095/001** GL Ficha: 214
Data Empenho: 08/11/2022 Data Liquidação:17/11/2022

Credor..: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI
Endereço: AV SANTOS DUMONT CEP: 69305-340
Cidade..: BOA VISTA

Valor **RR$ 187.303,75**

Extenso: cento e oitenta e sete mil, trezentos e três reais e setenta e cinco centavos * * *

EM BRANCO

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000052

Data e Hora de Emissão
17/11/2022 15:04:37

Data do Fato Gerador
17/11/2022

Código de Verificação
AAACEUER-IZABAU

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**UIRAMUTÃ/RR - BRASIL**	**UIRAMUTÃ/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **SOUZA & SOUSA CONSTRUCOES**
Endereco: **AV SANTOS DUMONT, 2180 SALA: 1**
31 DE MARÇO BOA VISTA - RR CEP: 69305-340
CPF/CNPJ: **37.170.418/0001-57** Insc. Municipal: **9729283**
Telefone: **(95) 9131-2944** E-mail: **ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA**
Nome Fantasia: **Prefeitura Municipal de Uiramutã**
Endereço: **RUA CICI MOTA S/N, S/N S/N**
CENTRO UIRAMUTÃ - RR CEP: 69358-000
CPF/CNPJ: **01.612.681/0001-01** Insc. Municipal:
Telefone: **(95) 9126-7226** E-mail:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 459
Rubrica
PMUI

Discriminação do(s) Serviço(s)

referente a Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha_ Município de Uiramutã/ PERÍODO DE EXECUÇÃO
PROCESSO CONTRATO Nº 134/2022-SMECD, FNDE.
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º FATURA/ MEDICAO-PERIODO 08/11/2022 à 16/11/2022
CONFORME ORDEM DE SERVICO- VALOR R$ 187.303,75

Atesto que os materiais / serviços constantes na presente Nota Fiscal foram entregues / realizados.
Em: 17 / NOV / 2022

Marcos Domingos da Silva
Engenheiro Civil PMUI - Fiscal
CREA 090347

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
4313400 - Obras de terraplenagem

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
187.303,75	**74.921,50**	**0,00**	**112.382,25**
Aliquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
3,72	**0,00**	**4.180,62**	**0,00**

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
187.303,75	**183.123,13**

Outras Informações

O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA) através de substituição tributária
*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 30.811,47 - (16,45%) - Fonte: IBPT
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 0250-X
C/C - 128.664.1

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://boavista.saatri.com.br

EM BRANCO

SOUSA & SOUSA
CONSTRUTORA

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.178.418/0001-57 INSC. M/A 522928

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 460
Rubrica
PMUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Boa vista, 17 de novembo de 2022
OBJETO: Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha_ Municipio de Uiramutã/ RR
PROCESSO CONTRATO Nº 134/2022-SMECD, FNDE

DE MEDIÇÃO N° 01

PERIODO DA MEDIÇÃO	08/11/2022 á 17/11/2022

FATURA 01

Item	Descrição	Und	Valor Unit com BDI	QUANT	TOTAL
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				10.909,61
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	134,15	32,00	4.292,80
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6.616,81	1,00	6.616,81
2	**ALIMENTAÇÃO CANTEIRO**				10.336,59
2.1	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	17,49	591,00	10.336,59
3	**DIVERSOS**				497,17
3.4	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	16,49	30,15	497,17
4	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**				37.466,02
4.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	688,36	3,60	2.478,10
4.2	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	766,35	1,00	766,35
4.3	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	2.756,33	1,00	2.756,33
4.4	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias	un	18.734,70	1,00	18.734,70
4.5	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	53,19	35,00	1.861,65
4.6	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	m²	3,24	900,00	2.916,00
4.7	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	0,62	7.864,91	4.876,24
4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,14	2.698,82	3.076,65
5	**INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES**				22.718,61
5.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	85,91	7,80	670,10
5.2	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	52,08	2,00	104,16
5.3	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	184,04	26,20	4.821,85
5.4	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	149,26	26,20	3.910,61
5.5	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	47,23	14,80	699,00
5.6	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	908,14	4,80	4.359,07
5.7	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	239,09	4,80	1.147,63
5.8	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	27,15	39,76	1.079,48
5.9	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	21,70	273,12	5.926,70
6	**INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME**				24.533,00
6.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	85,91	1,66	142,61
6.2	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	139,21	36,78	5.120,14
6.3	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	47,23	13,40	632,88
6.4	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	908,14	4,87	4.422,64
6.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	239,09	4,87	1.164,37
6.6	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	27,15	62,97	1.709,64
6.7	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	24,25	148,70	3.605,98
6.8	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	200,49	25,93	5.198,71
6.9	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	m²	47,27	53,65	2.536,04
7	**SUPERESTRUTURA - PILARES**				30.051,80
7.1	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	184,04	61,44	11.307,42
7.2	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	149,26	61,44	9.170,53

EM BRANCO

FATURA 01					
Item	Descrição	Und	Valor Unit com BDI	QUANT	TOTAL
7.3	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	908,14	3,34	3.033,19
7.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	239,09	3,34	798,56
7.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	KG	27,15	65,63	1.781,85
7.6	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	21,70	182,50	3.960,25
8	**SUPERESTRUTURA - VIGAS**				21.246,60
8.1	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	146,99	38,88	5.714,97
8.2	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	161,02	38,88	6.260,46
8.3	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	908,14	3,74	3.396,44
8.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	239,09	3,74	894,20
8.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	KG	27,15	65,43	1.776,42
8.6	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	25,80	124,19	3.204,10
9	**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**				29.544,35
9.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	145,51	203,04	29.544,35
TOTAL GERAL (R$)				1ª FATURA	187.303,75
			VALOR DA FATURA		187.303,75

Empresa
Engenheiro Civil
CREA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls 461
Rubrica
PMU

Engenheiro Civil
CREA

Fiscal PMU

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
FLS 462
Rubrica
PMU

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Boa vista, 17 de novembo de 2022
OBJETO: Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha_ Município de Uiramutã/ RR
PROCESSO CONTRATO Nº 134/2022-SMECD, FNDE

DE MEDIÇÃO N° 01

PERIODO DA MEDIÇÃO	08/11/2022 á 17/11/2022

FATURA 01

Item	Descrição	Und	Valor Unit com BDI	QUANT	TOTAL
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				10.909,61
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	134,15	32,00	4.292,80
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6.616,81	1,00	6.616,81
2	**ALIMENTAÇÃO CANTEIRO**				10.336,59
2.1	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	17,49	591,00	10.336,59
3	**DIVERSOS**				497,17
3.4	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	16,49	30,15	497,17
4	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**				37.466,02
4.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	688,36	3,60	2.478,10
4.2	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	766,35	1,00	766,35
4.3	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	2.756,33	1,00	2.756,33
4.4	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias	un	18.734,70	1,00	18.734,70
4.5	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	53,19	35,00	1.861,65
4.6	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	m²	3,24	900,00	2.916,00
4.7	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	0,62	7.864,91	4.876,24
4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,14	2.698,82	3.076,65
5	**INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES**				22.718,61
5.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	85,91	7,80	670,10
5.2	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	52,08	2,00	104,16
5.3	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	184,04	26,20	4.821,85
5.4	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	149,26	26,20	3.910,61
5.5	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	47,23	14,80	699,00
5.6	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	908,14	4,80	4.359,07
5.7	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	239,09	4,80	1.147,63
5.8	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	27,15	39,76	1.079,48
5.9	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	21,70	273,12	5.926,70
6	**INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME**				24.533,00
6.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	85,91	1,66	142,61
6.2	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	139,21	36,78	5.120,14
6.3	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	47,23	13,40	632,88
6.4	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	908,14	4,87	4.422,64
6.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	239,09	4,87	1.164,37
6.6	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	27,15	62,97	1.709,64
6.7	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	24,25	148,70	3.605,98
6.8	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	200,49	25,93	5.198,71
6.9	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	m²	47,27	53,65	2.536,04
7	**SUPERESTRUTURA - PILARES**				30.051,80
7.1	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	184,04	61,44	11.307,42
7.2	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	149,26	61,44	9.170,53

EM BRANCO

FATURA 01					
Item	Descrição	Und	Valor Unit com BDI	QUANT	TOTAL
7.3	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	908,14	3,34	3.033,19
7.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	239,09	3,34	798,56
7.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	KG	27,15	65,63	1.781,85
7.6	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	21,70	182,50	3.960,25
8	**SUPERESTRUTURA - VIGAS**				21.246,60
8.1	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	146,99	38,88	5.714,97
8.2	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	161,02	38,88	6.260,46
8.3	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	908,14	3,74	3.396,44
8.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	239,09	3,74	894,20
8.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	KG	27,15	65,43	1.776,42
8.6	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	25,80	124,19	3.204,10
9	**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**				29.544,35
9.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	145,51	203,04	29.544,35
	TOTAL GERAL (R$)			1ª FATURA	187.303,75
			VALOR DA FATURA		187.303,75

Empresa
Fábio Júlio Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA 0607966123

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 463
Rubrica
PMU

Marcos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 090349238

EM BRANCO

SOUSA & SOUSA

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Boa vista, 17 de novembo de 2022
OBJETC Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha_ Município de Uiramutã/RR
PROCESSO CONTRATO Nº 134/2022-SMECD, FNDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 464
Rubrica

Processo nº		133/2022	
DATA:	16/11/2022	BOL. MEDIÇÃO Nº 001/2022	
PRAZO	90	INÍCIO	TÉRMINO
PERÍODO DE EXECUÇÃO		08/11/2022	06/2/2023
08/11/2022 à 16/11/2022		8 DIAS CORRIDOS	

BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**21.819,22**	**50,00%**		**10.909,61**	**50,00%**		**10.909,61**
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	134,15	8.585,60	50,00%	32,00	4.292,80	50,00%	32,00	4.292,80
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	6.616,81	13.233,62	50,00%	1,00	6.616,81	50,00%	1,00	6.616,81
2	**ALIMENTAÇÃO CANTEIRO**				**20.673,18**	**50,00%**		10.336,59	**50,00%**	0,00	10.336,59
2.1	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	1.182,00	17,49	20.673,18	50,00%	591,00	10.336,59	50,00%	591,00	10.336,59
3	**DIVERSOS**				**14.924,32**	**3,33%**		**497,17**	**3,33%**		**497,17**
3.1	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	UN	1,00	1.676,56	1.676,56	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
3.2	Placa de acrilico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	UN	6,00	88,50	531,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
3.3	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	un	1,00	937,20	937,20	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
3.4	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	90,45	16,49	1.491,52	33,33%	30,15	497,17	33,33%	30,15	497,17
3.5	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	un	8,00	978,88	7.831,04	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
3.6	Limpeza geral (final da obra)	m²	900,00	2,73	2.457,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
4	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**				**45.418,89**	**82,49%**		37.466,02	**82,49%**		37.466,02
4.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	3,60	688,36	2.478,09	100,00%	3,60	2.478,10	100,00%	3,60	2.478,10
4.2	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	766,35	766,35	100,00%	1,00	766,35	100,00%	1,00	766,35
4.3	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	2.756,33	2.756,33	100,00%	1,00	2.756,33	100,00%	1,00	2.756,33
4.4	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros. telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias	un	1,00	18.734,70	18.734,70	100,00%	1,00	18.734,70	100,00%	1,00	18.734,70
4.5	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	35,00	53,19	1.861,65	100,00%	35,00	1.861,65	100,00%	35,00	1.861,65
4.6	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m²	900,00	3,24	2.916,00	100,00%	900,00	2.916,00	100,00%	900,00	2.916,00
4.7	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	15.729,81	0,62	9.752,48	50,00%	7864,91	4.876,24	50,00%	7.864,91	4.876,24
4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.397,63	1,14	6.153,29	50,00%	2698,52	3.076,65	50,00%	2.698,82	3.076,65
5	**INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES**				**22.718,58**	**100,00%**		22.718,61	**100,00%**		22.718,61
5.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	7,80	85,91	670,09	100,00%	7,80	670,10	100,00%	7,80	670,10
5.2	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	2,00	52,08	104,16	100,00%	2,00	104,16	100,00%	2,00	104,16
5.3	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	26,20	184,04	4.821,84	100,00%	26,20	4.821,85	100,00%	26,20	4.821,85
5.4	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	26,20	149,26	3.910,61	100,00%	26,20	3.910,61	100,00%	26,20	3.910,61
5.5	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	14,80	47,23	699,00	100,00%	14,80	699,00	100,00%	14,80	699,00
5.6	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,80	908,14	4.359,07	100,00%	4,80	4.359,07	100,00%	4,80	4.359,07
5.7	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,80	239,09	1.147,63	100,00%	4,80	1.147,63	100,00%	4,80	1.147,63
5.8	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	39,76	27,15	1.079,48	100,00%	39,76	1.079,48	100,00%	39,76	1.079,48
5.9	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	273,12	21,70	5.926,70	100,00%	273,12	5.926,70	100,00%	273,12	5.926,70
6	**INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME**				**24.532,96**	100,00%		24.533,00	100,00%		24.533,00
6.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	1,66	85,91	142,61	100,00%	1,66	142,61	100,00%	1,66	142,61
6.2	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	36,78	139,21	5.120,14	100,00%	36,78	5.120,14	100,00%	36,78	5.120,14
6.3	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	13,40	47,23	632,88	100,00%	13,40	632,88	100,00%	13,40	632,88
6.4	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,87	908,14	4.422,64	100,00%	4,87	4.422,64	100,00%	4,87	4.422,64
6.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,87	239,09	1.164,36	100,00%	4,87	1.164,37	100,00%	4,87	1.164,37
6.6	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	62,97	27,15	1.709,63	100,00%	62,97	1.709,64	100,00%	62,97	1.709,64
6.7	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	148,70	24,25	3.605,97	100,00%	148,70	3.605,98	100,00%	148,70	3.605,96
6.8	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	25,93	200,49	5.198,70	100,00%	25,93	5.198,71	100,00%	25,93	5.198,71

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 465
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
6.9	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	m²	53,65	47,27	2.536,03	100,00%	53,65	2.536,04	100,00%	53,65	2.536,04
7	**SUPERESTRUTURA - PILARES**				**30.051,78**	100,00%		30.051,80	100,00%	0,00	30.051,80
7.1	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44	184,04	11.307,41	100,00%	61,44	11.307,42	100,00%	61,44	11.307,42
7.2	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44	149,26	9.170,53	100,00%	61,44	9.170,53	100,00%	61,44	9.170,53
7.3	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	3,34	908,14	3.033,18	100,00%	3,34	3.033,19	100,00%	3,34	3.033,19
7.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,34	239,09	798,56	100,00%	3,34	798,56	100,00%	3,34	798,56
7.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	65,63	27,15	1.781,85	100,00%	65,63	1.781,85	100,00%	65,63	1.781,85
7.6	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	182,50	21,70	3.960,25	100,00%	182,50	3.960,25	100,00%	182,50	3.960,25
8	**SUPERESTRUTURA - VIGAS**				**21.246,57**	100,00%		21.246,60	100,00%		21.246,60
8.1	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	38,88	146,99	5.714,97	100,00%	38,88	5.714,97	100,00%	38,88	5.714,97
8.2	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	38,88	161,02	6.260,45	100,00%	38,88	6.260,46	100,00%	38,88	6.260,46
8.3	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	3,74	908,14	3.396,44	100,00%	3,74	3.396,44	100,00%	3,74	3.396,44
8.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,74	239,09	894,19	100,00%	3,74	894,20	100,00%	3,74	894,20
8.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	65,43	27,15	1.776,42	100,00%	65,43	1.776,42	100,00%	65,43	1.776,42
8.6	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	124,19	25,80	3.204,10	100,00%	124,19	3.204,10	100,00%	124,19	3.204,10
9	**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**				**35.019,46**	84,37%		29.544,35	84,37%		29.544,35
9.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6	m²	203,04	145,51	29.544,35	100,00%	203,04	29.544,35	100,00%	203,04	29.544,35
9.2	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	55,83	7,79	434,91	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	23,00	82,87	1.906,01	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
9.4	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	22,00	71,93	1.582,46	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
9.5	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	19,00	81,67	1.551,73	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
10	**REVESTIMENTO**				**41.475,24**	0,00%		0,00	0,00%		0,00
10.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos. com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	406,08	9,55	3.878,06	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
10.2	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	406,08	45,98	18.671,55	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
10.3	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	m²	111,36	54,50	6.069,12	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	111,36	115,45	12.856,51	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
11	**PINTURA**				**16.190,39**	0,00%		0,00	0,00%		0,00
11.1	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	406,08	2,87	1.165,44	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
11.2	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	m²	203,04	17,83	3.620,20	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
11.3	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	203,04	21,79	4.424,24	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
11.4	Aplicação manual de pintura com tinta acetinada em paredes, duas demãos.	m²	406,08	17,19	6.980,51	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12	**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**				**2.896,19**	0,00%		0,00	0,00%		0,00
12.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	1,20	145,51	174,61	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos. com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	2,60	9,55	24,83	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.3	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	2,60	45,98	119,54	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.4	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	3,98	2,87	11,42	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.5	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	3,98	21,79	86,72	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	3,98	17,19	68,41	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.7	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	1,46	908,14	1.325,88	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.8	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,46	239,09	349,07	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.9	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,00	735,71	735,71	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
13	**COBERTURA**				**42.002,35**	0,00%		-	0,00%		-
13.1	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	185,13	76,51	14.164,29	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls 466
Rubrica

Item	Descrição	Und	Contratual Quant.	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO DO PERÍODO %	QUANT	TOTAL	MEDIÇÃO ACUMULADO %	QUANT	TOTAL
13.2	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	185,13	67,51	12.498,12	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
13.3	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com composito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	M	32,24	139,31	4.491,35	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
13.4	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	185,13	7,53	1.394,02	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
13.5	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro.	m²	130,57	72,41	9.454,57	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
14	**PAVIMENTAÇÃO**				**42.873,37**	0,00%		-	0,00%		-
14.1	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	19,57	52,08	1.019,20	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
14.2	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	130,57	72,80	9.505,49	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
14.3	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	130,57	57,96	7.567,83	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
14.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	130,57	172,21	22.485,45	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
14.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	92,00	24,95	2.295,40	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
15	**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**				**4.705,55**	0,00%		0,00	0,00%		0,00
15.1	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	M	4,50	140,21	630,94	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
15.2	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	M	96,06	11,18	1.073,95	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
15.3	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	M	18,80	159,61	3.000,66	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
16	**CALÇADA DE PROTEÇÃO**				**18.594,36**	0,00%		0,00	0,00%		0,00
16.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	3,97	85,91	341,06	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
16.2	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	2,78	52,08	144,78	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
16.3	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	19,90	200,49	3.989,75	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
16.4	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	72,77	174,24	12.679,44	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
16.5	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos. com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	25,92	9,55	247,53	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
16.6	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	25,92	45,98	1.191,80	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
17	**ESQUADRIAS**				**20.005,04**	0,00%		-	0,00%	0,00	-
17.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	387,91	1.939,55	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
17.2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18,00	976,62	17.579,16	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
17.3	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,48	1.013,20	486,33	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18	**LOUÇAS E METAIS**				**8.620,67**	0,00%		0,00	0,00%		0,00
18.1	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	un	2,00	235,29	470,58	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.2	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	un	2,00	1.331,02	2.662,04	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.3	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	UN	2,00	177,14	354,28	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.4	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2,00	565,95	1.131,90	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.5	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	UN	2,00	44,04	88,08	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.6	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	3,00	261,27	783,81	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.7	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	un	2,00	31,50	63,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.8	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	un	1,00	1.029,04	1.029,04	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.9	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	un	1,00	2.037,94	2.037,94	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**				**12.244,54**	0,00%		0,00	0,00%		0,00

EM BRANCO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
19.1	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saida, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	UN	1,00	8.587,36	8.587,36	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.2	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	M	28,90	7,19	207,79	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.3	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	M	30,10	21,64	651,36	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.4	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	19,75	15,50	306,12	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.5	Joelho 90º soldável 25 mm água fria	UN	8,00	10,24	81,92	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.6	Curva 90º soldável 25 mm água fria	UN	2,00	13,94	27,88	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.7	Joelho 90º soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	11,00	17,51	192,61	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.8	Joelho de redução 90º soldável 40 x 25mm água fria	un	6,00	16,56	99,36	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.9	Joelho 90º soldável 40mm água fria	UN	3,00	15,35	46,05	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.10	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	3,00	128,37	385,11	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.11	Adaptador bucha soldavel 25mm x 3/4"	UN	14,00	7,26	101,64	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.12	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	1,00	100,61	100,61	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.13	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	6,00	14,24	85,44	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.14	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	1,00	11,63	11,63	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.15	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	UN	5,00	24,15	120,75	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.16	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	1,00	23,76	23,76	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.17	Registro de esfera soldável 40mm	UN	1,00	54,50	54,50	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.18	Registro de esfera soldável 25mm	UN	1,00	27,22	27,22	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.19	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	940,56	940,56	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.20	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,00	64,29	192,87	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**				**19.461,49**	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.1	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	M	9,10	22,96	208,93	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.2	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	12,40	33,65	417,26	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.3	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	28,00	64,54	1.807,12	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.4	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	8,40	15,50	130,20	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.5	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	3,00	46,53	139,59	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.6	Tê sanitário em PVC rigido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	un	1,00	60,29	60,29	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.7	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	1,00	24,90	24,90	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.8	Joelho 90º de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	un	10,00	14,02	140,20	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.9	Joelho 90º de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	un	10,00	13,54	135,40	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.10	Joelho 90º de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	UN	4,00	28,19	112,76	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.11	Joelho 45º de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	UN	1,00	13,29	13,29	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.12	Joelho 45º de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	UN	2,00	8,13	16,26	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.13	Curva 90º longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	2,00	74,10	148,20	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.14	Curva 90º longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	2,00	22,55	45,10	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.15	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	3,00	12,47	37,41	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.16	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no minimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	UN	3,00	34,17	102,51	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.17	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	2,00	23,20	46,40	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.18	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	1,00	5.469,62	5.469,62	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.19	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	1,00	5.073,57	5.073,57	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.20	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforçada, revestida internamente com barra lisa e fundo em concreto	un	8,00	666,56	5.332,48	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
21	**COMBATE A INCÊNDIO**				**641,21**	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
21.1	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	2,00	269,55	539,10	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
21.2	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	2,00	31,20	62,40	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
21.3	Placa de sinalização padrão para saida de emergência 400x120mm	Un	1,00	39,71	39,71	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**28.832,80**	0,00%		0,00	0,00%		0,00
22.1	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	46,00	17,93	824,78	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.2	Cabo unipolar de Cobre flexivel isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolitico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	62,60	3,51	219,72	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.3	Cabo unipolar de Cobre flexivel isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolitico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: BRANCO.	M	76,60	3,51	268,86	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.4	Cabo unipolar de Cobre flexivel isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolitico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	52,60	3,51	184,62	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUMUTUM
Fls 468
PMU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
22.5	Cabo unipolar de Cobre flexivel isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolitico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	142,20	3,51	499,12	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.6	Cabo unipolar de Cobre flexivel isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolitico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	142,20	5,16	733,75	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.7	Cabo unipolar de Cobre flexivel isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolitico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	82,60	5,16	426,21	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.8	Cabo unipolar de Cobre flexivel isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolitico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERDE.	M	188,30	5,16	971,62	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.9	Cabo unipolar de Cobre flexivel isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolitico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	153,90	5,16	794,12	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.10	Cabo unipolar de Cobre flexivel isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolitico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	40,00	31,36	1.254,40	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.11	Cabo unipolar de Cobre flexivel isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolitico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	40,00	31,36	1.254,40	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.12	Cabo unipolar de Cobre flexivel isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolitico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERDE.	M	40,00	31,36	1.254,40	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.13	Cabo unipolar de Cobre flexivel isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolitico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	40,00	31,36	1.254,40	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.14	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	un	3,00	342,74	1.028,22	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.15	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	UN	14,00	48,72	682,08	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.16	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	101,95	203,90	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	54,32	108,64	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.18	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	85,79	171,58	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.19	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	2,00	29,92	59,84	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.20	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	1,00	47,28	47,28	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.21	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	344,52	344,52	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.22	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	un	2,00	152,62	305,24	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.23	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	UN	6,00	69,24	415,44	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.24	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	UN	8,00	15,34	122,72	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.25	Eletroduto rigido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	M	75,00	14,49	1.086,75	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.26	Eletroduto rigido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	M	9,40	19,18	180,29	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.27	Eletroduto rigido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	M	50,30	15,35	772,10	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.28	Eletroduto rigido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	M	6,00	20,03	120,18	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.29	Eletroduto rigido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	M	36,00	24,62	886,32	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.30	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	M	57,80	7,73	446,79	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
469
Fls
Rubrica
PMU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
22.31	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade minima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 100W.	un	29,00	12,08	350,32	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.32	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W.	UN	5,00	171,32	856,60	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.33	Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt	un	31,00	34,35	1.064,85	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.34	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	UN	3,00	33,25	99,75	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.35	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por eletrodeposição anódica e pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco, diâmetro de 5/8" e comprimento de 3,0m. Conforme as normas NBR 13571/96 e UL-467.	UN	3,00	102,39	307,17	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.36	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR 5111.	M	10,00	74,02	740,20	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.37	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	un	2,00	14,93	29,86	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.38	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20 (vinte) metros de comprimento, conforme norma ABNT NBR NM 60454-3, tipo 5, Classe A, 90°C, espessura de 0,19mm e isolação para até 750V.	Un	3,00	10,97	32,91	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.39	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação, cor preta, espessura de 0,76mm, para isolação até 69kV. Rolos de 19mm de largura com 10 (dez) metros de comprimento	Un	3,00	15,74	47,22	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.40	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	4,50	85,91	386,59	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.41	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	3,50	52,08	182,28	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.42	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	2.159,67	2.159,67	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.43	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	731,17	1.462,34	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.44	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,00	4.190,75	4.190,75	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
			TOTAL GERAL (R$)		494.948,16	37,84%	1° BM	187.303,75	37,84%	ACUMUL.	187.303,75

VALOR DO 2° BOLETIM MEDIÇÃO	187.303,75
% MEDIDO	37,84%
VALOR ACUMULADO	187.303,75
% EXECUTADO	37,84%
VALOR DO CONTRATO	494.948,16
SALDO DO CONTRATO	307.644,41

Responsável Técnico da Empresa
Engenheiro Civil
CREA
Resp. Técnico

Engenheiro Civil
CREA

EM BRANCO

SOUSA & SOUSA

A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.178.418/0001-57 Inscr. Mun. 572628.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 470
Rubrica
PMU

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ		DATA:	17/11/2022	BOL. MEDIÇÃO Nº 00	
Boa vista, 17 de novembo de 2022		PRAZO:	90	INÍCIO	TÉRMINO
OBJETO:	Construção da Escola Municipal Indigena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha_ Municipio de Uiramutã/ RR	PERÍODO DE EXECUÇÃO		08/11/2022	06/2/2023
PROCESSO CONTRATO Nº 134/2022-SMECD, FNDE		08/11/2022 à 16/11/2022		9	DIAS CORRIDOS

BM N° 01_CFF x Executado

Item	SERVIÇO	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.819,22	5.454,81	5.454,81	5.454,81	5.454,81	
		100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
2	ALIMENTAÇÃO CANTEIRO	20.673,18	5.168,30	5.168,30	5.168,30	5.168,30	
		100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
3	DIVERSOS	14.924,32	14.924,32	-	-	-	
		100%	100,00%				
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE	45.418,89	45.418,89	-	-	-	
		100%	100,00%				
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E	22.718,58	22.718,58	-	-	-	
		100%	100,00%				
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS	24.532,96	-	24.532,96	-	-	
		100%		100,00%			
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	30.051,78	-	7.512,95	22.538,84	-	
		100%		25,00%	75,00%		
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	21.246,57	-	-	12.747,94	8.498,63	
		100%			60,00%	40,00%	
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	35.019,46	-	-	-	35.019,46	
		100%				100,00%	
10	REVESTIMENTO	41.475,24	-	-	-	41.475,24	
		100%				100,00%	
11	PINTURA	16.190,39	-	-	3.238,08	12.952,31	
		100%			20,00%	80,00%	
12	ABRIGO DO GÁS DE COZINHA	2.896,19	-	-	2.172,14	724,05	
		100%			75,00%	25,00%	
13	COBERTURA	42.002,35	21.001,18	21.001,18	-	-	
		100%	50,00%	50,00%			
14	PAVIMENTAÇÃO	42.873,37	-	10.718,34	32.155,03	-	
		100%		25,00%	75,00%		
15	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	4.705,55	-	-	4.705,55	-	
		100%			100,00%		
16	CALÇADA DE PROTEÇÃO	18.594,36	-	9.297,18	9.297,18	-	
		100%		50,00%	50,00%		
17	ESQUADRIAS	20.005,04	-		20.005,04	-	
		100%			100,00%		
18	LOUÇAS E METAIS	8.620,67	-	-	4.310,34	4.310,34	
		100%			50,00%	50,00%	
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	12.244,54	-	1.836,68	5.510,04	4.897,82	
		100%		15,00%	45,00%	40,00%	
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	19.461,49	-	2.919,22	8.757,67	7.784,60	
		100%		15,00%	45,00%	40,00%	
21	COMBATE A INCÊNDIO	641,21	-	-	-	641,21	
		100%				100,00%	
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	28.832,80	-	4.324,92	12.974,76	11.533,12	
		100%		15,00%	45,00%	40,00%	

PREVISTO						
DESEMBOLSO MENSAL OBRA (COM BDI)	494.948,16	114.686,07	92.766,53	149.035,70	138.459,86	494.948,16
TOTAL MENSAL (%)	100,0%	23,17%	18,74%	30,11%	27,97%	100,00%
TOTAL ACUMULADO (R$)		114.686,07	207.452,59	356.488,30	494.948,16	PREVISTO
TOTAL ACUMULADO (%)		23,17%	41,91%	72,0%	100,0%	

EXECUTADO					
	BM1	BM2	BM3	BM4	
Por etapa em R$:	*187.303,75*				187.303,75
	37,84%	0,00%	0,00%	0,00%	37,84%
Acumulado em R$:	*187.303,75*		-	-	% EXECUTADO
	37,84%	0,00%	0,00%	0,00%	

Responsável Técnico da Empresa
Engenheiro Civil
CREA

EM BRANCO

SOUSA & SOUSA
CONSTRUÇÕES
A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA
CNPJ: 37.170.418/0001-57 Insc.Mun. 973[illegible]8.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 471
Rubrica
PMUI

Relatório Fotográfico

Fatura 01

Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha_
Município de Uiramutã/ RR

PROCESSO CONTRATO Nº 134/2022-SMECD, FNDE

Periodo de 08/11/2022 á 16/11/2022

Av. Santos Dumont, 2180, Sala. 01 - Bairro 31 de Março - CEP 69.305-340 - Boa Vista / RR
Telefone: (095) 99131-2944 | @sousasousaconstrucoes | E-mail:anselmosousa663@gmail.com

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 472
Rubrica
PMUI

FOTOS

1 – Placa da Obra:



2 – Locação e limpeza da obra

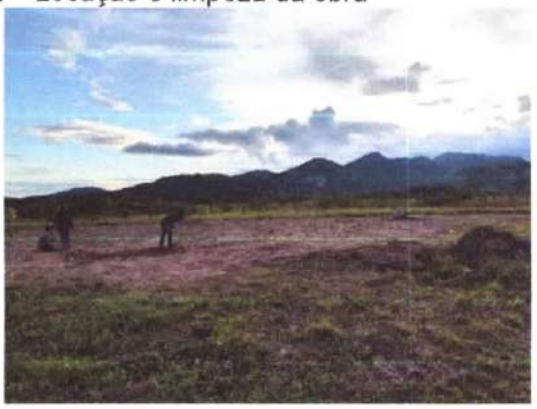

4 – (Impermeabilização e viga baldrame)



5 – Superestrutura (pilares e viga superior)



4 – Alvenaria



5 – Armaduras dos pilares



Sávio Júlio Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA 0907966128
Resp. Técnico

Engenheiro Civil Sávio Julio Pereira Franco
CREA-RR nº 0907966128
Responsável Técnio

EM BRANCO

Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências

(Primeira e Segunda Instâncias)

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima CERTIFICA que, revendo os registros de Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências, nas comarcas deste Estado, até a presente data, NADA CONSTA contra:

NOME: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI
CPF/CNPJ: 37.170.418/0001-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 473
Rubrica
PMU

OBSERVAÇÕES:
1) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Portaria Presidencial nº 493, do dia 09 de abril de 2014;
2) A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
3) A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;
4) As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça de Roraima, e, ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
5) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RR, pelo endereço http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa, informando o número de autenticidade abaixo.
6) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 2 (dois)anos após a sua expedição.

Número de Autenticidade: 020915984973

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/10/2022 as 07:00

Data da última atualização da base de dados: 04/10/2022 as 00:26

Válida até o dia: 05/12/2022

EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
Fls 474
Rubrica
PMU

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.170.418/0001-57
Certidão nº: 33682355/2022
Expedição: 06/10/2022, às 07:58:14
Validade: 04/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.170.418/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 475
Rubrica
PMU

Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"

CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND

CGF/CPF/CNPJ	Nome / Razão Social
37.170.418/0001-57	A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA

É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria SEFAZ/GAB n° 367/2011 publicada no D.O.E n° 1562 do dia 08/06/2011.

Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Data de emissão: 06/10/2022 **Validade:** 04/01/2023

A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de resposabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, no endereço: https://www.sefaz.rr.gov.br/

Código de Autenticação: 07354A

As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO

Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências

(Primeira e Segunda Instâncias)

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima CERTIFICA que, revendo os registros de Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências, nas comarcas deste Estado, até a presente data, NADA CONSTA contra:

NOME: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI
CPF/CNPJ: 37.170.418/0001-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 476
Rubrica
PMU

OBSERVAÇÕES:
1) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Portaria Presidencial nº 493, do dia 09 de abril de 2014;
2) A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
3) A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;
4) As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça de Roraima, e, ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
5) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RR, pelo endereço http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa, informando o número de autenticidade abaixo.
6) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 2 (dois)anos após a sua expedição.

Número de Autenticidade: 020915984973

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/10/2022 as 07:00

Data da última atualização da base de dados: 04/10/2022 as 00:26

Válida até o dia: 05/12/2022

EM BRANCO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 477
Rubrica
PMU

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA
CNPJ: 37.170.418/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:34:20 do dia 31/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/01/2023.
Código de controle da certidão: **A271.AEF4.7F61.A8EC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO

Voltar Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 478
Rubrica
PMU!

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.170.418/0001-57
Razão Social: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT 2180 SALA 1 / TRINTA E UM DE MARC / BOA VISTA / RR / 69305-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/09/2022 a 24/10/2022

Certificação Número: 2022092501555452996164

Informação obtida em 06/10/2022 08:04:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Departamento de Tributos
Rua Coronel Pinto, 188 - Centro
BOA VISTA - RR - CEP: 69301-150
FONE(S): 95 3621 1653 CNPJ/MF: 05.943.030/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 479
Rubrica
PMU

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 003425/2022

Nome/Razão Social: **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA**

Nome Fantasia: **SOUZA & SOUSA CONSTRUCOES**

Inscrição Municipal: **972928.3** CPF/CNPJ: **37.170.418/0001-57**

Endereço: **AV SANTOS DUMONT, 2180 SALA: 1 31 DE MARÇO**
BOA VISTA - RR - CEP: 69305-340

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADOS DÉBITOS PARCELADOS E/OU COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Data de Emissão: **10/10/2022**

Validade: **30 (TRINTA DIAS** **********)

Esta certidão abrange somente o contribuinte acima identificado.

Observações:

****
****
****
****
****

Código de controle da certidão: **11000013059800000590180300034252022010 9**

Emissor: EDSON

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

EM BRANCO

FUNDEB

30.776.317/0001-85 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Fls. 480 Rúbrica

ORDEM DE PAGAMENTO 00746

DATA: 18/11/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO:18/11/2022

Credor..: ISS CNPJ: Cod: 469

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL N° 52 DA EMPRESA A. ALMEIDA FE ITOSA DE SOUSA LTDA.

Valor **4.180,62**

(quatro mil, cento e oitenta reais e sessenta e dois centavos) * * *

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA - PMU
Fls 485
Rubrica

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM UIRAMUTA -FEB
Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2

Creditado

Nome	PM UIRA RECURSOS PROPRIOS
Agência	4263-3
Conta corrente	905267-4
Valor	4.180,62
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JG190583 VANDERLANE J LIMA	18/11/2022 10:55:28
	JE688997 BENISIO R SOUZA	18/11/2022 10:56:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO R SOUZA.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 1187
Rúbrica

FUNDEB

30.776.317/0001-85 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00745

DATA: 18/11/2022 VENCTO:17/11/2022 PAGTO:18/11/2022

Credor..: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIREI CNPJ: 37.170.418/0001-57 Cod: 1086

Endereço: AV SANTOS DUMONT

Cidade..: BOA VISTA CEP: 69305-340

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL I NDÍGENA AMOOKO ROSENO -COMUNIDADE BARREIRINHA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR .

Valor **187.303,75**

(cento e oitenta e sete mil, trezentos e três reais e setenta e cinco centavos) * * *

EM BRANCO

Fls 2183
Rúbrica

GOVERNO

G332181042740256027
18/11/2022 10:56:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM UIRAMUTA -FEB
Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2

Creditado

Nome	A A FEITOSA SOUSA
Agência	250-X
Conta corrente	128664-1
Valor	183.123,13
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG190583 VANDERLANE J LIMA	18/11/2022 10:48:27
	JE688997 BENISIO R SOUZA	18/11/2022 10:56:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO R SOUZA.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 4134
Rubrica
PMU

MUNICIPIO DE UIRAMUTA
Rua Cici Mota, s/n
01612681/0001-01 Exercício: 2022

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00095/002** GL Ficha: 430
Data Empenho: 08/11/2022 Data Liquidação:19/12/2022

Credor..: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: BOA VISTA CEP: 69305-340

Valor **RR$ 307.644,41**

Extenso: trezentos e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000000006		19/12/202		307.644,41
Total de Notas				307.644,41

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR$ 307.644,41

9999.00.0.0.05	ISS FUNDEB	RR$ 3.201,42
	TOTAL RETIDO.....	RR$ 3.201,42

Líquido a Pagar: . . . . . RR$ 304.442,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRS
Benisio Roberto de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R$

Liquidado em __/__/____ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: Vanderlane James Lima
Secretária de Educação Municipal
de Uiramutã
Portaria: nº 459/2022

EXEMPLAR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Numero da Nota: **00000061**
Data e Hora de Emissão: **19/12/2022 10:49:57**
Data do Fato Gerador: **19/12/2022**
Código de Verificação: **AAADEUGE-IZABAU**

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**UIRAMUTÃ/RR - BRASIL**	**UIRAMUTÃ/RR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 485
Rubrica
PMU

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social:	**A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA**		
Nome Fantasia:	**SOUZA & SOUSA CONSTRUCOES**		
Endereco:	**AV SANTOS DUMONT, 2180 SALA: 1 31 DE MARÇO BOA VISTA - RR CEP: 69305-340**		
CPF/CNPJ:	**37.170.418/0001-57**	Insc. Municipal:	**9729283**
Telefone:	**(95) 9131-2944**	E-mail:	**ANSELMOSOUSA663@GMAIL.COM**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ**		
Nome Fantasia:	**Prefeitura Municipal de Uiramutã**		
Endereço:	**RUA CICI MOTA S/N, S/N S/N CENTRO UIRAMUTÃ - RR CEP: 69358-000**		
CPF/CNPJ:	**01.612.681/0001-01**	Insc. Municipal:	
Telefone:	**(95) 9126-7226**	E-mail:	

Discriminação do(s) Serviço(s)

referente a Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha_ Municipio de Uiramutã/ PERÍODO DE EXECUÇÃO
PROCESSO CONTRATO Nº 134/2022-SMECD, FNDE.
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º FATURA/ MEDICAO-PERIODO 17/11/2022 à 19/12/2022
CONFORME ORDEM DE SERVICO- VALOR R$ 307.644,41
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA..... R$ 85.371,32
VALOR DA DEDUÇAO..... R$ 222.273,09

Atesto que os materiais / serviços constantes na presente Nota Fiscal foram entregues / realizados.
Em: 19 / Dez / 2022
fiscal

Marcos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 090[illegible]

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
4313400 - Obras de terraplenagem

Valor do(s) Serviço(s): **307.644,41**	Valor Dedução: **222.273,09**	Desconto Incondicionado: **0,00**	Base de Cálculo ISS: **85.371,32**
Alíquota ISS (%): **3,75**	Valor do ISS: **0,00**	Valor ISS Retido: **3.201,42**	Desconto Condicionado: **0,00**

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total

	Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
	307.644,41	**304.442,99**

Outras informações

O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ através de substituição tributária
*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 50.607,51 - (16,45%) - Fonte: IBPT
Nota Fiscal substituta da NFS-e nº 59 emitida em 19/12/2022 10:36:28
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 0250-X
C/C - 128.664.1

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://boavista.seatri.com.br

EM BRANCO

Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências

(Primeira e Segunda Instâncias)

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima CERTIFICA que, revendo os registros de Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências, nas comarcas deste Estado, até a presente data, NADA CONSTA contra:

NOME: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIRELI
CPF/CNPJ: 37.170.418/0001-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 186
Rubrica
PMU

OBSERVAÇÕES:
1) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Portaria Presidencial nº 493, do dia 09 de abril de 2014;
2) A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
3) A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;
4) As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça de Roraima, e, ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
5) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RR, pelo endereço http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa, informando o número de autenticidade abaixo.
6) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 2 (dois)anos após a sua expedição.

Número de Autenticidade: 017962351562

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/12/2022 as 16:51

Data da última atualização da base de dados: 11/12/2022 as 00:31

Válida até o dia: 10/02/2023

Voltar | Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 457
Rubrica
PMU

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.170.418/0001-57

Razão Social: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA

Endereço: AV SANTOS DUMONT 2180 SALA 1 / TRINTA E UM DE MARC / BOA VISTA / RR / 69305-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/12/2022 a 08/01/2023

Certificação Número: 2022121002032179792385

Informação obtida em 12/12/2022 17:49:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls 185
Rubrica
PMU

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.170.418/0001-57
Certidão nº: 45061067/2022
Expedição: 12/12/2022, às 17:37:33
Validade: 10/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.170.418/0001-57, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

EM BRANCO

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls 489
Rubrica
PMU

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 003977/2022

Nome/Razão Social: **A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **SOUZA & SOUSA CONSTRUCOES**
Inscrição Municipal: **972928.3** CPF/CNPJ: **37.170.418/0001-57**
Endereço: **AV SANTOS DUMONT, 2180 SALA: 1**
31 DE MARÇO - BOA VISTA - RR 69305340

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

****
****
****
****

Esta certidão foi emitida em **18/11/2022** com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **17/01/2023**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **4100001321360000059018060003977202211186**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://boavista.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 12/12/2022 às 16:34:47

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls 190
Rubrica
PMU

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA
CNPJ: 37.170.418/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:55:54 do dia 12/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/06/2023.
Código de controle da certidão: **3221.C574.38CB.FD4E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO

Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls 491
Rubrica
PMU

CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND

CGF/CPF/CNPJ	Nome / Razão Social
37.170.418/0001-57	A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA

É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria SEFAZ/GAB n° 367/2011 publicada no D.O.E n° 1562 do dia 08/06/2011.

Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Data de emissão: 12/12/2022 **Validade:** 12/03/2023

A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de resposabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaría de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, no endereço: https://www.sefaz.rr.gov.br/

Código de Autenticação: 09C13C

As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO

ORDEM DE PAGAMENTO 00860

DATA: 20/12/2022 VENCTO:19/12/2022 PAGTO:20/12/2022

Credor..: A ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA EIREI CNPJ: 37.170.418/0001-57 Cod: 1086

Endereço: AV SANTOS DUMONT

Cidade..: BOA VISTA CEP: 69305-340

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL I NDÍGENA AMOOKO ROSENO -COMUNIDADE BARREIRINHA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR .

Valor **307.644,41**

(trezentos e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centav os) *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 307.644,41**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
95 / 2	GL 020702	12.361.3400.1060.0000	4.4.90.51.00	R$ 307.644,41	R$ 0,00	R$ 3.201,42	R$ 304.442,99
TOTAL				R$ 307.644,41	R$ 0,00	R$ 3.201,42	304.442,99

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 304.442,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRS

Benisio Roberto de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	15.160-2		304.442,99
TOTAL. . .			R$ 304.442,99

Despesa paga em 20/12/2022 Com os recursos acima discriminados

Vanderlane James Lima
Secretária de Educação Municipal de Uiramutã
Portaria nº 459/2022

VANDERLANE JAMES LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____

CGC/CPF:_____

EM BRANCO

GOVERNO

G338201801714095034
20/12/2022 18:14:49

Transferência entre contas diversas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
Fls 493
Rubrica
PMUI

Debitado

Nome	PM UIRAMUTA -FEB
Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2

Creditado

Nome	A A FEITOSA SOUSA
Agência	250-X
Conta corrente	128664-1
Valor	304.442,99
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG190583 VANDERLANE J LIMA	20/12/2022 15:26:26
	JE688997 BENISIO R SOUZA	20/12/2022 18:14:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO R SOUZA.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE Uiramutã
Fls. 494
Rúbrica

FUNDEB

30.776.317/0001-85 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00928

DATA: 20/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO:20/12/2022

Credor..: ISS CNPJ: Cod: 469

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

pagamento de iss.

Valor **3.201,42**

(três mil, duzentos e um reais e quarenta e dois centavos) * * *

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome	PM UIRAMUTA -FEB
Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2

Creditado

Nome	PM UIRA RECURSOS PROPRIOS
Agência	4263-3
Conta corrente	905267-4
Valor	3.201,42
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JG190583 VANDERLANE J LIMA	20/12/2022 15:29:40
	JE688997 BENISIO R SOUZA	20/12/2022 18:14:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO R SOUZA.
