PREFEITURA DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
SEMECD / UIRAMUTÃ
Fls. 12
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – SEMECD

PMUI/SMECD/MEMO Nº 491/2022.

UIRAMUTÃ – RR, 26 de Setembro de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor
BENÍSIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã – RR.

Assunto: Construção de Escola Municipal Indígena Ko`Ko Tereza da Silva – Comunidade Caraparú I.

Senhor Prefeito,

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para abertura de processo que terá como objeto a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA Ko`Ko TERESA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ I NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR",** conforme especificações constantes no Projeto Básico ANEXO I e seus Anexos.

Respeitosamente,

Vanderlane James Lima

VANDERLANE JAMES LIMA
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto
PORTARIA Nº 459/2022

AUTORIZO A SOLICITAÇÃO ACIMA.

BRS

BENÍSIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE UIRAMUTÃ

SEMECD / UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU/ - Fls. 02 - Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – SEMECD

Pedido de Aquisição de Material/Serviço – PAMS

Protocolo

PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAMUTÃ/RR

Órgão Emitente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.	
Função/Programa/Subprograma 12.361.3400.1020.0000	**Projeto/Subprojeto** -
Elemento Despesas: 44905100	**Fonte de Recursos** 1540 - FUNDEB

Item	Especificação	Unid.	Quantidade
1	**"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA Ko`Ko TERESA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ I NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR",**	Und	1

APLICACAÇÃO:

Destina-se a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto - SMECD da Prefeitura do Município de Uiramuta – PMU/RR.

DATA: 26/09/2022

Tipo de Empenho:

GLOBAL

VANDERLANE JAMES LIMA
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto
PORTARIA Nº 459/2022

EMBARGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 05
Rúbrica

PROJETO BÁSICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 04
Rúbrica

PROJETO BÁSICO

Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva- Comunidade Caraparú I

UIRAMUTÃ-RR, SETEMBRO/2022

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 05 Rúbrica

SUMÁRIO

1. OBJETO 3.... 3
2. JUSTIFICATIVA.... 3
3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 3
4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO 3
4.1. ADMINISTRAÇÃO 3
4.2. Mobilização e Instalação de Canteiro 4
4.3. PROJETO ESTRUTURAL, HIDRAÚLICO, SANITÁRIO E COMBATE AINCENDIO 4
4.4. PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA E SPDA 4
4.5. Diversos 4
5. LOCAIS DE TRABALHO 13
6. SISTEMA DE TRABALHO 13
7. MEDIÇÃO E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS 13
8. INSTALAÇÕES FÍSICAS 13
9. HORÁRIOS DE TRABALHO 14
10. RECURSOS HUMANOS 14
11. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI.DUAL 14
12. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 15
13. MATERIAIS DE CONSUMO 15
14. FISCALIZAÇÃO 16
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 16
16. PENALIDADES 16
17. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 18
18. PREÇO 22
19. PRAZO DE EXECUÇÃO 22
20. CONSIDERAÇÕES FINAIS 22
21. Aprovação 22

PLANILHAS DE ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 1)
ART e DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (ANEXO 2)
RELÁTORIO FOTOGRÁFICO (ANEXO 3)

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 06
Rúbrica

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva- Comunidade Caraparú I

2. Justificativa

A prefeitura Municipal de Uiramutã-RR, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, que é o órgão municipal é o órgão encarregado de instrumentalizar e ofertar a educação infantil de Uiramutã. A Secretaria promove o desenvolvimento cultural da população e incentiva a recreação e lazer da comunidade. Nela constam os segmentos como: coordenação pedagógica, supervisão escolar, nutricionista, psicólogo, agentes administrativos, motoristas, professores, serventes e merendeiras. A Secretaria tem como objetivo, trabalhar em equipe para que haja um ótimo desempenho das atividades relacionadas à questão educacional do município. As especificações abordadas neste documento têm como objetivo estabelecer diretrizes para orientação de empresas interessadas em participar do certame licitatório para contratação da Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva- Comunidade Caraparú I- Município de Uiramutã, detalhando as atividades, locais, horários e demais aspectos relativos à prestação dos serviços. A Escola tem por objetivo a Educação Infantil, pois atualmente escola Educação Infantil mais próxima encontrasse 15 km desta comunidade. Está nova escola está delimitada pela reserva indígena, distante cerca de 89 km do centro do município. Atenderá uma demanda de 18 alunos. Justificamos a presente necessidade levando em consideração a prestação do serviço no intuito de justifica-se pela a necessidade de oferecer um prédio escolar adequado, com intuito de oferecer uma educação de qualidade, com conforto e segurança aos alunos, pois o local de funcionamento da escola atualmente cedido pela a comunidade, local e não possui estrutura adequada para o atendimento. Dessa forma trará uma maior acessibilidade e segurança para os usuários da mesma, podendo assim viabilizar as atividades, provendo uma melhor qualidade de serviço.

. Especificação dos Serviços

O objeto deste Projeto Básico compreende a execução dos seguintes serviços:
As especificações técnicas, bem como a qualidade dos serviços, devem obedecer fielmente às normas descritas no item 4, pois são condições essenciais para a realização dos serviços, devendo ser executado por empresa devidamente regularizada.
Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem o consentimento escrito do Membro e/ou Comissão Fiscalizadora da Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR.

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO
4.1. ADMINISTRAÇÃO

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 07
Rúbrica

O trabalho consiste no acompanhamento das diversas etapas da construção, desde a análise de viabilidade do projeto até a conclusão final da obra, tudo dentro do orçamento e dos prazos. Além disso, o serviço de administração e gerenciamento de obra também é responsável por levantar custos, elaborar orçamentos e cronogramas de execução, acompanhar as aprovações do empreendimento junto aos órgãos públicos e realizar a contratação de fornecedores. Assim, é possível assegurar a qualidade da obra, bem como o cumprimento dos prazos e a minimização de custos com a construção civil.

4.2. Mobilização e Instalação de Canteiro

Os serviços de **mobilização** e desmobilização são definidos como o conjunto de operações que o executor deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazê-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.
Canteiro de obras é a área destinada à execução da obra, aos serviços de apoio e a implantação de instalações provisórias indispensáveis para a realização da construção. Também é o local onde se armazenam os materiais que serão utilizados no projeto e se realizam os serviços auxiliares durante a obra.
Será fixada 01 (uma) placa **PADRÃO de obra**, de forma legível e de fácil visualização com os dizeres fornecidos pelo Setor de Engenharia do órgão municipal. Coleta e transporte de resíduos sólidos comerciais com o uso de veículos compactadores ou basculantes 06m³

4.3 PROJETO ESTRUTURAL, HIDRAÚLICO, SANITÁRIO E COMBATE A INCENDIO

4.3.1 Instalações

No canteiro de obra será executado o barracão de obra para alojamento/escritório, espaço destinado à utilização dos responsáveis técnicos e trabalhadores. As paredes serão em compensado 10mm, a cobertura em telha de fibrocimento 4,0mm e esquadrias, incluso instalações provisória de água e luz. Além disso, está prevista a construção de um barracão para deposito, espaço destinado para guarda de ferramentas e materiais pertinentes à obra, em tábua de madeira, cobertura em telha de fibrocimento 4,0mm, incluso piso argamassa traço 1:3. (Cimento e areia), incluso instalações provisória de luz. Em local adequado, será afixado a placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m), obedecendo-se aos padrões definidos pelo Ministério da Saúde.

4.3.2 Fundações

O projeto estrutural da escola foi elaborado com base na NBR 6118/2014, tendo sua infraestrutura de fundações definida para um solo com tensão admissível inferior ou igual a 2Kgf/cm². A estrutura da fundação foi determinada como sapatas com dimensões de 70x70x25cm, conforme consta no projeto estrutural. Está prevista a Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfáltica em duas demãos.

4.3.3 Superestrutura

Os elementos estruturais projetados na edificação são constituídos em vigas baldrame (12cm x 25cm), vigas superiores (12cm x 20cm), pilares de (12cm x 25cm) em concreto armado, conforme projeto. A resistência característica do concreto – Fck utilizada para todos os elementos estruturais, incluindo-se a fundação é de 25Mpa, conforme NBR 6118/2014, e armações descritas em projetos e planilha orçamentaria.

4.3.4 Alvenaria

As alvenarias serão de tijolos de seis furos na horizontal de 9x14x19 cm (e= 9 cm), assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com aditivo plastificante. Os tijolos deverão ser de boa qualidade

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 08
Rúbrica

e resistência. Seu assentamento far-se-á porfiadas perfeitamente alinhadas e niveladas. A camada de argamassa para assentamento deverá ter dois centímetros tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. As vergas para portas serão moldadas em loco em concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) e preparo mecânico com betoneira, e aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. As vergas para janelas serão moldadas em loco em concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira, e aço ca- 50, diâmetro de 6,3 mm. As contra-vergas das janelas serão moldadas em loco em concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira, e aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. O encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9 cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).

4.3.5 Revestimento e Pintura

O Chapisco deverá ser aplicado em todos os ambientes da edificação, tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 cimento e areia grossa, com preparo manual. O reboco, deverá ser aplicado em todos os ambientes da edificação exceto em áreas molhadas que receberão revestimento cerâmico, argamassa traço 1:4 (cimento e areia fina), com aditivo plastificante e impermeabilizante, com espessura 2,0cm e aplicado manualmente. O Emboço para recebimento de cerâmica será com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), com aditivo plastificante e impermeabilizante, aplicado manualmente nas paredes, para ambientes com áreas molhadas como banheiros, sobre pias, com espessura de 2,0 cm com execução de talisca O Revestimento cerâmico terá dimensões de 25x35cm, aplicado em parede em ambientes com áreas molhas como banheiros, DML e área das pias. As paredes internas e externas que foram rebocadas receberão 01 demão de selador látex PVA. As paredes internas receberam aplicação e lixamento de massa látex - PVA em
duas demãos.

As paredes externas receberam aplicação e lixamento de massa em duas demãos. As paredes internas e externas receberam aplicação manual de pintura com tinta látex PVA semi brilho em duas demãos, com cores definidas em projeto.

4.3.6 Cobertura

A cobertura proposta para edificação foi elaborada tendo como diretrizes o conforto térmico da edificação, a economia, a durabilidade e resistência às intempéries. É um sistema construtivo convencional e versátil que permite ao executor agilidade e rapidez na montagem da estrutura do telhamento com Telha de PVC colonial de com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior de 10°, com duas águas. A forma da cobertura busca além da proteção mecânica da edificação, um conforto térmico adequado ao atendimento à saúde e a permanência das equipes médicas e dos pacientes além uma identidade visual da edificação. O telhado é composto de duas águas com a estrutura em madeira e telha ondulada de fibrocimento. As águas estão dispostas no sentido longitudinal da edificação e sofrem um prolongamento nas fachadas laterais os quais conferem à edificação uma maior proteção em relação à insolação das empenas nestas fachadas e consequentemente uma melhora do conforto térmico dos ambientes da edificação. O madeiramento do telhado foi proposto com bitolas convencionais disponíveis
no mercado local da construção civil a fim de facilitar a aquisição do material, e está previsto a imunização utilizando cupinicida incolor. O forro escolhido foi de PVC branco de 200 mm x 6,0m com estrutura de sustenteção em metalon.

4.3.6 Piso, Soleira e Rodapé

O contrapiso será executado sobre o terreno já perfeitamente apiloado, nivelado e compactado, com espessura de 5 cm, regularizado com camada de 3,0cm de argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa), com preparo mecânico. O revestimento de piso proposto foi tipo Cerâmio PEI IV com dimensões de 30x30

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 09
Rúbrica

cm, na cor branca, em todos os ambientes da edificação. O rodapé com espessura de 7 cm, utilizando o mesmo tipo cerâmico do piso. As soleiras propostas são de granito na cor cinza, com largura de 15 cm e espessura de 3 cm, assentas sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia). A calçada de proteção ao redor da edificação tem 80 cm de largura.

4.3.7 Esquadrias

As esquadrias propostas são: Portas de madeira de abrir (0,80 x 2,10), pois são soluções completas, práticas de instalar e apresentam durabilidade superior. Além disso, não possuem problema com pragas e cupins, não empenam, não estufam e não apodrecem, fácil de instalar e limpar, são completas e prontas para instalação (com acessórios e pintura de acabamento). Janelas de aço e vidro de abrir com pintura a pó na cor branca (1,50 x 1,00) e janelas de aço tipo maxim-ar (0,60 x ,40), pois são soluções completas, práticas de instalar e apresentam durabilidade superior. Além disso, trata-se de um metal que permite produzir esquadrias robustas e seguras por possuir maior resistência a impactos, além de elevada resistência à corrosão atmosférica.

4.3.8 Louças e Metais

O banheiro proposto é adaptado para Pessoas com deficiência, e apresenta quatro (4) barras de apoio em inox polido, L=90 cm e D= 38,1 mm, um (1) banco articulado PCD em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45 cm conforme NBR 9050, um (1) vaso sanitário PCD sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo e assento plástico PCD, um (1) lavatório louça branca suspenso, com dimensões de 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular, previsto a instalação, um (1) chuveiro plástico branco simples e um (1) Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, com 5 peças incluso fixação. A copa pias em aço inox nos tamanhos 0,60x1,50m e 0,60x1,40m com 01 cuba deslocada a esquerda ou direita, conforme projeto, com sifão cromado, válvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7 cm. No depósito de materiais de limpeza (DML) está previsto um tanque de mármore sintético suspenso, com capacidade de 22 litros ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular,
Previsto instalação.

4.3.9 Diversos

Placa de inauguração metálica com dimensões de 0,40 x 0,60 m, prevendo a Instalação. Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, com bordas polida e dimensões de 25 x 8 cm, e espessura de 6 mm, prevendo a instalação. Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital, com dimensões de 1,50 x 2,00 m, inclusive estrutura de metolon de 20x20 cm e escoramento instalada. Para melhor conforto dos usuários, foi previsto tela nylon anti-inseto, cor branca, com proteção UV, fios de 0,25mm, para instalação nas janelas da edificação para proteção contra insetos, inclusive molduras de madeira.

4.3.10 Instalação hidráulica

Para o abastecimento de água potável da edificação, foi considerado um sistema direto, ou seja, a água proveniente do sistema de abastecimento de água da comunidade não segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em um reservatório elevado de água em polietileno com capacidade de 2000 litros, apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Que têm por finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do abastecimento da comunidade e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede predial.

O Sistema de abastecimento de água da comunidade abastecerá diretamente o reservatório superior, seguindo pela coluna de distribuição predial diretamente aos pontos, como consta nos desenhos do projeto.

O projeto de instalações de água fria foi dimensionado de forma a garantir o fornecimento de água de forma continua, em quantidade suficiente, com pressões e velocidades adequadas para o sistema de tubulações e

EN BLANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 10 Rúbrica

peças de utilização, preservar rigorosamente a qualidade da água do sistema de abastecimento. Garantir o máximo de conforto aos usuários, incluindo a redução dos níveis de ruído nas tubulações. A determinação da capacidade de reservação foi dimensionada levando-se em consideração a demanda diária de um estabelecimento de saúde, para atendimento de20 (vinte) pessoas em edificios públicos e/ou comerciais cujo consumo estimativo é de 50 litros/dia/pessoa. Assim, levando-se em consideração as reservas estabelecidas na NBR 5626, e levando em conta de se tratar de um estabelecimento de saúde que está localizado em aldeia indígena, onde o fornecimento de água quando suspenso há demora no reestabelecimento, a capacidade do reservatório foi dimensionada em 2000 litros.

O projeto foi elaborado utilizando-se uma demanda de 23 (vinte) alunos em atendimento na sala de aula. As caixas de inspeções ou passagem serão em alvenaria, com tampa de concreto, revestidas internamente com barra lisa, com dimensões de 40x40x50 cm e deverão ser localizadas na área externa da edificação, conforme descrito neste projeto referencial. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC seria normal.Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade constante, abaixo:

• 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 50mm;

• 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e verificação do caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento mínimo de 20 cm. Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 10cm de concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala recoberta com solo normal.

Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários

Como a unidade está localizada em aldeia indígena, que não existe rede pública de coleta de esgotos, estão previstas neste Projeto solução individual de destinação dos esgotos. Essa solução consiste num conjunto de tanque séptico e sumidouro. O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma população de projeto de até 20 (pessoas), e as diretrizes das ABNT NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 – Tanques sépticos

- Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos -

Projeto, construção e operação.

A Fossa séptica será construída em alvenaria de meia vez, com tijolo cerâmico, dimensões externas de 1,80 x 2,30 x 1,50 metros, piso de concreto com espessura de 8 cm, revestida internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 10 cm. O Sumidouro será construído em alvenaria de uma vez, com tijolo cerâmico, diâmetro 2,00 m e altura de 2,50 m, revestida internamente com chapisco, com lastro de concreto com espessura de 5 cm e fundo de brita de 2 cm, com tampa de concreto armado com espessura de 10 cm.

Indicações do sistema

O uso do sistema de tanques sépticos somente é indicado para:

a) Área desprovida de rede pública coletora de esgoto;

b) Alternativa de tratamento de esgoto em áreas desprovidas de rede coletora local;

c) Retenção prévia dos sólidos sedimentáveis, quando da utilização de rede coletora com diâmetro e/ou declividades reduzidos para transporte de efluente livre de sólidos sedimentáveis.

Distancias mínimas

Os tanques sépticos devem observar as seguintes distâncias horizontais mínimas:

a) 1,50 metros de construções, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal predial de água;

EN BLANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 11
Rúbrica

b) 3,00 metros de árvores e de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água;
c) 15 metros de poços freáticos e de corpos de água de qualquer natureza.
Nota: As distâncias mínimas são computadas da face externa mais próxima aos elementos considerados.
Está previsto 2 (dois) extintores de incêndio tipo abc de 6 kg, incluso suporte de fixação e placa indicativa.
Além disso, placa de saída de emergência e iluminação de emergência, conforme projetos.

4.4.0 PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA E SPDA

4.4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial tem finalidade de descrever e especificar as instalações elétricas destinadas à entrada de energia, medições e distribuição, quadros de distribuição (QD's), circuitos internos, SPDA e telefonia, referentes à escola

4.4.1.1 OBJETIVO

A Discriminação Técnica tem por objetivo definir as condições para a execução das obras escola

4.4.4.2 RELAÇÃO DE PRANCHAS

4.4.2.1 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

IE 01/04, 02/04, 03/04 e 04/04 Instalação elétrica, diagramas, quadros e detalhes.

4.4.3 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA E LÓGICA E SPDA

4.4.3.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todas as instalações deverão ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com as seguintes normas:
NBR 5410 da ABNT;
NBR 5419 da ABNT;
NBR 5413 da ABNT;
RDC 50 da Anvisa;
NR 10, Portaria nº06, de 28 de março de 2002
NEC - National Electrical Code;

4.4.3.1.1 Componentes da Instalação Elétrica de Baixa Tensão

Entrada de Energia:

A energia será fornecida em baixa tensão pela Eletrobrás Distribuição Roraima no sistema Monofásico com Retorno por Terra - MRT na tensão 230/115V. A entrada de energia da edificação será por meio de Padrão de Entrada de Energia Bifásico instalado em mureta de alvenaria localizada no limite do terreno definido para a edificação, conforme projeto.

A medição de energia será em mureta com entrada aérea com cabo multiplexado tipo triplex e saída subterrânea. Os principais componentes são:

- Poste de concreto armado tipo duplo T com comprimento de 7,0m com resistência de 150 daN;
- Caixa de medição polifásica em policarbonato, padrão Eletrobrás;
- Disjuntor geral bipolar DIN de 63A 3,0kA curva C;
- Cabos de cobre flexíveis na bitola de 16,0mm² isolados em PVC na tensão nominal de 0,6/1kV para as fases, neutro e terra;
- Eletrodutos rígidos de PVC roscável com bitola de 1 1/4" e conexões;
- Armação secundária com um estribo e isolador de porcelana tipo roldana;
- Caixa de passagem 40x40x50cm com tampa reforçada;
- Aterramento com três hastes de aterramento tipo copperweld de 5/8" x 3,0m dispostas em triângulo e conectadas com cabo de cobre nu 50,0mm²;
- Mureta de medição em alvenaria com pilaretes em concreto armado nas extremidades, chapiscada e rebocada.

EN BLANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 19
Rúbrica

Na mureta de medição está prevista a instalação de um quadro geral de baixa tensão (QD1) destinado à instalação de disjuntor geral, disjuntores parciais dos alimentadores dos quadros de distribuição da escola e do abrigo de resíduos de saúde. Além disso, está prevista a instalação de DPS classe I/II 175V 12,5/60kAinstalados entre as duas fases e o cabo de proteção (terra), conforme projeto;

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA ESCOLA:

A edificação é de pequeno porte, portanto possuirá apenas um quadro de distribuição (QD2) que atenderá os circuitos de iluminação, tomadas de uso geral, tomadas de uso especifico e centrais de ar tipo split. O quadro deverá ser de embutir, confeccionado em chapa de aço com pintura epóxi (IP50), possuir trinco com fechadura e dobradiças embutidas, equipado com barramentos internos em cobre eletrolitico bifásico, neutro e terra com corrente nominal de no mínimo 80A e adequado à tensão nominal de 230/115V. Deve possuir local destinado à instalação de um disjuntor geral bipolar DIN de 63A, 32 disjuntores parciais DIN e deve possuir resistência mecânica aos esforços de curto-circuito.

Deverá ser confeccionado de acordo com indicação contida em projeto e cada circuito deve ser identificado com etiquetas de identificação personalizadas e possuir porta projeto. Os cabos serão interligados aos disjuntores com o uso de conectores pré-isolados tipo pino e aos barramentos neutro e terra com o uso de conectores pré isolados tipo olhal.

Disjuntores

Os disjuntores de baixa tensão deverão ser do tipo termomagnético, padrão
DIN, curva C, adequados para a fixação em trilhos DIN 35mm, tensão nominal adequada ao uso em 230/115V, frequência nominal de 60Hz, conforme especificação em projeto e planilha.

Cabos Alimentadores do Quadro de Distribuição:

Os cabos do alimentador da edificação, serão em cobre flexível na bitola de
16,0mm² com isolação em PVC 70°C, na tensão nominal de 0,6/1kV, com características de não propagação e auto-extinção de fogo.

Os cabos deverão ter as cores recomendadas pela Norma Brasileira e definidas em projeto:
Neutro: Azul Claro
Condutor de Proteção: Verde
Fases: Preto e Vermelho

Cabos de Rede Comum:

Os cabos do alimentador da edificação, serão em cobre flexível nas bitolas indicadas em projeto, com isolação em PVC 70°C, na tensão nominal de 450/750V, com características de não propagação e auto-extinção de fogo.

Os cabos deverão ter as cores recomendadas pela Norma Brasileira e definidas em projeto:
Neutro: Azul Claro
Condutor de Proteção: Verde
Retorno: Branco
Fases: Preto e Vermelho

Os cabos deverão ser identificados nas caixas de passagens principais da edificação, onde os circuitos deverão estar separados e identificados para facilitar a manutenção futura.

Disjuntores

Os disjuntores de baixa tensão deverão ser do tipo termomagnético, padrão DIN, curva C, adequados para a fixação em trilhos DIN 35mm, tensão nominal adequada ao uso em 230/115V, frequência nominal de 60Hz, conforme especificação em projeto e planilha.

Cabos Alimentadores do Quadro de Distribuição:

Os cabos do alimentador da edificação, serão em cobre flexível na bitola de4,0mm² com isolação em PVC 70°C, na tensão nominal de 0,6/1kV, com características de não propagação e auto extinção de fogo.

Os cabos deverão ter as cores recomendadas pela Norma Brasileira e definidas em projeto:
Neutro: Azul Claro

EL BANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 13
Rúbrica

Condutor de Proteção: Verde
Fases: Preto

Cabos de Rede Comum:

Os cabos do alimentador da edificação, serão em cobre flexível nas bitolas indicadas em projeto, com isolação em PVC 70°C, na tensão nominal de 450/750V, com caracteristicas de não propagação e auto-extinção de fogo.

Os cabos deverão ter as cores recomendadas pela Norma Brasileira e definidas
em projeto:

Neutro: Azul Claro
Condutor de Proteção: Verde
Retorno: Branco
Fases: Preto

Os cabos deverão ser identificados nas caixas de passagens principais da edificação, onde os circuitos deverão estar separados e identificados para facilitar a manutenção futura.

Conexões dos Cabos:

Emendas de cabos: Todas as emendas deverão ser realizadas conforme norma, ou seja, não é permitida a existência de emendas no interior de eletrodutos ou local inacessível e devem possuir boa conexão elétrica e resistência mecânica. Isolamento de emendas: Todas as emendas deverão ser isoladas com fita isolante de autofusão e finalizadas com fitas isolantes adesivas.

Identificação: Todos os cabos deverão ser agrupados em circuitos e identificados com etiqueta vinilicas dentro dos quadros e caixas de passagem.

Aterramento:

O esquema de aterramento da edificação será TN-S, com o neutro conecta dono aterramento apenas na mureta de medição. O aterramento será composto por três hastes de aterramento tipo copperweldde 5/8" x 3,0m com alta camada de cobre. As hastes serão dispostas em triângulo, espaçadas igualmente com distância mínima de 3,0m e conectadas com cabo de cobre nu 50,0mm² de 7 fios de 3,0mm. A conexão entre as hastes e o cabo de cobre nu será feita com solda exotérmica, visando evitar processos de oxidação comuns no uso de conectores, no intuito de possuir uma maior durabilidade das instalações.

Todas as partes metálicas normalmente não energizadas deverão sera terradas com cabos de cobre flexíveis com bitola mínima de 6,0mm² com isolação na cor verde.

4.4.3.1.2 Quadro a ser Implantado na escola:

QD2

O Quadro de Distribuição (QD2) será do tipo embutir, conforme projeto, será instalado no corredor de circulação da edificação, a uma altura de 1,50 m. O seu alimentador será proveniente do quadro de medição através de cabos 16mm² 0,6/1kVpara as fases, 16mm² 0,6/1kV para o neutro e 16mm² 0,6/1kV para a proteção (terra), isolação em PVC 70°C, e instalados em eletroduto de PVC rígido com bitola de 1¼", conforme projeto. Este quadro deverá obedecer ao solicitado no diagrama unifilar, multifilar e no esquemático interno contido no projeto.

No interior do QD2, serão instalados os seguintes componentes:

- Disjuntores conforme NBR 5410, padrão Europeu fixados em trilho DIN 35mm, curva C, capacidade de interrupção mínima de 3,0kA, monopolares e bipolares, de acordo com a norma NBR 60898;
- Dispositivos de Proteção Contra Surtos (DPS) entre fase e o terra e, entre neutro e terra:
- Classe II;
- Tensão Nominal 175V;
- Corrente nominal de 40kA para a onda 8/20 µs;
- Dispositivos diferenciais residuais tipo interruptor bipolar com corrente nominal 25ª e corrente diferencial residual de 30,0mA.

4.4.3.1.3 Tubulações e Rotas das Instalações Elétricas

EMERGENCY

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 14
Rúbrica

Rotas acima do forro:

Eletrodutos

- Os lances de eletrodutos devem ser menores que 15m e evitar trechos com mais de 2 curvas de 90°;
- Os eletrodutos deverão ser fixados acima do forro através de abraçadeiras tipo D com cunha ou tirantes rigidos;
- Eletrodutos serão rigidos de PVC roscável e terão bitola mínima de Ø3/4";
- Eletrodutos com Ø3/4": o raio interno das curvas deve ser maior que 150mm;
- Eletrodutos com Ø1": o raio interno das curvas deve ser maior que 320mm;
- As conexões dos Eletrodutos nas caixas de passagem e quadros deverão ser feitas com buchas e arruelas de alumínio.

Caixas de saída e passagem

Caixas de saída e passagem para dutos, serão em PVC ou aço pintado a pó, conforme projeto.

4.4.3.1.4 Rede de Iluminação

A rede de iluminação da escola tipo I foi projetada conforme as normas existentes, em especial a NBR 8995-1 2013 e RDC 50/2002.

Conforme definido em norma foram projetadas para o interior da escola as seguintes quantidades de lux, para cada ambiente:

Salas 300 lux
Circulação 200 lux
Direção 200 lux
Copa 300 lux

Luminárias

Iluminação de Emergência

Deve ser instalada iluminação de emergência de LED bivolt 20W nos locais previstos em projeto para prover iluminação adequada em caso de falta de energia, no intuito de evitar pânico e indicar a rota de fuga até a parte externa da edificação.

A luminária de emergência será instalada fixada diretamente no forro e alimentada por ponto de tomada 2P+T 20A localizado no forro.

Com as principais características:

- Alimentação por tomada no circuito exclusivo no quadro de distribuição;
- Acendimento automático;
- Sistema carregador automático;
- Circuito limitador de descarga de bateria;
- Baterias do tipo: "livre de manutenção" incorporadas internamente ao seugabinete;
- Recarga automática;
- Autonomia mínima de 1 hora com acionamento total da iluminação.

A Iluminação em Geral da edificação:

A iluminação da edificação é feita utilizando luminária tipo plafon na cor branca com soquete E-27 em porcelana 4A/250V e lâmpada LED tipo pera com potência de20W, cor 6500K e iluminância mínima de 1000 lumens;

A Iluminação em externa - arandelas:

A iluminação externa da edificação é feita utilizando luminária arandela tipo tartaruga, com vidro leitoso e corpo em metal com pintura a pó na cor branca com soquete E-27 em porcelana 4A/250V e lâmpada LED tipo pera com potência de 20W, cor branca 6500K e iluminância mínima de 500 lumens;

Interruptores: Deverão ser fornecidos completos, de embutir, conforme indicado em projeto, com placa, base monopolar, 10A/250V, cor branca.

4.4.3.1.5 Rede Comum

Tomadas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 15
Rúbrica

As tomadas de rede comum do piso deverão ser do tipo 2P+T em caixa de alumínio 4x4", com espelho, conforme indicado em projeto. As tomadas de rede comum das paredes deverão ser do tipo 2P+T em caixa de PVC 4x2" com espelho, para uma tomada, conforme projeto.

Deverão ser utilizadas tomadas, 2P+T 20A - 250V em ambientes externos, bancadas, abrigo do compressor e nos equipamentos específicos. Nos demais locais utilizar tomadas 2P+T 10A - 250V, todas deverão ser de cor branca.

Identificação:

Será executado identificação externa por meio de etiquetas contendo o Circuito, a tensão 127V ou 220V e a capacidade de corrente 10 ou 20A na parte externa da tampa e deverá existir identificação conforme indicado a seguir:

4.4.3.1.6 Ar Condicionado

O sistema de refrigeração da edificação será baseado no uso de Ar

Condicionado tipo Split com a potência de 12000BTU's na tensão 230V instaladas nos ambientes definidos em projeto.

4.4.3.2 REDE DE LÒGICA E TELEFÔNICA

A edificação não possuirá sistema de telefonia ou rede lógica, tendo em vista que na localidade não há concessionária de telefonia. Caso a edificação seja contemplada com internet via satélite, os equipamentos serão instalados na sala de comunicação já com rack adequado e serão alimentados pelas tomadas existentes com o uso de nobreak adequado. Nesse caso, não há a necessidade de cabeamento, pois são instalados sistemas wifi.

4.4.3.3 SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Realizou-se o cálculo do gerenciamento da análise de risco, conformeNBR5419/2015 parte 2, não sendo necessária a implantação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas para a proteção da edificação, uma vez que o valor isco calculado ficou abaixo do valor máximo normativo. Para tanto, deve ser instaladas apenas Medidas de Proteção contra Surtos – MPS baseados no uso de dispositivos de proteção contra surtos - DPS coordenados. Conforme será apresentado posteriormente.

Os DPS deverão ser instalados em dois pontos das instalações elétricas:

Entrada de energia:

Serão instalados de entrada de energia, em quadro de distribuição geral de baixa tensão instalado na face interna da mureta de medição, dois DPS classe I/II com tensão de 175V e capacidade de corrente de 12,5kA para onda 10/350µs e 60kA de capacidade de corrente para a onda 8/20µs. Os DPS serão instalados entre as duas fases e o barramento de proteção (terra). Nesse ponto, devido ao sistema TN-S, não há a necessidade de DPS para o neutro.

Quadro de distribuição da escola (QD2):

Serão instalados três DPS classe II com tensão de 175V e capacidade de corrente de 40kA para a onda 8/20µs. Os DPS serão instalados entre as duas fases e o barramento de terra e entre o neutro e o barramento de terra. O aterramento será o mesmo da entrada de energia, conforme descrito anteriormente.

O cálculo do gerenciamento da análise de risco foi feito utilizando o Software TUPAN 2018 em planilha Excel, desenvolvido e fornecido pela IEE/USP. A seguir é apresentado o resumo dos resultados obtidos.

Projeto:

Escola Municipal Indigena

Dimensões da estrutura

Zona: externa

Área de exposição equivalente AD [m2] 1193

Influências ambientais

Localização (cD): Estrutura isolada

Frequência de descarga para terra NG [1/km2/ano]: 3,8

Tipo de solo: Mármore, Cerâmico

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 16
Rúbrica

Tipo de estrutura:
Locais onde falhas de sistemas internos não causam perdas devidas humanas
Risco de incêndio (rf): Nenhum
Perigo especial (hz):
Dificuldade de evacuação (ex.:presença de pessoas imobilizadas-hospitais)
Número de pessoas na zona: 10
Serviços conectados:
Largura da blindagem ou distância entre as descidas w1 [m] 8,3333
Largura da blindagem ou distância entre as descidas w2 [m] 8,3333

Medidas de proteção

Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA): sem SPDA
Meios para restringir as consequências de incêndio (rp):
Extintores manuais, alarmes manuais, hidrantes, rotas de fuga protegidas ou compartimentos à prova de fogo
Contra tensão de toque ou passo na estrutura (PTA):
Nenhuma medida de proteção
Contra tensão de toque ou passo na linha (PTA):
Nenhuma medida de proteção

Atributos da linha conectada:

Linha de energia

Fator ambiental da linha: Rural
Fiação interna:
Não blindado precaução para evitar grandes laços
Tensão suportável de impulso atmosférico no sistema [kV] 2,5kV
Dispositivo de proteção contra Surto DPS (PSPD): I
Modo de instalação da linha (CI): Enterrado

Linha de telecomunicação

Fator ambiental da linha:
Nenhuma linha externa
Fiação interna:
Nenhuma linha externa
Tensão suportável de impulso atmosférico no sistema [kV]
Nenhuma linha externa
Dispositivo de proteção contra Surto DPS (PSPD):
Nenhuma linha externa
Modo de instalação da linha (CI):
Nenhuma linha externa

Resultado

4.4.4. FINAL DE OBRA

Ao final da obra todas as instalações deverão ser testadas e estarem em perfeito funcionamento, não apresentando qualquer avaria que impossibilite seu uso pleno em acordo com as normas técnicas brasileiras.
A instalação elétrica deverá possuir níveis adequados de tensão, conforme projeto.
As luminárias deverão ser entregues limpas e em funcionamento adequado.
O interior dos quadros, caixas de passagem e demais componentes elétricos deverá ser entregue limpo, livre de poeira e não deverá apresentar contatos vivos exposto são operador.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 17
Rúbrica

Os eletrodutos provenientes de caixas de passagens externas deverão ser entregues limpos e tampados com massa de calafetar para inibir a entrada de água, animais e insetos.

4.5 - Diversos

A placa de inauguração metálica, *40* cm x *60* cm e a placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, borda polida, de *25 x 8*, as cores serão definidas pela secretaria de educação municipal.

5. LOCAIS DE TRABALHO

Os trabalhos serão realizados na Construção da Escola Municipal Indígena Koko Xie Macuxi _ Comunidade São Mateus_Uiramutã /RR

6. SISTEMA DE TRABALHO

As atividades serão executadas por equipes de operários da Contratada, comandadas por seus encarregados. As equipes de trabalho deverão estar permanentemente uniformizadas e munidas de ferramentas, equipamentos proteção individual – EPI's, equipamentos de proteção coletiva – EPC's e materiais de consumo necessários à execução completa das tarefas. Caberá a Fiscalização elaborar a programação de serviços, supervisionar e fiscalizar a sua execução.

Os trabalhos serão executados de acordo com programação prévia, através de **Ordens de Serviço** indicando o tipo de trabalho a ser realizado, o efetivo de operários a ser utilizado, os locais de trabalho, os prazos de execução e o quantitativo do serviço.

Será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Uiramutã-RR o fornecimento de caminhões para o recolhimento da produção dos serviços.

A programação de serviços será repassada previamente à Contratada, por meio de **Ordens de Serviço** devidamente assinada pelo Executivo Municipal, ou seu preposto, onde deverão necessariamente constar as seguintes informações:

a) Tipo de serviço a ser executado;
b) Local de execução do serviço;
c) Horários de execução;
d) Prazo de execução;
e) Quantitativo físico do serviço (quando for viável a sua mensuração);

7. MEDIÇÃO E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS

O pagamento pela execução dos serviços será feito mensalmente, poderão ser antecipados desde que sejam comprovadas as proativas do cronograma físico, com o aprova da fiscalização de acordo com os quantitativos de serviços executados e medidos.

A medição dos serviços, para efeito de faturamento e cobrança, será feita em períodos mensais, segundo calendário oficial.

8. INSTALAÇÕES FÍSICAS

A Contratada deverá dispor de instalações físicas compatíveis com o tamanho do efetivo que utilizará na prestação dos serviços, devendo atender as Normas de Saúde e Segurança do Trabalho, em especial a **NR 9**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 18
Rúbrica

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. Tais locais deverão ser dotados de vestiários e sanitários para ambos os sexos, refeitórios e almoxarifado.

Recomenda-se que a Contratada disponha de postos de serviço, de forma a minimizar tempos de deslocamento, custos de transporte para as frentes e serviço e despesas com prestação de serviços em horários extraordinários, uma vez que deverão ser cumpridos os horários de execução das atividades determinados pelo FISCALIZAÇÃO.

Nos postos de trabalho cuja prestação de serviços seja de forma rotineira, como é o caso dos operários alocados nas atividades de limpeza externa e carregamento de descarregamento manual de caminhões, caberá ao Fiscalização, ou ao órgão de prestação dos serviços, dispor das instalações necessárias para uso destes operários.

9. HORÁRIOS DE TRABALHO

Em geral os serviços se darão dentro das jornadas definidas, a seguir:

Turnos e horários normais de trabalho

Horários: 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h

Turno: Segundas a Sábados

Os serviços cuja medição será feita por produtividade deverão ser iniciados, diariamente, no máximo 15 minutos após os horários de início dos turnos de trabalho definidos acima.

10. RECURSOS HUMANOS

Para a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico a Contratada deverá disponibilizar um número mínimo de operários, devidamente capacitados para as atividades nas quais serão alocados.

A alocação de número de operários igual ou superior ao exigido pelo Fiscalização, em determinada atividade, não o obriga ao pagamento pela total execução dos serviços programados, se estes não tiverem sido concluídos.

Além do número mínimo de operários exigido acima, a Contratada deverá possuir, **no mínimo**, os seguintes profissionais:

01 (um) Mestre de obras com dedicação exclusiva aos serviços prestados ao Município munido de telefone celular e com autonomia para tomar decisões imediatas e resolver problemas de cunho operacional e o engenheiro civil, responsável com contato de prontidão para dirimir dúvidas da equipe de trabalho e a fiscalização.

A Contratada deverá cumprir e fazer cumprir todas as determinações que, em matéria de saúde e segurança do trabalho, os diferentes estatutos legais determinam ou venham a determinar como de observância obrigatória pelas empresas que possuem empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, independentemente do tipo de contrato de trabalho firmado com seus trabalhadores. Este compromisso deverá contemplar as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n.º 3214 do Ministério do Trabalho, na sua redação atual e também nas alterações que esta eventualmente possa vir a sofrer durante o período de vigência do contrato.

Deverão ser oferecidas condições mínimas de saúde, através do desenvolvimento de ações em saúde e do provimento de materiais e equipamentos, que assegurem a segurança dos trabalhadores em relação à saúde e integridade dos mesmos especialmente dentro do ambiente de trabalho.

Todo pessoal envolvido na execução dos serviços, como operários, operadores de máquinas, encarregados, supervisores, gerente operacional e técnicos de segurança do trabalho, deverão ser do quadro funcional da Contratada, sendo vedada a subcontratação.

11. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

A empresa contratada deverá fornecer gratuitamente aos seus operários, no mínimo, os seguintes uniformes e EPI's:

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI - Fls. 19 Rúbrica

Camisetas em malha de algodão – 6 unidades por ano;
Calças – 4 unidades por ano;
Bonés – 2 unidades por ano;
Botinas de segurança – 2 pares por ano;
Botas de borracha/pvc – 1 par
Luvas de proteção – 12 unidades por ano (para todos os operários e com especificações de acordo com a atividade realizada);
Capas de chuva – 1 unidade por ano;
Coletes reflexivos – 1 unidade por ano;
Óculos de proteção – 2 unidades por ano (para operadores de roçadeira e sopradores, e demais integrantes da equipe de roçada);
Protetores auriculares – 2 unidades por ano (para operadores de roçadeira e sopradores, e demais integrantes da equipe de roçada);
Perneira de couro – 1 unidade por ano (para operadores de roçadeira); Protetor facial – 1 unidade a cada 2 anos (para os operários que portam a rede de proteção);
Protetor solar – para todos os operários e encarregados que executarem atividades expostas a raios solares.
Observação: Os operadores de motosserra deverão portar equipamentos de proteção individuais específicos para esta atividade.
As quantidades indicadas acima são mínimas. As peças deverão ser repostas gratuitamente sempre que se apresentarem desgastadas, destruídas ou impróprias para a sua finalidade. A Fiscalização poderá determinar a substituição dos equipamentos.
A responsabilidade pela manutenção, reposição e higienização destes materiais será de exclusividade da Contratada.
A critério dos Técnicos de Segurança do Trabalho da Contratada, poderão ser utilizados outros equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, além dos exigidos neste projeto básico.
Em nenhuma hipótese será permitido, parte dos trabalhadores da Contratada, o desenvolvimento dos serviços especificados neste projeto básico, sem a devida utilização dos uniformes e EPI's listados anteriormente.
Os equipamentos de proteção coletiva, listados anteriormente, deverão obedecer às seguintes especificações:
Rede de proteção: deverão ser confeccionadas em tela de aço, com malha de abertura com dimensões inferiores a 2mm (dois milímetros), altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) e largura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros). O modelo de rede a ser utilizado pela Contratada deve ser aprovado pela Fiscalização.
Cones de sinalização viária: deverão atender o que recomenda a NBR 15.071.
A critério dos Técnicos de Segurança do Trabalho da Contratada, poderão ser utilizados outros equipamentos de proteção coletiva, além dos exigidos neste projeto básico.

12. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

As ferramentas e equipamentos necessários a execução dos serviços deverão ser fornecidas pela Contratada, devendo estar permanentemente disponíveis para uso nos serviços contratados.
Deverão ser disponibilizados para uso, quantidades mínimas de ferramentas e equipamentos.
A indisponibilidade de ferramentas para execução das atividades nas unidades de serviço, além das sanções contratuais cabíveis, implicará no não pagamento das horas de trabalho dos operários designados para as tarefas.
As ferramentas e equipamentos deverão obedecer às seguintes especificações:
Vassouras: As vassouras utilizadas no serviço de varrição manual deverão ter cerdas medianamente rígidas, cujo comprimento não poderá ser inferior à 12 (doze) centímetros, e com cabo de comprimento

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 20
Rúbrica
PMU

ergonomicamente compatível com a estatura do varredor, de modo a não exigir a curvatura da coluna vertebral durante a execução do serviço. A cepa e o cabo deverão ser confeccionados em material leve e resistente.

13. MATERIAIS DE CONSUMO

Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todo material necessário à operação dos sopradores, roçadeiras e motosserras, tais como: combustiveis, óleos, graxas e acessórios de corte, sendo também de sua responsabilidade a manutenção das mesmas.

Os **sacos de lixo** necessários ao acondicionamento dos resíduos resultantes dos serviços de varrição, roçada e limpezas diversas deverão ser fornecidos pela

Contratada, de acordo com as seguintes especificações:

□□Capacidade em volume não inferior a 100 litros;

□□Espessura do filme não inferior a 0,03 mm;

□□Largura de 75 cm, com variação admissível de 2 cm;

□□Comprimento de 105 cm, com variação admissível de 2,5 cm;

□□Resistência longitudinal a tração do filme não inferior a 2 N/cm;

□□Resistência transversal a tração do filme não inferior a 2 N/cm.

14. FISCALIZAÇÃO

Caberá à Fiscalização designada o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais. A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver havendo atendimento às cláusulas contratuais.

A Fiscalização terá direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da Contratada, alocado na prestação de serviços, cuja produtividade não estiver sendo satisfatória. Também terá poderes para solicitar a substituição de funcionários que apresentarem comportamento desrespeitoso para com a população, estiverem drogados ou alcoolizados ou que estiverem solicitando propina.

15. OBRIGAÇÕES DA(S) CONTRATADA(S)

Além das disposições contidas neste projeto básico, a Empresa Contratada estará sujeita às seguintes obrigações:

15.1. Disponibilizar o número mínimo de operários, indicados neste Projeto Básico;

15.2. Quando houver necessidade de alteração no quantitativo do efetivo a serviço da Prefeitura, promover esta alteração no prazo máximo de 07 (sete) dias a contar da data da solicitação;

15.3. Manter seus funcionários sempre identificados e uniformizados durante a execução dos serviços;

15.4. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionários em serviço, causados a terceiros ou a Prefeitura, mesmo quando utilizando equipamentos da Prefeitura;

15.5. Capacitar seus funcionários ao uso dos equipamentos e ferramentas postos a sua disposição para a execução das tarefas;

15.6. Executar o serviço de forma silenciosa, ordeira e com urbanidade para com a população;

15.7. Substituir qualquer componente da equipe que apresentar comportamento inadequado ou indecoroso ou não demonstrar qualificação para os serviços, objeto deste Projeto Básico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

15.8. Não permitir que componentes das equipes de trabalho, enquanto estiverem a serviço da Prefeitura, executem serviço para terceiros;

15.9. Manter as equipes de trabalho com todas as ferramentas, equipamentos e insumos exigidos no Projeto Básico em perfeitas condições de uso;

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 21
Rúbrica

15.10. Não permitir que seus funcionários solicitem à população gratificações ou contribuições materiais de qualquer espécie, mesmo quando da ocorrência de datas festivas;
15.11. Manter nas frentes de serviço pessoa autorizada a atender e fazer cumprir as determinações da Fiscalização;
15.12. Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela Fiscalização na execução dos serviços;
15.13. Manter a Fiscalização atualizado quanto à frota utilizada para transporte
dos operários e ferramentas/equipamentos ocupados na execução dos serviços, informando placas e prefixos de cada veículo;
15.14. Fornecer, ao supervisor, telefone celular, que deverá permanecer ligado enquanto houver serviços em execução;
15.15. Cumprir todas as disposições legais pertinentes à saúde e segurança do trabalho as quais estão sujeitos contratos de trabalho regidos pela CLT, independente do seu quadro de pessoal enquadrar-se nesta situação;
15.16. Acatar, em todos os seus termos, as determinações de segurança que venham a ser implantadas através de Ordens de Serviço expedidas;
15.17. Atender a todas as solicitações feitas pela Fiscalização para o fornecimento de informações e dados sobre os serviços, indicadores de acidentes de trabalho ou outros referentes à gestão de medicina e segurança do trabalho, dentro dos prazos estipulados;
15.18. Promover a vacinação de todos funcionários contra gripe, hepatite B e tétano, devido à exposição, durante o processo de trabalho, a intempéries e agentes biológicos potencialmente infectantes;
15.19. Desenvolver programa de capacitação contínua para prevenção de acidentes, com a realização de capacitação admissional e reciclagem, com frequência trimestral ou inferior;
15.20. Prover treinamento básico em primeiros socorros, bem como materiais de primeiros socorros que fiquem próximos e de fácil acesso aos funcionários, quando no exercício das tarefas de trabalho – Caixa de Primeiros Socorros;
15.21. Fornecer água fresca e potável, armazenada em recipientes adequados, para todos os trabalhadores, conforme especificação da Norma Regulamentadora n.°24 da portaria n.°3.214 do Ministério do Trabalho.
15.22. Disponibilizar banheiros equipados com vasos sanitários e lavatórios para os trabalhadores das equipes que prestam serviços externos, conforme especificação da Norma Regulamentadora n.°24 da portaria n.°3.2 14 do Ministério do Trabalho.
15.23. Obter, se necessário, alvarás e licenciamentos para suas atividades e instalações físicas, tanto próprias, como locadas, ou cedidas por meio de termo de cessão de uso.
15.24. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do contrato;

16. PENALIDADES

O não cumprimento das obrigações dispostas neste projeto básico sujeitará a Contratada, inicialmente, a aplicação da pena de advertência por escrito. Na hipótese de reincidência de qualquer tipo de transgressão, serão aplicadas as seguintes penalidades pecuniárias:
16.1. Por não dispor das ferramentas e/ou equipamentos nas quantidades, especificações e estado de conservação determinados neste projeto básico. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.2. Por executar serviços em vias públicas com trânsito de veículos sem sinalização, ou com sinalização inadequada. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.3. Por executar serviços de roçada com roçadeiras mecânicas sem a utilização de redes de proteção. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.

EN BLANCO

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 22
Rúbrica

16.4. Por danificar o caule de árvores com a utilização de roçadeiras mecânicas.
Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.5. Por utilizar materiais de consumo (sacos de lixo ou tinta para pintura de meio-fio) em desacordo com as especificações deste projeto básico. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.6. Por não dispor da quantidade mínima de operários definidos neste projeto básico, por local, por turno de trabalho e por atividade. Multa de 1 a 10 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por operário, por dia.
16.7. Por não dispor de encarregados e supervisores nas equipes de trabalho. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por encarregado/supervisor, por dia.
16.8. Por permitir que operários executem as atividades sem o uso dos uniformes e equipamentos de proteção individual exigidos neste projeto básico. Multa de 1 a 10 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por operário, por dia.
16.9. Por transportar operários e/ou encarregados em veículos não adequados ao transporte de pessoal. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.10. Por não atendimento as **Ordens de Serviço** expedidas pela Prefeitura, por causas que se caracterizem como de responsabilidade da Contratada, tanto por ação, como por omissão. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.11. Por não cumprir a programação mensal de varrição, por causas que se caracterizem como de responsabilidade da Contratada, tanto por ação, quanto por omissão. Multa de 0,1 a 1 vez o valor unitário da varrição, por quilômetro de meio-fio não varrido.
16.12. Pela descarga ou colocação de produção dos serviços em locais não pela Fiscalização. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.13. Por não cumprir os horários de início e fim das jornadas de trabalho, ressalvadas as tolerâncias de tempo para deslocamento, previstas neste projeto básico. Multa de 0,1 a 1 vez o valor unitário do serviço de varrição contratado, por operário, por dia. Sem prejuízo do desconto na medição do serviço.
16.14. Por não manter a frota de veículos utilizados para a adequada prestação dos serviços nas condições exigidas neste projeto básico. Multa de 1 a 10 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por veículo, por dia.
16.15. Por não atender a solicitação de informações da Fiscalização, dentro dos prazos estipulados. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.16. Por não sanar, no prazo estipulado, irregularidades identificadas pela fiscalização. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.17. Por comportamento desrespeitoso de funcionários com a população durante a execução dos serviços. Multa de 2 a 20 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.18. Por promover, para comercialização ou quaisquer fins, a triagem dos resíduos coletados. Multa de 1 a 10 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.19. Por solicitação de contribuições ou gratificações aos munícipes. Multa de
2 a 20 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.20. Por não atender, dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, pedido de substituição de funcionário. Multa de 1 a 10 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por funcionário, por dia.
16.21. Por não manter, durante os horários de prestação de serviços, seus supervisores munidos de telefone celular em funcionamento. Multa de 5 a 50 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.
16.22. Por executar, durante os horários de prestação dos serviços, com os equipamentos e/ou as equipes de pessoal, outros serviços que não sejam objeto do contrato com a Prefeitura. Multa de 10 a 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por ocorrência.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 23
Rúbrica
PMU

16.23. Por atrasar o inicio da prestação dos serviços, conforme data aprazada na "Ordem de Início dos Serviços" a ser expedida pela Prefeitura após a assinatura do contrato. Multa de 100 vezes o valor unitário do serviço de varrição contratado, por dia de atraso.
16.24. Por não atender às demais obrigações contratuais. Multa de 10 a 100 vezes o preço unitário do contrato, por irregularidade.
16.25. Para graduação das penalidades pecuniárias, serão adotadas as seguintes escalas:

- Na segunda e na terceira ocorrência de mesma natureza, valor mínimo previsto;
- Na quarta e na quinta ocorrência de mesma natureza, 5 (cinco) vezes o valor mínimo previsto;
- A partir da sexta ocorrência de mesma natureza, para cada ocorrência, o valor máximo previsto.

Além dos motivos previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93 para rescisão do contrato, A Prefeitura poderá rescindi-lo, também, unilateralmente, na ocorrência dos seguintes fatos:

- A paralisação total ou parcial do serviço;
- A subcontratação parcial ou total do serviço;
- O cometimento reiterado de faltas, com aplicação de penalidades também reiteradas.

17. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

As despesas decorrentes da execução do Contrato a ser firmado correrão, no Exercício de 2021, à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho: 12.365.3400.1020.0000
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00
Tipo de Empenho: Do Valor Global
Fontes: RECURSOS DO FUNDEB 30%

Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos com desoneração é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal, pois apresenta a planilha orçamentária de menor valor no comparativo dos valores das planilhas orçamentárias com preços onerados e desonerados, adotou se a NÃO desonerado e será usada no processo.
Conforme Art. 14 e 38 da Lei 8.666/93 c/c art.16, II da LRF, aprovada e assinada pela autoridade competente e fara face às despesas da pretendida Contratação
Serão emitidas Notas de Empenho global à conta da dotação orçamentária especificada neste item, para atender às despesas inerentes à execução do Contrato.

18. PREÇO

O valor anual estimado do presente orçamento é de R$ 516.468,16 **(quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos).**

19. PRAZO DE EXECUÇÃO

O presente contrato deverá ser executado em **60 (Sessenta) dias**, de forma continua e ininterrupta.

20. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a assinatura do contrato, a Empresa Contratada terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para providenciar o pessoal, ferramentas, equipamentos e instalações necessários à execução dos serviços, conforme definido neste projeto básico.
No final deste prazo, o Prefeito Municipal, acompanhado de seu corpo técnico, procederá visita de vistoria à Empresa, para constatar "in loco" o atendimento integral às condições do contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 24 Rúbrica

21. A APROVAÇÃO

O presente Projeto Básico será submetido à apreciação e aprovação do Senhor Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, nos termos do art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

Uiramutã-RR, 13 de setembro de 2022.

AUTOR DO PROJETO:

Engº Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 0905404068
Autor / Responsável Técnico

APROVO:

Vanderlane James Lima
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Port. 459/2022

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 25
Rúbrica

PLANILHAS DE ORÇAMENTÁRIA (ANEXO 1 DISPONIBILIZADO EM MÍDIA)

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 26
Rúbrica

PLANILHAS COM

BDI

NÃO DESONERADO

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 27
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva-Comunidade Caraparú I_Uiramutã_RR

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Roraima
ORSE - 07/2022 - Sergipe

B.D.I.
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.819,22	4,22 %
2	ALIMENTAÇÃO CANTEIRO	20.673,16	4,00 %
3	DIVERSOS	14.924,32	2,89 %
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	66.938,89	12,96 %
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	22.718,58	4,40 %
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	24.532,96	4,75 %
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	30.051,79	5,82 %
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	21.246,57	4,11 %
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	35.019,46	6,78 %
10	REVESTIMENTO	41.475,24	8,03 %
11	PINTURA	16.190,39	3,13 %
12	ABRIGO DO GÁS DE COZINHA	2.896,19	0,56 %
13	COBERTURA	42.002,35	8,13 %
14	PAVIMENTAÇÃO	42.873,37	8,30 %
15	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	4.705,55	0,91 %
16	CALÇADA DE PROTEÇÃO	18.594,36	3,60 %
17	ESQUADRIAS	20.005,04	3,87 %
18	LOUÇAS E METAIS	8.620,67	1,67 %
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	12.244,54	2,37 %
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	19.461,49	3,77 %
21	COMBATE A INCÊNDIO	641,21	0,12 %
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	28.832,80	5,58 %

Tipo de Licitação: Convite
Abertura da Licitação:
Número do Processo Licitatório: Processo Administrativo nº

Total sem BDI: 413.589,78
Total do BDI: 102.878,38
Total Geral: 516.468,16

Engª Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 0605404068

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 28
Rúbrica

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Ko´ko Tereza da Silva-Comunidade Caraparú I_Uiramutã_RR

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Roraima
ORSE - 07/2022 - Sergipe

B.D.I.
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					21.819,22	4,22 %
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64	107,36	134,15	8.585,60	1,66 %
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	5.295,15	6.616,81	13.233,62	2,56 %
2			ALIMENTAÇÃO CANTEIRO					20.673,18	4,00 %
2.1	3126	ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	1182	14,00	17,49	20.673,18	4,00 %
3			DIVERSOS					14.924,32	2,89 %
3.1	00010848	SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	UN	1	1.341,68	1.676,56	1.676,56	0,32 %
3.2	00010851	SINAPI	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 8mm fornecimento e instalação	UN	6	70,83	88,50	531,00	0,10 %
3.3	11397	ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	un	1	750,00	937,20	937,20	0,18 %
3.4	00010527	SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	90,45	13,20	16,49	1.491,52	0,29 %
3.5	2412	ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	un	8	783,36	978,88	7.831,04	1,52 %
3.6	2450	ORSE	Limpeza geral (final da obra)	m²	900	2,19	2,73	2.457,00	0,48 %
4			MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					66.938,89	12,96 %
4.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	3,6	550,87	688,36	2.478,09	0,48 %
4.2	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	613,28	766,35	766,35	0,15 %
4.3	11125	ORSE	Entrada provisoria de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1	2.205,77	2.756,33	2.756,33	0,53 %
4.4	62	ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e	un	1	14.992,56	18.734,70	18.734,70	3,63 %
4.5	99059	SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	35	42,57	53,19	1.861,65	0,36 %
4.6	98524	SINAPI	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	m²	900	2,60	3,24	2.916,00	0,56 %
4.7	9203	ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	35729,81	0,50	0,62	22.152,48	4,29 %
4.8	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13397,63	0,92	1,14	15.273,29	2,96 %
5			INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES					22.718,58	4,40 %
5.1	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	7,8	68,75	85,91	670,09	0,13 %
5.2	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	2	41,68	52,08	104,16	0,02 %
5.3	92263	SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	26,2	147,28	184,04	4.821,84	0,93 %
5.4	92415	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	26,2	119,45	149,26	3.910,61	0,76 %
5.5	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	14,8	37,80	47,23	699,00	0,14 %
5.6	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,8	726,75	908,14	4.359,07	0,84 %
5.7	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,8	191,34	239,09	1.147,63	0,22 %
5.8	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	39,76	21,73	27,15	1.079,48	0,21 %
5.9	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	273,12	17,37	21,70	5.926,70	1,15 %
6			INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME					24.532,96	4,75 %
6.1	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	1,66	68,75	85,91	142,61	0,03 %
6.2	96539	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	38,78	111,41	139,21	5.120,14	0,99 %
6.3	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	13,4	37,80	47,23	632,88	0,12 %
6.4	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,87	726,75	908,14	4.422,64	0,86 %
6.5	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,87	191,34	239,09	1.164,36	0,23 %
6.6	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	62,97	21,73	27,15	1.709,63	0,33 %
6.7	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	148,7	19,41	24,25	3.605,97	0,70 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 29
Rúbrica

6.8	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	25,93	160,45	200,49	5.198,70	1,01 %
6.9	98557 SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfáltica, duas demãos	m²	53,65	37,83	47,27	2.536,03	0,49 %
7		**SUPERESTRUTURA - PILARES**					**30.051,78**	**5,82 %**
7.1	92263 SINAPI	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44	147,28	184,04	11.307,41	2,19 %
7.2	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44	119,45	149,26	9.170,53	1,78 %
7.3	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	3,34	726,75	908,14	3.033,18	0,59 %
7.4	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,34	191,34	239,09	798,56	0,15 %
7.5	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	65,63	21,73	27,15	1.781,85	0,35 %
7.6	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	182,5	17,37	21,70	3.960,25	0,77 %
8		**SUPERESTRUTURA - VIGAS**					**21.246,57**	**4,11 %**
8.1	92265 SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	38,88	117,63	146,99	5.714,97	1,11 %
8.2	92455 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	38,88	128,86	161,02	6.260,45	1,21 %
8.3	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	3,74	726,75	908,14	3.396,44	0,66 %
8.4	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,74	191,34	239,09	894,19	0,17 %
8.5	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	65,43	21,73	27,15	1.776,42	0,34 %
8.6	92776 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	124,19	20,65	25,80	3.204,10	0,62 %
9		**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**					**35.019,46**	**6,78 %**
9.1	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	203,04	116,45	145,51	29.544,35	5,72 %
9.2	93201 SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (esoessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e	M	55,83	6,24	7,79	434,91	0,08 %
9.3	93186 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	23	66,32	82,87	1.906,01	0,37 %
9.4	93188 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	22	57,57	71,93	1.582,46	0,31 %
9.5	93196 SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	19	65,36	81,67	1.551,73	0,30 %
10		**REVESTIMENTO**					**41.475,24**	**8,03 %**
10.1	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	406,08	7,65	9,55	3.878,06	0,75 %
10.2	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	406,08	36,80	45,98	18.671,55	3,62 %
10.3	87528 SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	m²	111,36	43,62	54,50	6.069,12	1,18 %
10.4	87274 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	111,36	92,39	115,45	12.856,51	2,49 %
11		**PINTURA**					**16.190,39**	**3,13 %**
11.1	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	406,08	2,30	2,87	1.165,44	0,23 %
11.2	88497 SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	m²	203,04	14,27	17,83	3.620,20	0,70 %
11.3	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	203,04	17,44	21,79	4.424,24	0,86 %
11.4	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta acetinada em paredes, duas demãos.	m²	406,08	13,76	17,19	6.980,51	1,35 %
12		**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**					**2.896,19**	**0,56 %**
12.1	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	1,2	116,45	145,51	174,61	0,03 %
12.2	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	2,6	7,65	9,55	24,83	0,00 %
12.3	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	2,6	36,80	45,98	119,54	0,02 %
12.4	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	3,98	2,30	2,87	11,42	0,00 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 30 Rúbrica

12.5	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	3,98	17,44	21,79	86,72	0,02 %
12.6	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos	m²	3,98	13,76	17,19	68,41	0,01 %
12.7	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1): preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	1,46	726,75	908,14	1.325,88	0,26 %
12.8	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,46	191,34	239,09	349,07	0,07 %
12.9	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICÕES. AF_12/2019	m²	1	588,76	735,71	735,71	0,14 %
13		**COBERTURA**					**42.002,35**	**8,13 %**
13.1	283 ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	185,13	61,23	76,51	14.164,29	2,74 %
13.2	92540 SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	185,13	54,03	67,51	12.498,12	2,42 %
13.3	94223 SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	M	32,24	111,49	139,31	4.491,35	0,87 %
13.4	55960 SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	185,13	6,03	7,53	1.394,02	0,27 %
13.5	4449 ORSE	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro	m²	130,57	57,95	72,41	9.454,57	1,83 %
14		**PAVIMENTAÇÃO**					**42.873,37**	**8,30 %**
14.1	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	19,57	41,68	52,08	1.019,20	0,20 %
14.2	87690 SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	130,57	58,26	72,80	9.505,49	1,84 %
14.3	87630 SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	130,57	46,39	57,96	7.567,83	1,47 %
14.4	87255 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	130,57	137,82	172,21	22.485,45	4,35 %
14.5	88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X80CM. AF_06/2014	M	92	19,97	24,95	2.295,40	0,44 %
15		**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**					**4.705,55**	**0,91 %**
15.1	98689 SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF_06/2018	M	4,5	112,21	140,21	630,94	0,12 %
15.2	88648 SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm	M	96,06	8,95	11,18	1.073,95	0,21 %
15.3	101965 SINAPI	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	M	18,8	127,73	159,61	3.000,66	0,58 %
16		**CALÇADA DE PROTEÇÃO**					**18.594,36**	**3,60 %**
16.1	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	3,97	68,75	85,91	341,06	0,07 %
16.2	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	2,78	41,68	52,08	144,78	0,03 %
16.3	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	19,9	160,45	200,49	3.989,75	0,77 %
16.4	94994 SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	72,77	139,44	174,24	12.679,44	2,46 %
16.5	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	25,92	7,65	9,55	247,53	0,05 %
16.6	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	25,92	36,80	45,98	1.191,80	0,23 %
17		**ESQUADRIAS**					**20.005,04**	**3,87 %**
17.1	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	310,43	387,91	1.939,55	0,38 %
17.2	94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18	781,55	976,62	17.579,16	3,40 %
17.3	94559 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,48	810,82	1.013,20	486,33	0,09 %
18		**LOUÇAS E METAIS**					**8.620,67**	**1,67 %**
18.1	2390 ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	un	2	188,30	235,29	470,58	0,09 %
18.2	8974 ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com oés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	un	2	1.065,16	1.331,02	2.662,04	0,52 %
18.3	95546 SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	UN	2	141,76	177,14	354,28	0,07 %
18.4	86931 SINAPI	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2	452,91	565,95	1.131,90	0,22 %
18.5	00000377 SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	UN	2	35,25	44,04	88,08	0,02 %
18.6	86943 SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	UN	3	209,09	261,27	783,81	0,15 %
18.7	2050 ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	un	2	25,21	31,50	63,00	0,01 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 31
Rúbrica

18.8	2103 ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	un	1	823,50	1.029,04	1.029,04	0,20 %
18.9	2093 ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,valvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	un	1	1.630,88	2.037,94	2.037,94	0,39 %
19		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**12.244,54**	**2,37 %**
19.1	93243 SINAPI	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saida, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'Água em polietileno	UN	1	6.872,09	8.587,36	8.587,36	1,66 %
19.2	89446 SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	M	28,9	5,76	7,19	207,79	0,04 %
19.3	89448 SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	M	30,1	17,32	21,64	651,36	0,13 %
19.4	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	19,75	12,41	15,50	306,12	0,06 %
19.5	89362 SINAPI	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	UN	8	8,20	10,24	81,92	0,02 %
19.6	89364 SINAPI	Curva 90° soldável 25 mm água fria	UN	2	11,16	13,94	27,88	0,01 %
19.7	90373 SINAPI	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	11	14,02	17,51	192,61	0,04 %
19.8	1144 ORSE	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	un	6	13,26	16,56	99,36	0,02 %
19.9	89497 SINAPI	Joelho 90° soldável 40mm água fria	UN	3	12,29	15,35	46,05	0,01 %
19.10	1466 ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	3	102,73	128,37	385,11	0,07 %
19.11	89383 SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	UN	14	5,81	7,26	101,64	0,02 %
19.12	1470 ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	1	80,52	100,61	100,61	0,02 %
19.13	89395 SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	8	11,40	14,24	85,44	0,02 %
19.14	89420 SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	1	9,31	11,63	11,63	0,00 %
19.15	89623 SINAPI	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	UN	5	19,33	24,15	120,75	0,02 %
19.16	3147 ORSE	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	1	19,02	23,76	23,76	0,00 %
19.17	94491 SINAPI	Registro de esfera soldável 40mm	UN	1	43,62	54,50	54,50	0,01 %
19.18	94489 SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	UN	1	21,79	27,22	27,22	0,01 %
19.19	74166/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	752,69	940,56	940,56	0,18 %
19.20	2082 ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3	51,45	64,29	192,87	0,04 %
20		**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**19.461,49**	**3,77 %**
20.1	89711 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	M	9,1	18,38	22,96	208,93	0,04 %
20.2	89712 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	12,4	26,93	33,65	417,26	0,08 %
20.3	89714 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	28	51,65	64,54	1.807,12	0,35 %
20.4	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	8,4	12,41	15,50	130,20	0,03 %
20.5	89796 SINAPI	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	3	37,24	46,53	139,59	0,03 %
20.6	1588 ORSE	Tê sanitário em PVC rigido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	un	1	48,25	60,29	60,29	0,01 %
20.7	89785 SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	1	19,93	24,90	24,90	0,00 %
20.8	1603 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	un	10	11,22	14,02	140,20	0,03 %
20.9	1554 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	un	10	10,84	13,54	135,40	0,03 %
20.10	89744 SINAPI	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	UN	4	22,56	28,19	112,76	0,02 %
20.11	89732 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	UN	1	10,64	13,29	13,29	0,00 %
20.12	89726 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	UN	2	6,51	8,13	16,26	0,00 %
20.13	89750 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	2	59,30	74,10	148,20	0,03 %
20.14	89735 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	2	18,05	22,55	45,10	0,01 %
20.15	89709 SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	3	9,98	12,47	37,41	0,01 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 32
Rúbrica

20.16	89707 SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no mínimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	UN	3	27,35	34,17	102,51	0,02 %
20.17	1536 ORSE	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	2	18,57	23,20	46,40	0,01 %
20.18	98078 SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	1	4.377,10	5.469,62	5.469,62	1,06 %
20.19	98082 SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	1	4.060,18	5.073,57	5.073,57	0,98 %
20.20	2798 ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforcada, revestida internamente com barra lisa e fundo em	un	8	533,42	666,56	5.332,48	1,03 %
21		**COMBATE A INCÊNDIO**					**641,21**	**0,12 %**
21.1	101909 SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	2	215,71	269,55	539,10	0,10 %
21.2	10383 ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	2	24,97	31,20	62,40	0,01 %
21.3	11852 ORSE	Placa de sinalização padrão para saida de emergência 400x120mm	Un	1	31,78	39,71	39,71	0,01 %
22		**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**28.832,80**	**5,58 %**
22.1	91940 SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	46	14,35	17,93	824,78	0,16 %
22.2	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	62,6	2,81	3,51	219,72	0,04 %
22.3	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	76,6	2,81	3,51	268,86	0,05 %
22.4	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	52,6	2,81	3,51	184,62	0,04 %
22.5	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	142,2	2,81	3,51	499,12	0,10 %
22.6	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	142,2	4,13	5,16	733,75	0,14 %
22.7	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	82,6	4,13	5,16	426,21	0,08 %
22.8	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	188,3	4,13	5,16	971,62	0,19 %
22.9	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	153,9	4,13	5,16	794,12	0,15 %
22.10	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base composto de PVC, sem	M	40	25,10	31,36	1.254,40	0,24 %
22.11	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base composto de PVC, sem	M	40	25,10	31,36	1.254,40	0,24 %
22.12	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base composto de PVC, sem	M	40	25,10	31,36	1.254,40	0,24 %
22.13	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base composto de PVC, sem	M	40	25,10	31,36	1.254,40	0,24 %
22.14	2794 ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	un	3	274,28	342,74	1.028,22	0,20 %
22.15	91993 SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	UN	14	38,99	48,72	682,08	0,13 %
22.16	91973 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	81,59	101,95	203,90	0,04 %
22.17	91957 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	43,47	54,32	108,64	0,02 %
22.18	91969 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	68,66	85,79	171,58	0,03 %
22.19	91953 SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	2	23,95	29,92	59,84	0,01 %
22.20	91959 SINAPI	Interruptor simples (2 modulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	1	37,84	47,28	47,28	0,01 %
22.21	12241 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	275,71	344,52	344,52	0,07 %
22.22	10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo	un	2	122,14	152,62	305,24	0,06 %
22.23	93662 SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo	UN	6	55,41	69,24	415,44	0,08 %
22.24	93655 SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	UN	8	12,28	15,34	122,72	0,02 %
22.25	91863 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	M	75	11,60	14,49	1.086,75	0,21 %
22.26	91864 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	M	9,4	15,35	19,18	180,29	0,03 %
22.27	91871 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	M	50,3	12,29	15,35	772,10	0,15 %
22.28	91872 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	M	6	16,03	20,03	120,18	0,02 %
22.29	91873 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	M	36	19,71	24,62	886,32	0,17 %
22.30	90447 SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmetro menor ou igual a 40mm	M	57,8	6,19	7,73	446,79	0,09 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 33
Rúbrica

22.31	8324 ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma	un	29	9,67	12,08	350,32	0,07 %
22.32	97807 SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W	UN	5	137,10	171,32	856,60	0,17 %
22.33	11857 ORSE	Lâmpada tubular led T8, 16w, bivolt	un	31	27,48	34,35	1.064,85	0,21 %
22.34	97599 SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	UN	3	26,61	33,25	99,75	0,02 %
22.35	96985 SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por	UN	3	81,94	102,39	307,17	0,06 %
22.36	96977 SINAPI	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR	M	10	59,24	74,02	740,20	0,14 %
22.37	4192 ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	un	2	11,95	14,93	29,86	0,01 %
22.38	4014 ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20	Un	3	8,78	10,97	32,91	0,01 %
22.39	4015 ORSE	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação.	Un	3	12,60	15,74	47,22	0,01 %
22.40	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	4,5	68,75	85,91	386,59	0,07 %
22.41	96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	3,5	41,68	52,08	182,28	0,04 %
22.42	101502 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) AF_07/2020_P	UN	1	1.728,29	2.159,67	2.159,67	0,42 %
22.43	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	585,13	731,17	1.462,34	0,28 %
22.44	12628 ORSE	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1	3.353,68	4.190,75	4.190,75	0,81 %

Tipo de Licitação	Convite	**Total sem BDI**	**413.589,78**
Abertura da Licitação		**Total do BDI**	**102.878,38**
Número do Processo Licitatório	Processo Administrativo n°	**Total Geral**	**516.468,16**

Engª Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 090549606-8

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 34 Rúbrica

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva- Comunidade Caraparú I_Uiramutã_RR

Bancos
SINAPI 07/22 RR
ORSE 07/22 SE

B.D.I.
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		21.819,22	5.454,81	5.454,81	5.454,81	5.454,81
2	ALIMENTAÇÃO CANTEIRO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		20.673,18	5.168,30	5.168,30	5.168,30	5.168,30
3	DIVERSOS	100,00%	100,00%			
		14.924,32	14.924,32			
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	100,00%	100,00%			
		66.938,89	66.938,89			
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	100,00%	100,00%			
		22.718,58	22.718,58			
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	100,00%		100,00%		
		24.532,96		24.532,96		
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	100,00%		25,00%	75,00%	
		30.051,78		7.512,95	22.538,84	
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	100,00%			60,00%	40,00%
		21.246,57			12.747,94	8.498,63
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	100,00%				100,00%
		35.019,46				35.019,46
10	REVESTIMENTO	100,00%				100,00%
		41.475,24				41.475,24
11	PINTURA	100,00%			20,00%	80,00%
		16.190,39			3.238,08	12.952,31
12	ABRIGO DO GÁS DE COZINHA	100,00%			75,00%	25,00%
		2.896,19			2.172,14	724,05
13	COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%		
		42.002,35	21.001,18	21.001,18		
14	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		25,00%	75,00%	
		42.873,37		10.718,34	32.155,03	
15	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	100,00%			100,00%	
		4.705,55			4.705,55	
16	CALÇADA DE PROTEÇÃO	100,00%		50,00%	50,00%	
		18.594,36		9.297,18	9.297,18	
17	ESQUADRIAS	100,00%			100,00%	
		20.005,04			20.005,04	
18	LOUÇAS E METAIS	100,00%			50,00%	50,00%
		8.620,67			4.310,34	4.310,34
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%		15,00%	45,00%	40,00%
		12.244,54		1.836,68	5.510,04	4.897,82
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%		15,00%	45,00%	40,00%
		19.461,49		2.919,22	8.757,67	7.784,60
21	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%				100,00%
		641,21				641,21
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%		15,00%	45,00%	40,00%
		28.832,80		4.324,92	12.974,76	11.533,12
Porcentagem			**26,37%**	**17,96%**	**28,86%**	**26,81%**
Custo			**136.206,07**	**92.766,53**	**149.035,70**	**138.459,86**
Porcentagem Acumulado			**26,37%**	**44,33%**	**73,19%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**136.206,06**	**228.972,59**	**378.008,29**	**516.468,16**

Engº Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 0905404068

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 35
Rúbrica

OBJETO:
Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva- Comunidade Caraparú I_Uiramutã_RR

Banco
SINAPI 07/22 RR
ORSE 07/22 SE

Encargos Sociais (Não Desonerado):
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

LOCAL: MUNÍCIPIO UIRAMUTA / RR

B.D.I. 24,96%

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A -	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	20,00%	20,00%
A2	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1,50%	1,50%
A3	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	1,00%	1,00%
A4	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA	0,20%	0,20%
A5	SERVIÇO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8,00%	8,00%
A9	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO - SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ÍTEM "A"	36,80%	36,80%
B -	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DE "A"	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,07%	Não incide
B2	FERIADOS	5,08%	Não incide
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13° SALÁRIO	10,91%	8,33%
B5	LICENÇA À PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,49%	Não incide
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,50%	6,49%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
	TOTAL DO ÍTEM "B"	45,90%	16,25%
C -	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,14%	3,93%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3	5,20%	3,97%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,84%	2,94%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43%	0,33%
	TOTAL DO ÍTEM "C"	14,73%	11,26%
D -	TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REICIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE GRUPO "B"	16,89%	5,98%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
	TOTAL DO ÍTEM "D"	17,35%	6,33%
	PERCENTUAL TOTAL	114,78%	70,64%

*OBS.: * Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto*

FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVAS - INMET

Eng. Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA RN nº 0905404068

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 36 Rúbrica

COMPOSIÇÕES DO BDI NÃO DESONERADO

Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva- Comunidade Caraparú I_Uiramutã_RR

LOCAL DA OBRA

	ITENS PASSÍVEIS DE ACEITAÇÃO NO BDI	Índices			ÍNDICE ADOTADO
		mínimo	médio	máximo	
X	Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
	Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
	Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,10%
	Total				**4,90%**
Y	Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%
	Total				**1,23%**
Z	Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,50%
	Total				**7,50%**
I	**Tributos**				
	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
	ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	CPRB	0,00%	4,50%	4,50%	0,00%
	Total				**8,65%**
	% DE BDI A SER UTILIZADO =				**24,96%**

LEGENDA		FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI
X =	Despesas indiretas (exceto tributos e despesas financeiras)	$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z)}{(1-I)} - 1$
Y =	Despesas financeiras	
Z =	Lucro	
I =	Taxa representativa da incidência de impostos	

$$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z)}{(1 - I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1 + 0{,}04900) \times (1 + 0{,}01230) \times (1 + 0{,}07500)}{(1 - 0{,}08650)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1{,}04900) \times (1{,}01230) \times (1{,}07500)}{(0{,}91350)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1{,}14155)}{(0{,}91350)} - 1$$

$$BDI = 1{,}24964 - 1$$

BDI= 24,96%

A FÓRMULA ADOTADA PARA CÁLCULO DO BDI, SEGUE RECOMENDAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013- TCU.

1. Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

2. Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Eng. Civil: Marcos Domingos da Silva
CREA RN nº 0905404068

Rua Cici Mota, s/n – Centro – Uiramutã - RR
CNPJ: 01.612.681.0001.01

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 37
Rúbrica

Obra
Construção da Escola Municipal Indigena Ko'ko Tereza da Silva- Comunidade Caraparú I_Uiramutã_RR

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**			
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,0	= (8h/semana) - 32 mes x2 = 64
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,0	= (8h/semana) - 2 meses
2	**ALIMENTAÇÃO CANTEIRO**			
2.1	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	1.162,0	= Eng - 1 dia por semana - 3 meses - 1 pessoa - 12 / encarregado - 7 dias por semana - 3 meses - 1 pessoa - 90 / Pedreiro - 7 dias por semana - 3 meses - 4 pessoas - 360 / Carpinteiro - 7 dias por semana - 3 meses - 1 pessoa - 90 / Servente - 7 dias por semana - 3 meses - 6 pessoas - 540 / Cozinheiro - 7 dias por semana - 2 meses - 1 pessoa - 90
3	**DIVERSOS**			
3.1	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	UN	1,0	= 1 unidade
3.2	Placa de acrilico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	UN	6,0	= 6 unidade
3.3	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	un	1,0	= 1 unidade
3.4	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	90,45	= 1 lateral - largura*altura = 10,05*3,0*3 (durante 3 meses)
3.5	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	un	8,0	= unidade
3.6	Limpeza geral (final da obra)	m²	900,0	=
4	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**			
4.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	3,6	= 1 unidade de 1,5*2,4
4.2	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,0	= 1 unidade
4.3	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10.1 kw - Rev.01	un	1,0	= 1 unidade
4.4	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e	un	1,0	= 1 unidade
4.5	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	35,0	= Perimetro da obra = 35
4.6	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	m²	900,0	= terreno livre de 30x30m
4.7	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	14.391,75	= peso dos materiais em tonelada x distancia em km (20 Km BR401+ RR Comunidade)
4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.492,52	= peso dos materiais em tonelada x distancia em km (20 km Piçarra)
5	**INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES**			
5.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	7,8	= 20 sapatas 0,7x0,7 por 1,0m de profundidade
5.2	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	2,0	= volume de escavaçao 2,0 - volume de concreto 2,0
5.3	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	26,2	= 20*2*(0,16+0,29)*0,9
5.4	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	26,2	= 20*2*(0,16+0,29)*0,9
5.5	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	14,8	= 20*0,7*0,7
5.6	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,8	= vol. arranques = 0,84 + vol. Sapatas = 1,96 (arranque de 0,90m total e sapata de 20cm (25 menos 5 do lastro))
5.7	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,8	= volume de concreto
5.8	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	39,76	= 300 unidades de estribo 20x7 - 186m - 0,16kg/m = 39,76
5.9	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	273,12	= 156m para arranque e 118,8m para sapata ferro de 10mm = 274,8m - 0,63kg/m = 273,12
6	**INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME**			
6.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	1,66	= 62,66 metros de escavação com 15cm de largura e 7cm de profundidade
6.2	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	36,78	= medido do projeto = 36,78
6.3	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	13,4	= medido do projeto = 9,4

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 38 Rúbrica

6.4	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,87	= medido do projeto = 4,87
6.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,87	= medido do projeto = 4,87
6.6	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	62,97	= 534 unidades de estribo 20x7 - 331,08m - 0,16kg/m = 62,97
6.7	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	148,7	= 296,76 metros de ferro 8,0mm - 0,4kg/m
6.8	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	25,93	= Alvenaria de embasamento = 25,93
6.9	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	m²	53,65	= área de forma + área superior das sapatas = 34,78 + 20*(0,7*0,7-0,16*0,29)
7	**SUPERESTRUTURA - PILARES**			
7.1	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44	= medido do projeto = 61,44
7.2	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44	= medido do projeto = 61,44
7.3	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	3,34	= medido do projeto = 3,34
7.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,34	= medido do projeto = 3,34
7.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	65,63	= 534 unidades de estribo 20x7 - 285,2m - 0,16kg/m
7.6	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	182,5	= 242,00 metros de ferro 10,0mm - 0,63kg/m
8	**SUPERESTRUTURA - VIGAS**			
8.1	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	38,88	= medido do projeto = 38,88
8.2	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	38,88	= medido do projeto = 38,88
8.3	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	3,74	= medido do projeto - 3,74
8.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,74	= medido do projeto - 3,74
8.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	65,43	= 534 unidades de estribo 15x7 - 277,68m - 0,16kg/m
8.6	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	124,19	= 296,76 metros de ferro 6,3mm - 0,25kg/m
9	**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**			
9.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	203,04	= medido do projeto - 180,04
9.2	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e	M	55,83	= medido do projeto - 55,83
9.3	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	23,0	= medido do projeto - 23
9.4	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	22,0	= medido do projeto -22
9.5	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	19,0	= medido do projeto - 19
10	**REVESTIMENTO**			
10.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	406,08	= medido do projeto - 360,08
10.2	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	406,08	= medido do projeto
10.3	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	m²	111,36	= medido do projeto - com h= 3m
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	111,36	= medido do projeto - com h= 3m
11	**PINTURA**			
11.1	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	406,08	= medido do projeto
11.2	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	m²	203,04	= medido do projeto

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 39
Rúbrica

11.3	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	203.04	= medido do projeto
11.4	Aplicação manual de pintura com tinta acetinada em paredes, duas demãos.	m²	406.08	= medido do projeto - nas portas, janelas e grades
12	**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**			
12.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	1,2	= 2*0,6*1,0
12.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	2,6	= 2*1,20+0,1*1*2
12.3	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	2,6	= 2*1,20+0,1*1*2
12.4	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	3,98	= 2*1,20+0,1*1*2 + 0,6*1* + 0,6*1,3
12.5	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	3,98	= 2*1,20+0,1*1*2 + 0,6*1* + 0,6*1,3
12.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos	m²	3,98	= 2*1,20+0,1*1*2 + 0,6*1* + 0,6*1,3
12.7	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1), preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	1,46	= 0,65*1,3
12.8	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,46	= 0,65*1,3
12.9	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m²	1,0	= unidade de porta 1,0x1,0
13	**COBERTURA**			
13.1	Telhamento com telha PVC colonial: feitas com compósito de resina, 2.30x 0.88 x 0.028 m	m²	185.13	= 2*11.45*4,6
13.2	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	185.13	= 2*11,45*4,6
13.3	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial: feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	M	32,24	= medido do projeto - 32,24
13.4	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	185.13	= 2*11,45*4,6
13.5	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro.	m²	130,57	= medido do projeto -130,57
14	**PAVIMENTAÇÃO**			
14.1	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	19.57	= medido do projeto - 19.57
14.2	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	130.57	= medido do projeto - 130,57
14.3	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	130.57	= medido do projeto - 130,57
14.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	m²	130,57	= medido do projeto - 130,57
14.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014	M	92,0	= metros lineares
15	**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**			
15.1	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	M	4.5	= 6*0,8=6,41
15.2	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	M	96,06	= medido do projeto - 96,06
15.3	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	M	18,8	= medido do projeto - 18,8
16	**CALÇADA DE PROTEÇÃO**			
16.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	3,97	= 2*(8,65+11,25)*0,15 (cava de 15cm)
16.2	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	2,78	= 16,95m²*0,4 (40cm somente a parte interna da alv.)
16.3	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	19,9	= 2*(8,65+11,25)*0,50 (40cm + 10cm da cava)
16.4	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	72,77	= medido do projeto - 62,84 (área da calçada)
16.5	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	25,92	= 0,4*2*(8,65+22,25)
16.6	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	25,92	= 0,4*2*(8,65+22,25)
17	**ESQUADRIAS**			
17.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	5,0	= unidades de 0,80x2,10

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 40
Rúbrica

17.2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18,0 = 6 unidades de 1,50x1,00
17.3	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,48 = 2 unidades de 0,60x0,40m
18	**LOUÇAS E METAIS**		
18.1	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	un	2,0 = unidades
18.2	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixacão com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	un	2,0 = unidades
18.3	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	UN	2,0 = unidades
18.4	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2,0 = unidades
18.5	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	UN	2,0 = unidades
18.6	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	UN	3,0 = unidades
18.7	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	un	2,0 = unidades
18.8	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm concretada e assentada	un	1,0 = unidades
18.9	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	un	1,0 = unidades
19	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
19.1	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saída, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	UN	1,0 = unidades
19.2	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	M	28,9 = extraido do projeto
19.3	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	M	30,1 = extraido do projeto
19.4	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	19,75 = extraido do projeto
19.5	Joelho 90º soldável 25 mm água fria	UN	8,0 = unidades
19.6	Curva 90º soldável 25 mm água fria	UN	2,0 = unidades
19.7	Joelho 90º soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	11,0 = unidades
19.8	Joelho de redução 90º soldável 40 x 25mm água fria	un	6,0 = unidades
19.9	Joelho 90º soldável 40mm água fria	UN	3,0 = unidades
19.10	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	3,0 = unidades
19.11	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	UN	14,0 = unidades
19.12	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	1,0 = unidades
19.13	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	6,0 = unidades
19.14	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	1,0 = unidades
19.15	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	UN	5,0 = unidades
19.16	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	1,0 = unidades
19.17	Registro de esfera soldável 40mm	UN	1,0 = unidades
19.18	Registro de esfera soldável 25mm	UN	1,0 = unidades
19.19	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0 = unidades
19.20	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,0 = unidades
20	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**		
20.1	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	M	9,1 = extraido do projeto
20.2	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	12,4 = extraido do projeto
20.3	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	28,0 = extraido do projeto
20.4	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	8,4 = extraido do projeto

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 41 Rúbrica

20.5	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	3,0 = unidades
20.6	Tê sanitário em PVC rigido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	un	1,0 = unidades
20.7	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	1,0 = unidades
20.8	Joelho 90º de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	un	10,0 = unidades
20.9	Joelho 90º de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	un	10,0 = unidades
20.10	Joelho 90º de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	UN	4,0 = unidades
20.11	Joelho 45º de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	UN	1,0 = unidades
20.12	Joelho 45º de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	UN	2,0 = unidades
20.13	Curva 90º longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	2,0 = unidades
20.14	Curva 90º longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	2,0 = unidades
20.15	Raio sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	3,0 = unidades
20.16	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no minimo 3 entradas e greiha tipo abre e fecha	UN	3,0 = unidades
20.17	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	2,0 = unidades
20.18	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	1,0 = unidades
20.19	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	1,0 = unidades
20.20	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforcada revestida internamente com barra lisa e fundo em	un	8,0 = unidades
21	**COMBATE A INCÊNDIO**		
21.1	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	2,0 = unidades
21.2	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	2,0 = unidades
21.3	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Un	1,0 = unidades
22	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
22.1	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	46,0 = unidades
22.2	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	62,6 = extraido do projeto
22.3	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	76,6 = extraido do projeto
22.4	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	52,6 = extraido do projeto
22.5	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	142,2 = extraido do projeto
22.6	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	142,2 = extraido do projeto
22.7	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	82,6 = extraido do projeto
22.8	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	188,3 = extraido do projeto
22.9	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	153,9 = extraido do projeto
22.10	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	40,0 = extraido do projeto
22.11	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	40,0 = extraido do projeto
22.12	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	40,0 = extraido do projeto
22.13	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	M	40,0 = extraido do projeto

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 42 Rúbrica

22.14	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	un	3,0	= extraido do projeto
22.15	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	UN	14,0	= extraido do projeto
22.16	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,0	= extraido do projeto
22.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,0	= extraido do projeto
22.18	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,0	= extraido do projeto
22.19	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	2,0	= extraido do projeto
22.20	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	1,0	= extraido do projeto
22.21	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,0	= extraido do projeto
22.22	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo	un	2,0	= extraido do projeto
22.23	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo	UN	6,0	= extraido do projeto
22.24	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de	UN	8,0	= extraido do projeto
22.25	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	M	75,0	= extraido do projeto
22.26	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	M	9,4	= extraido do projeto
22.27	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	M	50,3	= extraido do projeto
22.28	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	M	6,0	= extraido do projeto
22.29	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	M	36,0	= extraido do projeto
22.30	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	M	57,8	= extraido do projeto
22.31	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma	un	29,0	= unidades
22.32	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acrílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W	UN	5,0	= unidades
22.33	Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt	un	31,0	=
22.34	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	UN	3,0	= unidades
22.35	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por	UN	3,0	= unidades
22.36	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR	M	10,0	= extraido do projeto
22.37	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	un	2,0	= unidades
22.38	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20	Un	3,0	= unidades
22.39	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação, cor	Un	3,0	= unidades
22.40	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	4,5	= extraido do projeto
22.41	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	3,5	= extraido do projeto
22.42	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,0	= unidades
22.43	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2.5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,0	= unidades
22.44	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,60m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,0	= unidades

Engº Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 0905404068

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 43
Rúbrica
PMU

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva- Comunidade Caraparú I_Uiramutã_RR

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRANSPORTE

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		
					Operativa	Coeficiente	Peso (kg)
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	19.264,52	1,00	19.264,52
1358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m²	242,27	10,20	2.471,15
7194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	310,81	18,00	5.594,66
4914	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	15,12	18,33	277,15
7267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	11.789,47	2,30	27.115,77
4114	SINAPI	MOURÃO CONCRETO CURVO, SEÇÃO "T", H = 2,80 M - CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS	Material	UN	76,60	45,00	3.447,00
7356	SINAPI	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	334,62	1,51	505,28
34	SINAPI	AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHÃO	Material	KG	470,00	1,00	470,00
11587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, RÉGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	Material	m²	50,75	1,50	76,12
3992	SINAPI	TÁBUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	308,32	9,75	3.006,10
867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	83,41	0,44	36,70
11197	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! JANELA DE CORRER, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISÃO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120 X 150 X L)	Material	UN	4,00	30,00	119,94
1350	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	Material	UN	54,10	14,52	785,56
995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 16 MM2	Material	M	210,21	0,18	37,84
4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	18,45	1.700,00	31.371,16
39025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	4,06	20,00	81,22
43059	SINAPI	AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHÃO	Material	KG	293,94	1,00	293,94
626	SINAPI	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTÔMEROS DILUÍDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICAÇÃO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁSTICA)	Material	KG	192,11	1,00	192,11
4433	SINAPI	CAIBRO NÃO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	257,59	7,31	1.883,01
1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3.674,44	1,00	3.674,44
36225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, RÉGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCAÇÃO)	Material	m²	74,96	1,50	112,44
1287	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	85,15	20,80	1.771,05
346	SINAPI	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	Material	KG	94,79	1,00	94,79
536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	87,00	20,80	1.809,64
4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	11,61	1.700,00	19.737,62
33	SINAPI	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHÃO	Material	KG	176,05	1,00	176,05
7156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	45,43	0,50	22,72
1014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	820,53	0,03	24,62
370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	61,24	2.000,00	########
4425	SINAPI	VIGA NÃO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	149,12	9,36	1.395,80
32	SINAPI	AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHÃO	Material	KG	154,76	1,00	154,76
11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	Material	m²	4,02	75,00	301,50
6189	SINAPI	TÁBUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	143,51	9,75	1.399,18
7258	SINAPI	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	2.875,32	2,10	6.038,17
13395	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	Material	UN	2,00	4,00	8,00
4491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	558,61	7,31	4.083,42
39427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	263,41	0,40	105,36
4430	SINAPI	CAIBRO NÃO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	259,70	3,90	1.012,81
4517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1.540,51	2,44	3.758,84
36888	SINAPI	GUARNIÇÃO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	Material	M	154,41	0,25	38,60
11190	SINAPI	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM	Material	UN	7,39	20,00	147,81

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 44
Rúbrica

	VIDROS)					
34747 SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	14,86	12,51	185,92
11986 ORSE	Dosador de pastilhas de cloro composto por câmara de dissolução de pastilhas d=150mm e altura de 450mm com disposição interna de modo a otimizar o contato entre o liquido e as pastilhas, modelo DP-75, Hemfibra ou similar	Material	un	1,00	1,00	1,00
3799 SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	8,20	0,70	5,74
34640 SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,00	33,00	33,00
4302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	357,12	0,03	10,71
12041 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	Material	UN	1,00	5,00	5,00
34566 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	Material	UN	287,14	9,50	2.727,82
4777 SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1 8" E 1/4"	Material	KG	81,57	1,00	81,57
34492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,11	2.400,00	2.653,20
1381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	785,58	1,00	785,58
4813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	Material	m²	3,60	6,40	23,04
5068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	43,51	1,00	43,51
36215 SINAPI	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	Material	UN	1,00	5,50	5,50
4056 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	Material	GL	34,10	6,50	221,68
36206 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	4,00	2,20	8,80
34557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	194,36	0,50	97,18
1013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	490,88	0,02	9,82
7219 SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	16,41	7,50	123,09
10848 SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	Material	UN	1,00	1,54	1,54
20232 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	11,45	12,51	143,24
142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	20,38	0,31	6,32
9836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	50,98	0,39	19,88
10932 SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	6,55	0,50	3,27
6013 SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	Material	UN	8,00	0,60	4,80
559 SINAPI	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M	Material	M	17,85	2,53	45,16
4351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	58,73	0,05	2,94
1743 SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	Material	UN	4,00	1,10	4,40
34547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	96,20	0,50	48,10
1346 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	Material	m²	12,74	6,00	76,43
21138 SINAPI	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	Material	M	81,63	10,20	832,65
43132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	24,00	1,00	24,00
37589 SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM	Material	UN	1,98	10,00	19,80
2674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	134,51	0,24	32,28
1345 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	Material	m²	7,60	10,80	82,08
10851 SINAPI	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	Material	UN	9,00	0,16	1,44
36520 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO	Material	UN	1,00	15,00	15,00
37411 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	19,06	0,50	9,53
10892 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	2,00	19,50	39,00
4047 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	Material	GL	44,44	5,70	253,28
4408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	433,74	0,98	425,06
11235 SINAPI	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM	Material	UN	2,00	5,90	11,80
34381 SINAPI	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM	Material	UN	2,00	20,00	40,00

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 45
Rúbrica

	GUARNICAO ALIZAR						
6193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	53,34	6,50	346,69
9413 SBC	POSTE CONCRETO DUPLO "T" 7,0m 100kg	Material	UN	1,00	300,00	300,00
38194 SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	21,00	0,08	1,68
10567 SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	126,74	7,48	947,99
3421 SINAPI	JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS	Material	m²	0,58	30,00	17,35
7334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	29,51	1,11	32,76
10425 SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	Material	UN	5,42	15,94	86,46
38775 SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	5,00	0,25	1,25
43130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	15,13	1,00	15,13
34360 SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	7,92	1,00	7,92
39445 SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Material	UN	3,00	0,17	0,51
1021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	69,10	0,05	3,66
34616 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	8,00	0,17	1,36
9874 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	28,03	0,43	12,05
40863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	3,00	0,00	0,00
7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	13,09	1,00	13,09
10997 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	20,05	1,00	20,05
2685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	48,77	0,39	19,02
2684 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	Material	M	36,61	0,54	19,77
6085 SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	54,96	1,44	79,14
9868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	82,03	0,20	16,41
34357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	46,43	1,00	46,43
863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,00	0,32	2,88
123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	38,89	1,11	43,17
39017 SINAPI	ESPACADOR DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, CORRIMENTO 20 MM	Material	UN	1.243,92	0,00	4,98
1764 SBC	DISJUNTOR - PROTETOR DPS 275V 12,5/60KA VCL SLIM 5137 CLAMPER	Material	UN	2,00	0,09	0,18
20083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	5,07	1,00	5,07
37591 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	9,68	9,80	94,85
37559 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Material	UN	8,00	0,12	0,96
10555 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,76	35,00	61,71
10886 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	1,07	14,80	15,78
39467 SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Material	UN	3,00	0,08	0,24
38101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	38,03	0,02	0,76
10891 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,07	6,80	7,25
13415 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	Material	UN	5,42	0,35	1,90
6157 SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Material	UN	4,00	0,10	0,40
6743 ORSE	Lona com impressão digital	Material	m²	2,98	0,19	0,57
122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	3,41	0,85	2,90
3743 SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	4,00	2.500,00	10.000,00
20247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	9,59	1,00	9,59
1524 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,24	2.400,00	571,80
10422 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	Material	UN	0,70	15,00	10,51
586 SINAPI	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3/16 "	Material	M	8,70	0,59	5,13
37395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	4,64	0,50	2,32
3379 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	3,70	3,72	13,77
4417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	56,73	2,44	138,42
34628 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	Material	UN	3,00	0,17	0,51
4448 SINAPI	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	23,10	12,48	288,29
13416 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	Material	UN	4,84	0,45	2,18

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 46
Rúbrica

2673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	50,89	0,20	10,18
392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	93,23	0,02	1,86
5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	8,67	1,00	8,67
38774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	6,00	0,13	0,78
11690	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM	Material	UN	1,00	13,00	13,00
39809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,00	0,89	0,89
4400	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	14,40	6,24	89,86
40568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	6,88	1,00	6,88
38773	SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	21,00	0,31	6,51
541	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	Material	UN	0,84	12,20	10,24
12001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	21,00	0,10	2,10
39027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	6,55	1,00	6,55
7348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	11,14	1,51	16,83
9838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	13,51	0,39	5,27
44842	SBC	TUBO EM METALON QUADRADO 20x20cm	Material	M	8,70	0,64	5,57
34653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	15,00	0,09	1,35
38094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	47,91	0,08	3,83
981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	25,63	0,05	1,36
36887	SINAPI	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	Material	m²	7,56	0,10	0,76
6148	SINAPI	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	13,24	0,10	1,32
37552	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	Material	KG	28,69	1,00	28,69
39772	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	Material	UN	1,00	1,90	1,90
1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	43,00	0,04	1,72
1879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	37,16	0,03	1,19
2705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	143,01	0,00	0,00
4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE GRANITO	Material	KG	3,34	1,00	3,34
38102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	12,00	0,02	0,24
7266	SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	MIL	0,14	2.300,00	312,09
12010	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	9,41	0,08	0,75
2432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	4,84	0,40	1,94
1891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	78,31	0,02	1,17
37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,67	1,00	0,67
39175	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	107,00	0,01	0,54
11881	SINAPI	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE- MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	Material	UN	0,72	40,00	28,94
11882	SINAPI	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)	Material	UN	1,00	31,18	31,18
11697	SINAPI	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	Material	UN	0,16	7,00	1,10
11891	SINAPI	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	Material	M	17,69	0,06	1,06
40304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	3,66	1,00	3,66
7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	135,92	0,01	1,36
2386	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	Material	UN	5,33	0,09	0,48
38112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	15,54	0,02	0,31
10490	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	0,76	7,50	5,69
11831	SINAPI	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	Material	UN	2,98	0,25	0,75
367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	2,59	2.000,00	5.180,89
39147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X	Material	UN	13,00	0,04	0,52

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 47
Rúbrica
- PMU -

	1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL					
43131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	2,91	1,00	2,91
8475 SBC	BORRACHA DE VEDACAO PARA ALUMINIO, PORTAS/JANELAS GUA256	Material	M	26,42	0,05	1,32
4720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,35	1.700,00	596,94
3378 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAINHA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,00	3,72	3,72
5075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	3,84	1,00	3,84
3777 SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	45,66	0,08	3,42
12266 SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	0,69	0,40	0,28
30542 SBC	CAMINHAO GUINDAUTO MERCEDES L1620 8tn 200CV	Material	H	1,00	0,00	0,00
1607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	364,18	0,02	5,46
9835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	13,64	0,23	3,14
13393 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	0,12	3,00	0,35
40552 SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"(6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	2,28	0,50	1,14
7421 ORSE	Canto pwll sl	Material	un	28,80	0,01	0,29
1091 SBC	FITA 3M DUPLA FACE ESPUMA VHB 4972 25mmx20m PARA ESTRUTURAL GLAZING	Material	RL	0,36	0,25	0,09
43777 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material	UN	0,40	30,00	12,09
3080 SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,38	0,64	0,89
7091 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	4,23	0,38	1,61
4513 SINAPI	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	31,36	3,25	101,92
6024 SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	Material	UN	1,00	0,60	0,60
650 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	25,83	9,80	253,18
38099 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	47,91	0,08	3,83
1571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	40,00	0,01	0,20
979 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	3,60	0,16	0,58
39398 SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Material	UN	1,00	1,01	1,01
37556 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	2,00	0,10	0,20
1562 SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	Material	UN	3,00	0,05	0,15
12295 SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	21,69	0,08	1,74
3535 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	10,00	0,03	0,30
11676 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	2,00	0,40	0,80
37595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	14,77	1,00	14,77
39795 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,11	1,00	1,11
4384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	3,40	0,20	0,68
11674 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	4,00	0,25	1,00
39209 SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	107,00	0,00	0,32
21127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	13,05	0,25	3,26
3517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	13,48	0,03	0,40
7141 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	5,00	0,06	0,30
1970 SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	0,44	0,44
38383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	21,78	0,01	0,22
38193 SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	5,00	0,05	0,25
1368 SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	0,63	0,40	0,25
1460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA,	Material	M	10,12	3,25	32,89

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 48
Rúbrica
PMU

[illegible]	ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34623 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	Material	UN	1,00	0,17	0,17
1902 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	16,00	0,04	0,64
7604 SINAPI	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	Material	UN	3,00	0,40	1,20
3524 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	5,57	0,04	0,22
3097 SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE	Material	CJ	0,70	0,64	0,45
11864 SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	1,00	0,10	0,10
9813 SINAPI	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	Material	M	6,00	0,30	1,80
1892 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	21,00	0,03	0,63
6141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	Material	UN	9,42	0,20	1,88
40547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	1,90	0,50	0,95
1871 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	7,78	0,09	0,70
3993 SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	m²	3,96	4,88	19,32
404 SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	Material	M	25,00	0,05	1,25
71889 SBC	CARTUCHO EM PO PARA SOLDA EXOTERMICA 90/115 150/250	Material	UN	5,00	0,10	0,50
10553 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	0,23	30,00	6,93
301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	10,28	0,04	0,41
377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,00	1,03	1,03
1884 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	7,00	0,04	0,28
5073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	1,44	1,00	1,44
10952 SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	Material	KG	10,00	1,00	10,00
4358 SINAPI	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	Material	UN	22,00	0,01	0,22
39961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,20	0,28	0,34
21112 SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material	UN	0,16	0,50	0,08
6016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material	UN	1,00	0,50	0,50
7345 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material	L	1,31	1,51	1,98
31134 SBC	CAIXA ALUMINIO DUPLA 4"x4" 3/4" PARA PISO TRAMONTINA	Material	UN	1,00	0,15	0,15
33225 SBC	MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA GTB 16Y2	Material	UN	0,20	0,50	0,10
3526 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	10,27	0,05	0,51
12016 SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	2,23	0,10	0,22
6153 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	8,40	0,05	0,42
4221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L		0,00	0,00
5103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	2,23	0,30	0,67
834 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	6,00	0,04	0,21
11948 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	Material	UN	53,55	0,08	4,28
39443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	149,92	0,00	0,45
1573 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	12,00	0,00	0,04
1968 SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,00	0,13	0,26
1094 SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 5/16 ", COM 1 ESTRIBO, TIPO DIN (4N)	Material	UN	1,00	0,80	0,80
7139 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	15,96	0,03	0,48
65 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	22,63	0,03	0,68
38191 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,15	0,10	0,11
11741 SINAPI	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	3,63	0,32	1,16
4346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,00	0,40	1,20
1874 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	4,00	0,10	0,40
11830 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,00	0,28	0,28
1575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	8,00	0,01	0,08
12298 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO	Material	UN	1,52	0,10	0,15
1200 SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,00	0,08	0,16
39177 SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	12,00	0,02	0,28
1966 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,82	0,25	0,20
39176 SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	18,00	0,01	0,13

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 49
Rúbrica

11455 SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	1,22	0,25	0,30
3529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	21,58	0,02	0,52
3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	32,15	0,01	0,32
39211 SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1 4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	12,00	0,02	0,24
20078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,64	0,40	0,26
87547 SBC	ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA	Material	UN	0,17	0,50	0,08
1870 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	5,36	0,03	0,16
2690 SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material	UN	1,98	0,03	0,06
11655 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	0,23	0,23
296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	8,28	0,03	0,25
11753 SINAPI	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400)	Material	UN	0,63	0,50	0,31
2697 SBC	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material	M	2,18	0,23	0,50
2692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	1,85	1,00	1,85
9892 SINAPI	UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,00	0,04	0,08
39210 SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	18,00	0,00	0,07
1414 SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Material	UN	1,00	0,15	0,15
20080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,62	0,18	0,11
6155 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	Material	UN	0,84	0,04	0,03
96 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,00	0,85	0,85
34643 SINAPI	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	Material	UN	1,00	0,85	0,85
3571 SBC	PLACA CEGA PARA CAIXA 4"x4" QUADRADA IRIEL	Material	UN	1,00	0,05	0,05
7128 SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	0,04	0,04
1574 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	5,33	0,01	0,05
11950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	47,61	0,01	0,24
55 SINAPI	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	Material	UN	2,00	0,15	0,30
11904 SINAPI	CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	Material	M	3,89	0,09	0,35
3662 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	0,20	0,20
12147 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	Material	UN	0,73	0,08	0,06
4415 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,60	1,63	5,87
6036 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	Material	UN	1,00	0,08	0,08
11002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,50	1,00	0,50
3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	2,57	0,01	0,03
11712 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	Material	UN	0,31	0,31	0,10
14618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,01	4,90	0,03
9856 SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	1,00	0,10	0,10
163358 SBC	PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA	Material	UN	5,16	0,01	0,05
6142 SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,00	0,65	0,65
3143 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	1,00	0,02	0,02
3670 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,31	0,30	0,09
3671 SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	7,72	0,05	0,39
1956 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	2,00	0,03	0,05
39276 SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,00	0,04	0,04
12128 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	Material	UN	0,76	0,05	0,04
11443 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS	Material	UN	1,14	0,40	0,46
3855 SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	Material	UN	1,00	0,03	0,03
3398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	1,00	0,40	0,40
11680 SINAPI	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	Material	UN	1,00	0,10	0,10
12296 SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,52	0,08	0,12
5085 SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	Material	UN	0,19	0,25	0,05
38780 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	0,23	0,12	0,03

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 50
Rúbrica

20254 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	Material	UN	0,12	0,25	0,03
7608 SINAPI	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	Material	UN	1,00	0,10	0,10
3869 SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	0,03	0,03
7097 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,50	0,10	0,05
14153 SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,06	0,60	0,04
1570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,00	0,00	0,00
7098 SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	0,02	0,02
3518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	0,05	0,05
6138 SINAPI	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	Material	UN	1,70	0,33	0,56
4222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	0,49	0,85	0,42
11467 SINAPI	FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES	Material	UN	0,19	0,64	0,12
4377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	23,42	0,01	0,23
7583 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,00	0,01	0,03
11056 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")	Material	UN	42,24	0,01	0,42
3659 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,16	0,25	0,04
3516 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,35	0,03	0,07
4375 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	22,00	0,01	0,11
2689 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,01	0,05	0,05
38100 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,00	0,10	0,10
11267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	2,00	0,01	0,01
2370 SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	Material	UN	0,19	0,09	0,02
4509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,22	3,25	3,97
4350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	4,00	0,01	0,04
11055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	31,97	0,01	0,32
3889 SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 800gr	Material	UN	0,03	0,80	0,02
5088 SINAPI	PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"	Material	UN	0,19	0,30	0,06
3906 SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,63	0,03	0,02
39996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6.3 MM)	Material	M	0,17	0,25	0,04
4895 SINAPI	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00	0,01	0,01
5067 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,02	1,00	0,02
3389 SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,03	0,08	0,00
3487 SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,02	0,03	0,00
39997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,00	0,02	0,03
20085 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,23	0,03	0,01
3148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,03	0,05	0,00
1901 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,31	0,01	0,00
37731 SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,00	0,00	0,00
43617 SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,01	1,00	0,01
40864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	3,00	0,00	0,00

Total em peso (kg) **29477,06kg**

Marcos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 090540408B

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 51
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva- Comunidade Caraparú I_Uiramutã_RR

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Roraima
ORSE - 07/2022 - Sergipe

B.D.I.
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Planilha Orçamentária Analítica

1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					21.819,22
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	107,36	107,36
Composição Auxiliar	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	1,25	1,25
Insumo	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,00	104,62	104,62
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00	0,66	0,66
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00	0,81	0,81
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00	0,01	0,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00	0,01	0,01
			MO sem LS => 49,29	LS => 56,58		MO com LS =>	105,87
			Valor do BDI => 26,79			Valor com BDI =>	134,15
				Quant. =>	64,00	Preço Total =>	8.585,60
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00	5.295,15	5.295,15
Composição Auxiliar	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00	63,63	63,63
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,00	4.857,64	4.857,64
Insumo	00043499 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00	202,94	202,94
Insumo	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00	18,58	18,58
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,00	152,35	152,35
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,00	0,01	0,01
			MO sem LS => 2.291,31	LS => 2.629,96		MO com LS =>	4.921,27
			Valor do BDI => 1.321,66			Valor com BDI =>	6.616,81
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	13.233,62
2		ALIMENTAÇÃO CANTEIRO					20.673,18
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3126 ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	Alimentação	un	1,00	14,00	14,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	1,00	14,00	14,00
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 3,49			Valor com BDI =>	17,49
				Quant. =>	1.182,00	Preço Total =>	20.673,18
3		DIVERSOS					14.924,32
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010848 SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	Material	UN	1,00	1.341,68	1.341,68
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 334,88			Valor com BDI =>	1.676,56
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.676,56
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010851 SINAPI	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	Material	UN	1,00	70,83	70,83
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 17,67			Valor com BDI =>	88,50
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>	531,00
3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11397 ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,65m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,00	750,00	750,00
Insumo	12325 ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	Material	un	1,00	750,00	750,00
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 187,20			Valor com BDI =>	937,20
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	937,20
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010527 SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	Equipamento	MXMES	1,00	13,20	13,20
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 3,29			Valor com BDI =>	16,49
				Quant. =>	90,45	Preço Total =>	1.491,52
3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2412 ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x200cm	Mobiliário	un	1,00	783,36	783,36
Insumo	2509 ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x200cm, natural (sem verniz) un	0	un	1,00	783,36	783,36
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 195,52			Valor com BDI =>	978,88
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>	7.831,04
3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2450 ORSE	Limpeza geral (final da obra)	Limpeza	m²	1,00	2,19	2,19
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,10	3,74	0,37
Insumo	1997 ORSE	Sabão em pó kg	0	kg	0,01	9,45	0,04
Insumo	2414 ORSE	Vassoura piaçava un	0	un	0,05	11,80	0,59
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,10	11,96	1,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 52
Rúbrica

				MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,64	MO com LS => 1,19
				Valor do BDI =>	0,54			Valor com BDI => 2,73
						Quant. =>	900,00	Preço Total => 2.457,00
4		MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO						43.557,47
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit / Total
Composição	51 ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização			m²	1,00	550,87 / 550,87
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios			h	2,00	3,74 / 7,48
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios			h	1,00	3,63 / 3,63
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material			m	4,00	10,99 / 43,96
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material			m	1,00	3,89 / 3,89
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra			H	1,00	19,81 / 19,81
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material			m²	1,00	445,00 / 445,00
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material			KG	0,15	21,22 / 3,18
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra			H	2,00	11,96 / 23,92
				MO sem LS =>	20,36	LS =>	22,37	MO com LS => 43,73
				Valor do BDI =>	137,49			Valor com BDI => 688,36
						Quant. =>	3,60	Preço Total => 2.478,09
4.2	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit / Total
Composição	6096 ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	Conversão InfoWOrca			UN	1,00	613,28 / 613,28
Composição Auxiliar	26 ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	Demolições / Remoções			m³	0,02	15,70 / 0,32
Composição Auxiliar	76 ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	Aterros / Reaterros / Compactações			m³	1,33	15,70 / 20,81
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana			m³	1,35	47,10 / 63,44
Composição Auxiliar	6083 ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	Conversão InfoWOrca			un	1,00	260,64 / 260,64
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios			h	1,00	3,74 / 3,74
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios			h	1,00	3,65 / 3,65
Insumo	980 ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	Material			m	20,00	0,22 / 4,40
Insumo	2260 ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Torneira plastica p/jardim d= 1/2" (herc - ref. 1128 ou similar)	Material			un	1,00	2,13 / 2,13
Insumo	2360 ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	Material			un	2,00	8,06 / 16,12
Insumo	5161 ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	Material			un	2,00	5,00 / 10,00
Insumo	5240 ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saida roscável de = 60mm x 1/2"	Material			un	1,00	12,29 / 12,29
Insumo	6313 ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	Material			UN	1,00	0,83 / 0,83
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra			H	1,00	19,81 / 19,81
Insumo	00004895 SINAPI	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material			UN	1,00	0,69 / 0,69
Insumo	00006036 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	Material			UN	1,00	11,49 / 11,49
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra			H	1,00	11,96 / 11,96
Insumo	00007098 SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material			UN	1,00	3,90 / 3,90
Insumo	00009813 SINAPI	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	Material			M	6,00	5,71 / 34,26
Insumo	00009856 SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material			M	1,00	8,95 / 8,95
Insumo	00012773 SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2"	Material			UN	1,00	123,85 / 123,85
				MO sem LS =>	65,27	LS =>	74,92	MO com LS => 140,19
				Valor do BDI =>	153,07			Valor com BDI => 766,35
						Quant. =>	1,00	Preço Total => 766,35
4.3	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit / Total
Composição	11125 ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifasica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	Entrada em Baixa Tensão			un	1,00	2.205,77 / 2.205,77
Composição Auxiliar	338 ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em nori	Entrada em Baixa Tensão			un	1,00	491,52 / 491,52
Composição Auxiliar	353 ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões			m	1,50	12,71 / 19,06
Composição Auxiliar	354 ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões			m	6,00	16,25 / 97,50
Composição Auxiliar	363 ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões			un	2,00	9,66 / 19,32
Composição Auxiliar	372 ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões			un	4,00	3,77 / 15,08
Composição Auxiliar	681 ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	Pontos de Suprimento de Telefone			un	1,00	6,16 / 6,16
Composição Auxiliar	2892 ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e			un	1,00	5,01 / 5,01
Composição Auxiliar	4005 ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais			M	20,00	12,50 / 250,00
Composição Auxiliar	4429 ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos			un	1,00	160,63 / 160,63
Composição Auxiliar	7925 ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos			un	4,00	2,30 / 9,20
Composição Auxiliar	7995 ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves			un	1,00	71,54 / 71,54
Composição Auxiliar	9163 ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão InfoWOrca			un	1,00	998,49 / 998,49
Composição Auxiliar	9379 ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	Conversão InfoWOrca			un	1,00	41,31 / 41,31
Composição Auxiliar	12370 ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	Pára-raios			kg	0,18	113,86 / 20,95
				MO sem LS =>	206,83	LS =>	237,40	MO com LS => 444,23
				Valor do BDI =>	550,56			Valor com BDI => 2.756,33
						Quant. =>	1,00	Preço Total => 2.756,33
4.4	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit / Total
Composição	62 ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização			un	1,00	14.992,56 / 14.992,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 53
Rúbrica

Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,30	712,60	926,38
Composição Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	2,80	1.085,87	3.040,43
Composição Auxiliar	199 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento	m²	52,92	56,35	2.982,04
Composição Auxiliar	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	52,92	36,33	1.922,58
Composição Auxiliar	641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	2,00	223,87	447,74
Composição Auxiliar	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	2,00	20,34	40,68
Composição Auxiliar	3297 ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	1,00	264,06	264,06
Composição Auxiliar	3644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	56,00	15,63	875,28
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	16,00	3,74	59,84
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	16,00	3,63	58,08
Insumo	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	2,00	25,40	50,80
Insumo	629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	77,00	36,36	2.799,72
Insumo	848 ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	4,00	3,60	14,40
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	87,00	10,99	956,13
Insumo	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	2,00	8,00	16,00
Insumo	1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,20	25,07	30,08
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	16,00	19,81	316,96
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	16,00	11,96	191,36
			MO sem LS => 1.452,41		LS => 1.667,07	MO com LS =>	3.119,48
			Valor do BDI => 3.742,14			Valor com BDI =>	18.734,70
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	18.734,70

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059 SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,00	42,57	42,57
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00	28,29	0,11
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,02	27,33	0,45
Composição Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,00	576,22	2,65
Composição Auxiliar	99062 SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,50	2,28	3,42
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36	18,28	6,51
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,71	25,21	17,96
Insumo	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,41	11,40	4,70
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,11	21,22	2,35
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,74	3,17	2,36
Insumo	00010567 SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,55	3,10	1,70
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,03	14,45	0,36
			MO sem LS => 10,36		LS => 11,89	MO com LS =>	22,25
			Valor do BDI => 10,62			Valor com BDI =>	53,19
				Quant. =>	35,00	Preço Total =>	1.861,65

4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524 SINAPI	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,00	2,60	2,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,38	1,24
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	19,01	1,36
			MO sem LS => 0,86		LS => 0,99	MO com LS =>	1,85
			Valor do BDI => 0,64			Valor com BDI =>	3,24
				Quant. =>	900,00	Preço Total =>	2.916,00

4.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9203 ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Conversão InfoWOrca	tkm	1,00	0,50	0,50
Insumo	9483 ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Equipamento	tkm	1,00	0,50	0,50
			MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,12			Valor com BDI =>	0,62
				Quant. =>	14.391,75	Preço Total =>	8.922,89

4.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100948 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,00	0,92	0,92
Composição Auxiliar	5824 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00	232,08	0,85
Composição Auxiliar	5826 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00	47,25	0,07
			MO sem LS => 0,04		LS => 0,04	MO com LS =>	0,08
			Valor do BDI => 0,22			Valor com BDI =>	1,14
				Quant. =>	4.492,52	Preço Total =>	5.121,47

5		INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES					22.718,58
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	68,75	68,75

EN BLANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 54
Rúbrica

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,96	17,38	68,75
			MO sem LS =>	22,40	LS =>	25,70	MO com LS =>	48,10
			Valor do BDI =>	17,16			Valor com BDI =>	85,91
					Quant. =>	7,80	Preço Total =>	670,09
5.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,00	41,68	41,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,40	17,38	41,68
			MO sem LS =>	13,58	LS =>	15,58	MO com LS =>	29,16
			Valor do BDI =>	10,40			Valor com BDI =>	52,08
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	104,16
5.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92263 SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	147,28	147,28
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,06	28,29	1,78
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,26	27,33	6,96
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	18,28	4,57
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,18	25,21	29,74
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material		m²	1,34	63,36	84,64
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,31	2,74	6,32
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,21	21,22	4,41
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	9,24	0,96	8,86
			MO sem LS =>	15,89	LS =>	18,24	MO com LS =>	34,13
			Valor do BDI =>	36,76			Valor com BDI =>	184,04
					Quant. =>	26,20	Preço Total =>	4.821,84
5.4	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	119,45	119,45
Composição Auxiliar	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	0,53	147,28	77,32
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,21	18,28	3,76
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,13	25,21	28,36
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,01	7,10	0,07
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento		MES	0,20	8,58	1,68
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento		MES	0,79	3,30	2,59
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento		MES	0,39	13,20	5,18
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,02	26,19	0,49
			MO sem LS =>	20,06	LS =>	23,02	MO com LS =>	43,08
			Valor do BDI =>	29,81			Valor com BDI =>	149,26
					Quant. =>	26,20	Preço Total =>	3.910,61
5.5	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	37,80	37,80
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,06	523,95	29,60
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,27	25,49	6,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,38	1,28
			MO sem LS =>	4,21	LS =>	4,83	MO com LS =>	9,04
			Valor do BDI =>	9,43			Valor com BDI =>	47,23
					Quant. =>	14,80	Preço Total =>	699,00
5.6	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,75	1,67	1,25
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,72	52,14	37,69
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,66	1,36	493,21
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,59	208,90	123,96
			MO sem LS =>	24,22	LS =>	27,80	MO com LS =>	52,02
			Valor do BDI =>	181,39			Valor com BDI =>	908,14
					Quant. =>	4,80	Preço Total =>	4.359,07
5.7	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,17	0,56	0,65

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 55 Rúbrica

Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,21	46,53
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,49	47,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,54	17,38	96,25
			MO sem LS =>	65,85	LS =>	75,58	MO com LS =>	141,43
			Valor do BDI =>	47,75			Valor com BDI =>	239,09
					Quant. =>	4,80	Preço Total =>	1.147,63

5.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	21,73	21,73
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	14,49	14,49
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,04	17,17	0,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,22	25,33	5,68
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	1,19	0,22	0,26
			MO sem LS =>	3,05	LS =>	3,51	MO com LS =>	6,56
			Valor do BDI =>	5,42			Valor com BDI =>	27,15
					Quant. =>	39,76	Preço Total =>	1.079,48

5.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	17,37	17,37
Composição Auxiliar	92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	13,91	13,91
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	17,17	0,26
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	25,33	2,42
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,54	0,22	0,11
			MO sem LS =>	1,09	LS =>	1,26	MO com LS =>	2,35
			Valor do BDI =>	4,33			Valor com BDI =>	21,70
					Quant. =>	273,12	Preço Total =>	5.926,70
6		INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME						24.532,96

6.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,00	68,75	68,75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,96	17,38	68,75
			MO sem LS =>	22,40	LS =>	25,70	MO com LS =>	48,10
			Valor do BDI =>	17,16			Valor com BDI =>	85,91
					Quant. =>	1,66	Preço Total =>	142,61

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96539 SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	111,41	111,41
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,03	28,29	0,73
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,06	27,33	1,50
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,76	18,28	13,94
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,94	25,21	48,85
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material		m²	0,59	63,36	37,57
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,01	7,10	0,07
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,29	2,74	6,28
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,01	26,19	0,26
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,01	23,49	0,16
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,04	21,63	0,75
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,36	0,96	1,30
			MO sem LS =>	23,54	LS =>	27,01	MO com LS =>	50,55
			Valor do BDI =>	27,80			Valor com BDI =>	139,21
					Quant. =>	36,78	Preço Total =>	5.120,14

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	37,80	37,80
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,06	523,95	29,60
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,27	25,49	6,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,38	1,28
			MO sem LS =>	4,21	LS =>	4,83	MO com LS =>	9,04
			Valor do BDI =>	9,43			Valor com BDI =>	47,23
					Quant. =>	13,40	Preço Total =>	632,88

6.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,71	0,42	0,29

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 56 Rúbrica

Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75		1,25
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	52,14	37,69
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,36	493,21
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	208,90	123,96
			MO sem LS => 24,22	LS =>	27,80	MO com LS =>	52,02
			Valor do BDI => 181,39			Valor com BDI =>	908,14
				Quant. =>	4,87	Preço Total =>	4.422,64

6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,21	46,53
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,49	47,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	17,38	96,25
			MO sem LS => 65,85	LS =>	75,58	MO com LS =>	141,43
			Valor do BDI => 47,75			Valor com BDI =>	239,09
				Quant. =>	4,87	Preço Total =>	1.164,36

6.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	21,73	21,73
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	14,49	14,49
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,17	0,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	25,33	5,68
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,22	0,26
			MO sem LS => 3,05	LS =>	3,51	MO com LS =>	6,56
			Valor do BDI => 5,42			Valor com BDI =>	27,15
				Quant. =>	62,97	Preço Total =>	1.709,63

6.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92777 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	19,41	19,41
Composição Auxiliar	92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	15,00	15,00
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,17	0,35
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	25,33	3,23
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,74	0,22	0,16
			MO sem LS => 1,52	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,26
			Valor do BDI => 4,84			Valor com BDI =>	24,25
				Quant. =>	148,70	Preço Total =>	3.605,97

6.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00	160,45	160,45
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	669,88	9,04
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,00	25,49	76,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	17,38	26,05
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	55,85	0,68	37,97
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,04	40,33	1,46
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	1,51	6,31	9,52
			MO sem LS => 37,45	LS =>	42,99	MO com LS =>	80,44
			Valor do BDI => 40,04			Valor com BDI =>	200,49
				Quant. =>	25,93	Preço Total =>	5.198,70

6.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557 SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,00	37,83	37,83
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	18,49	1,57
Composição Auxiliar	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42	25,73	10,65
Insumo	00000626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	1,50	16,94	25,41
			MO sem LS => 4,53	LS =>	5,19	MO com LS =>	9,72
			Valor do BDI => 9,44			Valor com BDI =>	47,27
				Quant. =>	53,65	Preço Total =>	2.536,03

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 57 Rúbrica

7		SUPERESTRUTURA - PILARES						30.051,78
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263 SINAPI	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	147,28	147,28
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,06	28,29	1,78
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,26	27,33	6,96
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	18,28	4,57
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,18	25,21	29,74
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material		m²	1,34	63,36	84,64
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,31	2,74	6,32
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,21	21,22	4,41
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	9,24	0,96	8,86
			MO sem LS =>	15,89	LS =>	18,24	MO com LS =>	34,13
			Valor do BDI =>	36,76			Valor com BDI =>	184,04
					Quant. =>	61,44	Preço Total =>	11.307,41
7.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	119,45	119,45
Composição Auxiliar	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	0,53	147,28	77,32
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,21	18,28	3,76
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,13	25,21	28,36
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,01	7,10	0,07
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento		MES	0,20	8,58	1,68
Insumo	00040267 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento		MES	0,79	3,30	2,59
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento		MES	0,39	13,20	5,18
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,02	26,19	0,49
			MO sem LS =>	20,06	LS =>	23,02	MO com LS =>	43,08
			Valor do BDI =>	29,81			Valor com BDI =>	140,26
					Quant. =>	61,44	Preço Total =>	9.170,53
7.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,75	1,67	1,25
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,72	52,14	37,69
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,66	1,36	493,21
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,59	208,90	123,96
			MO sem LS =>	24,22	LS =>	27,80	MO com LS =>	52,02
			Valor do BDI =>	181,39			Valor com BDI =>	908,14
					Quant. =>	3,34	Preço Total =>	3.033,18
7.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,21	46,63
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,49	47,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,54	17,38	96,25
			MO sem LS =>	65,85	LS =>	75,58	MO com LS =>	141,43
			Valor do BDI =>	47,75			Valor com BDI =>	239,09
					Quant. =>	3,34	Preço Total =>	798,56
7.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	21,73	21,73
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	14,49	14,49
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,04	17,17	0,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,22	25,33	5,68
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	1,19	0,22	0,26

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 58
Rúbrica

			MO sem LS =>	3,05	LS =>	3,51	MO com LS =>	6,56
			Valor do BDI =>	5,42			Valor com BDI =>	27,15
					Quant. =>	65,63	Preço Total =>	1.781,85
7.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	17,37	17,37
Composição Auxiliar	92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	13,91	13,91
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	17,17	0,26
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	25,33	2,42
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,04	0,22	0,11
			MO sem LS =>	1,09	LS =>	1,26	MO com LS =>	2,35
			Valor do BDI =>	4,33			Valor com BDI =>	21,70
					Quant. =>	182,50	Preço Total =>	3.960,25
8		SUPERESTRUTURA - VIGAS						21.246,57
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92266 SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	117,63	117,63
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,05	28,29	1,41
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,24	27,33	6,47
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,20	18,28	3,69
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,91	25,21	22,96
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material		m²	1,15	63,36	72,61
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,17	2,74	0,46
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,16	21,22	3,37
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	6,96	0,96	6,67
			MO sem LS =>	12,77	LS =>	14,65	MO com LS =>	27,42
			Valor do BDI =>	29,36			Valor com BDI =>	146,99
					Quant. =>	38,88	Preço Total =>	5.714,97
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92455 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	128,86	128,86
Composição Auxiliar	92265 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	0,41	117,63	48,69
Composição Auxiliar	92272 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		M	1,73	26,94	46,57
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,19	18,28	3,47
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,04	25,21	26,09
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,01	7,10	0,07
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,05	26,19	1,28
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,33	8,23	2,69
			MO sem LS =>	19,75	LS =>	22,67	MO com LS =>	42,42
			Valor do BDI =>	32,16			Valor com BDI =>	161,02
					Quant. =>	38,88	Preço Total =>	6.260,45
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,75	1,67	1,25
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,72	52,14	37,69
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,66	1,36	493,21
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,59	208,90	123,96
			MO sem LS =>	24,22	LS =>	27,80	MO com LS =>	52,02
			Valor do BDI =>	181,39			Valor com BDI =>	908,14
					Quant. =>	3,74	Preço Total =>	3.396,44
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,21	46,63
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,49	47,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,54	17,38	96,25
			MO sem LS =>	65,85	LS =>	75,58	MO com LS =>	141,43
			Valor do BDI =>	47,75			Valor com BDI =>	239,09
					Quant. =>	3,74	Preço Total =>	894,19

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RMUI - Fls. 59 Rúbrica

8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	21,73	21,73
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	14,49	14,49
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,17	0,63
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	25,33	5,68
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,22	0,26
			MO sem LS => 3,05	LS =>	3,51	MO com LS =>	6,56
			Valor do BDI => 5,42			Valor com BDI =>	27,15
				Quant. =>	65,43	Preço Total =>	1.776,42

8.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92776 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	20,65	20,65
Composição Auxiliar	92792 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	14,96	14,96
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	17,17	0,48
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	25,33	4,33
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,97	0,22	0,21
			MO sem LS => 2,16	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,64
			Valor do BDI => 5,15			Valor com BDI =>	25,80
				Quant. =>	124,19	Preço Total =>	3.204,10
9		ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO					35.019,46

9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00	116,45	116,45
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	581,25	6,16
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,33	25,49	59,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,17	17,38	20,28
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,74	0,68	25,66
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,01	40,33	0,52
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	1,09	3,99	4,34
			MO sem LS => 28,86	LS =>	33,13	MO com LS =>	61,99
			Valor do BDI => 20,06			Valor com BDI =>	145,51
				Quant. =>	203,04	Preço Total =>	29.544,35

9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93201 SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	6,24	6,24
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	543,88	1,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	25,49	3,82
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	17,38	0,52
			MO sem LS => 1,69	LS =>	1,93	MO com LS =>	3,62
			Valor do BDI => 1,56			Valor com BDI =>	7,79
				Quant. =>	55,83	Preço Total =>	434,91

9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93186 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	66,32	66,32
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,49	14,66	7,18
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,02	671,35	12,08
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,35	91,15	31,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	25,49	9,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	17,38	3,26
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	7,10	0,04
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,22	1,32
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,35	2,74	0,96
			MO sem LS => 9,12	LS =>	10,46	MO com LS =>	19,58
			Valor do BDI => 16,55			Valor com BDI =>	82,87
				Quant. =>	23,00	Preço Total =>	1.906,01

9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93188 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	57,57	57,57
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,31	14,00	4,31
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,01	671,35	8,05
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,30	91,15	27,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 60 Rúbrica

Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,39	25,49	9,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,19	17,38	3,35
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,01	7,10	0,03
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	6,00	0,22	1,32
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,22	2,74	3,34
			MO sem LS =>	8,57	LS =>	9,84	MO com LS =>	18,41
			Valor do BDI =>	14,36			Valor com BDI =>	71,93
					Quant. =>	22,00	Preço Total =>	1.582,46

9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93196 SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	65,36	65,36
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,49	14,66	7,18
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,02	671,35	12,08
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,35	91,15	31,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	25,49	9,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	17,38	3,26
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	7,10	0,04
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,22	1,32
			MO sem LS =>	9,12	LS =>	10,46	MO com LS =>	19,58
			Valor do BDI =>	16,31			Valor com BDI =>	81,67
					Quant. =>	19,00	Preço Total =>	1.551,73
10		REVESTIMENTO						41.475,24

10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	7,65	7,65
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	815,94	3,42
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	25,49	3,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	17,38	1,07
			MO sem LS =>	1,77	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,80
			Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI =>	9,55
					Quant. =>	406,08	Preço Total =>	3.878,06

10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	36,80	36,80
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	581,25	21,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47	25,49	11,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	17,38	2,97
			MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,64	MO com LS =>	14,30
			Valor do BDI =>	9,18			Valor com BDI =>	45,98
					Quant. =>	406,08	Preço Total =>	18.671,55

10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87528 SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de taliscа	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	43,62	43,62
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	689,88	25,18
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,58	25,49	14,78
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	17,38	3,66
			MO sem LS =>	8,99	LS =>	10,32	MO com LS =>	19,31
			Valor do BDI =>	10,88			Valor com BDI =>	54,50
					Quant. =>	111,36	Preço Total =>	6.069,12

10.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87274 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	92,39	92,39
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,02	29,15	29,73
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,50	17,38	8,69
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,14	1,25	7,67
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,22	7,34	1,61
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,09	41,00	44,69
			MO sem LS =>	14,14	LS =>	16,22	MO com LS =>	30,36
			Valor do BDI =>	23,06			Valor com BDI =>	115,45
					Quant. =>	111,36	Preço Total =>	12.856,51
11		PINTURA						16.190,39

11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	PINT - PINTURAS	m²	1,00	2,30	2,30
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	26,53	1,03

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 61 Rúbrica

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,01	17,38	0,24
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material		L	0,16	6,49	1,03
			MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
			Valor do BDI =>	0,57			Valor com BDI =>	2,87
					Quant. =>	406,08	Preço Total =>	1.165,44
11.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88497 SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS		m²	1,00	14,27	14,27
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,31	26,53	8,27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,11	17,38	1,98
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material		UN	0,10	0,86	0,08
Insumo	00043626 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material		KG	1,56	2,54	3,94
			MO sem LS =>	3,55	LS =>	4,08	MO com LS =>	7,63
			Valor do BDI =>	3,56			Valor com BDI =>	17,83
					Quant. =>	203,04	Preço Total =>	3.620,20
11.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	Latex PVA		m²	1,00	17,44	17,44
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,25	3,74	0,93
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios		h	0,35	3,81	1,33
Insumo	1602 ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material		l	0,72	6,72	4,83
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material		UN	0,50	0,86	0,43
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra		H	0,35	19,81	6,93
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,25	11,96	2,99
			MO sem LS =>	4,62	LS =>	5,30	MO com LS =>	9,92
			Valor do BDI =>	4,35			Valor com BDI =>	21,79
					Quant. =>	203,04	Preço Total =>	4.424,24
11.4	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta acetinada em paredes, duas demãos.	PINT - PINTURAS		m²	1,00	13,76	13,76
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	26,53	3,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,05	17,38	0,83
Insumo	00007345 SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material		L	0,33	28,76	9,49
			MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,70	MO com LS =>	3,18
			Valor do BDI =>	3,43			Valor com BDI =>	17,19
					Quant. =>	406,08	Preço Total =>	6.980,51
12		**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**						**2.896,19**
12.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,00	116,45	116,45
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,01	581,25	6,16
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,33	25,49	59,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,17	17,38	20,28
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	37,74	0,68	25,66
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,01	40,33	0,52
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	1,09	3,99	4,34
			MO sem LS =>	28,86	LS =>	33,13	MO com LS =>	61,99
			Valor do BDI =>	29,06			Valor com BDI =>	145,51
					Quant. =>	1,20	Preço Total =>	174,61
12.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,00	7,65	7,65
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_05/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,00	815,94	3,42
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,12	25,49	3,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,06	17,38	1,07
			MO sem LS =>	1,77	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,80
			Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI =>	9,55
					Quant. =>	2,80	Preço Total =>	24,83
12.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,00	36,80	36,80
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,04	581,25	21,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,47	25,49	11,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	17,38	2,97
			MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,64	MO com LS =>	14,30
			Valor do BDI =>	9,18			Valor com BDI =>	45,98
					Quant. =>	2,80	Preço Total =>	119,54
12.4	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI - Fls. 69 Rúbrica

Composição	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	PINT - PINTURAS		m²	1,00	2,30	2,30
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,04	26,53	1,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,01	17,38	0,24
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material		L	0,16	6,49	1,03
				MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
				Valor do BDI =>	0,57			Valor com BDI =>	2,87
						Quant. =>	3,98	Preço Total =>	11,42
12.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	8624	ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	Latex PVA		m²	1,00	17,44	17,44
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,25	3,74	0,93
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios		h	0,35	3,81	1,33
Insumo	1602	ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material		l	0,72	6,72	4,83
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material		UN	0,50	0,86	0,43
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra		H	0,35	19,81	6,93
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,25	11,96	2,99
				MO sem LS =>	4,62	LS =>	5,30	MO com LS =>	9,92
				Valor do BDI =>	4,35			Valor com BDI =>	21,79
						Quant. =>	3,98	Preço Total =>	86,72
12.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS		m²	1,00	13,76	13,76
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	26,53	3,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,05	17,38	0,83
Insumo	00007345	SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material		L	0,33	28,76	9,49
				MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,70	MO com LS =>	3,18
				Valor do BDI =>	3,43			Valor com BDI =>	17,19
						Quant. =>	3,98	Preço Total =>	68,41
12.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,75	1,67	1,25
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,72	52,14	37,69
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,66	1,36	493,21
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,59	208,90	123,96
				MO sem LS =>	24,22	LS =>	27,80	MO com LS =>	52,02
				Valor do BDI =>	181,39			Valor com BDI =>	908,14
						Quant. =>	1,46	Preço Total =>	1.325,88
12.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,21	46,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,49	47,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,54	17,38	96,25
				MO sem LS =>	65,85	LS =>	75,58	MO com LS =>	141,43
				Valor do BDI =>	47,75			Valor com BDI =>	230,09
						Quant. =>	1,46	Preço Total =>	349,07
12.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO		m²	1,00	588,76	588,76
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,01	742,05	8,90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,46	25,49	11,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,23	17,38	3,98
Insumo	00004930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material		m²	1,00	564,24	564,24
				MO sem LS =>	6,17	LS =>	7,09	MO com LS =>	13,26
				Valor do BDI =>	146,95			Valor com BDI =>	735,71
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	735,71
13			**COBERTURA**						**42.002,35**
13.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	283	ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	Telhamento		m²	1,00	61,23	61,23
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,22	3,74	0,82
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	0,22	3,63	0,79
Insumo	667	ORSE	Kit de fixação (prego/arruela) para telhas onduline (20 pregos e 20 arruelas)	Material		un	0,50	8,69	4,34

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 63
Rúbrica

Insumo	2191 ORSE	Telha ecológica onduline 2,00 x 0,95 x 0,028 m	Material		un	0,65	73,90	48,30
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	0,22	19,81	4,35
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,22	11,96	2,63
			MO sem LS =>	3,25	LS =>	3,73	MO com LS =>	6,98
			Valor do BDI =>	15,28			Valor com BDI =>	76,51
					Quant. =>	185,13	Preço Total =>	14.164,29

13.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92540 SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	COBE - COBERTURA		m²	1,00	54,03	54,03
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,06	22,30	1,34
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,04	23,11	1,00
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,48	18,28	8,84
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,64	25,21	16,15
Insumo	00004430 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,98	5,83	11,52
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,07	23,49	1,64
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material		KG	0,05	21,20	1,06
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material		KG	0,03	21,38	0,64
Insumo	00004408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,31	1,11	3,67
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,66	12,33	8,17
			MO sem LS =>	9,75	LS =>	11,20	MO com LS =>	20,95
			Valor do BDI =>	13,48			Valor com BDI =>	67,51
					Quant. =>	185,13	Preço Total =>	12.498,12

13.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94223 SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com composito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	COBE - COBERTURA		M	1,00	111,49	111,49
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,00	23,11	0,04
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,00	22,30	0,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,38	1,26
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,06	24,97	1,49
Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material		CJ	4,20	0,24	1,00
Insumo	00007219 SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material		UN	1,03	89,72	92,32
Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material		UN	4,20	3,65	15,33
			MO sem LS =>	0,99	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,13
			Valor do BDI =>	27,82			Valor com BDI =>	139,31
					Quant. =>	32,24	Preço Total =>	4.491,35

13.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	55960 SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	COBE - COBERTURA		m²	1,00	6,03	6,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,20	17,38	3,47
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material		L	0,10	25,61	2,56
			MO sem LS =>	1,13	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,43
			Valor do BDI =>	1,50			Valor com BDI =>	7,53
					Quant. =>	185,13	Preço Total =>	1.394,02

13.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4449 ORSE	Forro em da PVC 100mm - inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro.	Forros		m²	1,00	57,95	57,95
Insumo	1019 ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref Araforros ou similar	Material		m²	1,00	57,95	57,95
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	14,46			Valor com BDI =>	72,41
					Quant. =>	130,57	Preço Total =>	9.454,57

14		PAVIMENTAÇÃO						42.873,37
14.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,00	41,68	41,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,40	17,38	41,68
			MO sem LS =>	13,58	LS =>	15,58	MO com LS =>	29,16
			Valor do BDI =>	10,40			Valor com BDI =>	52,08
					Quant. =>	19,57	Preço Total =>	1.019,20

14.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87690 SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	PISO - PISOS		m²	1,00	58,26	58,26
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	0,06	799,74	48,54
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,29	25,49	7,26
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,14	17,38	2,46
			MO sem LS =>	5,71	LS =>	6,55	MO com LS =>	12,26
			Valor do BDI =>	14,54			Valor com BDI =>	72,80
					Quant. =>	130,57	Preço Total =>	9.505,49

14.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 64 Rúbrica

Composição	87630 SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	PISO - PISOS		m²	1,00	46,39	46,39
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,04	799,74	34,46
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	25,49	6,24
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,12	17,38	2,13
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material		L	0,21	13,72	2,88
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,50	1,36	0,68
			MO sem LS =>	4,58	LS =>	5,25	MO com LS =>	9,83
			Valor do BDI =>	11,57			Valor com BDI =>	57,96
					Quant. =>	130,57	Preço Total =>	7.567,83
14.4	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87255 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS		m²	1,00	137,82	137,82
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,93	29,15	27,10
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,34	17,38	5,90
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	8,62	1,25	10,77
Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material		m²	1,12	83,07	93,03
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,14	7,34	1,02
			MO sem LS =>	12,23	LS =>	14,04	MO com LS =>	26,27
			Valor do BDI =>	34,39			Valor com BDI =>	172,21
					Quant. =>	130,57	Preço Total =>	22.495,45
14.5	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	PISO - PISOS		M	1,00	19,97	19,97
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,09	29,15	2,47
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	17,38	0,53
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	0,60	1,25	0,75
Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material		m²	0,19	83,07	15,61
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,06	7,34	0,41
			MO sem LS =>	1,11	LS =>	1,28	MO com LS =>	2,39
			Valor do BDI =>	4,98			Valor com BDI =>	24,95
					Quant. =>	92,00	Preço Total =>	2.295,40
15		**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**						**4.705,55**
15.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96689 SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	PISO - PISOS		M	1,00	112,21	112,21
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,55	26,63	14,56
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,27	17,38	4,74
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	1,29	3,84	4,96
Insumo	00020232 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	Material		M	1,00	87,96	87,96
			MO sem LS =>	6,96	LS =>	7,99	MO com LS =>	14,95
			Valor do BDI =>	28,00			Valor com BDI =>	140,21
					Quant. =>	4,50	Preço Total =>	630,94
15.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88648 SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	PISO - PISOS		M	1,00	8,95	8,95
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	29,15	2,04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	17,38	0,53
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	0,60	1,25	0,76
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material		m²	0,12	40,75	5,01
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,09	7,34	0,62
			MO sem LS =>	0,95	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,03
			Valor do BDI =>	2,23			Valor com BDI =>	11,18
					Quant. =>	96,06	Preço Total =>	1.073,95
15.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101965 SINAPI	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		M	1,00	127,73	127,73
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,02	28,29	0,59
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,40	27,33	10,87
Composição Auxiliar	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,01	544,86	3,26
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,42	26,63	11,15
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,21	17,38	3,63
Insumo	00034747 SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0" CM, COM PINGADEIRA	Material		M	1,04	94,46	98,23
			MO sem LS =>	10,01	LS =>	11,49	MO com LS =>	21,50
			Valor do BDI =>	31,88			Valor com BDI =>	159,61
					Quant. =>	18,80	Preço Total =>	3.000,66
16		**CALÇADA DE PROTEÇÃO**						**18.594,36**
16.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,00	68,75	68,75

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 65
Rúbrica

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,96	MO com LS =>	68,75
			MO sem LS =>	22,40	LS =>	25,70	MO com LS =>	48,10
			Valor do BDI =>	17,16			Valor com BDI =>	85,91
					Quant. =>	3,97	Preço Total =>	341,06
16.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,00	41,68	41,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,40	17,38	41,68
			MO sem LS =>	13,58	LS =>	15,58	MO com LS =>	29,16
			Valor do BDI =>	10,40			Valor com BDI =>	52,08
					Quant. =>	2,78	Preço Total =>	144,78
16.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,00	160,45	160,45
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,01	669,88	9,04
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,00	25,49	76,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,50	17,38	26,05
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	56,85	0,68	37,97
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,04	40,33	1,46
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material		M	1,51	6,31	9,52
			MO sem LS =>	37,45	LS =>	42,99	MO com LS =>	80,44
			Valor do BDI =>	40,04			Valor com BDI =>	200,49
					Quant. =>	19,90	Preço Total =>	3.989,75
16.4	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94994 SINAPI	Caiçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	PISO - PISOS		m²	1,00	139,44	139,44
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,10	680,09	60,96
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,18	25,21	4,55
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,28	25,49	7,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,46	17,38	7,94
Insumo	00003777 SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material		m²	1,13	1,90	2,14
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,20	0,96	0,19
Insumo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,25	4,11	1,02
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material		m²	1,12	45,06	50,59
			MO sem LS =>	9,42	LS =>	10,82	MO com LS =>	20,24
			Valor do BDI =>	34,80			Valor com BDI =>	174,24
					Quant. =>	72,77	Preço Total =>	12.679,44
16.5	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,00	7,65	7,65
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,00	815,94	3,42
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,12	25,49	3,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,06	17,38	1,07
			MO sem LS =>	1,77	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,80
			Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI =>	9,55
					Quant. =>	25,92	Preço Total =>	247,53
16.6	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2.0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,00	36,80	36,80
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,04	581,25	21,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,47	25,49	11,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	17,38	2,97
			MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,64	MO com LS =>	14,30
			Valor do BDI =>	9,18			Valor com BDI =>	45,96
					Quant. =>	25,92	Preço Total =>	1.191,80
17		**ESQUADRIAS**						**20.005,04**
17.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,00	310,43	310,43
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,68	24,08	40,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,84	17,38	14,58
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material		UN	3,00	16,06	48,18

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 66 Rúbrica

Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material		UN	19,80	0,07	1,38
Insumo	00010556 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material		UN	1,00	205,89	205,89
			MO sem LS =>	19,48	LS =>	22,36	MO com LS =>	41,84
			Valor do BDI =>	77,48			Valor com BDI =>	387,91
					Quant. =>	5,00	Preço Total =>	1.939,55

17.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	1,00	781,55	781,55
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,01	861,54	6,89
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,10	25,49	53,50
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,05	17,38	18,23
Insumo	00011199 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Material		UN	0,56	1.264,72	702,93
			MO sem LS =>	26,01	LS =>	29,86	MO com LS =>	55,87
			Valor do BDI =>	195,07			Valor com BDI =>	976,62
					Quant. =>	18,00	Preço Total =>	17.579,16

17.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94559 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	1,00	810,82	810,82
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,02	861,54	18,09
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,58	25,49	116,76
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,29	17,38	39,81
Insumo	00011190 SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material		UN	2,78	229,00	636,16
			MO sem LS =>	56,96	LS =>	65,37	MO com LS =>	122,33
			Valor do BDI =>	202,38			Valor com BDI =>	1.013,20
					Quant. =>	0,48	Preço Total =>	486,33

18		LOUÇAS E METAIS						8.620,67

18.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2390 ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	Alambrados e Gradis		un	1,00	188,30	188,30
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,30	3,60	1,08
Insumo	2063 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2" - Jackwal ou similar	Material		un	1,00	181,28	181,28
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,30	19,81	5,94
			MO sem LS =>	2,77	LS =>	3,17	MO com LS =>	5,94
			Valor do BDI =>	46,99			Valor com BDI =>	235,29
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	470,58

18.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8974 ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	Louças e Metais Sanitários		un	1,00	1.065,16	1.065,16
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,03	734,10	22,02
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,30	3,60	1,08
Insumo	9262 ORSE	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) - em placa sólida de fórmica, sistema de travamento na vertical e ferragens em latão	Material		un	1,00	1.036,12	1.036,12
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,30	19,81	5,94
			MO sem LS =>	3,43	LS =>	3,94	MO com LS =>	7,37
			Valor do BDI =>	265,86			Valor com BDI =>	1.331,02
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	2.662,04

18.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95546 SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	141,76	141,76
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,90	24,86	47,15
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,60	17,38	10,38
Insumo	00039398 SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Material		UN	1,00	84,23	84,23
			MO sem LS =>	21,12	LS =>	24,25	MO com LS =>	45,37
			Valor do BDI =>	35,38			Valor com BDI =>	177,14
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	354,28

18.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86931 SINAPI	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS		UN	1,00	452,91	452,91
Composição Auxiliar	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	442,00	442,00
Composição Auxiliar	86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	10,91	10,91
			MO sem LS =>	11,46	LS =>	13,16	MO com LS =>	24,62
			Valor do BDI =>	113,04			Valor com BDI =>	565,95
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.131,90

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000377 SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	Material		UN	1,00	35,25	35,25
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	8,79			Valor com BDI =>	44,04
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	88,08

18.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 67
Rúbrica
PMU

Composição	86943 SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	209,09	209,09
Composição Auxiliar	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	10,64	10,64
Composição Auxiliar	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	134,17	134,17
Composição Auxiliar	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	49,32	49,32
Composição Auxiliar	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	6,69	6,69
Composição Auxiliar	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	8,27	8,27
			MO sem LS => 9,74	LS =>	11,19	MO com LS =>	20,93
			Valor do BDI => 52,18			Valor com BDI =>	261,27
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	783,81

18.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2050 ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	Louças e Metais Sanitários	un	1,00	25,21	25,21
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,40	3,65	1,46
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,40	19,81	7,92
Insumo	00007606 SINAPI	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	Material	UN	1,00	6,49	6,49
Insumo	00011680 SINAPI	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	Material	UN	1,00	9,34	9,34
			MO sem LS => 3,69	LS =>	4,23	MO com LS =>	7,92
			Valor do BDI => 6,29			Valor com BDI =>	31,50
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	63,00

18.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2103 ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	Louças e Metais Sanitários	un	1,00	823,50	823,50
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,04	762,70	27,45
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	2,88	14,07	40,52
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,00	3,74	7,48
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,00	3,60	7,20
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,00	3,65	7,30
Insumo	245 ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	Material	un	1,00	188,88	188,88
Insumo	2016 ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar	Material	un	1,00	178,60	178,60
Insumo	9964 ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	1,20	19,61	23,53
Insumo	14004 ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar) un	0	un	1,00	186,45	186,45
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	2,00	19,81	39,62
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,00	19,81	39,62
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,00	11,96	23,92
Insumo	00006157 SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Material	UN	1,00	52,93	52,93
			MO sem LS => 52,82	LS =>	60,62	MO com LS =>	113,44
			Valor do BDI => 205,54			Valor com BDI =>	1.029,04
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.029,04

18.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2093 ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas valvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	1,00	1.630,88	1.630,88
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,06	762,70	45,76
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	4,80	14,07	67,53
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,00	3,74	14,96
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	4,00	3,60	14,40
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	4,00	3,65	14,60
Insumo	246 ORSE	Pia de cozinha em aço inox 2,00x0,60m c/ 2 cubas, sem valvula (padrão comercial) un	0	un	1,00	407,82	407,82
Insumo	2016 ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar	Material	un	2,00	178,60	357,20
Insumo	9964 ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	1,20	19,61	23,53
Insumo	14004 ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar) un	0	un	2,00	186,45	372,90
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	4,00	19,81	79,24
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	4,00	19,81	79,24
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,00	11,96	47,84
Insumo	00006157 SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Material	UN	2,00	52,93	105,86
			MO sem LS => 104,04	LS =>	119,41	MO com LS =>	223,45
			Valor do BDI => 407,06			Valor com BDI =>	2.037,94
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.037,94

19		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					12.244,54
19.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93243 SINAPI	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saida, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	6.872,09	6.872,09
Composição Auxiliar	98462 SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	5.470,89	5.470,89

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 68
Rúbrica

Composição Auxiliar	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,00	7,50	22,50
Composição Auxiliar	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	20,00	10,57	211,40
Composição Auxiliar	94688 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,00	9,99	19,98
Composição Auxiliar	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	21,17	21,17
Composição Auxiliar	89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	42,72	42,72
Composição Auxiliar	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	34,02	34,02
Insumo	00034640 SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,00	1.049,41	1.049,41
			MO sem LS => 196,64	LS =>	225,70	MO com LS =>	422,34
			Valor do BDI => 1.715,27			Valor com BDI =>	8.587,36
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	8.587,36

19.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89446 SINAPI	Tubo de PVC rígido soldável marrom para água fria Ø 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	5,76	5,76
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,86	0,34
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	24,86	0,48
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,00	2,30	0,01
Insumo	00009865 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,05	4,70	4,93
			MO sem LS => 0,30	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,64
			Valor do BDI => 1,43			Valor com BDI =>	7,19
				Quant. =>	28,90	Preço Total =>	207,79

19.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89448 SINAPI	Tubo de PVC rígido soldável marrom para água fria Ø 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	17,32	17,32
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	17,86	0,50
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	24,86	0,70
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01	2,30	0,01
Insumo	00009874 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,05	15,36	16,11
			MO sem LS => 0,43	LS =>	0,49	MO com LS =>	0,92
			Valor do BDI => 4,32			Valor com BDI =>	21,64
				Quant. =>	30,10	Preço Total =>	651,36

19.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	12,41	12,41
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,86	1,25
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,45	24,86	11,16
			MO sem LS => 4,62	LS =>	5,31	MO com LS =>	9,93
			Valor do BDI => 3,09			Valor com BDI =>	15,50
				Quant. =>	19,75	Preço Total =>	306,12

19.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362 SINAPI	Joelho 90º soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	8,20	8,20
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	17,86	2,71
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	24,86	3,77
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08	0,32
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	0,93	0,93
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03	2,30	0,07
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	51,08	0,40
			MO sem LS => 2,34	LS =>	2,69	MO com LS =>	5,03
			Valor do BDI => 2,04			Valor com BDI =>	10,24
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>	81,92

19.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89364 SINAPI	Curva 90º soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	11,16	11,16
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	17,86	2,71
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	24,86	3,77
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08	0,32
Insumo	00001956 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00	3,89	3,89
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03	2,30	0,07
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	51,08	0,40
			MO sem LS => 2,34	LS =>	2,69	MO com LS =>	5,03
			Valor do BDI => 2,78			Valor com BDI =>	13,94
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	27,88

19.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373 SINAPI	Joelho 90º soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	14,02	14,02
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	17,86	2,34
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	24,86	3,26
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08	0,26
Insumo	00020147 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	7,74	7,74

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 69
Rúbrica

Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,03	2,30	0,07
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,35
			MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,32	MO com LS =>	4,34
			Valor do BDI =>	3,49			Valor com BDI =>	17,51
					Quant. =>	11,00	Preço Total =>	192,61

19.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1144 ORSE	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável		un	1,00	13,26	13,26
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,18	3,74	0,67
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,18	3,65	0,65
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,01	81,38	0,48
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,01	78,37	0,78
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,18	19,81	3,56
Insumo	00003538 SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,00	4,97	4,97
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,18	11,96	2,15
			MO sem LS =>	2,56	LS =>	3,05	MO com LS =>	5,71
			Valor do BDI =>	3,30			Valor com BDI =>	16,56
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	99,36

19.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89497 SINAPI	Joelho 90° soldável 40mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	12,29	12,29
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	17,86	1,86
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	24,86	2,60
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,53
Insumo	00003535 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,00	6,56	6,56
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,02	2,30	0,03
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,71
			MO sem LS =>	1,62	LS =>	1,85	MO com LS =>	3,47
			Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	15,35
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	46,05

19.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1466 ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	Registros e Válvulas		un	1,00	102,73	102,73
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,61	3,74	2,28
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,61	3,65	2,22
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	1,20	0,22	0,26
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,61	19,81	12,08
Insumo	00006013 SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	Material		UN	1,00	78,60	78,60
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,61	11,96	7,29
			MO sem LS =>	9,02	LS =>	10,35	MO com LS =>	19,37
			Valor do BDI =>	25,64			Valor com BDI =>	128,37
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	385,11

19.11	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383 SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	5,81	5,81
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,09	17,86	1,68
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,09	24,86	2,34
Insumo	00000065 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material		UN	1,00	1,11	1,11
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,26
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,03	2,30	0,07
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,35
			MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,67	MO com LS =>	3,12
			Valor do BDI =>	1,45			Valor com BDI =>	7,26
					Quant. =>	14,00	Preço Total =>	101,64

19.12	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1470 ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	Registros e Válvulas		un	1,00	80,52	80,52
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,61	3,74	2,28
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,61	3,65	2,22
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,94	0,22	0,20
Insumo	1966 ORSE	Registro pressão 3/4" c/canopla acab crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	Material		un	1,00	56,45	56,45
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,61	19,81	12,08
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,61	11,96	7,29
			MO sem LS =>	9,02	LS =>	10,35	MO com LS =>	19,37
			Valor do BDI =>	20,09			Valor com BDI =>	100,61
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	100,61

19.13	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395 SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	11,40	11,40
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,20	17,86	3,61

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 70
Rúbrica

Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,20	24,86	5,03
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,47
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,05	2,30	0,11
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,61
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,00	1,57	1,57
			MO sem LS =>	3,13	LS =>	3,59	MO com LS =>	6,72
			Valor do BDI =>	2,84			Valor com BDI =>	14,24
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	85,44

19.14	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89420 SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	9,31	9,31
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,05	17,86	0,92
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,05	24,86	1,29
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,27
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,03	2,30	0,05
Insumo	00003855 SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	Material		UN	1,00	6,48	6,48
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,30
			MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,92	MO com LS =>	1,72
			Valor do BDI =>	2,32			Valor com BDI =>	11,63
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	11,63

19.15	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89623 SINAPI	Té PVC soldável de 40 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	19,33	19,33
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,14	17,86	2,50
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,14	24,86	3,48
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,02	45,08	0,79
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,02	2,30	0,05
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,02	51,08	1,07
Insumo	00007141 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,00	11,44	11,44
			MO sem LS =>	2,16	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,64
			Valor do BDI =>	4,82			Valor com BDI =>	24,15
					Quant. =>	5,00	Preço Total =>	120,75

19.16	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3147 ORSE	Té de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	Conversão InfoWOrca		un	1,00	19,02	19,02
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,30	3,74	1,12
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,30	3,65	1,09
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,01	81,38	1,13
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,02	78,37	1,56
Insumo	2672 ORSE	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm	Material		un	1,00	4,60	4,60
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,30	19,81	5,94
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,30	11,96	3,58
			MO sem LS =>	4,43	LS =>	5,09	MO com LS =>	9,52
			Valor do BDI =>	4,74			Valor com BDI =>	23,76
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	23,76

19.17	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94491 SINAPI	Registro de esfera soldável 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	43,62	43,62
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,11	17,86	2,02
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,11	24,86	2,81
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material		UN	0,07	14,71	1,05
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,01	2,30	0,02
Insumo	00011676 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material		UN	1,00	36,81	36,81
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,02	51,08	0,91
			MO sem LS =>	1,75	LS =>	2,00	MO com LS =>	3,75
			Valor do BDI =>	10,68			Valor com BDI =>	54,50
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	54,50

19.18	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94489 SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	21,79	21,79
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,08	17,86	1,41
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,08	24,86	1,97
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material		UN	0,04	14,71	0,58
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,01	2,30	0,01
Insumo	00011674 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material		UN	1,00	17,34	17,34
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,48
			MO sem LS =>	1,22	LS =>	1,41	MO com LS =>	2,63

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 71 Rubrica

			Valor do BDI => 5,43			Valor com BDI =>	27,22
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	27,22

19.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74166/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	752,69	752,69
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	17,86	17,86
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	24,86	24,86
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	25,49	38,23
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	17,38	26,07
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,00	52,14	0,10
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,00	1,36	2,72
Insumo	00003279 SINAPI	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60" CM, H= 60" CM	Material	UN	2,92	220,42	642,85
			MO sem LS => 38,01	LS =>	43,63	MO com LS =>	81,64
			Valor do BDI => 187,87			Valor com BDI =>	940,56
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	940,56

19.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2082 ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,00	51,45	51,45
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,34	3,74	1,27
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,34	3,65	1,24
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,30	0,22	0,06
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,34	19,81	6,73
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,34	11,96	4,06
Insumo	00011762 SINAPI	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)	Material	UN	1,00	38,09	38,09
			MO sem LS => 5,02	LS =>	5,77	MO com LS =>	10,79
			Valor do BDI => 12,84			Valor com BDI =>	64,29
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	192,87

20		INSTALAÇÃO SANITÁRIA					19.461,49
20.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89711 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	18,38	18,38
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30	17,86	5,35
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30	24,86	7,45
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,10	2,30	0,23
Insumo	00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,05	5,10	5,35
			MO sem LS => 4,63	LS =>	5,31	MO com LS =>	9,94
			Valor do BDI => 4,56			Valor com BDI =>	22,90
				Quant. =>	9,10	Preço Total =>	208,93

20.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	26,93	26,93
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	17,86	6,78
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	24,86	9,44
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08	0,48
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,13	2,30	0,29
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02	51,08	0,83
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,05	8,68	9,11
			MO sem LS => 5,87	LS =>	6,73	MO com LS =>	12,60
			Valor do BDI => 6,72			Valor com BDI =>	33,65
				Quant. =>	12,40	Preço Total =>	417,26

20.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	51,65	51,65
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,74	17,86	13,21
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,74	24,86	18,39
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,04	45,08	1,63
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,25	2,30	0,56
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,06	51,08	3,02
Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,05	14,14	14,84
			MO sem LS => 11,43	LS =>	13,11	MO com LS =>	24,54
			Valor do BDI => 12,89			Valor com BDI =>	64,54
				Quant. =>	28,00	Preço Total =>	1.807,12

20.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	12,41	12,41
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,86	1,25
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,45	24,86	11,16
			MO sem LS => 4,62	LS =>	5,31	MO com LS =>	9,93
			Valor do BDI => 3,09			Valor com BDI =>	15,50
				Quant. =>	8,40	Preço Total =>	130,20

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 72
Rúbrica

20.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89796	SINAPI	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	37,24	37,24
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	17,86	5,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	24,86	8,20
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,00	3,00	6,00
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,09	18,61	1,71
Insumo	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	15,44	15,44
				MO sem LS => 5,09	LS => 5,84		MO com LS =>	10,93
				Valor do BDI => 9,29			Valor com BDI =>	46,63
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	139,89

20.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1588	ORSE	Tê sanitário em PVC rígido soldável para esgoto primário, dn 100 x 50 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,00	48,25	48,25
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,46	3,74	1,72
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,46	3,65	1,67
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,08	81,38	6,10
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,12	78,37	9,40
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,46	19,81	9,11
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,46	11,96	5,50
Insumo	00011655	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	14,75	14,75
				MO sem LS => 6,80	LS => 7,81		MO com LS =>	14,61
				Valor do BDI => 12,04			Valor com BDI =>	60,29
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	60,29

20.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89785	SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	19,93	19,93
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	17,86	3,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	24,86	4,22
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,00	1,69	3,38
Insumo	00003662	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	8,56	8,56
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,04	18,61	0,74
				MO sem LS => 2,62	LS => 3,01		MO com LS =>	5,63
				Valor do BDI => 4,97			Valor com BDI =>	24,90
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	24,90

20.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1603	ORSE	Joelho 90º de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,00	11,22	11,22
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,12	3,74	0,44
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,12	3,65	0,43
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,02	81,38	1,30
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,02	78,37	1,72
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,12	19,81	2,37
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	3,53	3,53
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,12	11,96	1,43
				MO sem LS => 1,77	LS => 2,03		MO com LS =>	3,80
				Valor do BDI => 2,80			Valor com BDI =>	14,02
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>	140,20

20.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1554	ORSE	Joelho 90º de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,00	10,84	10,84
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,14	3,74	0,52
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,14	3,65	0,51
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,02	81,38	1,22
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,02	78,37	1,72
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,14	19,81	2,77
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	2,43	2,43
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,14	11,96	1,67
				MO sem LS => 2,07	LS => 2,37		MO com LS =>	4,44
				Valor do BDI => 2,70			Valor com BDI =>	13,54
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>	135,40

20.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744	SINAPI	Joelho 90º de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	22,56	22,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	17,86	4,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	24,86	6,21
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,00	3,00	3,00
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	8,04	8,04
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,05	18,61	0,85
				MO sem LS => 3,86	LS => 4,43		MO com LS =>	8,29
				Valor do BDI => 5,63			Valor com BDI =>	28,19

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 73
Rúbrica

					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	112,76
20.11	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89732 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	10,64	10,64
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	17,86	2,32
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	24,86	3,23
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,00	1,69	1,69
Insumo	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	3,03	3,03
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,02	18,61	0,37
			MO sem LS =>	2,01	LS =>	2,30	MO com LS =>	4,31
			Valor do BDI =>	2,65			Valor com BDI =>	13,29
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**13,29**
20.12	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89726 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	6,51	6,51
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	17,86	1,78
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	24,86	2,48
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,44
Insumo	00003516 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	1,01	1,01
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,02	2,30	0,04
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,02	51,08	0,76
			MO sem LS =>	1,54	LS =>	1,76	MO com LS =>	3,30
			Valor do BDI =>	1,62			Valor com BDI =>	8,13
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**16,26**
20.13	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89750 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	59,30	59,30
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	17,86	4,46
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	24,86	6,21
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,00	3,00	3,00
Insumo	00001970 SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	44,78	44,78
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,05	18,61	0,85
			MO sem LS =>	3,86	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,29
			Valor do BDI =>	14,80			Valor com BDI =>	74,10
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**148,20**
20.14	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89735 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	18,05	18,05
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	17,86	2,32
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	24,86	3,23
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,00	1,69	1,69
Insumo	00001968 SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	10,44	10,44
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,02	18,61	0,37
			MO sem LS =>	2,01	LS =>	2,30	MO com LS =>	4,31
			Valor do BDI =>	4,50			Valor com BDI =>	22,55
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**45,10**
20,15	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89709 SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	9,98	9,98
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,86	1,25
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	24,86	1,74
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,00	45,08	0,22
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,02	2,30	0,03
Insumo	00011741 SINAPI	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material		UN	1,00	6,36	6,36
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,38
			MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,31
			Valor do BDI =>	2,49			Valor com BDI =>	12,47
					Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**37,41**
20.16	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89707 SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no mínimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	27,35	27,35
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	17,86	4,46
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	24,86	6,21
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,00	1,69	1,69

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 74 Rubrica

Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,68	0,66
Insumo	00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material		UN	1,00	12,68	12,68
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,06	2,30	0,14
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,02	18,61	0,37
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,02	51,08	1,14
			MO sem LS =>	3,86	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,29
			Valor do BDI =>	6,82			Valor com BDI =>	34,17
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	102,51

20.17	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1536 ORSE	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		un	1,00	18,57	18,57
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,12	3,74	0,44
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,12	3,65	0,43
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,03	81,38	2,03
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,04	78,37	3,13
Insumo	00001200 SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	8,74	8,74
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,12	19,81	2,37
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,12	11,96	1,43
			MO sem LS =>	1,77	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,80
			Valor do BDI =>	4,63			Valor com BDI =>	23,20
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	46,40

20.18	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98078 SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	4.377,10	4.377,10
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,24	54,71	13,30
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,12	151,78	18,12
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,10	1.285,17	133,65
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	3,21	14,01	44,94
Composição Auxiliar	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,04	54,19	56,36
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,13	2.675,67	337,13
Composição Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,03	3.113,31	78,45
Composição Auxiliar	101625 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,19	108,44	20,27
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,02	940,90	959,81
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	31,15	25,49	793,90
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	24,47	17,38	425,31
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,37	241,18	89,14
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	2.198,02	0,64	1.406,73
			MO sem LS =>	571,22	LS =>	655,64	MO com LS =>	1.226,86
			Valor do BDI =>	1.092,52			Valor com BDI =>	5.469,62
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	5.469,62

20.19	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98082 SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	4.060,16	4.060,16
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,14	54,71	7,66
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,07	151,78	10,70
Composição Auxiliar	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,10	1.317,88	137,85
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,10	1.285,17	134,42
Composição Auxiliar	89996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	3,46	14,48	50,03
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,75	671,35	506,13
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	4,20	14,01	58,78
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	20,01	19,23	384,83
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,24	2.675,67	629,31

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 75
Rúbrica

Composição Auxiliar	101624 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,30	330,55	98,83
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,09	620,01	54,68
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,47	786,56	373,38
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,99	25,49	560,63
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	17,28	17,38	300,34
Insumo	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	106,89	5,71	610,36
Insumo	00000660 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	35,70	3,54	126,37
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,02	7,10	0,13
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,42	2,74	1,15
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,04	21,63	0,96
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,50	0,96	0,48
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,57	8,23	12,94
			MO sem LS => 527,69	LS =>	695,68	MO com LS =>	1.133,37
			Valor do BDI => 1.013,41			Valor com BDI =>	5.073,57
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	5.073,57

20.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2798 ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampo de concreto armado reforcada, revestida internamente com barra lisa e fundo em	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos	un	1,00	533,42	533,42
Composição Auxiliar	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,78	87,37	68,14
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,11	762,70	83,13
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	3,20	15,06	48,19
Composição Auxiliar	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	2,24	101,14	226,55
Composição Auxiliar	1908 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1,92	34,25	65,76
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,58	47,10	27,12
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,92	7,57	14,53
			MO sem LS => 100,32	LS =>	115,14	MO com LS =>	215,46
			Valor do BDI => 133,14			Valor com BDI =>	666,56
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>	5.332,48

21		COMBATE A INCÊNDIO					641,21
21.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101909 SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00	215,71	215,71
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	17,86	8,16
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	24,86	11,37
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,00	0,59	1,18
Insumo	00010692 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,00	195,00	195,00
			MO sem LS => 7,06	LS =>	8,10	MO com LS =>	15,16
			Valor do BDI => 53,84			Valor com BDI =>	269,55
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	539,10

21.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10363 ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	Sinalizrsção Vertical	un	1,00	24,97	24,97
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,25	3,63	0,90
Insumo	2682 ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	Material	un	4,00	0,14	0,56
Insumo	11143 ORSE	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	Material	un	1,00	18,56	18,56
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,25	19,81	4,95
			MO sem LS => 2,30	LS =>	2,65	MO com LS =>	4,95
			Valor do BDI => 6,23			Valor com BDI =>	31,20
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	62,40

21.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	11852 ORSE	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Sinalização Vertical	Un	1,00	31,78	31,78
Insumo	00037559 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Material	UN	1,00	31,78	31,78
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 7,93			Valor com BDI =>	39,71
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	39,71

22		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					28.832,80
22.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91940 SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	14,35	14,35
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	861,54	0,77
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	18,65	4,60

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 76
Rúbrica

Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	25,76	6,36
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1,00	2,62	2,62
			MO sem LS =>	3,91	LS =>	4,49	MO com LS =>	8,40
			Valor do BDI =>	3,58			Valor com BDI =>	17,93
					Quant. =>	46,00	Preço Total =>	824,78

22.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	2,81	2,81
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	18,65	0,44
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	25,76	0,61
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,19	1,47	1,74
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,79
			Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,51
					Quant. =>	62,60	Preço Total =>	219,72

22.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	2,81	2,81
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	18,65	0,44
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	25,76	0,61
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,19	1,47	1,74
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,79
			Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,51
					Quant. =>	76,60	Preço Total =>	268,86

22.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	2,81	2,81
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	18,65	0,44
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	25,76	0,61
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,19	1,47	1,74
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,79
			Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,51
					Quant. =>	52,60	Preço Total =>	184,82

22.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	2,81	2,81
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	18,65	0,44
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	25,76	0,61
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,19	1,47	1,74
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,79
			Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,51
					Quant. =>	142,20	Preço Total =>	499,12

22.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	4,13	4,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,65	0,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	25,76	0,77
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,19	2,35	2,79
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,00
			Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>	5,16
					Quant. =>	142,20	Preço Total =>	733,75

22.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	4,13	4,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,65	0,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	25,76	0,77
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,19	2,35	2,79
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,00
			Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>	5,16
					Quant. =>	82,60	Preço Total =>	426,21

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 77

22.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	4,13	4,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,65	0,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	25,76	0,77
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,19	2,35	2,79
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS => 0,47	LS => 0,53		MO com LS =>	1,00
			Valor do BDI => 1,03			Valor com BDI =>	5,16
				Quant. =>	188,30	Preço Total =>	971,62

22.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	4,13	4,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,65	0,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	25,76	0,77
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,19	2,35	2,79
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS => 0,47	LS => 0,53		MO com LS =>	1,00
			Valor do BDI => 1,03			Valor com BDI =>	5,16
				Quant. =>	153,90	Preço Total =>	794,12

22.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	25,10	25,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,65	2,14
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	25,76	2,96
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	16,79	19,98
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS => 1,80	LS => 2,06		MO com LS =>	3,86
			Valor do BDI => 6,26			Valor com BDI =>	31,36
				Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.254,40

22.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	25,10	25,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,65	2,14
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	25,76	2,96
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	16,79	19,98
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS => 1,80	LS => 2,06		MO com LS =>	3,86
			Valor do BDI => 6,26			Valor com BDI =>	31,36
				Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.254,40

22.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	25,10	25,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,65	2,14
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	25,76	2,96
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	16,79	19,98
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS => 1,80	LS => 2,06		MO com LS =>	3,86
			Valor do BDI => 6,26			Valor com BDI =>	31,36
				Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.254,40

22.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	25,10	25,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,65	2,14
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	25,76	2,96
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	16,79	19,98
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,32	0,02
			MO sem LS => 1,80	LS => 2,06		MO com LS =>	3,86
			Valor do BDI => 6,26			Valor com BDI =>	31,36
				Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.254,40

22.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2794 ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,00	274,28	274,28

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 73
Rúbrica

Composição Auxiliar	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,44	87,37	38,79
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,06	762,70	43,93
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,29	14,07	18,20
Composição Auxiliar	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,20	101,14	121,36
Composição Auxiliar	1908 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	0,96	34,25	32,88
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,25	47,10	11,86
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,96	7,57	7,26
			MO sem LS => 51,86	LS => 59,52		MO com LS =>	111,38
			Valor do BDI => 68,46			Valor com BDI =>	342,74
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	1.028,22

22.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993 SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	38,99	38,99
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	7,41	7,41
Composição Auxiliar	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	31,58	31,58
			MO sem LS => 8,95	LS => 10,27		MO com LS =>	19,22
			Valor do BDI => 9,73			Valor com BDI =>	48,72
				Quant. =>	14,00	Preço Total =>	682,06

22.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91973 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	61,59	61,59
Composição Auxiliar	91950 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	11,77	11,77
Composição Auxiliar	91972 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	69,82	69,82
			MO sem LS => 15,37	LS => 17,64		MO com LS =>	33,01
			Valor do BDI => 20,36			Valor com BDI =>	101,95
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	203,90

22.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91957 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	43,47	43,47
Composição Auxiliar	91956 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	36,06	36,06
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	7,41	7,41
			MO sem LS => 8,57	LS => 9,84		MO com LS =>	18,41
			Valor do BDI => 10,85			Valor com BDI =>	54,32
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	108,64

22.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91969 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	68,66	68,66
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	7,41	7,41
Composição Auxiliar	91968 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	61,25	61,25
			MO sem LS => 13,75	LS => 15,78		MO com LS =>	29,53
			Valor do BDI => 17,13			Valor com BDI =>	85,79
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	171,58

22.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953 SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	23,95	23,95
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	7,41	7,41
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	16,54	16,54
			MO sem LS => 4,70	LS => 5,40		MO com LS =>	10,10
			Valor do BDI => 5,97			Valor com BDI =>	29,92
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	59,84

22.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959 SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	37,84	37,84
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	7,41	7,41
Composição Auxiliar	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	30,43	30,43
			MO sem LS => 7,29	LS => 8,36		MO com LS =>	15,65
			Valor do BDI => 9,44			Valor com BDI =>	47,28
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	47,28

22.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12241 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	1,00	275,71	275,71

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 79 Rubrica

Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,80	3,59	17,23
Insumo	558	ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	Material	un	1,00	163,40	163,40
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,80	19,81	95,08
				MO sem LS => 44,27	LS => 50,81		MO com LS =>	95,08
				Valor do BDI => 68,81			Valor com BDI =>	344,52
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	344,52

22.22	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10237	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,00	122,14	122,14
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,60	3,74	2,24
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,60	3,59	2,15
Insumo	3692	ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	1,00	98,70	98,70
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,60	19,81	11,88
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,60	11,96	7,17
				MO sem LS => 8,87	LS => 10,18		MO com LS =>	19,05
				Valor do BDI => 30,48			Valor com BDI =>	152,62
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	305,24

22.23	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93662	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	55,41	55,41
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	18,65	2,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	25,76	3,41
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,00	47,35	47,35
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,00	1,09	2,18
				MO sem LS => 2,08	LS => 2,38		MO com LS =>	4,46
				Valor do BDI => 13,83			Valor com BDI =>	69,24
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	415,44

22.24	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	12,28	12,28
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	18,65	1,23
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	25,76	1,70
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,00	8,26	8,26
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,00	1,09	1,09
				MO sem LS => 1,04	LS => 1,19		MO com LS =>	2,23
				Valor do BDI => 3,06			Valor com BDI =>	15,34
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>	122,72

22.25	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91863	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	11,60	11,60
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	3,22	3,22
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08	18,65	1,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08	25,76	2,11
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,02	4,68	4,75
				MO sem LS => 1,98	LS => 2,28		MO com LS =>	4,26
				Valor do BDI => 2,89			Valor com BDI =>	14,49
					Quant. =>	75,00	Preço Total =>	1.086,75

22.26	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91864	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	15,35	15,35
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	3,22	3,22
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11	18,65	1,97
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11	25,76	2,73
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,02	7,31	7,43
				MO sem LS => 2,36	LS => 2,71		MO com LS =>	5,07
				Valor do BDI => 3,83			Valor com BDI =>	19,18
					Quant. =>	9,40	Preço Total =>	180,29

22.27	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91871	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	12,29	12,29
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	18,65	3,17
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	25,76	4,37
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,02	4,68	4,75
				MO sem LS => 2,65	LS => 3,05		MO com LS =>	5,71
				Valor do BDI => 3,06			Valor com BDI =>	15,36

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 80 Rúbrica

				Quant. =>	50,30	Preço Total =>	772,10

22.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872 SINAPI	Eletroduto rigido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	16,03	16,03
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	18,65	3,61
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	25,76	4,99
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,02	7,31	7,43
			MO sem LS => 3,04	LS => 3,48		MO com LS =>	6,52
			Valor do BDI => 4,00			Valor com BDI =>	20,03
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>	120,18

22.29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91873 SINAPI	Eletroduto rigido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	19,71	19,71
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	18,65	4,12
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	25,76	5,69
Insumo	00002684 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,02	9,74	9,90
			MO sem LS => 3,46	LS => 3,97		MO com LS =>	7,43
			Valor do BDI => 4,91			Valor com BDI =>	24,62
				Quant. =>	36,00	Preço Total =>	886,32

22.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447 SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	6,19	6,19
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,65	0,63
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	25,76	5,56
			MO sem LS => 2,26	LS => 2,59		MO com LS =>	4,85
			Valor do BDI => 1,54			Valor com BDI =>	7,73
				Quant. =>	57,80	Preço Total =>	446,79

22.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8324 ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma	Luminárias Internas	un	1,00	9,67	9,67
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,20	3,59	0,71
Insumo	8518 ORSE	Plafon plastico branco com soquete E-27	Material	un	1,00	5,00	5,00
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,20	19,81	3,96
			MO sem LS => 1,84	LS => 2,12		MO com LS =>	3,96
			Valor do BDI => 2,41			Valor com BDI =>	12,08
				Quant. =>	29,00	Preço Total =>	350,32

22.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97607 SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	137,10	137,10
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23	18,65	4,28
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,55	25,76	14,21
Insumo	00038193 SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,00	7,12	7,12
Insumo	00038775 SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,00	111,49	111,49
			MO sem LS => 6,66	LS => 7,64		MO com LS =>	14,30
			Valor do BDI => 34,22			Valor com BDI =>	171,32
				Quant. =>	5,00	Preço Total =>	856,60

22.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11857 ORSE	Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt	Luminárias Internas	un	1,00	27,49	27,49
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,15	3,59	0,53
Insumo	12689 ORSE	Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt un	0	un	1,00	23,99	23,99
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,15	19,81	2,97
			MO sem LS => 1,38	LS => 1,59		MO com LS =>	2,97
			Valor do BDI => 6,86			Valor com BDI =>	34,35
				Quant. =>	31,00	Preço Total =>	1.064,85

22.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97599 SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	26,61	26,61
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	18,65	1,39
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	25,76	4,62
Insumo	00038774 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,00	20,60	20,60
			MO sem LS => 2,17	LS => 2,48		MO com LS =>	4,65
			Valor do BDI => 6,64			Valor com BDI =>	33,25
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	99,75

22.35	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985 SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura cor	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	81,94	81,94
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	18,65	4,72
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	25,76	6,51
Insumo	00003379 SINAPI	HEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,00	70,71	70,71
			MO sem LS => 3,97	LS => 4,55		MO com LS =>	8,52

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 81
Rúbrica

				Valor do BDI =>	20,45		Valor com BDI =>	102,39
						Quant. => 3,00	Preço Total =>	307,17
22.36	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98977	SINAPI	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E		M	1,00	59,24	59,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,65	0,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	25,76	0,86
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1,10	52,51	57,76
				MO sem LS =>	0,52	LS => 0,60	MO com LS =>	1,12
				Valor do BDI =>	14,78		Valor com BDI =>	74,02
						Quant. => 10,00	Preço Total =>	740,20
22.37	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4192	ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	Subestação Transformadora em Poste		un	1,00	11,95	11,95
Insumo	00011862	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	Material		UN	1,00	11,95	11,95
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,98		Valor com BDI =>	14,93
						Quant. => 2,00	Preço Total =>	29,86
22.38	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4014	ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais		Un	1,00	8,78	8,78
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material		UN	1,00	8,78	8,78
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,19		Valor com BDI =>	10,97
						Quant. => 3,00	Preço Total =>	32,91
22.39	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4015	ORSE	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação, cor	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais		Un	1,00	12,60	12,60
Insumo	2643	ORSE	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	Material		un	1,00	12,60	12,60
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,14		Valor com BDI =>	15,74
						Quant. => 3,00	Preço Total =>	47,22
22.40	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,00	68,75	68,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,96	17,38	68,75
				MO sem LS =>	22,40	LS => 25,70	MO com LS =>	46,10
				Valor do BDI =>	17,16		Valor com BDI =>	85,91
						Quant. => 4,50	Preço Total =>	386,58
22.41	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,00	41,68	41,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,40	17,38	41,68
				MO sem LS =>	13,58	LS => 15,58	MO com LS =>	29,16
				Valor do BDI =>	10,40		Valor com BDI =>	52,08
						Quant. => 3,50	Preço Total =>	182,28
22.42	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101502	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	1.728,29	1.728,29
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	6,05	16,03	96,98
Composição Auxiliar	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	9,91	9,91
Composição Auxiliar	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	16,72	16,72
Composição Auxiliar	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	18,93	18,93
Composição Auxiliar	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	16,65	25,10	417,91
Composição Auxiliar	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,00	66,74	66,74
Composição Auxiliar	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	488,96	488,96
Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E		M	1,95	59,24	115,51
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E		UN	1,00	122,17	122,17
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,02	717,74	11,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,32	18,65	6,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,91	25,76	74,96
Insumo	00001094	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material		UN	1,00	27,21	27,21
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material		UN	2,00	1,11	2,22
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	Material		UN	1,00	23,07	23,07
Insumo	00039809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material		UN	1,00	164,11	164,11

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 89
Rúbrica

Insumo	00011864 SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material		UN	1,00	26,97	26,97
Insumo	00014153 SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material		UN	0,06	55,49	3,32
Insumo	00003398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material		UN	1,00	5,01	5,01
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material		UN	3,00	9,42	28,26
Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material		UN	2,00	0,28	0,56
Insumo	00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material		M	0,17	5,07	0,84
			MO sem LS =>	149,98	LS =>	172,14	MO com LS =>	322,12
			Valor do BDI =>	431,38			Valor com BDI =>	2.159,67
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**2.159,67**

22.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	585,13	585,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,06	18,65	19,73
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,44	25,76	88,53
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	2,00	37,70	75,40
Insumo	00011975	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	Material	UN	4,00	21,83	87,32
Insumo	00012386	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	Material	UN	1,00	314,15	314,15
				MO sem LS => 39,19	LS =>	44,98	MO com LS =>	84,17
				Valor do BDI => 146,04			Valor com BDI =>	731,17
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**1.462,34**

22.44	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12628	ORSE	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,00	3.353,68	3.353,68
Composição Auxiliar	80	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	3,70	101,99	377,36
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,70	47,10	32,97
Composição Auxiliar	10603	ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios	h	1,00	4,20	4,20
Composição Auxiliar	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,51	733,13	1.107,02
Insumo	8904	ORSE	Máquina de solda elétrica	Equipamento	h	0,85	3,86	3,28
Insumo	13424	ORSE	Roldana de aço, com rolamento, Ø =30mm	Material	un	3,00	50,99	152,97
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR	Mão de Obra	H	1,00	21,65	21,65
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,85	22,08	18,76
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,45* KG/M (NBR 5580)	Material	M	6,60	68,64	453,02
Insumo	00021013	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	Material	M	13,20	89,58	1.182,45
				MO sem LS => 212,40	LS =>	243,80	MO com LS =>	456,20
				Valor do BDI => 837,07			Valor com BDI =>	4.190,75
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**4.190,75**

Tipo de Licitação Convite
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório Processo Administrativo n°

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Engº Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 0905404068

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RMUI
Fls. 33
Rúbrica

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva-Comunidade Caraparú I_Uiramutã_RR

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Roraima
ORSE - 07/2022 - Sergipe

B.D.I.
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	204,24	145,51	29.718,96	6,03	6,03
87255 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	130,57	172,21	22.485,45	4,56	10,59
3126 ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	Alimentação	un	1.182,0	17,49	20.673,18	4,19	14,78
87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	434,6	45,96	19.982,90	4,05	18,83
62 ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0	18.734,70	18.734,70	3,80	22,63
94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	18,0	976,62	17.579,16	3,57	26,20
94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) , preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	18,21	908,14	16.537,22	3,35	29,55
92263 SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	87,64	184,04	16.129,26	3,27	32,82
283 ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,026 m	Telhamento	m²	185,13	76,51	14.164,20	2,87	35,69
93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	2,0	6.616,81	13.233,62	2,68	38,38
92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	87,64	149,26	13.081,14	2,65	41,03
87274 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	111,36	115,45	12.856,51	2,61	43,64
94994 SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	PISO - PISOS	m²	72,77	174,24	12.679,44	2,57	46,21
92540 SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	COBE - COBERTURA	m²	185,13	67,51	12.498,12	2,53	48,74
92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	455,62	21,70	9.886,95	2,01	50,75
87690 SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	PISO - PISOS	m²	130,57	72,80	9.505,49	1,93	52,68
4449 ORSE	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro	Forros	m²	130,57	72,41	9.454,57	1,92	54,60
87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	45,83	200,49	9.188,45	1,86	56,46
9203 ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Conversão InfoWOrca	tkm	14.391,75	0,62	8.922,88	1,81	58,27
93243 SINAPI	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saida, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,0	8.587,36	8.587,36	1,74	60,01
90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	64,0	134,15	8.585,60	1,74	61,75
2412 ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	Mobiliário	un	8,0	978,88	7.831,04	1,59	63,34
87630 SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	PISO - PISOS	m²	130,57	57,96	7.567,83	1,53	64,87
88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta acetinada em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS	m²	410,06	17,19	7.048,93	1,43	66,30
92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	233,79	27,15	6.347,39	1,29	67,59
92455 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	38,88	161,02	6.260,45	1,27	68,86
87528 SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	111,36	54,50	6.069,12	1,23	70,09
92265 SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	38,88	146,99	5.714,97	1,16	71,25
98078 SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	5.469,62	5.469,62	1,11	72,36
2798 ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforcada, revestida internamente com barra lisa e fundo em	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos	un	8,0	666,56	5.332,48	1,08	73,44
100948 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	4.492,52	1,14	5.121,47	1,04	74,48

EMBRAER

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 84
Rubrica

96539 SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	36,78	139,21	5.120,14	1,04	75,52
98082 SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	5.073,57	5.073,57	1,03	76,55
91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	160,0	31,36	5.017,60	1,02	77,56
8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	Latex PVA	m²	207,02	21,79	4.510,96	0,91	78,48
94223 SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial, feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	CORF - CORERTURA	M	32,24	139,31	4.491,35	0,91	79,39
92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	18,21	239,09	4.353,82	0,88	80,27
12628 ORSE	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	4.190,75	4.190,75	0,85	81,12
87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	434,6	9,55	4.150,43	0,84	81,96
88497 SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS	m²	203,04	17,83	3.620,20	0,73	82,70
92777 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	148,7	24,25	3.605,97	0,73	83,43
92776 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	124,19	25,80	3.204,10	0,65	84,08
101965 SINAPI	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	18,8	159,61	3.000,66	0,61	84,69
91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	567,0	5,16	2.925,72	0,59	85,28
98524 SINAPI	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	900,0	3,24	2.916,00	0,59	85,87
11125 ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0	2.756,33	2.756,33	0,56	86,43
8974 ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	Louças e Metais Sanitários	un	2,0	1.331,02	2.662,04	0,54	86,97
98557 SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	53,65	47,27	2.536,03	0,51	87,49
51 ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	3,6	688,36	2.478,09	0,50	87,99
2450 ORSE	Limpeza geral (final da obra)	Limpeza	m²	900,0	2,73	2.457,00	0,50	88,49
88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM AF_06/2014	PISO - PISOS	M	92,0	24,95	2.295,40	0,47	88,95
101502 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	2.159,67	2.159,67	0,44	89,39
2093 ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	2.037,94	2.037,94	0,41	89,80
90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	5,0	387,91	1.939,55	0,39	90,20
93186 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	23,0	82,87	1.906,01	0,39	90,58
99059 SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	35,0	53,19	1.861,65	0,38	90,96
89714 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	28,0	64,54	1.807,12	0,37	91,33
00010848 SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	Material	UN	1,0	1.676,56	1.676,56	0,34	91,67
93188 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	22,0	71,93	1.582,46	0,32	91,99
93196 SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	19,0	81,67	1.551,73	0,31	92,30
93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	17,93	85,91	1.540,36	0,31	92,62
00010527 SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	Equipamento	MXMES	90,45	16,49	1.491,52	0,30	92,92
100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	731,17	1.462,34	0,30	93,22
96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	27,85	52,08	1.450,42	0,29	93,51
55960 SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	CCBE - COBERTURA	m²	185,13	7,53	1.394,02	0,28	93,79
95241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	28,2	47,23	1.331,88	0,27	94,06
88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	PINT - PINTURAS	m²	410,06	2,87	1.176,87	0,24	94,30
91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	334,0	3,51	1.172,34	0,24	94,54
86931 SINAPI	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	565,95	1.131,90	0,23	94,77
91863 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	75,0	14,49	1.086,75	0,22	94,99
88648 SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	PISO - PISOS	M	96,06	11,18	1.073,95	0,22	95,21
11857 ORSE	Lâmpada tubular led T8, 16w, bivolt	Luminárias Internas	un	31,0	34,35	1.064,85	0,22	95,42
2103 ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	1.029,04	1.029,04	0,21	95,63
2794 ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	3,0	342,74	1.028,22	0,21	95,84
74166/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	940,56	940,56	0,19	96,03

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 85 Rúbrica

11397 ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metalon de 20x20cm, fornecida e instalada	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0	937,20	937,20	0,19	96,22
91873 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4"),	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	36,0	24,62	886,32	0,18	96,40
97607 SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acrílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,0	171,32	856,60	0,17	96,57
91940 SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	46,0	17,93	824,78	0,17	96,74
86943 SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	261,27	783,81	0,16	96,90
91871 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	50,3	15,35	772,10	0,16	97,06
6096 ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	Conversão InfoWOrca	UN	1,0	766,35	766,35	0,16	97,21
96977 SINAPI	Cabo de cobre nu 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	10,0	74,02	740,20	0,15	97,36
100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0	735,71	735,71	0,15	97,51
91993 SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	14,0	48,72	682,08	0,14	97,65
89448 SINAPI	Tubo de PVC rígido soldável marrom para água fria Ø 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	30,1	21,64	651,36	0,13	97,78
98689 SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	PISO - PISOS	M	4,5	140,21	630,94	0,13	97,91
101909 SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	2,0	269,55	539,10	0,11	98,02
00010851 SINAPI	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm: fornecimento e instalação	Material	UN	6,0	88,50	531,00	0,11	98,13
94559 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,48	1.013,20	486,33	0,10	98,23
2390 ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	Alambrados e Gradis	un	2,0	235,29	470,58	0,10	98,32
90447 SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmetro menor ou igual a 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	57,8	7,73	446,79	0,09	98,41
90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	28,15	15,50	436,32	0,09	98,50
93201 SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	55,83	7,79	434,91	0,09	98,59
89712 SINAPI	Tubo de PVC, série normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	12,4	33,65	417,26	0,08	98,67
93662 SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	6,0	69,24	415,44	0,08	98,76
1466 ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	Registros e Válvulas	un	3,0	128,37	385,11	0,08	98,84
95546 SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	177,14	354,28	0,07	98,91
8324 ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma	Luminárias Internas	un	29,0	12,08	350,32	0,07	98,98
12241 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	1,0	344,52	344,52	0,07	99,05
96985 SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	3,0	102,39	307,17	0,06	99,11
10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	2,0	152,62	305,24	0,06	99,17
89711 SINAPI	Tubo de PVC, série normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	9,1	22,96	208,93	0,04	99,21
89446 SINAPI	Tubo de PVC rígido soldável marrom para água fria Ø 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	28,9	7,19	207,79	0,04	99,26
91973 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	101,95	203,90	0,04	99,30
2082 ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	3,0	64,29	192,87	0,04	99,34
90373 SINAPI	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	11,0	17,51	192,61	0,04	99,38
91864 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	9,4	19,18	180,29	0,04	99,41
91969 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	85,79	171,58	0,03	99,45
89750 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	74,10	148,20	0,03	99,48
1603 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	10,0	14,02	140,20	0,03	99,51
89796 SINAPI	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	46,53	139,59	0,03	99,53
1554 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	10,0	13,54	135,40	0,03	99,56
93655 SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	8,0	15,34	122,72	0,02	99,59
89623 SINAPI	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	24,15	120,75	0,02	99,61
91872 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,0	20,03	120,18	0,02	99,64
89744 SINAPI	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	28,19	112,76	0,02	99,66
91967 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	54,32	108,64	0,02	99,68
89707 SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no mínimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	34,17	102,51	0,02	99,70

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 86 Rúbrica

89383	SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	7,26	101,64	0,02	99,72
1470	ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	Registros e Válvulas	un	1,0	100,61	100,61	0,02	99,74
97599	SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	33,25	99,75	0,02	99,76
1144	ORSE	Joelho de redução 90º soldável 40 x 25mm água fria	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	16,56	99,36	0,02	99,78
00000377	SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	Material	UN	2,0	44,04	88,08	0,02	99,80
89395	SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	14,24	85,44	0,02	99,82
89362	SINAPI	Joelho 90º soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	10,24	81,92	0,02	99,83
2050	ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	Louças e Metais Sanitários	un	2,0	31,50	63,00	0,01	99,85
10363	ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	Sinalização Vertical	un	2,0	31,20	62,40	0,01	99,86
1588	ORSE	Té sanitário em PVC rígido soldável para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0	60,29	60,29	0,01	99,87
91953	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	29,92	59,84	0,01	99,88
94491	SINAPI	Registro de esfera soldável 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	54,50	54,50	0,01	99,90
91959	SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	47,28	47,28	0,01	99,90
4015	ORSE	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação, cor	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	Un	3,0	15,74	47,22	0,01	99,91
1536	ORSE	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	2,0	23,20	46,40	0,01	99,92
89497	SINAPI	Joelho 90º soldável 40mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	15,35	46,05	0,01	99,93
89735	SINAPI	Curva 90º longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	22,55	45,10	0,01	99,94
11852	ORSE	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Sinalização Vertical	Un	1,0	39,71	39,71	0,01	99,95
89709	SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	12,47	37,41	0,01	99,96
4014	ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	Un	3,0	10,97	32,91	0,01	99,96
4192	ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	Subestação Transformadora em Poste	un	2,0	14,93	29,86	0,01	99,97
89364	SINAPI	Curva 90º soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	13,94	27,88	0,01	99,98
94489	SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	27,22	27,22	0,01	99,98
89785	SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	24,90	24,90	0,01	99,99
3147	ORSE	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	Conversão InfoWOrca	un	1,0	23,76	23,76	0,00	99,99
89726	SINAPI	Joelho 45º de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	8,13	16,26	0,00	99,99
89732	SINAPI	Joelho 45º de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	13,29	13,29	0,00	100,00
89420	SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	11,63	11,63	0,00	100,00

Engº Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 090540068

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 87
Rúbrica

PLANILHAS COM

BDI

DESONERADO

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 88
Rúbrica

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva-Comunidade Caraparú I_Uiramutã_RR

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Roraima
ORSE - 07/2022 - Sergipe

B.D.I.
32,2%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,74%
Mensalista: 48,18%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					20.073,06	3,81 %
1.1	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	92,88	122,78	7.857,92	1,49 %
1.2	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	4.619,95	6.107,57	12.215,14	2,32 %
2		ALIMENTAÇÃO CANTEIRO					21.867,00	4,15 %
2.1	3126 ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	1.182,00	14,00	18,50	21.867,00	4,15 %
3		DIVERSOS					15.602,13	2,96 %
3.1	00010848 SINAPI	Placa de inauguração metálica 0.40 x 0.60m, fornecimento e colocação	UN	1,00	1.341,68	1.773,70	1.773,70	0,34 %
3.2	00010851 SINAPI	Placa de acrilico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	UN	6,00	70,83	93,63	561,78	0,11 %
3.3	11397 ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metoion de 20x20cm, fornecida e instalada	un	1,00	750,00	991,50	991,50	0,19 %
3.4	00010527 SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	90,45	13,20	17,45	1.578,35	0,30 %
3.5	2412 ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	un	8,00	783,36	1.035,60	8.284,80	1,57 %
3.6	2450 ORSE	Limpeza geral (final da obra)	m²	900,00	2,03	2,68	2.412,00	0,46 %
4		MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					69.745,88	13,24 %
4.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	3,60	544,88	720,33	2.593,18	0,49 %
4.2	6096 ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	594,09	785,38	785,38	0,15 %
4.3	11125 ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10.1 kw - Rev 01	un	1,00	2.145,05	2.835,75	2.835,75	0,54 %
4.4	62 ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e	un	1,00	14.565,36	19.255,40	19.255,40	3,66 %
4.5	99059 SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	35,00	39,50	52,21	1.827,35	0,35 %
4.6	98524 SINAPI	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	m²	900,00	2,35	3,10	2.790,00	0,53 %
4.7	9203 ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	35.729,81	0,50	0,66	23.581,67	4,48 %
4.8	100948 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13.397,63	0,91	1,20	16.077,15	3,05 %
5		INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES					23.236,38	4,41 %
5.1	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	7,80	62,14	82,14	640,69	0,12 %
5.2	96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	2,00	37,68	49,81	99,62	0,02 %
5.3	92263 SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	26,20	142,61	188,53	4.939,48	0,94 %
5.4	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	26,20	113,56	150,12	3.933,14	0,75 %
5.5	96241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	14,80	36,56	48,33	715,28	0,14 %
5.6	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,80	719,62	951,33	4.566,38	0,87 %
5.7	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,80	171,95	227,31	1.091,08	0,21 %
5.8	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	KG	39,76	20,83	27,53	1.094,59	0,21 %
5.9	92778 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	273,12	17,05	22,54	6.156,12	1,17 %
6		INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME					24.774,91	4,70 %
6.1	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	1,66	62,14	82,14	136,35	0,03 %
6.2	96539 SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	36,78	104,51	138,16	5.081,52	0,96 %
6.3	96241 SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	13,40	36,56	48,33	647,62	0,12 %
6.4	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,87	719,62	951,33	4.632,97	0,88 %
6.5	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,87	171,95	227,31	1.106,99	0,21 %
6.6	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação	KG	62,97	20,83	27,53	1.733,56	0,33 %
6.7	92777 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	148,70	18,96	25,06	3.726,42	0,71 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 39
Rúbrica

6.8	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	25,93	149,42	197,53		0,97 %
6.9	98557 SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	m²	53,65	36,49	48,23	2.587,53	0,49 %
7		**SUPERESTRUTURA - PILARES**					**30.663,64**	**5,82 %**
7.1	92263 SINAPI	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44	142,61	188,53	11.583,28	2,20 %
7.2	92415 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44	113,56	150,12	9.223,37	1,75 %
7.3	94965 SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	m³	3,34	719,62	951,33	3.177,44	0,60 %
7.4	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,34	171,95	227,31	759,21	0,14 %
7.5	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	65,63	20,83	27,53	1.806,79	0,34 %
7.6	92776 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	182,50	17,05	22,54	4.113,55	0,78 %
8		**SUPERESTRUTURA - VIGAS**					**21.671,02**	**4,12 %**
8.1	92265 SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	38,88	113,68	150,54	5.852,99	1,11 %
8.2	92455 SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	38,88	123,04	162,65	6.323,83	1,20 %
8.3	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	m³	3,74	719,62	951,33	3.557,97	0,68 %
8.4	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,74	171,95	227,31	850,13	0,16 %
8.5	92775 SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	65,43	20,83	27,53	1.801,28	0,34 %
8.6	92776 SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	124,19	20,01	26,45	3.284,82	0,62 %
9		**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**					**34.506,42**	**6,55 %**
9.1	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	203,04	107,95	142,70	28.973,80	5,50 %
9.2	93201 SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e	M	55,83	5,74	7,58	423,19	0,08 %
9.3	93186 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	23,00	63,53	84,11	1.934,53	0,37 %
9.4	93188 SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	22,00	55,05	72,77	1.600,94	0,30 %
9.5	93196 SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	19,00	62,67	82,84	1.573,96	0,30 %
10		**REVESTIMENTO**					**41.536,30**	**7,89 %**
10.1	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	406,08	7,12	9,41	3.821,21	0,73 %
10.2	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	406,08	34,83	46,04	18.695,92	3,55 %
10.3	87528 SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	m²	111,36	40,98	54,17	6.032,37	1,15 %
10.4	87274 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	111,36	88,22	116,62	12.986,80	2,47 %
11		**PINTURA**					**16.178,20**	**3,07 %**
11.1	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	406,08	2,16	2,85	1.157,32	0,22 %
11.2	88497 SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	m²	203,04	13,23	17,49	3.551,16	0,67 %
11.3	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	203,04	16,08	21,25	4.314,60	0,82 %
11.4	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta acetinada em paredes, duas demãos.	m²	406,08	13,33	17,62	7.155,12	1,36 %
12		**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**					**2.978,16**	**0,57 %**
12.1	87515 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	1,20	107,95	142,70	171,24	0,03 %
12.2	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	2,60	7,12	9,41	24,46	0,00 %
12.3	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	2,60	34,83	46,04	119,70	0,02 %
12.4	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	3,98	2,16	2,85	11,34	0,00 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 90
Rúbrica

12.5	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	3,98	18,08	21,25	84,57	0,02 %
12.6	88487 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos	m²	3,98	13,33	17,62	70,12	0,01 %
12.7	94965 SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	1,46	719,62	951,33	1.388,84	0,26 %
12.8	92873 SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,46	171,95	227,31	331,87	0,06 %
12.9	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,00	586,93	775,92	775,92	0,15 %
13		**COBERTURA**					**43.408,30**	**8,24 %**
13.1	283 ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	185,13	60,28	79,69	14.753,00	2,80 %
13.2	92540 SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	185,13	51,16	67,63	12.520,34	2,38 %
13.3	94223 SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	M	32,24	111,20	147,00	4.739,28	0,90 %
13.4	55960 SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	185,13	5,70	7,53	1.394,02	0,26 %
13.5	4449 ORSE	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro.	m²	130,57	57,95	76,60	10.001,66	1,90 %
14		**PAVIMENTAÇÃO**					**44.074,43**	**8,37 %**
14.1	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	19,57	37,68	49,81	974,78	0,19 %
14.2	87690 SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	130,57	56,58	74,79	9.765,33	1,85 %
14.3	87830 SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	130,57	45,05	59,55	7.775,44	1,48 %
14.4	87255 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	130,57	134,23	177,45	23.169,64	4,40 %
14.5	88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	92,00	19,65	25,97	2.389,24	0,45 %
15		**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**					**4.857,51**	**0,92 %**
15.1	98689 SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF_06/2018	M	4,50	110,15	145,61	655,24	0,12 %
15.2	88648 SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	M	96,06	8,67	11,46	1.100,84	0,21 %
15.3	101965 SINAPI	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	M	18,80	124,79	164,97	3.101,43	0,59 %
16		**CALÇADA DE PROTEÇÃO**					**18.979,27**	**3,60 %**
16.1	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	3,97	62,14	82,14	326,09	0,06 %
16.2	96995 SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	2,78	37,68	49,81	138,47	0,03 %
16.3	87502 SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	19,90	149,42	197,53	3.930,84	0,75 %
16.4	94994 SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	72,77	136,98	180,66	13.146,62	2,50 %
16.5	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	25,92	7,12	9,41	243,90	0,05 %
16.6	87529 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	25,92	34,83	46,04	1.193,35	0,23 %
17		**ESQUADRIAS**					**20.933,00**	**3,97 %**
17.1	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	304,70	402,81	2.014,05	0,38 %
17.2	94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18,00	773,86	1.023,06	18.415,08	3,50 %
17.3	94559 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,48	794,06	1.049,74	503,87	0,10 %
18		**LOUÇAS E METAIS**					**9.014,75**	**1,71 %**
18.1	2390 ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	un	2,00	187,49	247,86	495,72	0,09 %
18.2	0074 ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	un	2,00	1.064,15	1.406,80	2.813,60	0,53 %
18.3	95546 SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	UN	2,00	135,55	179,19	358,38	0,07 %
18.4	86931 SINAPI	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2,00	449,54	594,29	1.188,58	0,23 %
18.5	00000377 SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	UN	2,00	35,25	46,60	93,20	0,02 %
18.6	86943 SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	UN	3,00	206,20	272,59	817,77	0,16 %
18.7	2050 ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	un	2,00	24,13	31,89	63,78	0,01 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 91
Rúbrica

18.8	2103 ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	un	1,00	807,97	1.068,13	1.068,13	0,20 %
18.9	2093 ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	un	1,00	1.600,30	2.115,59	2.115,59	0,40 %
19		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**12.750,64**	**2,42 %**
19.1	93243 SINAPI	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saida, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	UN	1,00	6.814,43	9.008,67	9.008,67	1,71 %
19.2	89446 SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	M	28,90	5,68	7,50	216,75	0,04 %
19.3	89448 SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	M	30,10	17,19	22,72	683,87	0,13 %
19.4	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	19,75	11,04	14,59	288,15	0,05 %
19.5	89362 SINAPI	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	UN	8,00	7,52	9,94	79,52	0,02 %
19.6	89364 SINAPI	Curva 90° soldável 25 mm água fria	UN	2,00	10,48	13,85	27,70	0,01 %
19.7	90373 SINAPI	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	11,00	13,42	17,74	195,14	0,04 %
19.8	1144 ORSE	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	un	6,00	12,47	16,48	98,88	0,02 %
19.9	89497 SINAPI	Joelho 90° soldável 40mm água fria	UN	3,00	11,82	15,62	46,86	0,01 %
19.10	1466 ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	3,00	100,08	132,30	396,90	0,08 %
19.11	89383 SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	UN	14,00	5,38	7,11	99,54	0,02 %
19.12	1470 ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	1,00	77,87	102,94	102,94	0,02 %
19.13	89395 SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	6,00	10,48	13,85	83,10	0,02 %
19.14	89420 SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	1,00	9,07	11,99	11,99	0,00 %
19.15	89623 SINAPI	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	UN	5,00	18,68	24,69	123,45	0,02 %
19.16	3147 ORSE	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	1,00	17,72	23,42	23,42	0,00 %
19.17	94491 SINAPI	Registro de esfera soldável 40mm	UN	1,00	43,11	56,99	56,99	0,01 %
19.18	94489 SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	UN	1,00	21,43	28,33	28,33	0,01 %
19.19	74166/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	741,50	980,26	980,26	0,19 %
19.20	2082 ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,00	49,97	66,06	198,18	0,04 %
20		**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**19.620,32**	**3,73 %**
20.1	89711 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	M	9,10	17,03	22,51	204,84	0,04 %
20.2	89712 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	12,40	25,21	33,32	413,16	0,08 %
20.3	89714 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	28,00	48,30	63,85	1.787,80	0,34 %
20.4	90443 SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	8,40	11,04	14,59	122,55	0,02 %
20.5	89796 SINAPI	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	3,00	35,74	47,24	141,72	0,03 %
20.6	1588 ORSE	Tê sanitário em PVC rigido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	un	1,00	46,24	61,12	61,12	0,01 %
20.7	89785 SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	1,00	19,16	25,32	25,32	0,00 %
20.8	1603 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	un	10,00	10,70	14,14	141,40	0,03 %
20.9	1554 ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	un	10,00	10,23	13,52	135,20	0,03 %
20.10	89744 SINAPI	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	UN	4,00	21,42	28,31	113,24	0,02 %
20.11	89732 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	UN	1,00	10,04	13,27	13,27	0,00 %
20.12	89726 SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	UN	2,00	6,06	8,01	16,02	0,00 %
20.13	89750 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	2,00	58,18	76,88	153,76	0,03 %
20.14	89735 SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	2,00	17,45	23,06	46,12	0,01 %
20.15	89709 SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	3,00	9,65	12,75	38,25	0,01 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR - PMU
Fls. 92
Rubrica

20.16	89707 SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no mínimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	UN	3,00	26,21	34,64	103,92	0,02 %
20.17	1538 ORSE	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	2,00	18,05	23,86	47,72	0,01 %
20.18	98078 SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	1,00	4.208,90	5.564,16	5.564,16	1,06 %
20.19	98082 SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	1,00	3.904,35	5.161,55	5.161,55	0,98 %
20.20	2798 ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforcada, revestida internamente com barra lisa e fundo em	un	8,00	503,90	666,15	5.329,20	1,01 %
21		**COMBATE A INCÊNDIO**					**671,09**	**0,13 %**
21.1	101909 SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	2,00	213,64	282,43	564,86	0,11 %
21.2	10363 ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	2,00	24,29	32,11	64,22	0,01 %
21.3	11852 ORSE	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Un	1,00	31,78	42,01	42,01	0,01 %
22		**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**29.480,84**	**5,60 %**
22.1	91940 SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	46,00	13,20	17,45	802,70	0,15 %
22.2	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	82,60	2,71	3,58	224,10	0,04 %
22.3	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	76,60	2,71	3,58	274,22	0,05 %
22.4	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	52,60	2,71	3,58	188,30	0,04 %
22.5	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	142,20	2,71	3,58	509,07	0,10 %
22.6	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	142,20	3,99	5,27	749,39	0,14 %
22.7	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	82,60	3,99	5,27	435,30	0,08 %
22.8	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	188,30	3,99	5,27	992,34	0,19 %
22.9	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo	M	153,90	3,99	5,27	811,05	0,15 %
22.10	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem	M	40,00	24,57	32,48	1.299,20	0,25 %
22.11	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem	M	40,00	24,57	32,48	1.299,20	0,25 %
22.12	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem	M	40,00	24,57	32,48	1.299,20	0,25 %
22.13	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem	M	40,00	24,57	32,48	1.299,20	0,25 %
22.14	2794 ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	un	3,00	259,02	342,42	1.027,26	0,20 %
22.15	91993 SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	UN	14,00	36,35	48,05	672,70	0,13 %
22.16	91973 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	77,07	101,88	203,76	0,04 %
22.17	91957 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	40,95	54,13	108,26	0,02 %
22.18	91969 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	64,62	85,42	170,84	0,03 %
22.19	91953 SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	2,00	22,56	29,82	59,64	0,01 %
22.20	91959 SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	1,00	35,69	47,18	47,18	0,01 %
22.21	12241 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	262,71	347,30	347,30	0,07 %
22.22	10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interruoção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo	un	2,00	119,54	158,03	316,06	0,06 %
22.23	93662 SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interruoção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo	UN	6,00	54,79	72,43	434,58	0,08 %
22.24	93655 SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interruoção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva	UN	8,00	11,98	15,83	126,64	0,02 %
22.25	91863 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	M	75,00	11,03	14,58	1.093,50	0,21 %
22.26	91864 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	M	9,40	14,66	19,36	182,17	0,03 %
22.27	91871 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	M	50,30	11,51	15,21	765,06	0,15 %
22.28	91872 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	M	6,00	15,14	20,01	120,06	0,02 %
22.29	91873 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	M	36,00	18,68	24,69	888,84	0,17 %
22.30	90447 SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	M	57,80	5,53	7,31	422,51	0,08 %

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 93
Rubrica

22.31	8324 ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma	un	29,00	9,13	12,06	349,74	0,07 %
22.32	97607 SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W	UN	5,00	135,14	178,65	893,25	0,17 %
22.33	11857 ORSE	Lâmpada tubular led T8, 16w, bivolt	un	31,00	27,08	35,79	1.109,49	0,21 %
22.34	97599 SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	UN	3,00	25,97	34,33	102,99	0,02 %
22.35	96985 SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por	UN	3,00	80,77	106,77	320,31	0,06 %
22.36	96977 SINAPI	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR	M	10,00	59,09	78,11	781,10	0,15 %
22.37	4192 ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	un	2,00	11,95	15,79	31,58	0,01 %
22.38	4014 ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20	Un	3,00	8,78	11,60	34,80	0,01 %
22.39	4015 ORSE	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação	Un	3,00	12,60	16,65	49,95	0,01 %
22.40	93358 SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	4,50	62,14	82,14	369,63	0,07 %
22.41	96995 SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	3,50	37,68	49,81	174,33	0,03 %
22.42	101502 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) AF_07/2020_P	UN	1,00	1.684,23	2.226,55	2.226,55	0,42 %
22.43	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	573,61	758,31	1.516,62	0,29 %
22.44	12628 ORSE	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,00	3.291,13	4.350,87	4.350,87	0,83 %

Tipo de Licitação Convite
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório Processo Administrativo nº

Total sem BDI	**398.450,02**
Total do BDI	**128.173,23**
Total Geral	**526.623,25**

Engº Civ. Marcos Domingos Da Silva
CREA-RR Nº 0905404068

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 94
Rúbrica

OBJETO:
Construção da Escola Municipal Indígena Arthur Nabuco de Araújo- Comunidade Maracanã I_ Município de Uiramutã/ RR

LOCAL: MUNÍCIPIO UIRAMUTA / RR

Banco
SINAPI 07/22 RR
ORSE 07/22 SE

B.D.I. 32,20%

Encargos Sociais (Desonerado):
Horista: 86,74%
Mensalista: 48,18%

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A -	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00%	0,00%
A2	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1,50%	1,50%
A3	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	1,00%	1,00%
A4	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA	0,20%	0,20%
A5	SERVIÇO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8,00%	8,00%
A9	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO - SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ÍTEM "A"	16,80%	16,80%
B -	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DE "A"	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,06%	Não incide
B2	FERIADOS	4,77%	Não incide
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13° SALÁRIO	10,97%	8,33%
B5	LICENÇA À PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,68%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,51%	7,23%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
	TOTAL DO ÍTEM "B"	46,86%	16,98%
C -	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,54%	4,21%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,32%	0,24%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3	3,73%	2,84%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,65%	3,53%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,35%
	TOTAL DO ÍTEM "C"	14,71%	11,17%
D -	TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REICIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE GRUPO "B"	7,87%	2,85%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,50%	0,38%
	TOTAL DO ÍTEM "D"	8,37%	3,23%
	PERCENTUAL TOTAL	86,74%	48,18%

*OBS.: * Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto.*

FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVAS - INMET

Eng. Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA RN nº 0985404068

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 95 Rúbrica

COMPOSIÇÕES DO BDI DESONERADO

Construção da Escola Municipal Indígena Arthur Nabuco de Araújo- Comunidade Maracanã I_ Município de Uiramutã/ RR

LOCAL DA OBRA

	ITENS PASSÍVEIS DE ACEITAÇÃO NO BDI	Índices mínimo	Índices médio	Índices máximo	ÍNDICE ADOTADO
X	Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
	Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
	Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,10%
	Total				**4,90%**
Y	Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%
	Total				**1,23%**
Z	Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,50%
	Total				**7,50%**
I	**Tributos**				
	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
	ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	CPRB	0,00%	4,50%	4,50%	5,00%
	Total				**13,65%**
	% DE BDI A SER UTILIZADO =				**32,20%**

LEGENDA	
X =	Despesas indiretas (exceto tributos e despesas financeiras)
Y =	Despesas financeiras
Z =	Lucro
I =	Taxa representativa da incidência de impostos

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1 + 0{,}04900) \times (1 + 0{,}01230) \times (1 + 0{,}07500)}{(1 - 0{,}13650)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1{,}04900) \times (1{,}01230) \times (1{,}07500)}{(0{,}86350)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1{,}14155)}{(0{,}86350)} - 1$$

$$BDI = 1{,}32200 - 1$$

BDI= 32,20%

A FÓRMULA ADOTADA PARA CÁLCULO DO BDI, SEGUE RECOMENDAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013- TCU.

1. Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

2. Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Eng. Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA RN nº 0905404068

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 96
Rúbrica

ART, DECLARAÇÃO ORÇAMENÁRIA E MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

(ANEXO 2 DISPONIBILIZADO EM MÍDIA)

EM BRANCO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RR20220093632

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI - Fls. 97 Rúbrica

1. Responsável Técnico

MARCOS DOMINGOS DA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **0905404068**
Registro: **0905404068RR**

Empresa contratada: **VK CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-EPP**
Registro : **0001148192-RR**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Uiramutã - RR**
CPF/CNPJ: **01.612.681/0001-01**
RUA CICI MOTA, S/N
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **UIRAMUTÃ**
UF: **RR**
CEP: **69358970**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em: **01/12/2021**
Valor: **R$ 410.000,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Nenhum**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CICI MOTA, S/N
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **UIRAMUTÃ**
UF: **RR**
CEP: **69358970**
Data de Início: **01/12/2021**
Previsão de término: **01/12/2023**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Uiramutã - RR**
CPF/CNPJ: **01.612.681/0001-01**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	175,13	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE AUTORIA OBRA: OBJETO: Construção da Escola Municipal Indígena com duas salas mais refeitório - Comunidade Ticoça_Uiramutã/RR

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RR, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro para os devidos fins que não possuo nenhuma ART de execução registrada, em andamento em outro regional. Sendo assim, declaro ainda estar ciente da impossibilidade de registrar ARTs de execução junto a outro regional, enquanto durar os contratos no Estado de Roraima, sob pena de sanções previstas na legislação vigente junto ao sistema CONFEA/CREA.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RORAIMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MARCOS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 008.885.727-19

Benisio Roberto de Souza
Prefeitura Municipal de Uiramutã - RR - CNPJ: 01.612.681/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **19/09/2022** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8207571273**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: Yz57b
Impresso em: 19/09/2022 às 11:41:36 por: , ip: 192.168.100.1

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI - Fls. 98 Rubrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Uiramutã/RR, 16 de setembro de 2022.

Ao Exmª. Sra,

Vanderlane James Lima
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Prefeitura de Uiramutã/RR

Prezado Secretário,

Cumprimentando Vossa Excelência, declaro para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto "Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva- Comunidade Caraparú I /RR", foi adotado percentual de BDI de 24,96 % com encargos com não desonerado em conformidade com o estabelecido no SINAPI.
O regime de execução do objeto é por preço global.

Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos com desoneração é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal, pois apresenta a planilha orçamentária de menor valor.

Respeitosamente,

Engº Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA-RR nº 0905404068
Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR
Portaria nº230, 01/07/2021

EMBRAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 99
Rubrica

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A Empresa _____, inscrita no CNPJ Nº _____, sediada_____, por intermédio do seu representante legal_____, portador da carteira de identidade nº_____e do CPF nº _____, DECLARA, que vistoriou o local para prestação dos serviços constantes da Tomada de Preço nº_e tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletou informações de dados e elementos necessários á perfeita elaboração de proposta comercial.

Boa Vista – RR, de 2022.

Nome do representante legal da empresa CPF nº

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 100
Rubrica

PROJETOS EXECUTIVOS
(ANEXO 3 DISPONIBILIZADO EM MÍDIA)

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - Fls 108 - Fábrica

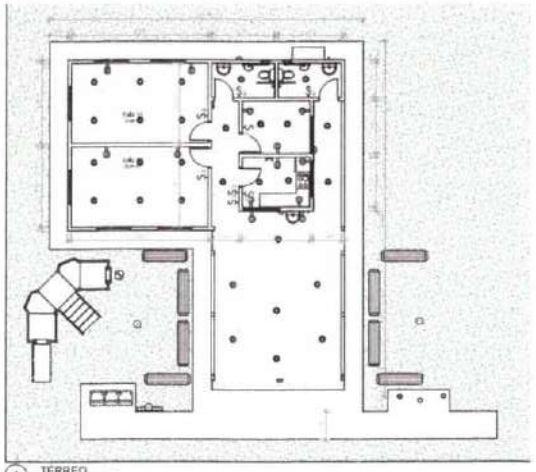

1 TÉRREO

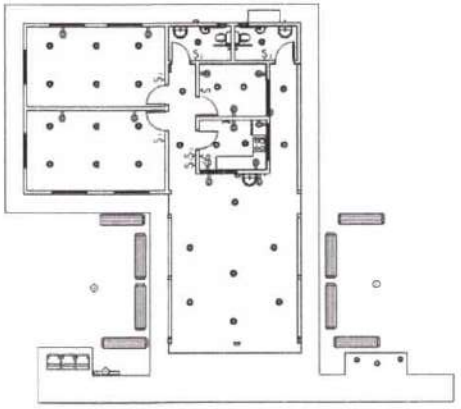

2 Layout Elétrico E Hidráulico

LEGENDAS | HIDRAULICO

LEGENDA - HIDRÁULICO

QTO - ESQUADRIAS TOTAIS

QTO - PORTAS

QUADRO DE ÁREAS

LEGENDA - QUADRO DE ÁREAS

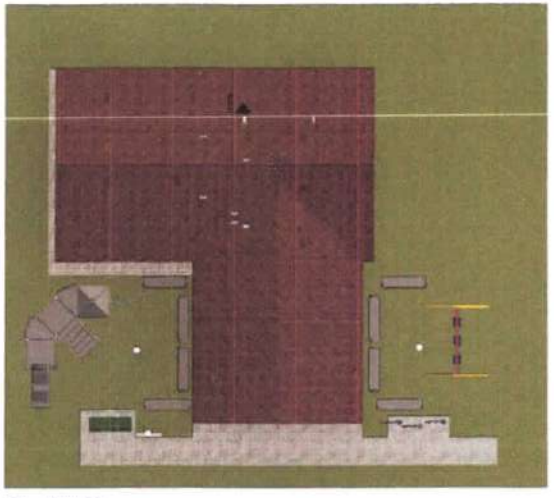

4 COBERTURA

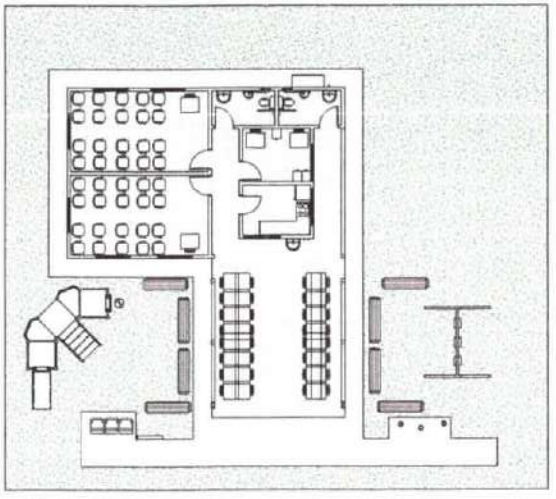

3 Layout Mobiliario

LEGENDAS | ELETRICO

LEGENDA - ELETRICO



9 CORTE B



5 Fachada frontal



8 CORTE A

FOLHA P01 /01

Projetista	Função	Data	Assinatura
01			
02			
03			

ESCALAS

DEMOLIÇÕES
PLANTA BAIXA LAY. TERREO
LAYOUT ELETRICO - HIDRAULICO
E COBERTA

Jairo Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 0905404038

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI - RORAIMA
Fls. 808

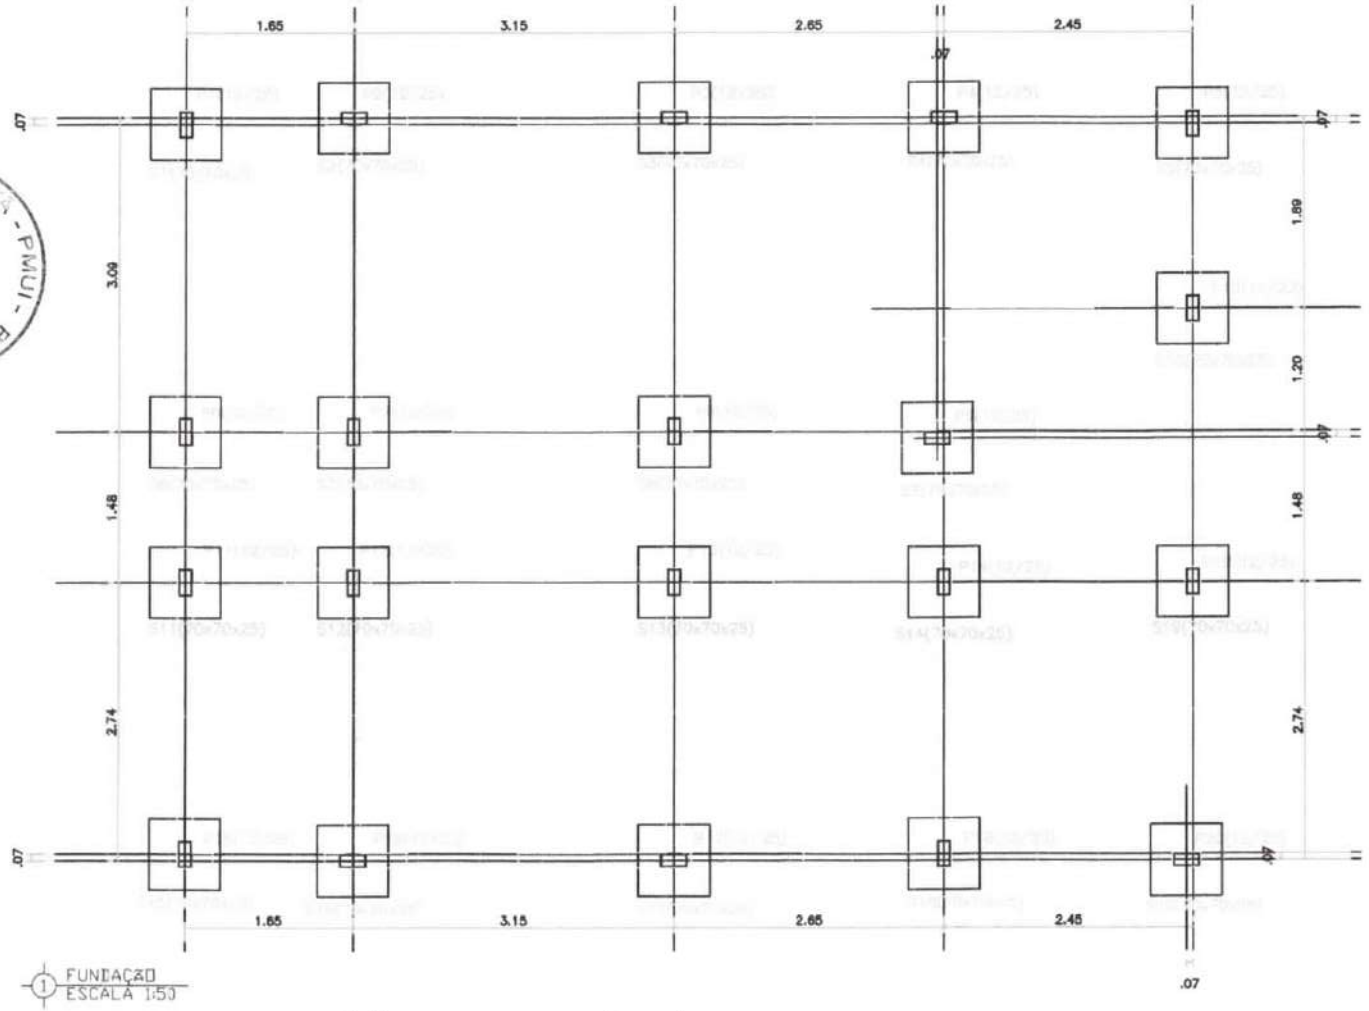

① FUNDAÇÃO
ESCALA 1:50

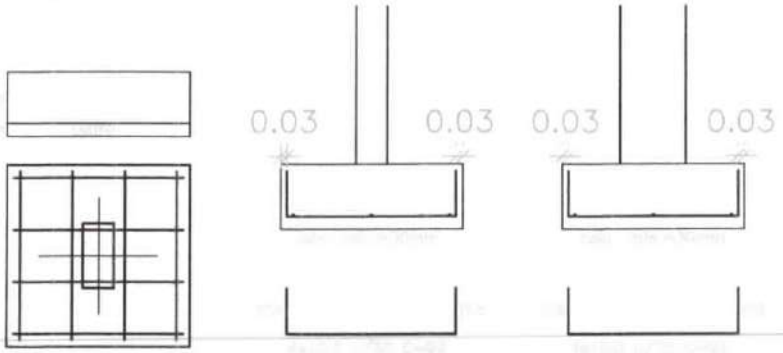

② FUNDAÇÃO - SAPATAS
S/ ESCALA

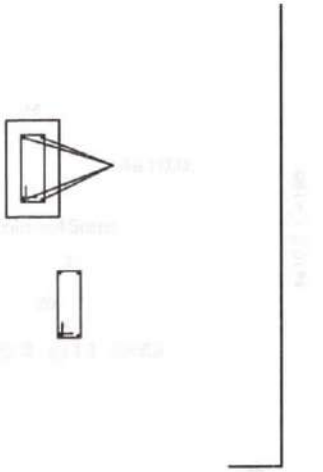

③ FUNDAÇÃO - ARRANQUE
S/ ESCALA

Marcos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 090540[illegible]

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI			
LOCAL: COMUNIDADES INDIGENAS UIRAMUTÃ			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ			
RESPONSAVEL/AUTOR: Engº Civil. Marcos Domingos da Silva CREA-RR nº 090540[illegible]	PRANCHA: FUNDAÇÃO	AREA: 175,13m	FOLHA: 1/7
	DATA:	ESCALA: INDICADA	

EM BRANCO

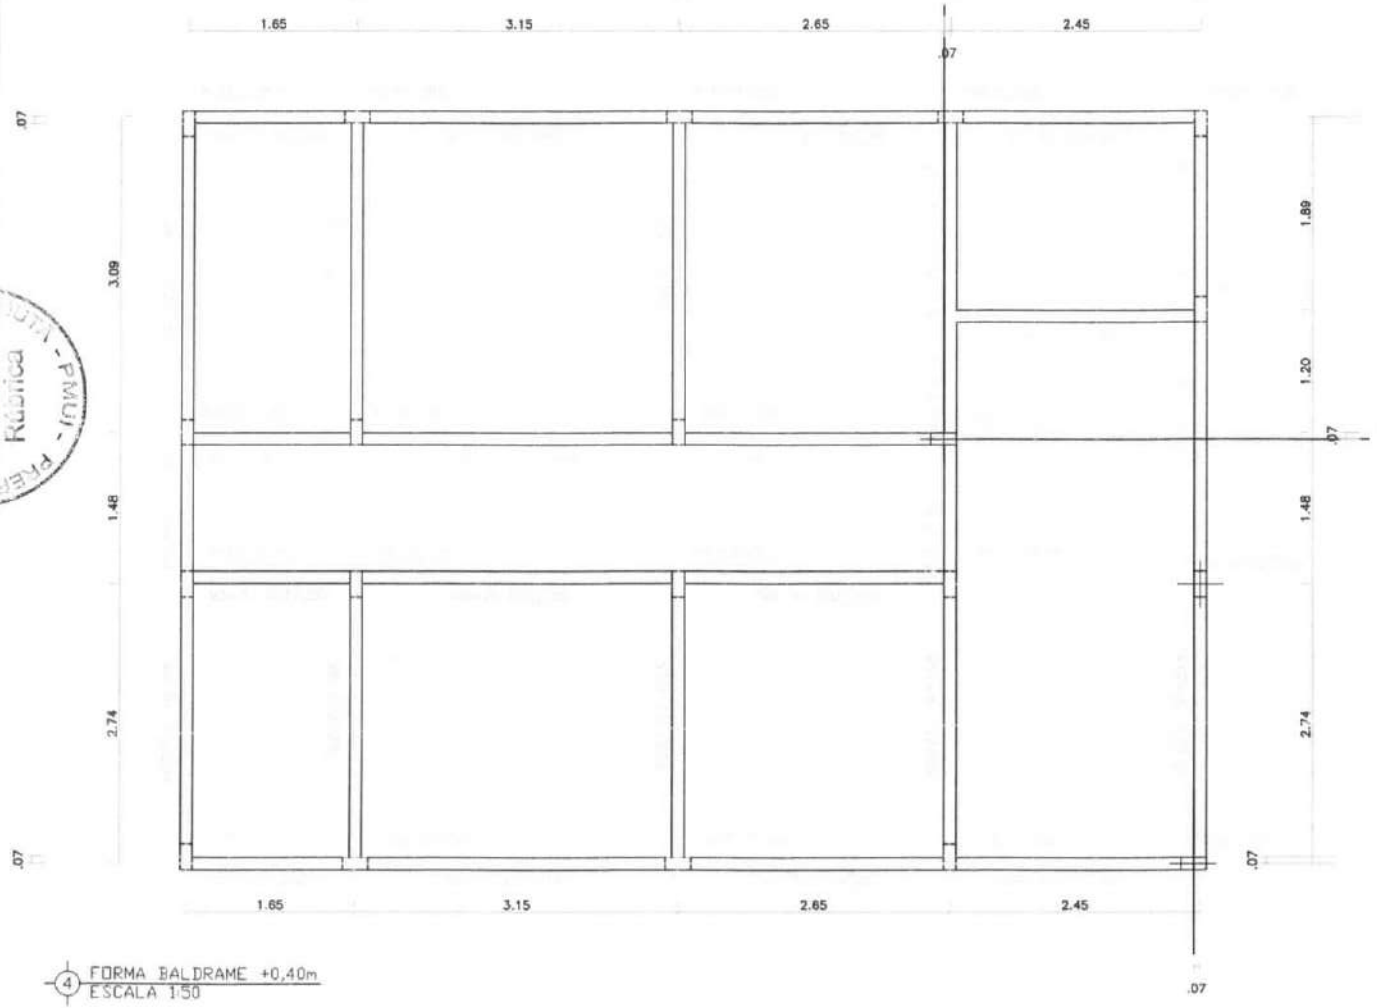

④ FORMA BALDRAME +0,40m
ESCALA 1:50



⑤ VIGA BALDRAME - ESTRIBO
S/ ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI - Rústica
Fls. 103

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI			
LOCAL: COMUNIDADES INDÍGENAS UIRAMUTÃ			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ			
RESPONSÁVEL/AUTOR: Engº Civil. Marcos Domingos da Silva CREA-RR nº 0[illegible]4068	PRANCHA: FORMA BALDRAME +0,40m	AREA: 175,13m	FOLHA: 2/7
	DATA:	ESCALA: INDICADA	

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 104
Rubrica

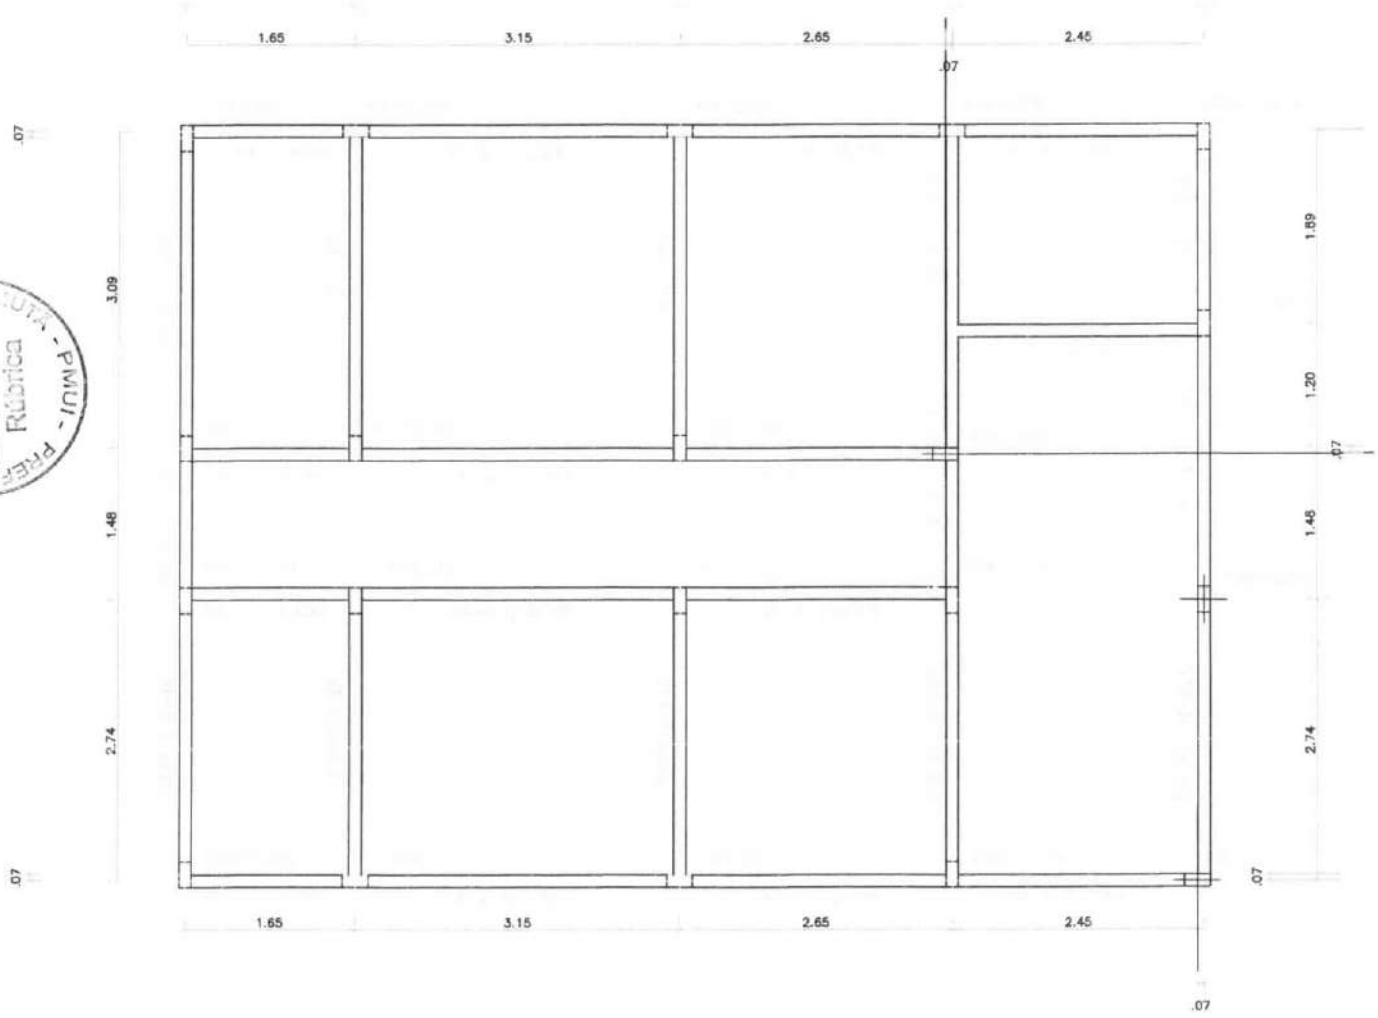

⑧ FORMA SUPERIOR +3,40m
ESCALA 1:50



⑤ PILARES - ESTRIBO
S/ ESCALA



⑦ VIGA SUPERIOR - ESTRIBO
S/ ESCALA

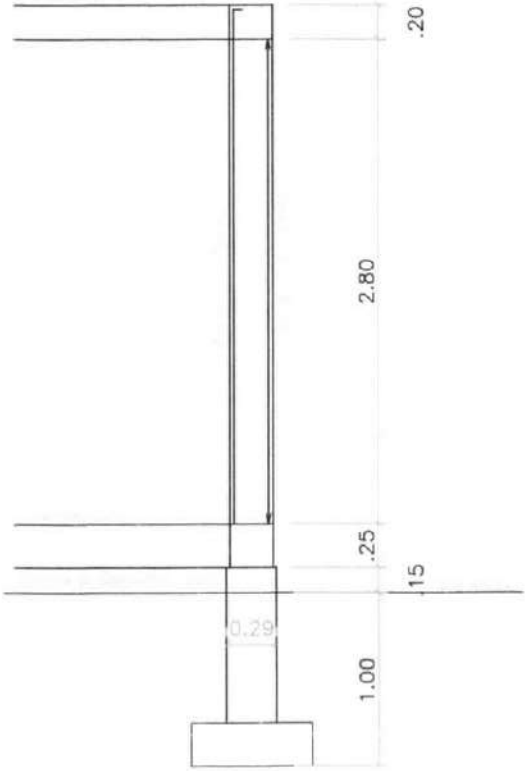

⑨ PILARES
ESCALA 1:50

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO:	PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI
LOCAL:	COMUNIDADES INDIGENAS UIRAMUTÃ
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
RESPONSÁVEL/AUTOR:	Engº Civil. Marcos Domingos da Silva CREA-RR nº 0[illegible]4068
PRANCHA: FORMA SUPERIOR +3,40m	AREA: 175,13m
DATA:	ESCALA: INDICADA
FOLHA:	3/7

EM BRANCO

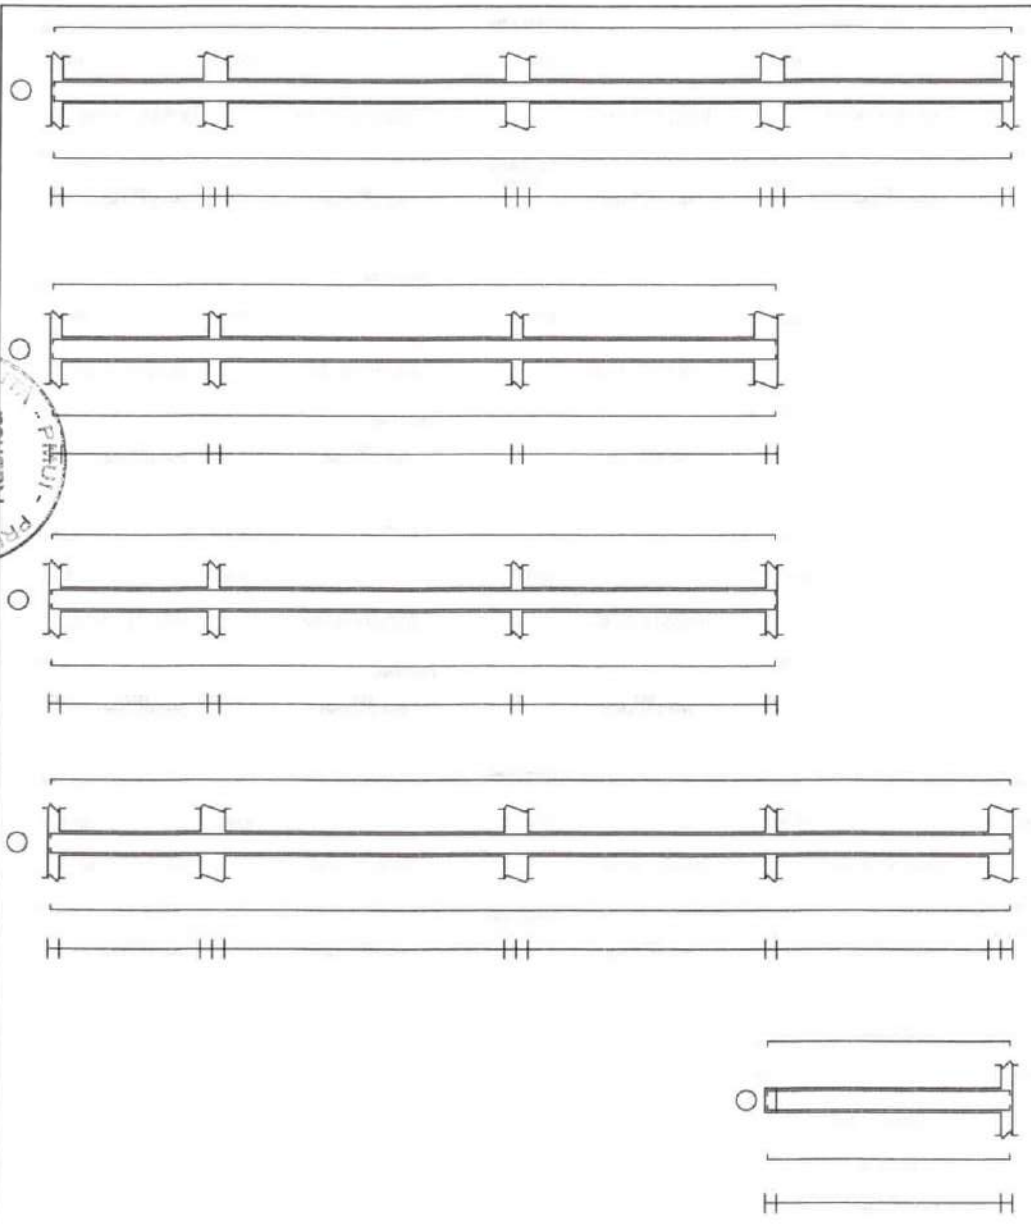

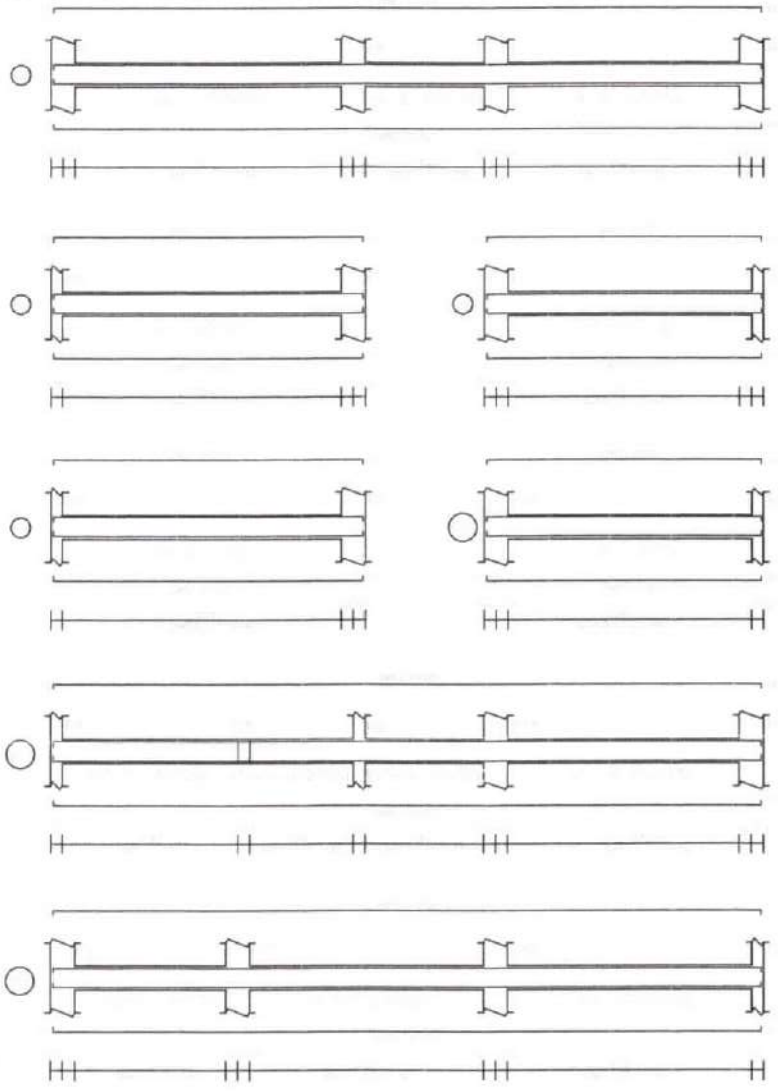

VIGAS BALDRAME
S/ ESCALA

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI

LOCAL: COMUNIDADES INDÍGENAS UIRAMUTÃ

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

RESPONSÁVEL/AUTOR:	PRANCHA: VIGAS BALDRAME	ÁREA: 175,13m	FOLHA: 4/7
Engº Civil. Marcos Domingos da Silva CREA-RR nº 090[illegible]58	DATA:	ESCALA: INDICADA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 106
Rubrica

EM BRANCO

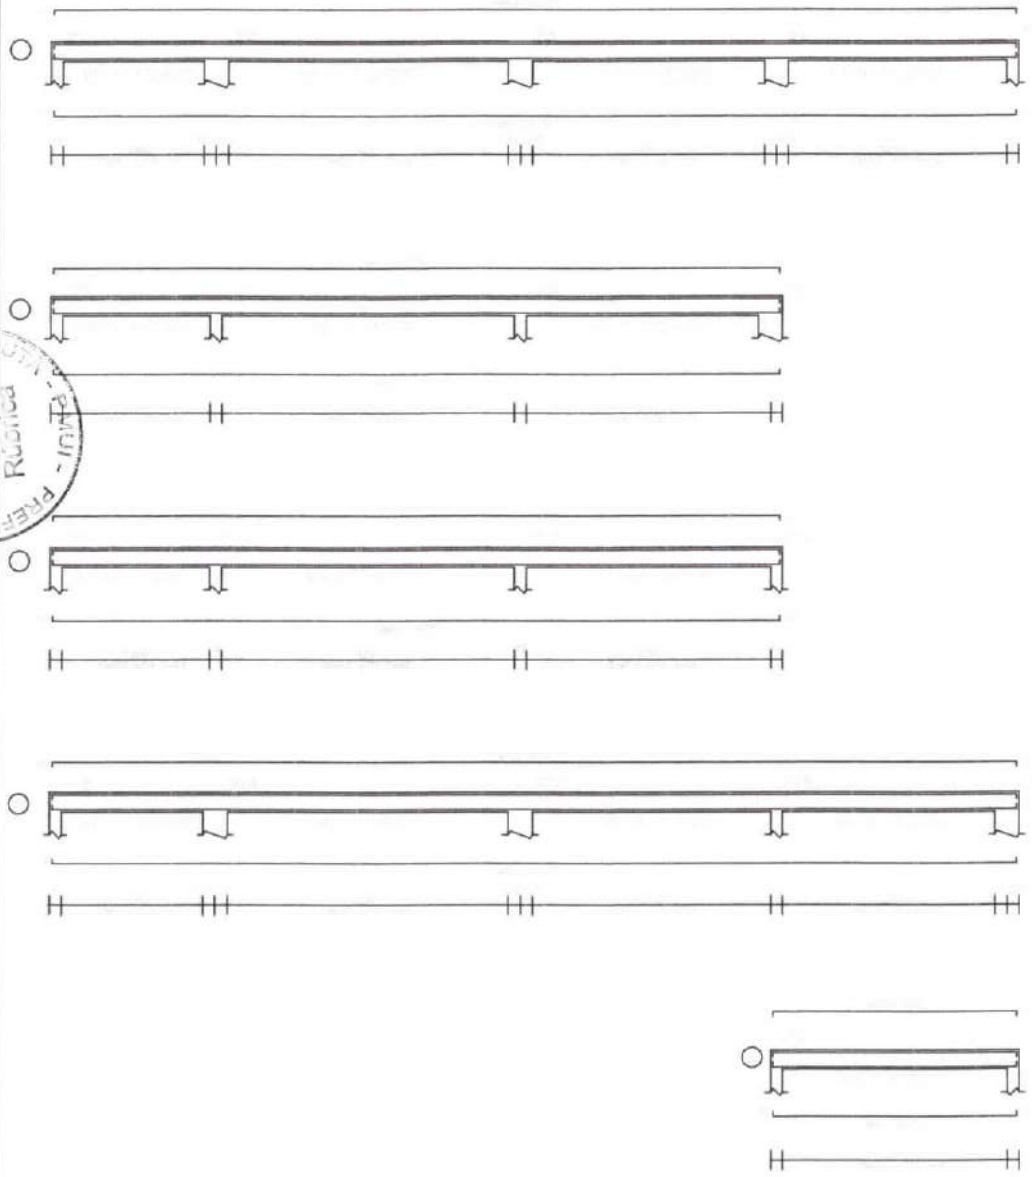

VIGAS SUPERIORES
S/ ESCALA

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI			
LOCAL: COMUNIDADES INDÍGENAS UIRAMUTÃ			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ			
RESPONSÁVEL/AUTOR: Engº Civil Marcos Domingos da Silva CREA-RR nº 0905[illegible]	PRANCHA: VIGAS SUPERIORES	AREA: 175,13m	FOLHA: 5/7
	DATA:	ESCALA: INDICADA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible] - UIRAMUTÃ - RORAIMA
Fls. 206
Técnica

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAIMA - PMUI
Fls. 007

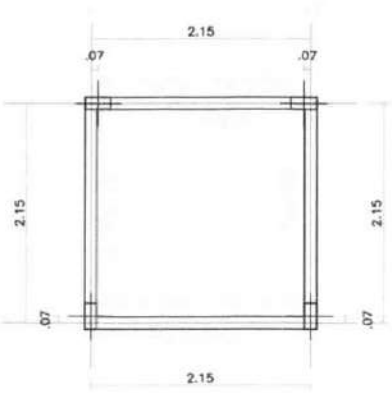

④ FORMA BALDRAME +0,40m
ESCALA 1:50

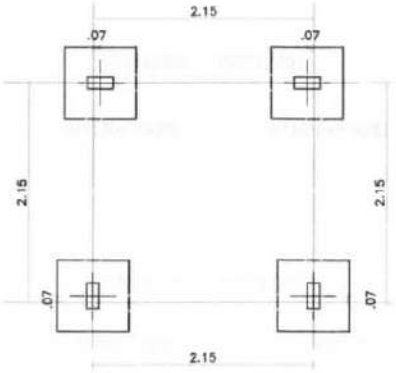

① FUNDAÇÃO
ESCALA 1:50



③ FUNDAÇÃO - ARRANQUE
S/ ESCALA



⑦ VIGA SUPERIOR - ESTRIBO
S/ ESCALA



⑥ PILARES - ESTRIBO
S/ ESCALA



⑤ VIGA BALDRAME - ESTRIBO
S/ ESCALA

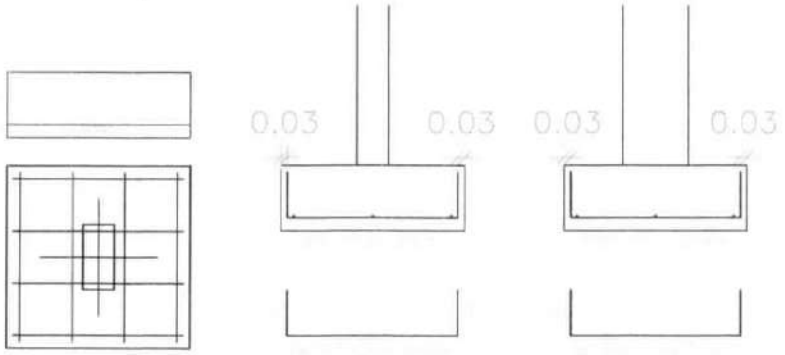

② FUNDAÇÃO - SAPATAS
S/ ESCALA

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TÍTULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI			
LOCAL: COMUNIDADES INDÍGENAS UIRAMUTÃ			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ			
RESPONSÁVEL/AUTOR: Engº Civil. Marcos Domingos da Silva. CREA-RR nº 0905404068	PRANCHA: ABRIGO DE RES.	ÁREA: 175,13m²	FOLHA 6/7
	DATA:	ESCALA: INDICADA	

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI - Técnica
Fls. 108

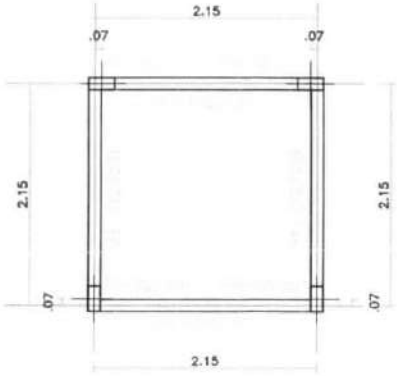

⑧ FORMA SUPERIOR +3,40m
ESCALA 1:50

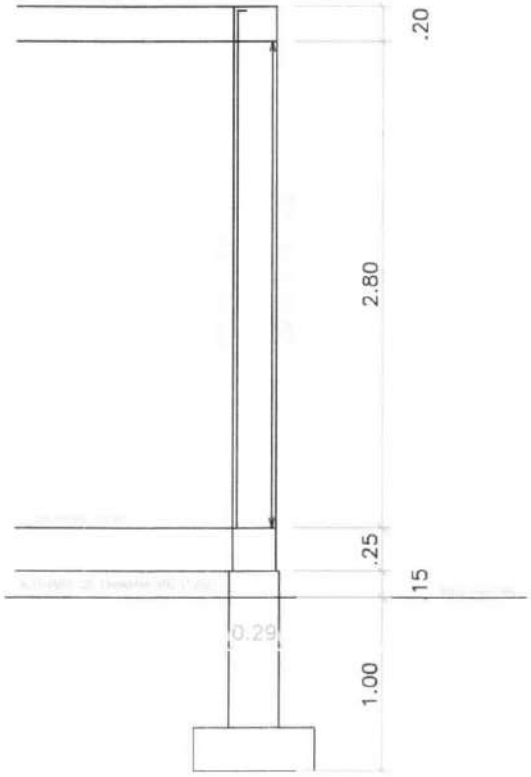

⑨ PILARES
ESCALA 1:50

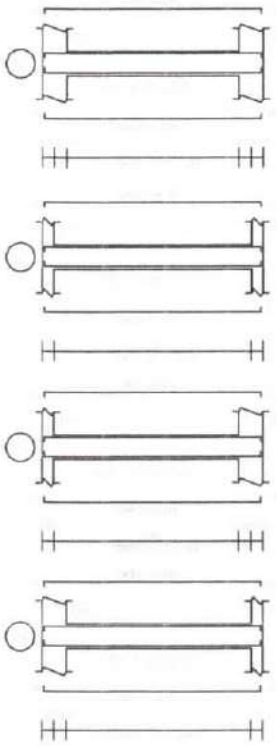

⑩ VIGAS BALDRAME
S/ ESCALA

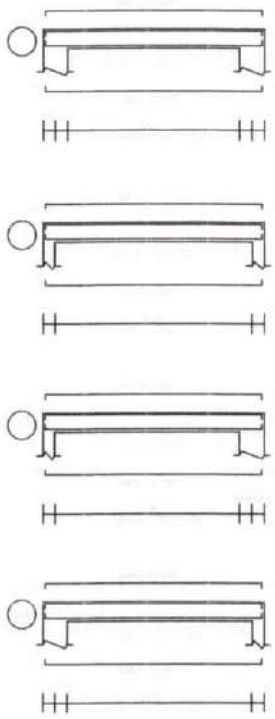

⑪ VIGAS SUPERIORES
S/ ESCALA

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI			
LOCAL: COMUNIDADES INDÍGENAS UIRAMUTÃ			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ			
RESPONSÁVEL/AUTOR: Engº Civil. Marcos Domingos da Silva CREA-RR nº 0905404068	PRANCHA: ESTRUT DE RES.	AREA: 175,13m²	FOLHA: 7/7
	DATA:	ESCALA: INDICADA	

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls 109
Rúbrica

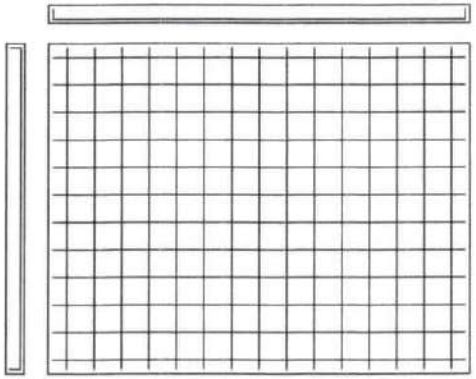

TAMPA DO TANQUE SÉPTICO

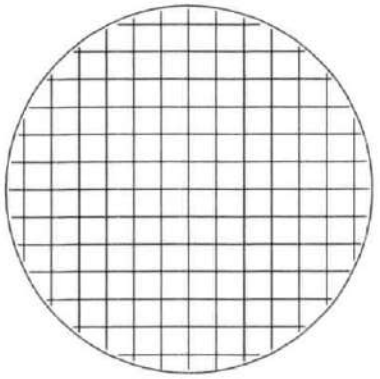

TAMPA DO SUMIDOURO

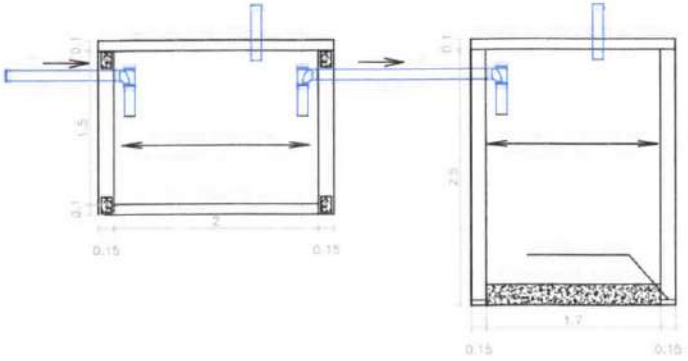

② TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO
ESCALA 1:50



VIGAS E PILARES

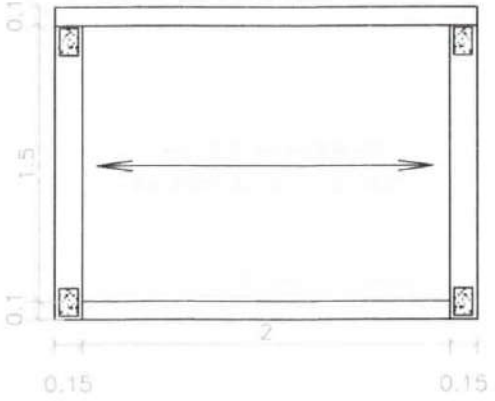

③ ESTRUTURAL TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO
S/ ESCALA

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI			
LOCAL: COMUNIDADES INDIGENAS UIRAMUTÃ			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ			
RESPONSÁVEL/AUTOR: Engª Civil. Marcos Domingos da Silva CREA-RR nº 090540068	PRANCHA: ESQ. DETALHES	ÁREA: 175,13m²	FOLHA: 1/1
	DATA:	ESCALA: INDICADA	

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI - ASSESSORIA TÉCNICA
Fls. 120

ABRIGO DE RESIDUOS DE SAUDE

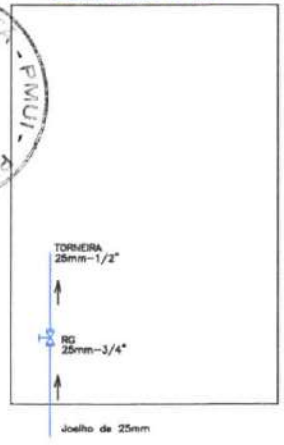

DETALHE BANHEIRO

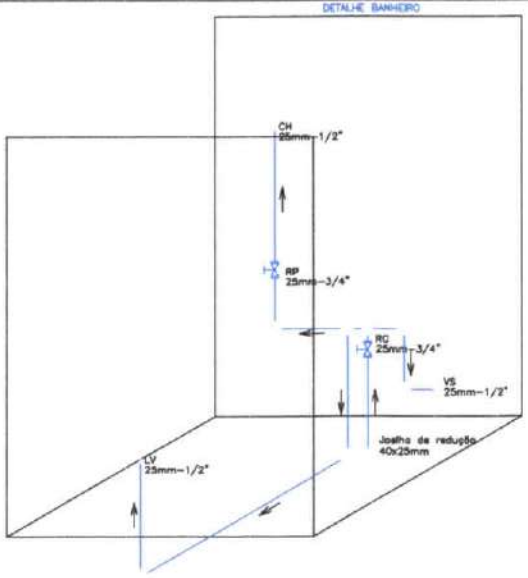

DETALHE SALA DE ODONTOLOGIA

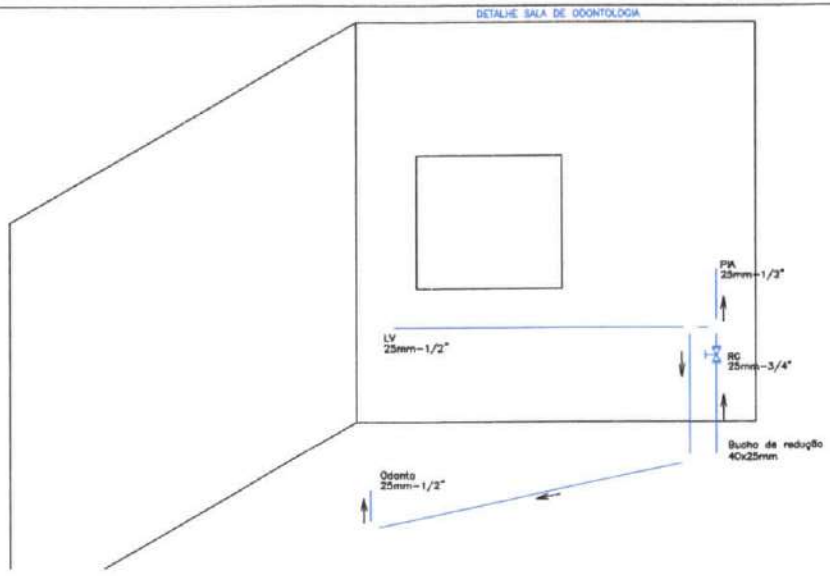

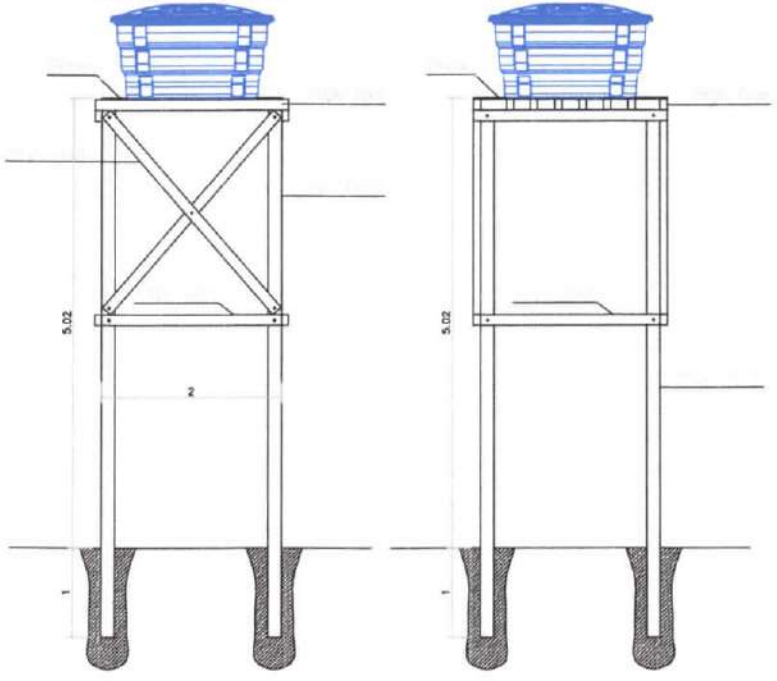

DETALHE DML

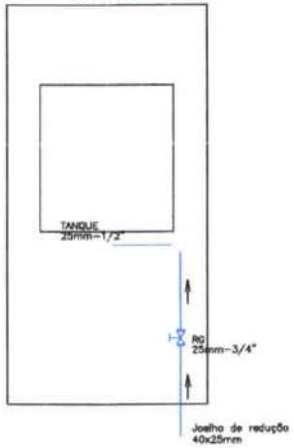

DETALHE SALA DE PREP. DE PACIENTES

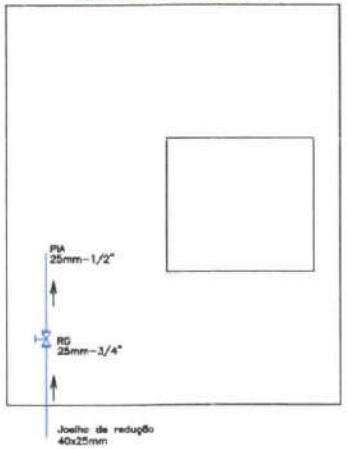

DETALHE CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO

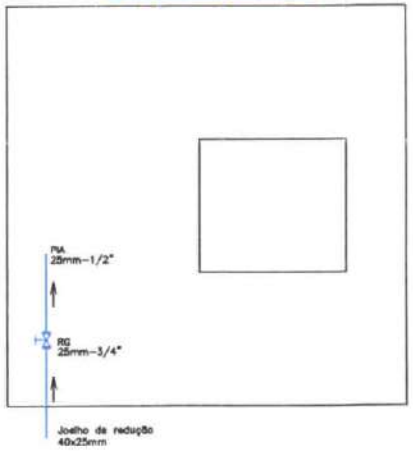

NOTA: A LOCAÇÃO DOS PONTOS DEVERÁ SER COMPATIBILIZADA EM LOCO.

① DETALHES
S/ ESCALA

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI

LOCAL: COMUNIDADES INDIGENAS UIRAMUTÃ

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

RESPONSÁVEL/AUTOR:
Engº Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA-RR nº 090540

PRANCHA: HIDRAUL. DETALHES | ÁREA: 175,13m

DATA:

ESCALA: INDICADA

FOLHA: 2/2

EM BRANCO

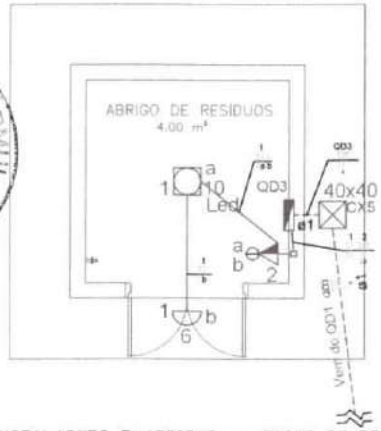

③ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ABRIGO DE RESIDUOS
ESCALA 1:50

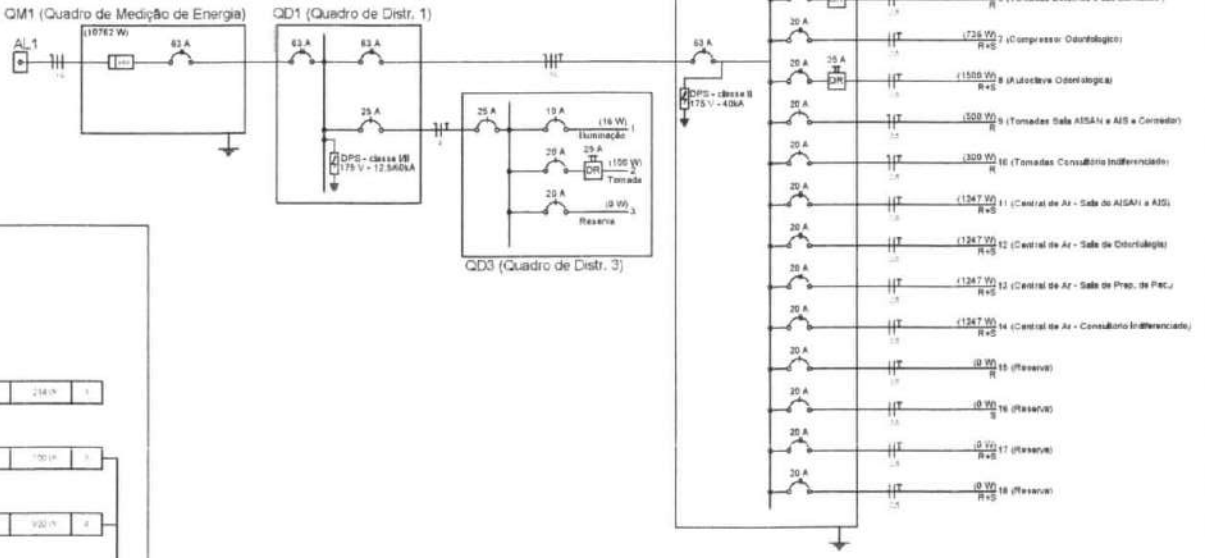

QD2 (Quadro de Distribuição 02)

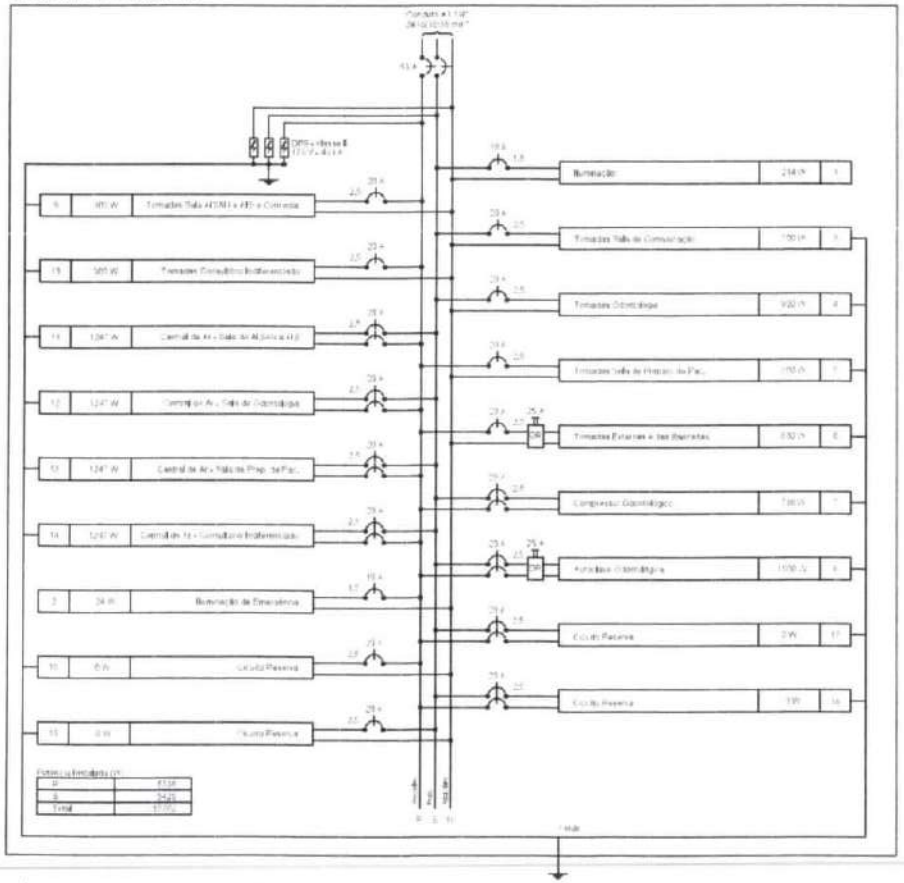

② DIAGRAMAS UNIFILAR E MULTIFILAR
S/ ESCALA

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI			
LOCAL: COMUNIDADES INDÍGENAS UIRAMUTÃ			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ			
RESPONSÁVEL/AUTOR: Engº Civil. Marcos Domingos da Silva CREA-RR nº 090540468	PRANCHA: DETALHES	ÁREA: 175,13m²	FOLHA: 1/3
	DATA:	ESCALA: INDICADA	

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI - Fls. 119 - Rubrica

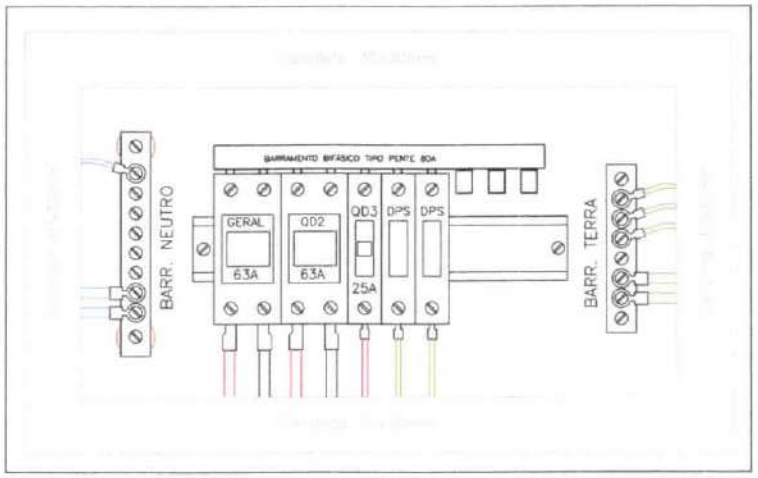

⑥ ESQUEMA INTERNO DE MONTAGEM DO QUADRO QD1
S/ ESCALA

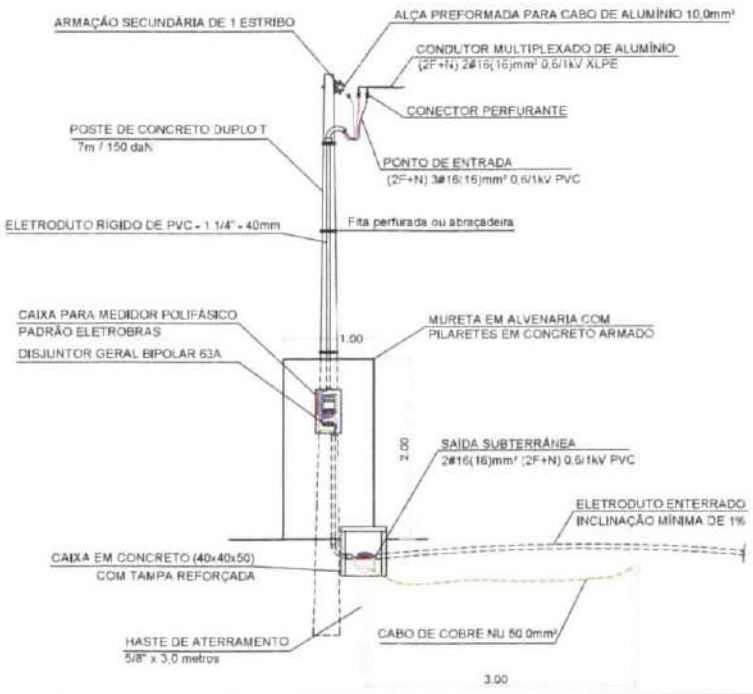

④ PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA
S/ ESCALA

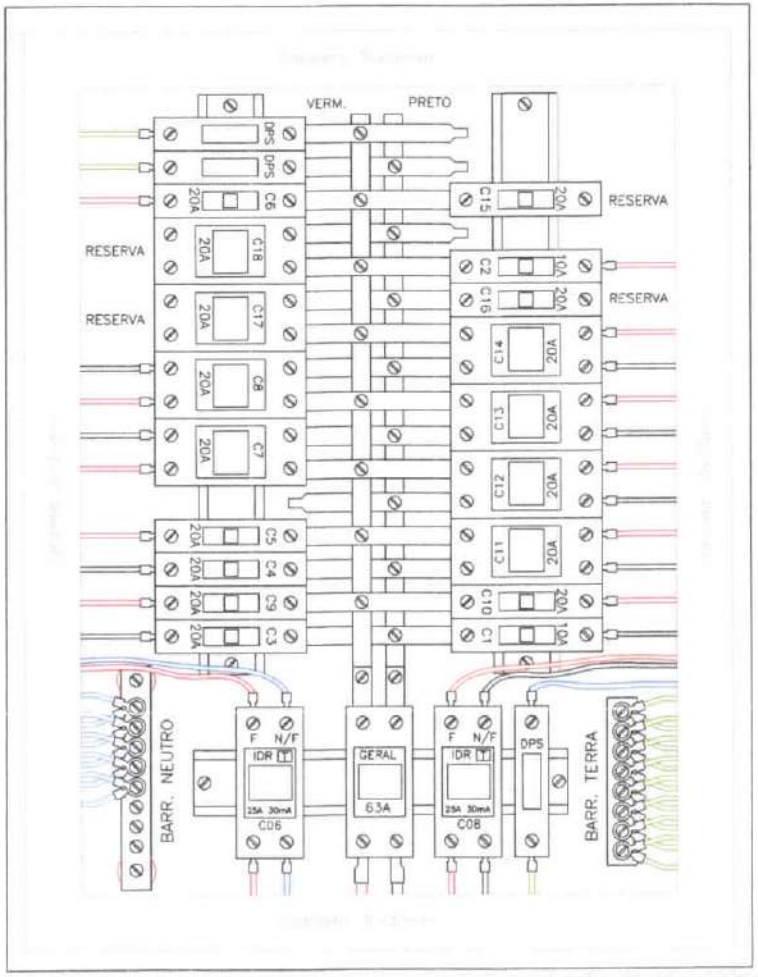

⑤ ESQUEMA INTERNO DE MONTAGEM DO QUADRO QD2
S/ ESCALA

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI
LOCAL: COMUNIDADES INDIGENAS UIRAMUTÃ
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

RESPONSÁVEL/AUTOR:	PRANCHA: DETALHES	AREA: 175,13m	FOLHA: 2/3
Engº Civil. Marcos Domin[illegible] Silva CREA-RR nº 090540[illegible]	DATA:	ESCALA: INDICADA	

EM BRANCO

Quadro de Cargas (QDG)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	In - R (A)	In - S (A)	FP	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	dV Part. (%)
1	Iluminação	F+N	B1	115 V	233	214	S		214		2,0	0,92	1,00	0,60	2,9	2,0	1,5	17,5	10,0	0,18	3,98	
	a				11	10	S		10					0,60	0,1		1,5	17,5				
	b				43	40	S		40		0,4			0,60	0,6		1,5	17,5				
	c				22	20	S		20		0,2			0,70	0,3		1,5	17,5				
	d				11	10	S		10					0,60	0,1		1,5	17,5				
	e				22	20	S		20		0,2			0,60	0,2		1,5	17,5				
	f				11	10	S		10					0,60	0,1		1,5	17,5				
	g				43	40	S		40		0,4			0,60	0,6		1,5	17,5				
	h				22	20	S		20		0,2			0,65	0,3		1,5	17,5				
	i				22	20	S		20		0,2			0,60	0,2		1,5	17,5				
	j				26	24	S		24		0,2			0,60	0,4		1,5	17,5				
2	Iluminação de Emergência	F+N	B1	115 V	26	24	R	24		0,2		0,92	1,00	0,70	0,3	0,2	1,5	17,5	10,0	0,01	3,81	
3	Tomadas Sala de Comunicação	F+N+T	B1	115 V	761	700	S		700		6,6	0,92	1,00	0,70	9,5	6,6	2,5	24,0	20,0	0,72	4,52	
	Tomadas Odontologia	F+N+T	B1	115 V	978	900	S		900		8,5	0,92	1,00	0,60	14,2	8,5	2,5	24,0	20,0	0,87	4,67	
	Tomadas Sala de Preparo de Pac.	F+N+T	B1	115 V	326	300	R	300		2,8		0,92	1,00	0,65	4,4	2,8	2,5	24,0	20,0	0,25	4,05	
6	Tomadas Externas e das Bancadas	F+N+T	B1	115 V	652	600	R	600		5,7		0,92	1,00	0,60	8,1	5,7	2,5	24,0	20,0	0,27	4,07	
7	Compressor Ocontológico	F+F+T	B1	230 V	1085	736	R+S	368	368	4,7	4,7	0,68	1,00	0,60	7,9	4,7	2,5	24,0	20,0	0,25	4,05	4,36
8	Autoclave Odontológica	F+F+T	B1	230 V	1500	1500	R+S	750	750	6,5	6,5	1,00	1,00	0,60	10,9	6,5	2,5	24,0	20,0	0,31	4,11	
9	Tomadas Sala AISAN e AIS e Corredor	F+N+T	B1	115 V	543	500	R	500		4,7		0,92	1,00	0,60	6,8	4,7	2,5	24,0	20,0	0,33	4,13	
10	Tomadas Consultório Indiferenciado	F+N+T	B1	115 V	326	300	R	300		2,8		0,92	1,00	0,60	4,7	2,8	2,5	24,0	20,0	0,23	4,03	
11	Central de Ar - Sala do AISAN a AIS	F+F+T	B1	230 V	1355	1247	R+S	624	624	5,9	5,9	0,92	1,00	0,70	8,4	5,9	2,5	24,0	20,0	0,29	4,09	
12	Central de Ar - Sala de Odontologia	F+F+T	B1	230 V	1355	1247	R+S	624	624	5,9	5,9	0,92	1,00	0,60	9,8	5,9	2,5	24,0	20,0	0,25	4,05	
13	Central de Ar - Sala de Prep. de Pac.	F+F+T	B1	230 V	1355	1247	R+S	624	624	5,9	5,9	0,92	1,00	0,65	9,1	5,9	2,5	24,0	20,0	0,29	4,09	
14	Central de Ar - Consultório Indiferenciado	F+F+T	B1	230 V	1355	1247	R+S	624	624	5,9	5,9	0,92	1,00	0,60	9,8	5,9	2,5	24,0	20,0	0,30	4,10	
TOTAL					11853	10762	R+S	5336	5426													

Quadro de Demanda (QDG)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Uso específico	8,01	100	8,01
Iluminação e Tomadas - UBSI I	3,85	80	3,08
		TOTAL	11,08

NOTAS:

- A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS NR10, NBR 5410/2005 E NBR 5419/2015. O PROJETO DEVERÁ SER EXECUTADO FIELMENTE. EM CASO DE DÚVIDAS A EMPRESA DEVE CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO.
- TODOS OS CABOS DE ALIMENTADORES DOS QUADROS DEVERÁ SER DE ISOLAÇÃO 1kV, CARACTERISTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO À FOGO, LIVRE DE HALOGÊNIOS;
- TODOS OS ELETRODUTOS DE PVC DEVERÃO SER RÍGIDO ROSCÁVEL CLASSE "A", DE ACORDO COM A EB-744(ABNT);
- ELETRODUTOS DE PVC NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE DIÂMETRO NOMINAL ø25mm.
- EM NENHUM TRECHO A FIAÇÃO PODERÁ ESTAR EXPOSTA OU EMBUTIDA DIRETAMENTE NA ALVENARIA OU REBOCO;
- FIAÇÃO NÃO ESPECIFICADA SERÁ DE 1,5mm²;
- CORES DOS CONDUTORES = (ELETRICA REDE COMUM) FASES: VERMELHO E PRETO; NEUTRO : AZUL CLARO; TERRA : VERDE
- OS ELETRODUTOS SERÃO FIXADOS FIRMEMENTE NAS PAREDES OU ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO FORRO COM O USO DE ABRAÇADEIRAS DO TIPO "D" OU TIRANTES;
- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS NO INTERIOR DOS QUADROS E JUNTO AS TOMADAS;
- AS TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS EXTERNAMENTE;
- TODAS AS EMENDAS DE CABOS FLEXÍVEIS DEVERÃO SER ISOLADAS COM FITA DE AUTO FUSÃO E FINALIZADAS COM FITA ISOLANTE COMUM;
- TODAS AS PARTES METÁLICAS NORMALMENTE NÃO ENERGIZADAS DEVERÃO SER ATERRADAS;
- TODAS AS LIGAÇÕES NAS CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS DEVERÃO SER FEITAS UTILIZANDO DE BUCHA E ARRUELA;
- TODAS AS TOMADAS 2P+T CONFORME PADRÃO BRASILEIRO ABNT NBR 14136, DEVERÃO POSSUIR CERTIFICÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELO INMETRO;
- TODAS AS CONEXÕES DOS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE SOLDA EXOTÉRMICA;
- OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA PROFUNDIDADE DE 50cm. DEVERÃO SER UTILIZADAS SOLDA TIPO EXOTÉRMICAS NAS CONEXÕES CABO-HASTE E CABO-CABO.

⑦ QUADRO DE CARGAS, NOTAS E ADVERTÊNCIAS
S/ ESCALA

NOTAS continuação:

- INSTALAR DISJUNTOR PADRÃO EUROPEU - DIN;
- CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO CORRENTE MÍNIMA DE 3,0kA, QUANDO NÃO INDICADO;
- IDENTIFICAR CADA CIRCUITO COM PLAQUETA ACRÍLICA;
- UTILIZAR CONECTORES ADEQUADOS: DISJUNTORES: CONECTOR TIPO PINO; BARRAMENTO NEUTRO E TERRA: CONECTOR TIPO OLHAL;
- INSTALAR PORTA PROJETOS;
- UTILIZAR ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE OS DISPOSITIVOS PARA EVITAR AQUECIMENTO;
- UTILIZAR IDR BIPOLAR 25A 30mA NOS CIRCUITOS PARA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE;
- UTILIZAR DPS CLASSE I/II 175V 12,5/60kA NA MURETA DE ENTRADA DE ENERGIA;
- UTILIZAR DPS CLASSE II 175V 40kA NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA UBSI.

ADVERTÊNCIA A SER INSTALADA NOS QUADROS:

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga. Por isso, nunca troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção(bitola).
2. Da mesma forma, nunca desative ou remova a chave automática de proteção contra choque elétrico (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamento sem causa aparente. Se os desligamento forem freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiver êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificados e corrigidos por profissionais qualificados.

A desativação ou remoção da chave significa a eliminação de medida protetora contra choque elétrico e risco de vida para os usuários da instalação.

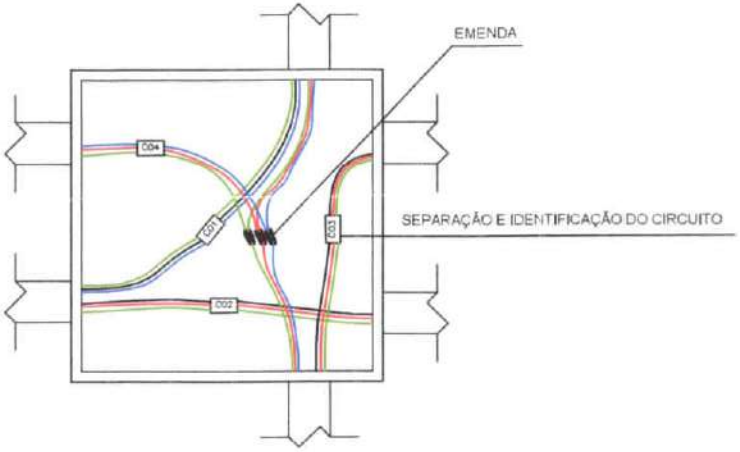

⑧ SEPARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS NAS CAIXAS DE PASSAGEM
S/ ESCALA

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TITULO: PROJETO PADRÃO DUAS SALAS COM REFEITÓRIO _PMUI			
LOCAL: COMUNIDADES INDÍGENAS UIRAMUTÃ			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ			
RESPONSÁVEL/AUTOR: Engº Civil. Marcos Domingos da Silva CREA-RR nº 090[illegible]4068	PRANCHA: DETALHES	AREA: 175,13m	FOLHA: 3/3
	DATA:	ESCALA: INDICADA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 113
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls.
Rúbrica

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - RR
Fls 114
Rúbrica

RELATORIO FOTOGRÁFICO
(ANEXO 4 DISPONIBILIZADO EM MÍDIA)

EM BRANCO

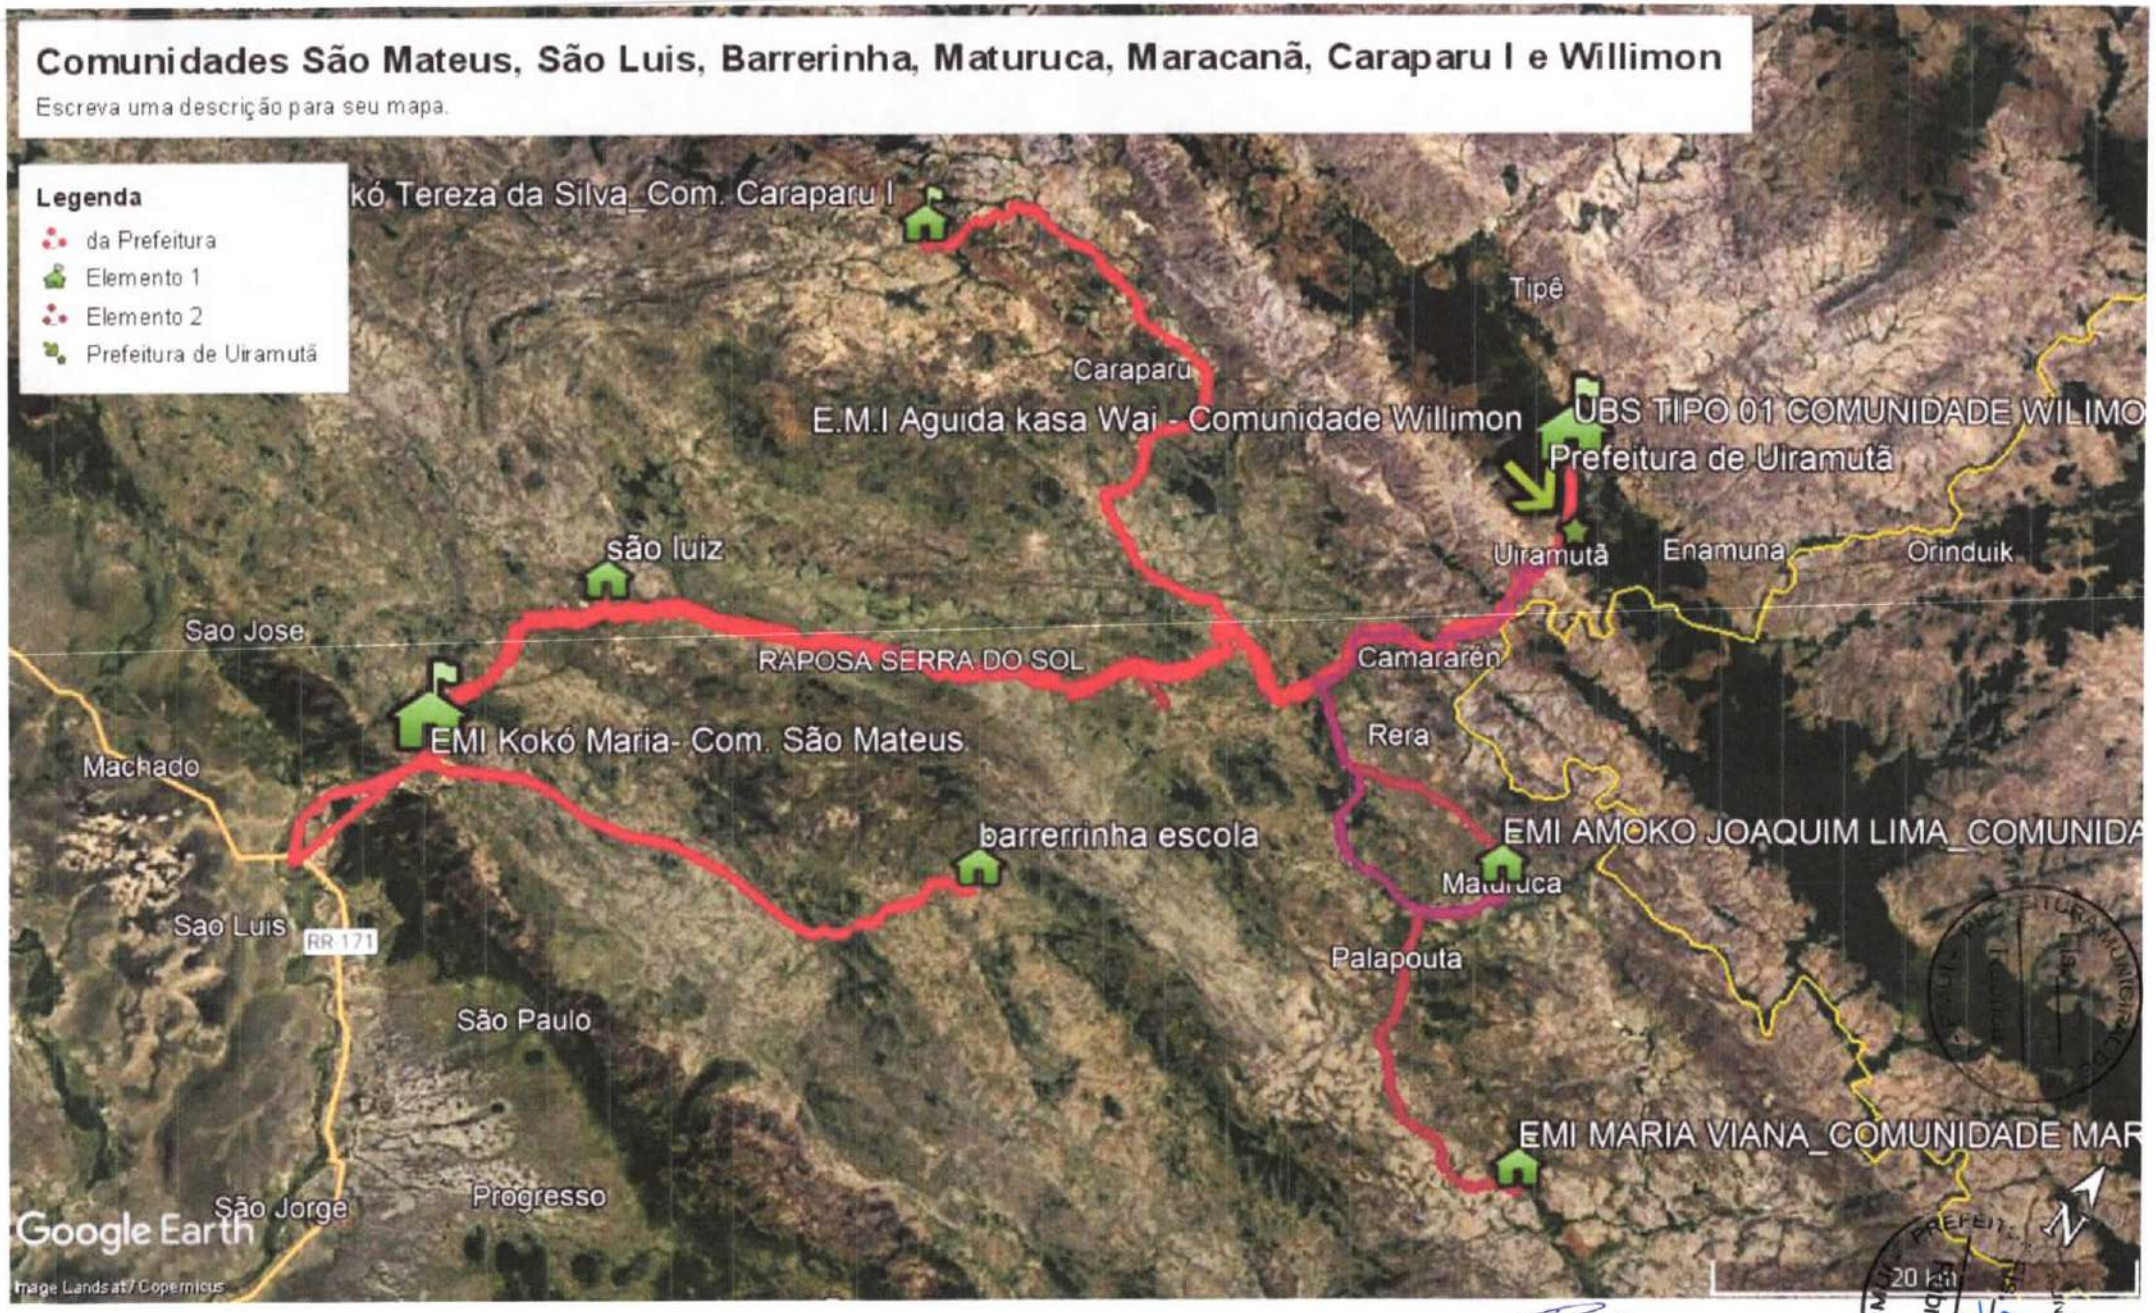

Engenheiro Civil
CREA 090504008

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Rubrica

EM BRANCO

PREFEITURA DE
UIRAMUTÃ

SEMECD - UIRAMUTÃ
Fls.
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – SEMECD

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 116
Rúbrica

Da: Secretaria de Educação Cultura e Desporto
Para: Gabinete do Prefeito

OBJETO: CONSTRUÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA Ko`Ko TERESA DA SILVA NA COMUNIDADE CARAPARÚ I NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ –RR.

Em atendimento ao Art. 14 da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, informamos a Vossa Excelência a existência de credito orçamentário, visando a construção da escola municipal indígena na comunidade caraparú i no município de UIRAMUTÃ –RR, conforme PAMPS, projeto Básico e Anexos.

Os recursos para essa contratação estão seguros na Classificação Orçamentaria:

Unidade Orçamentaria: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Exercício: 2022.
Programa de atividade: 12.361.3400.1020.0000
Elemento de Despesa: 44905100
Tipo de empenho: GLOBAL
Fonte de recurso: 1540 - FUNDEB

UIRAMUTÃ – RR, 26 de Setembro de 2022.

Vanderlane James Lima

VANDERLANE JAMES LIMA
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto
PORTARIA Nº 459/2022

EM BRANCO

PREFEITURA DE
UIRAMUTÃ

SEMECD / UIRAMUTÃ
Fls. 14
Rubrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – SEMECD

AUTORIZAÇÃO

Estando devidamente cumpridas as formalidades previstas non art. 38, caput, da Lei Federal n. 8.666/93, e suas alterações posteriores, conforme se constante no despacho anexado, AUTORIZO a abertura do processo licitatório visando a Construção da escola municipal indígena na comunidade Caraparú i no município de UIRAMUTÃ –RR. Conforme PAMS, Projeto Básico, e anexos.
Na qualidade de ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de UIRAMUTÃ –RR, declaro para os efeitos do inciso II, do Art. 16 da Lei Complementar n. 101- Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa abaixo especificada possui adequação orçamentaria e financeira com a Lei Orçamentaria Anual (LDO) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO).

Remeta-se o procedimento a Comissão Permanente de Licitação - CPL para os procedimentos cabíveis. Após sejam os autos submetidos a análise da Assessoria Jurídica para emissão de parecer jurídico.

UIRAMUTÃ – RR, 26 de Setembro de 2022.

BRS

Benisio Roberto de Souza
Prefeito do Município de Uiramuta- RR

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – SEMECD

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS Nº: 013/2022.

OBJETO: CONSTRUÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA Ko`Ko TERESA DA SILVA NA COMUNIDADE CARAPARÚ I NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ –RR.

REQUERENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO - SMECD

AUTUAÇÃO

Hoje, nesta cidade, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, autuo o processo licitatório **n. 135/2022,** do que para constar, lavrei este termo. Eu SANDRO DA SILVA MAFRA, Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, o subscrevo.

UIRAMUTÃ – RR, 26 de Setembro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 119 Rúbrica

PORTARIA Nº 003A/2022

Dispõe sobre a Nomeação da Comissão permanente de Licitação e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE

Art. 1º Nomear os servidores abaixo relacionados para recompor a Equipe de Apoio da Comissão Permanente de Licitação – CPL:

Senhor **Sandro da Silva Mafra**, portador do CPF: 889.112.762-00, como Presidente;

Senhora **Juliana Souza da Silva**, portador do CPF: 686.860.992-20, como membro;

Senhora **Cleiciane Pinho de Assis**, portadora do CPF: 973.284.642-91, como membro.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito de Uiramutã-RR.03 de janeiro de 2022.

BRS

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito

PUBLICADO NO MURAL EM 03/01/22
Eloiza Cavalcante de Lima
Chefe de Gabinete
Port. 010/2021

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 120
Rúbrica

PROCESSO 135/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ Fls. 121 Rúbrica

NOTA EXPLICATIVA

A presente licitação visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA- COMUNIDADE CARAPARÚ I. Verifique se este exemplar está completo.

O Edital desta licitação contém a presente nota explicativa, o preâmbulo, as normas de especificação, as regras de procedimento e julgamento, bem como as de contratação do objetodeste certame e os seguintes anexos que integram o Edital:

Anexo I – Relação da equipe técnica básica / Declaração de disponibilidade da equipe.
Anexo II – Declaração de disponibilidade dos equipamentos e instalações.
Anexo III – Modelo de Atestado de Visita Técnica.
Anexo IV – Modelo de credenciamento de participação em visita técnica.
Anexo V – Modelo de credenciamento de participação.
Anexo VI – Modelo de declaração de integral submissão ao edital
Anexo VII – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo da habilitação.
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil.
Anexo IX – Modelo de declaração de enquadramento de microempresa;
Anexo X – Modelo da Proposta de Preços.
Anexo XI – Minuta de Contrato.
Anexo XII – Planilha Orçamentária (disponível em mídia).
Anexo XIII – Cronograma Físico-Financeiro (disponível em mídia).
Anexo XIV – Memorial Descritivo (disponível em mídia).
Anexo XV – Projeto (disponível em mídia).

Para a perfeita compreensão das normas reguladoras da presente licitação, examine atentamente todas as peças deste Edital e seus Anexos.

Os envelopes contendo propostas de preço, propostas técnicas e documentos de habilitação serão apresentados pelos licitantes, **devidamente lacrados**, em suporte físico e só poderão ser abertos após a sua publicização, pelo servidor responsável pela licitação e os documentos que compõem os envelopes de habilitação e proposta deverão, **obrigatoriamente, por todos os licitantes, conter sumário e paginação, a fim de evitar discussão futura quanto aos seus conteúdos**.

O descumprimento de tais determinações não poderão ser interpretadas em prejuízo da Administração Pública.

O Edital prevê o procedimento a ser observado pelo licitante em caso de dúvida de caráter técnico ou legal na interpretação de seus termos. O protocolamento da proposta presume o pleno conhecimento e entendimento de todas as condições por parte da licitante e, nos termos dalei, implica a sua aceitação automática, integral e irretratável, motivo por que, após este ato, a Administração não tomará conhecimento de qualquer reclamação da proponente, fundada em erro, omissão ou obscuridade do Edital.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 122
Rúbrica

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei, através do e-mail **cpluiramita@gmail.com** ou carta protocolada na Prefeitura Municipal, situada a Rua Cici Mota, s/n.°, Centro, em até **05 (cinco) dias úteis** antesda data fixada para a entrega da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS,devendo a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO julgar e responder à impugnação ematé **3 (três) dias úteis**, nos termos do § 1° do artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/93 e encaminhara decisão do julgamento via e-mail, com a devida publicação no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 193
Rúbrica

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 013/2022

PROCESSO Nº 135/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

PREÂMBULO

O Município de Uiramutã/RR, em atendimento à Secretaria Municipal Educação, Cultura e Desporto, torna público que a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 003-A/2022, a fim de realizar certame licitatório, sob a modalidade Tomada de Preço, receberá na sala da CPL situado na Rua Cici Mota s/n, Centro, no município de Uiramutã/RR, envelopes contendo documentos de habilitação e proposta, para julgamento da mais vantajosa, em tudo observando a Lei 8.666/93 e nos termos do presente edital.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às XXhXXmin do dia XX de XXXXX de 2022.
ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia XX de XXXX de 2022 às XXhXXmin.
Qualquer cidadão interessado poderá acompanhar as sessões informado neste edital.

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei, através do e-mail **cpluiramuta@gmail.com** ou carta protocolada na Prefeitura Municipal, situada a Rua Cici Mota, s/n.º , Centro, em até **05 (cinco) dias úteis** antesda data fixada para a entrega da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS,devendo a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO julgar e responder à impugnação em até **3(três) dias úteis**, nos termos do § 1º do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93, via e-mail.

Decairá o direito de impugnar os termos deste edital de licitação, por falhas ou irregularidadesque o viciariam, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para a abertura da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e PROPOSTAS, hipótese em quetal comunicação não terá efeito de recurso.

I - OBJETO

1.1. Constitui o objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA- COMUNIDADE CARAPARÚ I.

1.2 O valor estimado do referido processo licitatório é **R$ 516.468,16 (quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos)**, devendo as propostas se limitar a este valor, sob pena de desclassificação.

II – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR

2.1. Poderão participar da presente licitação todos os interessados que satisfaçam as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, e ainda, cujo contrato social esteja em vigor, registrado no órgão competente, com o ramo de atividade compatível ao objeto deste edital.

2.2. Não poderá participar da presente licitação pessoa jurídica:

2.2.1. Que esteja sob falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação e não sejam controladas, coligadas ou subsidiarias entre si;

2.2.2. Declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com o Município de Uiramutã, oucom declaração de

EMBRAER

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 184 Rúbrica

inidoneidade e/ou impedimento de licitar com a Administração Pública;
2.2.3. Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;
2.2.4. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
2.2.5. Que possua qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do Termo de Referência/Projeto e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários;
2.2.6. O disposto no item anterior aplica-se também aos membros da comissão de licitação.
2.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.

III - CADASTRO

3.1. O interessado deverá requerer cadastramento até **três (03) dias** anteriores à data fixada para a entrega da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, junto à Comissão Permanente de Licitação, situado a Rua Cici Mota, s/n° - Centro, município de Uiramutã/RR, anexando cópias autenticadas dos documentos abaixo relacionados ou acompanhada dos respectivos originais para conferencia pela Comissão Permanente de Licitação:
3.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as suas alterações ou Contrato Social Consolidado e alterações posteriores, devidamente registrado no órgão competente; no caso de Sociedades por Ações, documento de eleição de seus administradores; no caso de Empresa Individual, Registro Comercial;
3.1.2. Carteira de Identidade e CPF dos sócios;
3.1.3. Prova de inscrição no CNPJ;
3.1.4. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal;
3.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa;
3.1.6. Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
3.1.7. Certidão Negativa de Falência e Concordata;
3.1.8. Certidão de Registro e Quitação de Empresa, expedida pelo CREA e/ou CAU, comprovando sua situação de registro, bem como de seu(s) responsável(is) técnico(s);
3.1.9. Declaração de Micro e Pequena Empresa, se for o caso.
Os **certificados de registros cadastrais**, expedidos pela Prefeitura Municipal de Uiramutã, estarão à disposição dos interessados até as 16h00min, do dia anterior a data fixada para a entrega da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, no endereço acima mencionado.

IV - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

4.1. As empresas participantes deverão apresentar dois envelopes contendo habilitação e proposta, os mesmos deverão ser apresentados, em envelope não transparente, fechado e indevassável, ambos contendo em sua parte externa, a identificação da licitante, e os seguintes dizeres:

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 125
Rúbrica

MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 013/2022
ENVELOPE N° 1 – HABILITAÇÃO

MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 013/2022
ENVELOPE N° 2 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: _____

4.1.1. No verso dos envelopes deverá constar o nome e o endereço do proponente.

4.1.2. Os documentos que compõem os envelopes de habilitação e proposta deverão conter sumário e paginação, a fim de evitar discussão futura quanto aos seus conteúdos;

4.2. O PRIMEIRO ENVELOPE, constando, o subscrito acima, deverá conter, em cópias autenticadas ou acompanhados dos respectivos originais, para conferencia da Comissão Permanente de Licitação nos termos do artigo 32 da Lei n° 8.666/93, no ato da abertura do envelope, sendo esses últimos devolvidos após a autenticação requerida, ao representante legal presente:

4.2.1 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento do objeto de licitação (Recibo de Retirada do Edital).
b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Lei n° 5.194/66) (Lei n° 12.378/2010), na qual constem todos os seus responsáveis técnicos, com jurisdição sobre o domicílio da sede da LICITANTE;
c) Certidão de Registro de Pessoa Física emitida pelo CREA da jurisdição do domicílio do profissional, em nome de cada integrante da Equipe Técnica do subitem onde conste atribuição compatível com a área de atuação indicada pela licitante;
d) A Licitante deverá apresentar nos termos de seu art. 30, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações Atestado de Capacidade Técnica-Operacional emitido por pessoa Jurídica de direito pública ou privada, com atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação conforme itens de maior relevância a seguir:

QUANTITATIVO PARA ACERVO TÉCNICO E OPERACIONAL			
Itens	**Descrição**	**Un.**	**40% ref. Aos itens de maior relevância dos serviços executados**
1,1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	204,24
1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	130,57
1.3	Massa única para recebimento de pintura em		

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 126
Rúbrica

	argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	434,60
1.4	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	18,21
1.5	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	185,13

e) O Atestado de Capacidade Técnica-Operacional só será válido se reconhecido e ou chancelado pelo CREA devidamente acompanhado da Certidão de Acervo Técnico - CAT do Profissional que realizou a obra/serviços;
f) A Licitante deverá apresentar nos termos de seu art. 30, § 1°, inc. I da Lei 8.666/93 e suas alterações, Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA de obras e serviços semelhantes ao do objeto licitado;
g). Caso o Responsável Técnico da empresa não seja o detentor da Certidão de Acervo Técnico – CAT que originou o Atestado de Capacidade Técnica Operacional apresentado pela Licitante, o mesmo deverá apresentar a Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA com os serviços compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação conforme itens de maior relevância a seguir, além de comprovar que o detentor do acerco possuam vínculo com a empresa.

4.2.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.2.2.1. Certidão Negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei n° 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; datado dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

4.2.2.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelo INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

4.2.2.2.1. O Balanço e as Demonstrações deverão ser apresentados por cópias reprográficas da página do Livro Diário, onde se encontram transcritos, comprobatório do registro na Junta Comercial. Poderá também ser apresentada cópia reprográfica de publicação em jornal, na forma da lei. As cópias deverão ser autenticadas.

4.2.2.2.2. Caso a licitante tenha iniciado suas atividades no presente exercício, deverá apresentar cópia do Balanço de Abertura ou do Livro Diário, apresentados na forma da lei para lançamento dos índices mencionados.

4.2.2.2.3. As empresas optantes do "SIMPLES NACIONAL" não estão dispensadas de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis.

4.2.2.2.4. **O Balanço Patrimonial e demonstrações apresentadas para fins de habilitação após o dia 31 de maio do corrente ano serão, obrigatoriamente, do exercício imediatamente anterior**.

4.2.2.3. A boa situação econômico-financeira da empresa licitante estará consubstanciada nos seguintes índices, devidamente justificados no processo licitatório:

- Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1% (um por cento), a ser obtido pela fórmula:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - Fls. 197 Rúbrica

- Índice de Endividamento Patrimonial (IEP) igual ou inferior a 1% (um por cento), que mostrará a relação entre Capital de Terceiros (Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo) e o Capital Próprio (Patrimônio Líquido), a ser calculado pela fórmula:

$$IEP = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

4.2.2.3.1. Caso o licitante apresente índices incompatíveis com o item 6.1.4.3, a comprovação de qualificação econômica financeira poderá ser demonstrada através da comprovação de patrimônio líquido no importe de 10% (dez por cento) do valor orçado para licitação (item 7.1 deste edital).

4.2.2.3.1.1. A licitante deverá apresentar cálculo demonstrativo da atualização do Capital Social, sempre que o valor nominal constante do contrato social não estiver grafado em real.

4.2.3 – OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

4.2.3.1. Certificado de Registro Cadastral atualizado, emitido pela Prefeitura Municipal de Uiramutã;

4.2.3.1.1. Caso a empresa interessada não houver se cadastrado, conforme exigido no item 03 deste edital, mas atenda a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, esta poderá apresentar os documentos relacionados no mesmo item, no invólucro nº 01 – "Documentação para Habilitação".

4.2.3.1.2. Na hipótese de apresentação do CRC, caso algum documento já se encontre vencido, o licitante deverá apresentá-lo atualizado, dentro do invólucro nº 01 - Documentação para Habilitação, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas.

4.2.3.2. Carta de Credenciamento para participação na respectiva licitação, conforme **ANEXO V**.

4.2.3.2.1. Tratando-se de procurador, deverá ser apresentada procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, e documentooficial de identificação que contenha foto.

4.2.3.3. Declaração de Integral submissão ao edital, conforme **ANEXO VI**.

4.2.3.4. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, do art. 32 da Lei 8.666/93, alterado pela Lei nº 9.648/98, conforme **ANEXO VII**.

4.2.3.5. Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme **ANEXO VIII**.

4.2.3.6. As **MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE** e **EQUIPARADAS**, que desejarem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006 e suas posteriores alterações, deverão apresentar, os seguintes documentos:

4.2.3.6.1. Declaração assinada pelo responsável legal da empresa, atestando que até a presente data a empresa esta enquadrada no regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo constante no **ANEXO IX**; e,

4.2.3.6.2. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa;

4.2.3.6.3. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da pequena empresa.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 128
Rúbrica

4.3. No SEGUNDO ENVELOPE, que será apresentado da mesma forma que o primeiro, e deve conter proposta com preço unitário e total e também o valor global proposto para execução da obra.

4.3.1 A proposta de preço deverá ser legível, digitada ou impressa em processador de texto sem emendas ou rasuras, em uma única via, em papel timbrado onde conste o CNPJ ou carimbo padronizado do CNPJ da proponente, datada, assinada pelo representante legal da licitante, com prazo de validade no mínimo de 60 (sessenta) dias.

4.3.2. A proposta de preços, **ANEXO X**, deverá ser apresentada, sob pena de desclassificação, juntamente com os seguintes documentos:

4.3.2.1. Planilha de orçamento.

4.3.2.1.1. Os preços deverão estar grafados em reais, com duas casas decimais após a vírgula.

4.3.2.2 Cronograma Físico Financeiro.

4.3.3. A proposta de preços deverá indicar o valor da execução completa dos serviços e obras, segundo a cotação de preços unitários aplicados pela proponente nos itens da planilha de orçamento deste edital. Os preços terão como base o mês de apresentação das propostas.

4.3.4. A empresa deverá preencher a planilha de orçamento, que integra este Edital com os preços unitários por ela propostos, e com valor final indicado em algarismos e por extenso. Poderá ser apresentada planilha computadorizada pela própria proponente, desde que guarde, sob pena de desclassificação, absoluta fidelidade com a planilha de orçamento integrante deste edital, no que se refere aos itens, às atividades, unidades e quantidades.

4.3.5. Todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, os fretes, seguros, bem como todas as despesas diretas e indiretas que incidirem nos serviços, deverão estar inclusos no preço.

4.3.6. A apresentação da proposta implica na aceitação tácita de todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como a aceitação de que, caso necessário, a CPL, no transcorrer da licitação poderá solicitar que as licitantes estendam o período de validade das mesmas para igual período adicional.

4.3.6.1. A solicitação prevista acima, bem como as respostas dos proponentes, será feita por escrito, circunstanciadas na respectiva ata ou através de e-mail;

4.3.6.2. A proponente poderá recusar a solicitação, resultando na desistência da participação do processo licitatório, sem que a ele sejam imputadas penalidades para tal ato.

V - DO JULGAMENTO

5.1. A Comissão Permanente de Licitação – CPL, abrirá em primeiro lugar o envelope nº 1 – **DOCUMENTAÇÃO**, para que os membros da Comissão possam examinar e rubricar cada documento e os representantes presentes na Sessão, possam ratificar as informações.

5.2. A Comissão Permanente de Licitação – CPL poderá suspender a sessão sempre que julgar necessário analisar os documentos e propostas oferecidas pelos licitantes, objetivando confirmar as informações prestadas.

5.3. Após o exame da documentação apresentada e a formulação de eventuais impugnações, deverá a Comissão Permanente de Licitação apresentar sua decisão sobre a habilitação das licitantes e consultá-las sobre a interposição de recursos, determinando o prazo para este fim.

5.4. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer às exigências desta Tomada de Preços.

5.5. Os envelopes de proposta dos licitantes inabilitados serão devolvidos fechados, logo após a decisão definitiva da inabilitação.

5.6. Transcorrido o prazo sem interposição de recursos, tendo havido expressa desistência deles ou após julgamento dos recursos interpostos, proceder-se-á a abertura dos envelopes nº 02.

5.7. Na classificação das propostas observar-se-ão seu valor global e os preços unitários

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 199
Rúbrica

oferecidos, atendidos os seguintes critérios:

5.7.1. O **Preço de Referência** – valor estimado da contratação, constante deste Edital - item 1.2, **é o preço teto**, limite para as propostas das licitantes, **sendo desclassificadas as que superarem o valor estipulado**.

5.7.2. Será classificada em primeiro lugar a proposta apresentada de acordo com as especificações deste Edital, que contiver oferta do **MENOR PREÇO GLOBAL**.

5.8. A Comissão desclassificará propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim entendidas aquelas definidas nos termos da alínea "a" e "b" do parágrafo 1° do inciso II, do art. 48 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

5.9. A Comissão Permanente de Licitação no julgamento das propostas de preços, poderá determinar que sejam promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como:

a) Discrepância entre valores grifados em algarismo ou por extenso: prevalecerá o valor por extenso;
b) Erro de multiplicação do valor unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o valor total;
c) Erro de adição será retificado conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;
d) Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço unitário e as quantidades previstas, alterando-se o valor final;
e) Erro no preço total será corrigido de acordo com o disposto nas letras acima.

5.9.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar das licitantes que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Proposta de Preços, desde que, as informações não alterem os preços apresentados e não correspondam a documentos que, originalmente, deveriam figurar na proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na desclassificação da licitante.

5.10. A Comissão Permanente de Licitação observará também, quando do julgamento das propostas, os seguintes procedimentos:

5.10.1. Não utilizará qualquer elemento, fator ou critério sigiloso ou subjetivo, secreto ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.

5.10.2. Não considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes.

5.11. No caso de empate entre duas ou mais propostas, referente ao objeto licitado, de empresas não enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, a classificação dar-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público para o qual todos os licitantes serão convocados (Lei nº 8.666/93, e alterações, art. 45, § 2.º, segunda parte).

5.11.1. Se desta Tomada de Preços estiverem participando microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação destas.

5.11.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

5.11.3. Ocorrendo o empate entre microempresas e empresas de pequeno porte, a Comissão Permanente de licitação procederá da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea a, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 5.11.2. deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 130
Rúbrica

5.11.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 5.11.1. deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
5.11.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 5.11, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
5.11.6. O disposto no subitem 5.11 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
5.12. Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou forem todas as propostas desclassificadas, poderá a Administração fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou novas propostas, escoimadas das causas que levaram à inabilitação ou desclassificação.
5.13. Deverá a Comissão Julgadora, em conjunto com a equipe de apoio, especialmente convocada para este certame, consignar, em ata, a síntese de fatos ocorridos e pronunciados, submetendo todo o procedimento à homologação da autoridade competente.
5.14. O Município de Uiramutã se reserva o direito de, por despacho fundamentado, decidir:
5.14.1. Pela revogação desta licitação, em razão de interesse público.
5.14.2. Anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida no seu curso.
5.14.3. Homologar a licitação, sem prejuízo da redução superveniente das obras e serviços a serem contratados.
5.15. Observando-se o disposto no art. 109 da Lei 8.666/93, admitir-se-á a interposição de recurso em qualquer fase desta licitação ou durante a execução do contrato que dela resultar.

VI - DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Os recursos financeiros são os constantes no Projeto Básico;

VII – DOS PRAZOS

7.1. A vigência do contrato será de **90 (noventa) dias**, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso ocorra algumas das hipóteses elencadas no § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
7.2. O prazo de execução dos serviços deverá obedecer ao cronograma físico-financeiro – Anexo XIII, parte integrante deste edital.

VIII - DA GARANTIA À EXECUÇÃO

8.1. Homologada a licitação e adjudicado o seu objeto à licitante vencedora, esta será convocada pela Administração para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prestar garantia à execução, que deverá cobrir o prazo contratual de execução da obra até o seu recebimento definitivo e ainda ser prorrogada sua vigência, na hipótese de ocorrer prorrogação do prazo contratual.
8.2. A garantia à execução poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no parágrafo primeiro do artigo 56 da Lei 8.666/93.
8.2.1. Caso a licitante vencedora do certame opte por formalizá-la em espécie, deverá depositar a referida importância na conta caução de execução n° 10.693-3, agência 0591-6, do Banco Brasil localizada no Município de Uiramutã.
8.2.2. Caso a licitante vencedora do certame opte por formalizá-la em outra modalidade, deverá depositá-la na Tesouraria do Município, localizada na Rua Cici Mota, s/n° , Centro,nesta cidade, no horário de 08h00min às 12h00min, que emitirá o respectivo recibo.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 131
Rúbrica

8.3. A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações estipuladas no Contrato.
8.4. Não serão aceitos instrumentos de garantia que possuam, em seu bojo, cláusulas de exclusão de sua aplicabilidade em casos de inexecução contratual e em situações que representem potencial risco de prejuízo ao CONTRATANTE.
8.5. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
8.5.1. Ocorrendo alteração, dentro dos limites legais, dos valores constantes do contrato ou prorrogação do prazo de execução da obra ou, ainda, qualquer outra causa que impeça a entrega do objeto no prazo avençado, a CONTRATADA deverá providenciar a complementação ou prorrogação, conforme o caso, da garantia prestada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do respectivo termo.
8.6. A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à contratada, podendo ser retida para a satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão dolosa ou culposa da contratada.
8.7. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
8.7.1. Na notificação devem constar as razões da utilização da garantia, com referência ao documento em que a contratada foi cientificada das correções que deveria providenciar e do valor das mesmas.
8.8. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída no prazo máximo de 30 (trinta) dias da solicitação da contratada.
8.9. O contrato firmado pelo Município de Uiramutã poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer das condições previstas no artigo 65 da Lei 8.666/93 em especial paraprorrogação do prazo contratual de execução avençado, conforme disposto no artigo 57 da referida lei.

IX - DA EXECUÇÃO DA OBRA

9.1. A obra e suas etapas serão executadas mediante autorização(ões), expedida(s) pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .

X - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos serão efetuados em parcelas, mediante apresentação de Nota Fiscal, à qual o Secretário requisitante aporá seu visto, solicitando sua regular quitação, acompanhada de relatório de medição e memória de cálculo, assinada pelo RT da Contratada, e aprovada pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .
Parágrafo primeiro: O pagamento está condicionado à apresentação de:
10.1.1. A comprovação de sua situação regular perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho (CNDT), extrato do Simples Nacional, quando for o caso, bem como quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços.
10.1.2. Deverão ser apresentados também o comprovante de pagamento dos tributos relativos à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) vencidos até a data da nota fiscal.
10.1.3. GFIP tendo como tomador a Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, relativo ao CEI da obra.
Parágrafo segundo: A última parcela só será paga mediante execução integral da obra,

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 132
Rúbrica

comprovada por relatório, assinado pelo Responsável Técnico pela fiscalização da obra.

XI - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

11.1. A prática de ato ilícito na licitação ou na execução do contrato e o descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão as sanções previstas nos arts. 81 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei Estadual n° 14.184, de 31 de janeiro de 2002, e nos arts. 19 a 22 do Decreto Estadual n° 44.431, de 29 de dezembro de 2006.
11.2. A ADJUDICATÁRIA perderá em favor da ADJUDICANTE a garantia a que se refere o item 8.1, no caso de recusa injustificada em assinar o contrato.
11.3. Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo as multas nos seguintes percentuais:
11.3.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia, até o trigésimo dia, de atraso, sobre valor dos serviços previstos no cronograma físico não executados;
11.3.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;
11.3.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços previstos no Cronograma Físico não executados, no caso de atraso superior a 30(trinta) dias;
11.3.4. 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.
11.3.5. As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes, ressalvada a situação descrita nos itens **11.3.6** e **11.3.7**.
11.3.6. O atraso no cumprimento do Cronograma Físico- Financeiro previsto para execução dos serviços será verificado nas medições mensais, a partir do qual incidirá a multa prevista no item **11.3.1**.
11.3.7. Verificando o atraso, na forma do item anterior, a CONTRATADA será notificada, por escrito, para sanar a irregularidade.
11.3.8. Persistindo a irregularidade prevista no item **11.3.6**, até a medição mensal subsequente, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento da multa prevista no item **11.3.3**, que substituirá aquela constante do item **11.3.1**.

11.4. Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição pela Prefeitura Municipal de Ordens de Início, Reinício ou Paralisão de Serviços.
11.5. As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de idoneidade poderão ser aplicadas comulativamente com a de multa, assegurando-se ao interessado o direito de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de idoneidade, em prazo será de 10 (dez) dias.
11.5.1. Para aplicação das sanções referidas no item anterior, deverá ser instaurado processo administrativo punitivo, seguindo de notificação para defesa, em coformidade com o disposto nos arts. 19 a 22 do Decreto Estadual n° 44.431/06, submetida a aplicação das sanções à decisão do Secretário Municipal, salvo na hipótese de aplicação de sanção de declaração de indoneidade, de competência exclusiva do Prefeito Municipal, ou de autoridade a ele equivalente, nos termos da lei.
11.6. As multas deverão ser recolhidas no Departamento de Fazenda do município de Uiramutã, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contado à partir da decisão definitiva na esfera administrativa.
11.7. Se a multa aplicada for de valor superior ao da garantia prestada, além da sua perda responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda quando for o caso, cobrada judicialmente.
11.8. Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 133
Rúbrica

compensatórias expressandamente concedidas pela CONTRATANTE ou resultante de fato superviniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade da CONTRATADA, tais como o estado de calamidade pública, guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas características.

11.9. As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente fundamentedas através de registro no Diário de Obras realizado pela FISCALIZAÇÃO.

XII - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

12.1. A presente licitação poderá ser revogada ou anulada em qualquer das fases, em conformidade com a Lei 8.666/93.

XIII - DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

13.1. Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

13.1.1. Considera-se receita bruta, para fins do disposto no item A.1, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

13.1.2. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o item 13.1 será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.

13.1.3. O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados.

13.1.4. Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item A.1 deste Edital;

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item A.1 deste Edital;

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item A.1 deste Edital;

f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 134
Rúbrica

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;
h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
j) constituída sob a forma de sociedade por ações.

13.1.5. O disposto nas alíneas itens d e g do subitem 13.1.4 não se aplica à participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio previsto na Lei Complementar nº 123/2006, e associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.

13.1.6. Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações previstas nas alíneas do subitem 13.1.4 deste Edital, será excluída do regime de que trata a Lei Complementar nº 123/2006, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.

13.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, que participarem desta Concorrência, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

13.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado ao licitante, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que este for declarado o vencedor do presente certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

13.2.1.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 13.2.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1. Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições da Lei Federal Nº 8.666/93 no que couber.

14.2. Este Edital de Licitação, seus anexos e a Proposta de Preços oferecida pela contratada constituirão peças integrantes do Contrato, independentemente de transcrição no instrumento respectivo.

XV - ANEXO

15.1. Fazem parte integrante deste edital:
Anexo I – Relação da equipe técnica básica / Declaração de disponibilidade da equipe.
Anexo II – Declaração de disponibilidade dos equipamentos e instalações.
Anexo III – Modelo de Atestado de Visita Técnica.
Anexo IV – Modelo de credenciamento de participação em visita técnica.
Anexo V – Modelo de credenciamento de participação.
Anexo VI – Modelo de declaração de integral submissão ao edital.

EM BRANCO

PREFEITURA UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 135
Fls. 2
Rubrica

Anexo VII – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo da habilitação.
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.
Anexo IX – Modelo de declaração de enquadramento de microempresa.
Anexo X – Modelo da Proposta de Preços.
Anexo XI – Minuta de Contrato.
Anexo X – Planilha Orçamentária (disponível em mídia);
Anexo XI – Cronograma Físico-Financeiro (disponível em mídia);
Anexo XII – Memorial Descritivo (disponível mídia);Anexo XIII – Projeto (disponível em mídia).

Uiramutã, XX de XXXXX de 2022.

Sandro da Silva Mafra
Presidente da Comissão de Licitações

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 136
Rúbrica

ANEXO

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA BÁSICA / DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 013/2022
Processo Licitatório nº 135/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

A licitante .....CNPJ:....., declara ter disponibilidade de pessoal técnico especializada e compromete-se a compor a Equipe Técnica Básica aqui relacionada, caso o objeto da licitação venha a ser contratado com a mesma.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA	
NOME	**ESPECIALIZAÇÃO**
OBS:	

Por ser verdade, firmo a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 137 Rúbrica

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 013/2022
Processo Licitatório nº 135/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

A licitante .....CNPJ:....., declara ter disponibilidade de, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o adequado cumprimento do objeto da licitação e compromete-se a utilizá-los, caso o objeto venha a ser contratado com a mesma.

Por ser verdade, firmo a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 138
Rúbrica

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

PROCESSO Nº 135/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ DECLARA, para fins do disposto no Edital de Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA- COMUNIDADE CARAPARÚ I, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital T.P. nº 013/2022; que a empresa _____, cadastrada com o CNPJ nº_, com sedena_____, n°__, Bairro_____, CEP: _____, no município de_____, vistoriou o local onde seráexecutada a obra, observando o local onde será executado, inteirando-se assim das condicionantes, não cabendo, posteriormente, em hipótese alguma, alegações de desconhecimento ou dúvida no que tange ao referido objeto, sendo de sua inteira responsabilidade, caso seja vencedora do mesmo, quaisquer ônus porventura decorrentes.

Uiramutã,_____de_____de 2022.

_____
Prefeitura Municipal de Uiramutã

Declaramos nossa concordância com os termos acima expostos, dando-nos por satisfeitos com as informações e detalhes obtidos e julgando-nos plenamente capacitados a elaborar nossa proposta de licitação.

_____
Empresa Participante
Representante da empresa
Nº do documento

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 139
Rúbrica

MODELO DE CREDENCIAMENTO DE VISITA TÉCNICA

Uiramutã/RR,_____de_____de 20---.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 013/2022
Processo Licitatório nº 0135/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

O abaixo assinado, responsável legal pela empresa_____vem pela presente, informar a V. Sas. que o_____, CREA/CAU/CPF/RG Nº_____, é a pessoa designada para representar nossa empresa na visita técnica da Licitação acima referida.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 140 Rúbrica

CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO

Uiramutã/RR,_____de_____de 20---.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 013/2022
Processo Licitatório nº 0135/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

O abaixo assinado responsável legal pela empresa_____vem pela presente, informar a V. Sas. que o Sr._____, carteira de identidade nº_____, é pessoa designada para representar nossa empresa na Licitação acima referida, na sessão de entrega, recebimento e abertura dos envelopes contendo documentos e proposta comercial, podendo examinar e rubricar documentos, assinar atas, apresentar impugnações e recursos, inclusive renúncia expressa a recurso.

Atenciosamente,

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 144
Rúbrica

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TOTAL SUBMISSÃO AO EDITAL

Uiramutã/RR,_____de_____de 20---.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 013/2022
Processo Licitatório nº 135/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

Declaro, para os devidos fins, a minha total submissão ao Edital Tomada de Preços 013/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I

.

Por ser verdade, firmo a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI -
Fls. 142
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI -
Fls.
Rúbrica

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 013/2022
Processo Licitatório nº 135/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

A empresa....., inscrita no CNPJ sob o nº. ....., DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firma a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EMBRAER

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de UiramutãComissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 013/2022
Processo Licitatório nº 135/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

A Empresa....., inscrita no CNPJ sob o nº....., DECLARA, sob as penas da lei, para surtir efeito junto à Prefeitura do Município de Uiramutã, no procedimento licitatório sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, que **não** incide na proibição contida no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.

Por ser verdade, firma a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 144
Rubrica

MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 013/2022
Processo Licitatório nº 135/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

.....(Razão Social da Empresa) ....., estabelecida na .....(endereço completo) ....., inscrita no CNPJ sob n.º ....., representada pelo....., brasileiro, RG nº....., CPF nº..... residente e domiciliado (endereço) declara para os devidos fins que na presente data a mesma se encontra enquadrada nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 de 14/12/2006, que trata do Regime das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estando apta portanto a sua participação no processo n º....., tomada de preço nº ....., junto ao Município de Uiramutã. Por ser verdade,

firma a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

Fls. 045

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 013/2022
Processo Licitatório nº 135/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob o nº....., com endereço na Rua ....., por seu representante legal, Sr....., portador da Carteira de Identidade nº ....., DECLARA que concorda e submete-se a todos os termos do edital da Tomada de Preço nº 013/2022 e vem, apresentar PROPOSTA DE PREÇOS conforme planilha em anexo com a discriminação dos quantitativos, valores unitários, valores de mão-de-obra e materiais, valor final de R$..... (.....).

Nos preços apresentados já estão incluídos todos os encargos tributários, previdenciários, trabalhistas e todos os demais custos para a prestação dos serviços objeto da licitação.
O prazo máximo de execução é de 02 (dois) meses, observado o cronograma físico-financeiro da Prefeitura Municipal de Uiramutã.

A presente proposta tem prazo de validade de 60 dias a contar da data da entrega das propostas, excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

Atenciosamente,

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

Fls. 146

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº .../2022.

PROCESSO Nº 135/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022

Contrato que, entre si, fazem o **MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ**, Estado de Roraima, inscrita no CNPJ sob nº 01.612.681/0001-01, com sua sede administrativa na Rua Cici Mota, s/n – Centro – Uiramutã, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de -----, Sr.(ª) ----------, delegatório(a) autorizado(a) pelo Decreto Municipal n° XX/202X,doravante denominado **CONTRATANTE**, denominada doravante CONTRATANTE e a empresa__, cadastrada no CNPJ sob o n° _____, sediada na_____, telefone_____, e-mail _____, representada por_____, inscrito no CPF sob o n°_____, residente e domiciliado_____, denominada CONTRATADA, de conformidade com a Tomada de Preços 013/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.O presente contrato tem como objeto a execução da obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA- COMUNIDADE CARAPARÚ I, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor inicial deste contrato é de **R$** _____ (_____), correspondente à proposta ofertada pela CONTRATADA, aplicada às quantidades estimadas nas planilhas de orçamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA A EXECUÇÃO

3.1. Como garantia de execução deste contrato a CONTRATADA apresentou antes de sua assinatura, comprovante de garantia na modalidade_____, na importância de R$ _____ (_____), (Guia de Recolhimento acostada ao Processo nº 135/2022 – Tomada de Preços nº 013/2022, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual.

3.2. A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações estipuladas neste Contrato.

3.3. No caso de alteração do valor deste contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

3.3.1. Ocorrendo alteração, dentro dos limites legais, dos valores constantes do contrato ou prorrogação do prazo de execução da obra ou, ainda, qualquer outra causa que impeça a entrega do objeto no prazo avençado, a CONTRATADA deverá providenciar a complementação ou prorrogação, conforme o caso, da garantia prestada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do respectivo termo.

3.4. A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à contratada, podendo ser retida para a satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão dolosa ou culposa da contratada.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RORAIMA
Fls. 147
Rubrica

3.5. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
3.5.1. Na notificação devem constar as razões da utilização da garantia, com referência ao documento em que a contratada foi cientificada das correções que deveria providenciar e do valor das mesmas.
3.6. Após a execução deste contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída no prazo máximo de 30 (trinta) dias da solicitação da contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DA GESTÃO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

4.1. A gestão e execução do presente contrato será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .
4.2. A fiscalização do objeto da presente contratação pela Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, será exercida pelo servidor **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
4.2.1. É permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
4.2.2. É permitida a substituição do servidor designado neste item sempre que a Administração julgar necessário, devendo a CONTRATADA ser cientificada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
4.3. Além das atividades neste contrato, no edital que originou esse contrato, bem como em seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:
4.3.1. Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;
4.3.2. Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos que envolvem a obra: projetos, licitação, contrato, medições, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como Construído (As Built), termos de recebimento provisório e definitivo e devolução de cauções, etc.
4.3.3. Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra;
4.3.4. Aferir as medições dos serviços executados que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo;
4.3.5. Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;
4.3.6. Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.
4.3.7. Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execução de cada serviço/etapa será aferida, em cada medição, consoante CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, previamente aprovado e que a aferição dos prazos se dará mediante a comparação entre o valor total da etapa prevista no cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise.

EM BRANCO

4.4. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
4.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou.

CLÁUSULA QUINTA – DA MEDIÇÃO E DOS PAGAMENTOS

5.1. As medições serão formalizadas e datadas no último dia de cada mês e serão pagas até 30 (trinta) dias da data de sua aceitação, de acordo com o cronograma físico financeiro, pelo valor nominal nela expresso.
5.2. A Prefeitura Municipal de Uiramutã terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da medição para aceitá-la ou não;
5.3. Acompanhando a primeira fatura deverá ser apresentada a "anotação de responsabilidade técnica" - ART no CREA.
5.4. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR até o 10º (décimo) dia útil após aprovada a medição pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos , mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, sendo efetuada a retenção de tributos sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a legislação vigente.
5.4. O pagamento está condicionado à apresentação de:
5.4.1. A comprovação de sua situação regular perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho (CNDT), extrato do Simples Nacional, quando for o caso, bem como quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços.
5.4.2. Deverão ser apresentados também o comprovante de pagamento dos tributos relativos à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) vencidos até a data da nota fiscal – guia recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) de todos os empregados alocados na execução do contrato.
5.4.3. GFIP tendo como tomador a Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, relativo ao CEI da obra.
5.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta tenha comprovado, por antecipação, a matrícula da obra junto ao INSS, ou antes, de paga ou relevada à multa que lhe tenha sido aplicada.
5.6. A última parcela só será paga mediante execução integral da obra, comprovada por relatório, assinado pelo Responsável Técnico pela fiscalização da obra.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

6.1. Durante a vigência do Contrato os preços serão fixos e passíveis de recomposição e reajuste, desde que comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65, bem como, parágrafo 8º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, respectivamente, ou de redução dos preços praticados no Mercado.
6.2. Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, a Contratada poderá solicitar a atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao Município de Uiramutã, instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido.
6.3. Mesmo comprovada às ocorrências das hipóteses previstas na alínea "d" do inciso II do artigo 65, bem como, parágrafo 8º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro Processo Licitatório.
6.4. Comprovada a redução dos preços praticados no Mercado nas mesmas condições do contrato e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, a Contratada será convocada pelo Município de Uiramutã para a alteração, por aditamento, do

EM BRANCO

Fls 149

preço contratado, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA SETIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO

7.1. O prazo da presente execução de obras e prestação de serviços é de 60 **(sessenta) dias**, contados da data da "Ordem de Serviço" que autorizar o início das atividades.

CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato terá vigência de XX **(XXXX) meses**, a partir da data de sua assinatura, com termo final em ..... de ..... de ....., podendo ser prorrogado, caso ocorra algumas das hipóteses elencadas no § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fonte de Recurso: XXXXXX.**

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES

10.1. São Obrigações da contratada:

10.1.1. Apresentar-se ao Município de Uiramutã/rr – Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a ordem de serviço inicial, o seguinte:

a) Apresentar cronograma físico – financeiro compatível com a planilha vencedora;

b) Anotações de Responsabilidade Técnica- ART, no CREA/CAU, em nome do Engenheiro Responsável Técnico pela obra ou serviço;

c) Abertura de Certificado de Matrícula da obra/serviço – CEI INSS junto com a primeira medição;

d) Visto junto ao CREA/CAU/RR, para as empresas que possuírem CRPJ de outros Estados da Federação.

e) Plano de Segurança específico da Obra, elaborado conforme as normas regulamentares da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e alterações posteriores;

f) Plano de sinalização diurna e noturna, aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

g) Apresentar cronograma de utilização da equipe técnica, de acordo com o prazo de execução de cada obra/serviço, observada a mesma ordem e quantidade da relação de que trata o subitem 6.1.3.3, Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 013/2022, devendo ser aprovado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .

h) Apresentar cronograma de utilização de equipamentos e instalações, de acordo com o prazo de execução da obra/serviço, observada a necessidade de cada projeto, devendo ser aprovado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .

10.1.2. Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas.

8.1.3. Assegurar, durante a execução das obras/serviços, a proteção e a conservação dos serviços realizados.

10.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

10.1.5. Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão do Município de Uiramutã/ RR – Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos a inspeção das obras em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 150
Rubrica

10.1.6. Providenciar as placas da obra com seus dados indicativos, conforme modelo apresentado pela fiscalização, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados à partir da ordem de serviço.
10.1.7. Obedecer ao plano de segurança das obras, conforme as Normas de Segurança do Trabalho.
10.1.8. Participar à fiscalização ou à supervisão do Município de Uiramutã aocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão da obra, no todo o em parte, de acordo com o cronograma da mesma, indicando as medidas para corrigir talsituação.
10.1.9. Executar, conforme a melhor técnica, as obras contratadas, obedecendo rigorosamente às normas ABNT, bem como as instruções, especificações e os detalhes fornecidos ou editados pela Administração.
10.1.10. Manter atualizado "Diário de Obras", nele registrando todas as ocorrências que afetem o prazo de execução ou orçamento das obras.
10.1.11. Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e as posturas municipais sobre a execução de obras em locais públicos.
10.1.12. Manter à frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta ou a que venha a ser aprovada pela Administração, sempre liderada por engenheiro qualificado com capacidade e poderes bastantes para representá-la perante a Fiscalização e resolver problemas referentes às obras em execução.
10.1.13. Manter na obra em bom estado todo o equipamento necessário à perfeita execução dos serviços contratados, objetivando atender ao cronograma físico, à qualidade e às especificações técnicas.
10.1.14. Manter equipe para o acompanhamento topográfico da obra, adequada e compatível com as exigências e qualidades técnicas pertinentes.
10.1.15. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.2. Constitui obrigação do Município:

10.2.1 Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, recebendo seu objeto, conforme especificações constantes dos itens 10 e 11 do presente edital.
10.2.2. Realizar o pagamento conforme cláusula terceira deste contrato.
10.2.3. Notificar a empresa a ser contratada da ocorrência de qualquer descumprimento dos termos do edital da TOMADA DE PREÇOS nº 013/2022 e deste instrumento.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS

11.1. A CONTRATADA será responsável pelos seguintes encargos:

11.1.1. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, as responsabilidades advindas deste Contrato. A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE, desde que não afetem a boa execução do presente instrumento;
11.1.2. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais, e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;
11.1.3. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas relacionados com o objeto deste contrato;
11.1.4. Assumir a responsabilidade exclusiva por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência de falhas decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA.

EM BRANCO

Fls. 151

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES

12.1. A prática de ato ilícito na licitação ou na execução do contrato e o descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão as sanções previstas nos artis. 81 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei Estadual n° 14.184, de 31 de Janeiro de 2002,e nos arts. 19 a 22 do Decreto Estadual n° 44.431, de 29 de dezembro de 2006.

12.2. A ADJUDICATÁRIA perderá em favor da ADJUDICANTE a garantia a que se refere o item 8.1, no caso de recusa injustificada em assinar o contrato.

12.3. Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo as multas nos seguintes percentuais:

12.3.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia, até o trigésimo dia, de atraso, sobre valor dos serviços previstos no cronograma físico não executados;

12.3.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

12.3.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços previstos no Cronograma Físico não executados, no caso de atraso superior a 30(trinta) dias;

12.3.4. 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.

12.3.5. As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes, ressalvada a situação descrita nos itens **12.3.6** e **12.3.7**.

12.3.6. O atraso no cumprimento do Cronograma Físico- Financeiro previsto para execução dos serviços será verificado nas medições mensais, a partir do qual incidirá a multa prevista no item **12.3.1**.

12.3.7. Verificando o atraso, na forma do item anterior, a CONTRATADA será notificada, por escrito, para sanar a irregularidade.

12.3.8. Persistindo a irregularidade prevista no item **12.3.6**, até a medição mensal subsequente, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento da multa prevista no item **12.3.3**, que substituirá aquela constante do item **12.3.1**.

12.4. Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição pela Prefeitura Municipal de Ordens de Início, Reinício ou Paralisação de Serviços.

12.5. As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de idoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a de multa, assegurando-se ao interessado o direito de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de idoneidade, em prazo será de 10 (dez) dias.

12.5.1. Para aplicação das sanções referidas no item anterior, deverá ser instaurado processo administrativo punitivo, seguindo de notificação para defesa, em conformidade com o disposto nos arts. 19 a 22 do Decreto Estadual n° 44.431/06, submetida a aplicação das sanções à decisão do Secretário Municipal, salvo na hipótese de aplicação de sanção de declaração de inidoneidade, de competência exclusiva do Prefeito Municipal, ou de autoridade a ele equivalente, nos termosda lei.

12.6. As multas deverão ser recolhidas no Departamento de Fazenda do município de Uiramutã, no prazo de 72(setenta e duas) horas, contado à partir da decisão definitiva na esfera administrativa.

12.7. Se a multa aplicada for de valor superior ao da garantia prestada, além da sua perda responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda quando for o caso, cobrada judicialmente.

12.8. Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações compensatórias expressamente concedidas pela CONTRATANTE ou resultante de fato superveniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade da CONTRATADA, tais como o

EM BRANCO

Fls. 152

estado de calamidade pública, guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas características.

12.9. As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente fundamentadas através de registro no Diário de Obras realizado pela FISCALIZAÇÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1. Operar-se-á de pleno direito a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 013/2022, quando ocorrerem as hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ABSTENÇÃO

14.1. A abstenção pelo CONTRATANTE do uso dos direitos que lhe são assegurados neste contrato não será considerada novação ou renúncia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

15.1. Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93, sempre através de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES

16.1. O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei 8.666/93 e suas modificações supervenientes, complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais constantes da TOMADA DE PREÇOS nº 013/2022 e seus anexos, bem como a proposta de preços, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, apresentados pela CONTRATADA, que fazem parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pacaraima/RR para dirimir as dúvidasoriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo, para os fins de direito.

Uiramutã, -- de ---------- de 2022.

_____

Secretário Municipal de ----------

_____

Contratada

_____ Testemunha

_____ **Testemunha**

EM BRANCO

PREFEITURA DE
UIRAMUTÃ

SEMECD / UIRAMUTÃ

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – SEMECD

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI - Fls. 153 Rubrica

Da: Comissão Permanente de Licitação – CPL
Para: Assessoria Jurídica

Para análise e emissão de parecer jurídico, quanto a legalidade da contratação que se pretende levar o efeito e a minuta de Edital e minuta de Contrato, concernente ao Processo n°135/2022, mediante Tomada de Preços n° 013/2022, conforme Lei Federal n° 8.666/93.

UIRAMUTÃ – RR, 27 de Setembro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

EM BRANCO

Fls. 154

PARECER JURÍDICO

PROCESSO Nº 135/2022

REFERÊNCIA : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA - COMUNIDADE CARAPARÚ I – NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR.

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

1. DO RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo autuado sob o nº 135/2022, instaurado a partir de solicitação da Ilustre Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, visando a Contratação de Empresa Especializada em Execução de SAerviços de Construção da Escola Municipal Indígena KO'KO TEREZA DA SILVA – Comunidade Caraparú I - no MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR, conforme especificações do Projeto Básico e Planilhas Orçamentárias.

Cumpre salientar, que a presente manifestação toma por base somente os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe, cabendo-lhe prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito administrativo.

2. DO PARECER

Inicialmente, o procedimento em análise encontra-se instruído com: a) solicitação de autorização do serviço, devidamente acompanhada de Projeto Básico e Planilhas Orçamentárias; b) declaração de disponibilidade e adequação financeira de ordem da Secretária de Educação, Cultura e Desportos; c) Minuta de Edital de Tomada de Preços e seus anexos.

Convém esclarecer, diante da justificativa, tendo em vista que o inciso I, alínea "b", do art. 23, da Lei nº 8.666/93, prevê expressamente a possibilidade de tomada de preço para tais hipóteses, in verbis:

> "Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior, serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação, alterada pelo Decreto 9412/2018:

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 155
Rubrica

I - para obras e serviços de Engenharia:

b) tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais);".

Verificando-se os autos, comprova-se a abertura de procedimento administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado a partir de autorização expressa do gestor público, bem como a correta instrução do procedimento a partir dos requisitos mínimos estabelecidos por força da Lei nº 8.666/93, haja vista a descrição sucinta de seu objeto e do recurso para a despesa.

A minuta editalícia juntada aos autos (bem como seus anexos) atende às obediências legais, justificando-se pela edição do Projeto básico e Planilhas Orçamentárias, bem como os elementos técnicos sobre os quais a justificativa deve estar apoiada.

3. DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, evidenciada a submissão dos atos deste procedimento licitatório aos ditames legais norteadores da matéria, em especial à Lei nº 8.666/93, atesta-se, portanto, a regularidade jurídico-formal do procedimento, o qual se entende apto à continuidade do certame.

Uiramutã/RR, 29 de setembro de 2022.

JANIO FERREIRA
OAB/RR Nº 1060
Assessoria Jurídica

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 156
RORAIMA

PROCESSO 135/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

EDITAL DE LICITAÇÃO

EN BLANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 157
Rubrica

NOTA EXPLICATIVA

A presente licitação visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA- COMUNIDADE CARAPARÚ I. Verifique se este exemplar está completo.

O Edital desta licitação contém a presente nota explicativa, o preâmbulo, as normas de especificação, as regras de procedimento e julgamento, bem como as de contratação do objetodeste certame e os seguintes anexos que integram o Edital:

Anexo I – Relação da equipe técnica básica / Declaração de disponibilidade da equipe.
Anexo II – Declaração de disponibilidade dos equipamentos e instalações.
Anexo III – Modelo de Atestado de Visita Técnica.
Anexo IV – Modelo de credenciamento de participação em visita técnica.
Anexo V – Modelo de credenciamento de participação.
Anexo VI – Modelo de declaração de integral submissão ao edital
Anexo VII – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo da habilitação.
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.
Anexo IX – Modelo de declaração de enquadramento de microempresa;
Anexo X – Modelo da Proposta de Preços.
Anexo XI – Minuta de Contrato.
Anexo XII – Planilha Orçamentária (disponível em mídia).
Anexo XIII – Cronograma Físico-Financeiro (disponível em mídia).
Anexo XIV – Memorial Descritivo (disponível em mídia).
Anexo XV – Projeto (disponível em mídia).

Para a perfeita compreensão das normas reguladoras da presente licitação, examine atentamente todas as peças deste Edital e seus Anexos.

Os envelopes contendo propostas de preço, propostas técnicas e documentos de habilitação serão apresentados pelos licitantes, **devidamente lacrados**, em suporte físico e só poderão ser abertos após a sua publicização, pelo servidor responsável pela licitação e os documentos que compõem os envelopes de habilitação e proposta deverão, **obrigatoriamente, por todos os licitantes, conter sumário e paginação, a fim de evitar discussão futura quanto aos seus conteúdos**.

O descumprimento de tais determinações não poderão ser interpretadas em prejuízo da Administração Pública.

O Edital prevê o procedimento a ser observado pelo licitante em caso de dúvida de caráter técnico ou legal na interpretação de seus termos. O protocolamento da proposta presume o pleno conhecimento e entendimento de todas as condições por parte da licitante e, nos termos dalei, implica a sua aceitação automática, integral e irretratável, motivo por que, após este ato, a Administração não tomará conhecimento de qualquer reclamação da proponente, fundada em erro, omissão ou obscuridade do Edital.

[illegible]RANCO

Fls. 158

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei, através do e-mail **cpluiramita@gmail.com** ou carta protocolada na Prefeitura Municipal, situada a Rua Cici Mota, s/n.º, Centro, em até **05 (cinco) dias úteis** antesda data fixada para a entrega da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, devendo a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO julgar e responder à impugnação ematé **3 (três) dias úteis**, nos termos do § 1º do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93 e encaminhara decisão do julgamento via e-mail, com a devida publicação no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR.

BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 159
Rubrica

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 013/2022

PROCESSO N° 135/2022

TOMADA DE PREÇOS N° 013/2022

PREÂMBULO

O Município de Uiramutã/RR, em atendimento à Secretaria Municipal Educação, Cultura e Desporto, torna público que a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 003-A/2022, a fim de realizar certame licitatório, sob a modalidade Tomada de Preço, receberá na sala da CPL situado na Rua Cici Mota s/n, Centro, no município de Uiramutã/RR, envelopes contendo documentos de habilitação e proposta, para julgamento da mais vantajosa, em tudo observando a Lei 8.666/93 e nos termos do presente edital.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 10h30min do dia 24 de outubro de 2022.
ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 24 de outubro de 2022 às 10h30min.
Qualquer cidadão interessado poderá acompanhar as sessões informado neste edital.

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei, através do e-mail **cpluiramuta@gmail.com** ou carta protocolada na Prefeitura Municipal, situada a Rua Cici Mota, s/n.° , Centro, em até **05 (cinco) dias úteis** antesda data fixada para a entrega da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS,devendo a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO julgar e responder à impugnação em até **3(três) dias úteis**, nos termos do § 1° do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93, via e-mail.

Decairá o direito de impugnar os termos deste edital de licitação, por falhas ou irregularidadesque o viciariam, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para a abertura da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e PROPOSTAS, hipótese em quetal comunicação não terá efeito de recurso.

I - OBJETO

1.1. Constitui o objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA- COMUNIDADE CARAPARÚ I.

1.2 O valor estimado do referido processo licitatório é **R$ 516.468,16 (quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos)**, devendo as propostas se limitar a este valor, sob pena de desclassificação.

II – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR

2.1. Poderão participar da presente licitação todos os interessados que satisfaçam as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, e ainda, cujo contrato social esteja em vigor, registrado no órgão competente, com o ramo de atividade compatível ao objeto deste edital.

2.2. Não poderá participar da presente licitação pessoa jurídica:

2.2.1. Que esteja sob falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação e não sejam controladas, coligadas ou subsidiarias entre si;

2.2.2. Declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com o Município de Uiramutã, oucom declaração de

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls 160
Rubrica

inidoneidade e/ou impedimento de licitar com a Administração Pública;
2.2.3. Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;
2.2.4. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
2.2.5. Que possua qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do Termo de Referência/Projeto e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários;
2.2.6. O disposto no item anterior aplica-se também aos membros da comissão de licitação.
2.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.

III - CADASTRO

3.1. O interessado deverá requerer cadastramento até **três (03) dias** anteriores à data fixada para a entrega da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, junto à Comissão Permanente de Licitação, situado a Rua Cici Mota, s/n° - Centro, município de Uiramutã/RR, anexando cópias autenticadas dos documentos abaixo relacionados ou acompanhada dos respectivos originais para conferencia pela Comissão Permanente de Licitação:
3.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as suas alterações ou Contrato Social Consolidado e alterações posteriores, devidamente registrado no órgão competente; no caso de Sociedades por Ações, documento de eleição de seus administradores; no caso de Empresa Individual, Registro Comercial;
3.1.2. Carteira de Identidade e CPF dos sócios;
3.1.3. Prova de inscrição no CNPJ;
3.1.4. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal;
3.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa;
3.1.6. Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
3.1.7. Certidão Negativa de Falência e Concordata;
3.1.8. Certidão de Registro e Quitação de Empresa, expedida pelo CREA e/ou CAU, comprovando sua situação de registro, bem como de seu(s) responsável(is) técnico(s);
3.1.9. Declaração de Micro e Pequena Empresa, se for o caso.
Os **certificados de registros cadastrais**, expedidos pela Prefeitura Municipal de Uiramutã, estarão à disposição dos interessados até as 16h00min, do dia anterior a data fixada para a entrega da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, no endereço acima mencionado.

IV - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

4.1. As empresas participantes deverão apresentar dois envelopes contendo habilitação e proposta, os mesmos deverão ser apresentados, em envelope não transparente, fechado e indevassável, ambos contendo em sua parte externa, a identificação da licitante, e os seguintes dizeres:

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 361
Rubrica

MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 013/2022
ENVELOPE N° 1 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE: _____

MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 013/2022
ENVELOPE N° 2 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: _____

4.1.1. No verso dos envelopes deverá constar o nome e o endereço do proponente.

4.1.2. Os documentos que compõem os envelopes de habilitação e proposta deverão conter sumário e paginação, a fim de evitar discussão futura quanto aos seus conteúdos;

4.2. O PRIMEIRO ENVELOPE, constando, o subscrito acima, deverá conter, em cópias autenticadas ou acompanhados dos respectivos originais, para conferencia da Comissão Permanente de Licitação nos termos do artigo 32 da Lei n° 8.666/93, no ato da abertura do envelope, sendo esses últimos devolvidos após a autenticação requerida, ao representante legal presente:

4.2.1 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento do objeto de licitação (Recibo de Retirada do Edital).
b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Lei nº 5.194/66) (Lei nº 12.378/2010), na qual constem todos os seus responsáveis técnicos, com jurisdição sobre o domicílio da sede da LICITANTE;
c) Certidão de Registro de Pessoa Física emitida pelo CREA da jurisdição do domicílio do profissional, em nome de cada integrante da Equipe Técnica do subitem onde conste atribuição compatível com a área de atuação indicada pela licitante;
d) A Licitante deverá apresentar nos termos de seu art. 30, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações Atestado de Capacidade Técnica-Operacional emitido por pessoa Jurídica de direito pública ou privada, com atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação conforme itens de maior relevância a seguir:

QUANTITATIVO PARA ACERVO TÉCNICO E OPERACIONAL			
Itens	**Descrição**	**Un.**	**40% ref. Aos itens de maior relevância dos serviços executados**
1,1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	204,24
1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	130,57
1.3	Massa única para recebimento de pintura em		

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 162
Rubrica

	argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	434,60
1.4	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	18,21
1.5	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	185,13

e) O Atestado de Capacidade Técnica-Operacional só será válido se reconhecido e ou chancelado pelo CREA devidamente acompanhado da Certidão de Acervo Técnico - CAT do Profissional que realizou a obra/serviços;
f) A Licitante deverá apresentar nos termos de seu art. 30, § 1°, inc. I da Lei 8.666/93 e suas alterações, Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA de obras e serviços semelhantes ao do objeto licitado;
g). Caso o Responsável Técnico da empresa não seja o detentor da Certidão de Acervo Técnico – CAT que originou o Atestado de Capacidade Técnica Operacional apresentado pela Licitante, o mesmo deverá apresentar a Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA com os serviços compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação conforme itens de maior relevância a seguir, além de comprovar que o detentor do acerco possuam vínculo com a empresa.

4.2.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.2.2.1. Certidão Negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; datado dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

4.2.2.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelo INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

4.2.2.2.1. O Balanço e as Demonstrações deverão ser apresentados por cópias reprográficas da página do Livro Diário, onde se encontram transcritos, comprobatório do registro na Junta Comercial. Poderá também ser apresentada cópia reprográfica de publicação em jornal, na forma da lei. As cópias deverão ser autenticadas.

4.2.2.2.2. Caso a licitante tenha iniciado suas atividades no presente exercício, deverá apresentar cópia do Balanço de Abertura ou do Livro Diário, apresentados na forma da lei para lançamento dos índices mencionados.

4.2.2.2.3. As empresas optantes do "SIMPLES NACIONAL" não estão dispensadas de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis.

4.2.2.2.4. **O Balanço Patrimonial e demonstrações apresentadas para fins de habilitação após o dia 31 de maio do corrente ano serão, obrigatoriamente, do exercício imediatamente anterior**.

4.2.2.3. A boa situação econômico-financeira da empresa licitante estará consubstanciada nos seguintes índices, devidamente justificados no processo licitatório:

- Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1% (um por cento), a ser obtido pela fórmula:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 363

- Índice de Endividamento Patrimonial (IEP) igual ou inferior a 1% (um por cento), que mostrará a relação entre Capital de Terceiros (Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo) e o Capital Próprio (Patrimônio Líquido), a ser calculado pela fórmula:

$$IEP = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

4.2.2.3.1. Caso o licitante apresente índices incompatíveis com o item 6.1.4.3, a comprovação de qualificação econômica financeira poderá ser demonstrada através da comprovação de patrimônio líquido no importe de 10% (dez por cento) do valor orçado para licitação (item 7.1 deste edital).

4.2.2.3.1.1. A licitante deverá apresentar cálculo demonstrativo da atualização do Capital Social, sempre que o valor nominal constante do contrato social não estiver grafado em real.

4.2.3 – OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

4.2.3.1. Certificado de Registro Cadastral atualizado, emitido pela Prefeitura Municipal de Uiramutã;

4.2.3.1.1. Caso a empresa interessada não houver se cadastrado, conforme exigido no item 03 deste edital, mas atenda a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, esta poderá apresentar os documentos relacionados no mesmo item, no invólucro nº 01 – "Documentação para Habilitação".

4.2.3.1.2. Na hipótese de apresentação do CRC, caso algum documento já se encontre vencido, o licitante deverá apresentá-lo atualizado, dentro do invólucro nº 01 - Documentação para Habilitação, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas.

4.2.3.2. Carta de Credenciamento para participação na respectiva licitação, conforme **ANEXO V**.

4.2.3.2.1. Tratando-se de procurador, deverá ser apresentada procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, e documentooficial de identificação que contenha foto.

4.2.3.3. Declaração de Integral submissão ao edital, conforme **ANEXO VI**.

4.2.3.4. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, do art. 32 da Lei 8.666/93, alterado pela Lei nº 9.648/98, conforme **ANEXO VII**.

4.2.3.5. Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme **ANEXO VIII**.

4.2.3.6. As **MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE** e **EQUIPARADAS**, que desejarem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006 e suas posteriores alterações, deverão apresentar, os seguintes documentos:

4.2.3.6.1. Declaração assinada pelo responsável legal da empresa, atestando que até a presente data a empresa esta enquadrada no regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo constante no **ANEXO IX**; e,

4.2.3.6.2. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa;

4.2.3.6.3. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da pequena empresa.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 164
Rubrica

4.3. No SEGUNDO ENVELOPE, que será apresentado da mesma forma que o primeiro, e deve conter proposta com preço unitário e total e também o valor global proposto para execução da obra.

4.3.1 A proposta de preço deverá ser legível, digitada ou impressa em processador de texto sem emendas ou rasuras, em uma única via, em papel timbrado onde conste o CNPJ ou carimbo padronizado do CNPJ da proponente, datada, assinada pelo representante legal da licitante, com prazo de validade no mínimo de 60 (sessenta) dias.

4.3.2. A proposta de preços, **ANEXO X**, deverá ser apresentada, sob pena de desclassificação, juntamente com os seguintes documentos:

4.3.2.1. Planilha de orçamento.

4.3.2.1.1. Os preços deverão estar grafados em reais, com duas casas decimais após a vírgula.

4.3.2.2 Cronograma Físico Financeiro.

4.3.3. A proposta de preços deverá indicar o valor da execução completa dos serviços e obras, segundo a cotação de preços unitários aplicados pela proponente nos itens da planilha de orçamento deste edital. Os preços terão como base o mês de apresentação das propostas.

4.3.4. A empresa deverá preencher a planilha de orçamento, que integra este Edital com os preços unitários por ela propostos, e com valor final indicado em algarismos e por extenso. Poderá ser apresentada planilha computadorizada pela própria proponente, desde que guarde, sob pena de desclassificação, absoluta fidelidade com a planilha de orçamento integrante deste edital, no que se refere aos itens, às atividades, unidades e quantidades.

4.3.5. Todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, os fretes, seguros, bem como todas as despesas diretas e indiretas que incidirem nos serviços, deverão estar inclusos no preço.

4.3.6. A apresentação da proposta implica na aceitação tácita de todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como a aceitação de que, caso necessário, a CPL, no transcorrer da licitação poderá solicitar que as licitantes estendam o período de validade das mesmas para igual período adicional.

4.3.6.1. A solicitação prevista acima, bem como as respostas dos proponentes, será feita por escrito, circunstanciadas na respectiva ata ou através de e-mail;

4.3.6.2. A proponente poderá recusar a solicitação, resultando na desistência da participação do processo licitatório, sem que a ele sejam imputadas penalidades para tal ato.

V - DO JULGAMENTO

5.1. A Comissão Permanente de Licitação – CPL, abrirá em primeiro lugar o envelope nº 1 – **DOCUMENTAÇÃO**, para que os membros da Comissão possam examinar e rubricar cada documento e os representantes presentes na Sessão, possam ratificar as informações.

5.2. A Comissão Permanente de Licitação – CPL poderá suspender a sessão sempre que julgar necessário analisar os documentos e propostas oferecidas pelos licitantes, objetivando confirmar as informações prestadas.

5.3. Após o exame da documentação apresentada e a formulação de eventuais impugnações, deverá a Comissão Permanente de Licitação apresentar sua decisão sobre a habilitação das licitantes e consultá-las sobre a interposição de recursos, determinando o prazo para este fim.

5.4. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer às exigências desta Tomada de Preços.

5.5. Os envelopes de proposta dos licitantes inabilitados serão devolvidos fechados, logo após a decisão definitiva da inabilitação.

5.6. Transcorrido o prazo sem interposição de recursos, tendo havido expressa desistência deles ou após julgamento dos recursos interpostos, proceder-se-á a abertura dos envelopes nº 02.

5.7. Na classificação das propostas observar-se-ão seu valor global e os preços unitários

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 165
Rubrica

oferecidos, atendidos os seguintes critérios:

5.7.1. O **Preço de Referência** – valor estimado da contratação, constante deste Edital - item 1.2, **é o preço teto**, limite para as propostas das licitantes, **sendo desclassificadas as que superarem o valor estipulado**.

5.7.2. Será classificada em primeiro lugar a proposta apresentada de acordo com as especificações deste Edital, que contiver oferta do **MENOR PREÇO GLOBAL**.

5.8. A Comissão desclassificará propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim entendidas aquelas definidas nos termos da alínea "a" e "b" do parágrafo 1° do inciso II, do art. 48 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

5.9. A Comissão Permanente de Licitação no julgamento das propostas de preços, poderá determinar que sejam promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como:

a) Discrepância entre valores grifados em algarismo ou por extenso: prevalecerá o valor por extenso;

b) Erro de multiplicação do valor unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o valortotal;

c) Erro de adição será retificado conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;

d) Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço unitário e as quantidades previstas, alterando-se o valor final;

e) Erro no preço total será corrigido de acordo com o disposto nas letras acima.

5.9.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar das licitantes que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Proposta de Preços, desde que, as informações não alterem os preços apresentados e não correspondam a documentos que, originalmente, deveriam figurar na proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na desclassificação da licitante.

5.10. A Comissão Permanente de Licitação observará também, quando do julgamento das propostas, os seguintes procedimentos:

5.10.1. Não utilizará qualquer elemento, fator ou critério sigiloso ou subjetivo, secreto ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.

5.10.2. Não considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes.

5.11. No caso de empate entre duas ou mais propostas, referente ao objeto licitado, de empresas não enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, a classificação dar-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público para o qual todos os licitantes serão convocados (Lei n° 8.666/93, e alterações, art. 45, § 2.°, segunda parte).

5.11.1. Se desta Tomada de Preços estiverem participando microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação destas.

5.11.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

5.11.3. Ocorrendo o empate entre microempresas e empresas de pequeno porte, a Comissão Permanente de licitação procederá da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea a, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 5.11.2. deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

5.11.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 5.11.1. deste Edital, será

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 166
Rubrica

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.11.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 5.11, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

5.11.6. O disposto no subitem 5.11 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.12. Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou forem todas as propostas desclassificadas, poderá a Administração fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou novas propostas, escoimadas das causas que levaram à inabilitação ou desclassificação.

5.13. Deverá a Comissão Julgadora, em conjunto com a equipe de apoio, especialmente convocada para este certame, consignar, em ata, a síntese de fatos ocorridos e pronunciados, submetendo todo o procedimento à homologação da autoridade competente.

5.14. O Município de Uiramutã se reserva o direito de, por despacho fundamentado, decidir:

5.14.1. Pela revogação desta licitação, em razão de interesse público.

5.14.2. Anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida no seu curso.

5.14.3. Homologar a licitação, sem prejuízo da redução superveniente das obras e serviços a serem contratados.

5.15. Observando-se o disposto no art. 109 da Lei 8.666/93, admitir-se-á a interposição de recurso em qualquer fase desta licitação ou durante a execução do contrato que dela resultar.

VI - DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Os recursos financeiros são os constantes no Projeto Básico;

VII – DOS PRAZOS

7.1. A vigência do contrato será de **90 (noventa) dias**, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso ocorra algumas das hipóteses elencadas no § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666/93.

7.2. O prazo de execução dos serviços deverá obedecer ao cronograma físico-financeiro – Anexo XIII, parte integrante deste edital.

VIII - DA GARANTIA À EXECUÇÃO

8.1. Homologada a licitação e adjudicado o seu objeto à licitante vencedora, esta será convocada pela Administração para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prestar garantia à execução, que deverá cobrir o prazo contratual de execução da obra até o seu recebimento definitivo e ainda ser prorrogada sua vigência, na hipótese de ocorrer prorrogação do prazo contratual.

8.2. A garantia à execução poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no parágrafo primeiro do artigo 56 da Lei 8.666/93.

8.2.1. Caso a licitante vencedora do certame opte por formalizá-la em espécie, deverá depositar a referida importância na conta caução de execução n° 10.693-3, agência 0591-6, do Banco Brasil localizada no Município de Uiramutã.

8.2.2. Caso a licitante vencedora do certame opte por formalizá-la em outra modalidade, deverá depositá-la na Tesouraria do Município, localizada na Rua Cici Mota, s/n° , Centro,nesta cidade, no horário de 08h00min às 12h00min, que emitirá o respectivo recibo.

8.3. A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações estipuladas no Contrato.

EM BRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 167
Rubrica

8.4. Não serão aceitos instrumentos de garantia que possuam, em seu bojo, cláusulas de exclusão de sua aplicabilidade em casos de inexecução contratual e em situações que representem potencial risco de prejuízo ao CONTRATANTE.

8.5. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

8.5.1. Ocorrendo alteração, dentro dos limites legais, dos valores constantes do contrato ou prorrogação do prazo de execução da obra ou, ainda, qualquer outra causa que impeça a entrega do objeto no prazo avençado, a CONTRATADA deverá providenciar a complementação ou prorrogação, conforme o caso, da garantia prestada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do respectivo termo.

8.6. A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à contratada, podendo ser retida para a satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão dolosa ou culposa da contratada.

8.7. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

8.7.1. Na notificação devem constar as razões da utilização da garantia, com referência ao documento em que a contratada foi cientificada das correções que deveria providenciar e do valor das mesmas.

8.8. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída no prazo máximo de 30 (trinta) dias da solicitação da contratada.

8.9. O contrato firmado pelo Município de Uiramutã poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer das condições previstas no artigo 65 da Lei 8.666/93 em especial paraprorrogação do prazo contratual de execução avençado, conforme disposto no artigo 57 da referida lei.

IX - DA EXECUÇÃO DA OBRA

9.1. A obra e suas etapas serão executadas mediante autorização(ões), expedida(s) pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .

X - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos serão efetuados em parcelas, mediante apresentação de Nota Fiscal, à qual o Secretário requisitante aporá seu visto, solicitando sua regular quitação, acompanhada de relatório de medição e memória de cálculo, assinada pelo RT da Contratada, e aprovada pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .

Parágrafo primeiro: O pagamento está condicionado à apresentação de:

10.1.1. A comprovação de sua situação regular perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho (CNDT), extrato do Simples Nacional, quando for o caso, bem como quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços.

10.1.2. Deverão ser apresentados também o comprovante de pagamento dos tributos relativos à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) vencidos até a data da nota fiscal.

10.1.3. GFIP tendo como tomador a Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, relativo ao CEI da obra.

Parágrafo segundo: A última parcela só será paga mediante execução integral da obra, comprovada por relatório, assinado pelo Responsável Técnico pela fiscalização da obra.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 168
Rubrica

XI - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

11.1. A prática de ato ilícito na licitação ou na execução do contrato e o descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão as sanções previstas nos arts. 81 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei Estadual n° 14.184, de 31 de janeiro de 2002, e nos arts. 19 a 22 do Decreto Estadual n° 44.431, de 29 de dezembro de 2006.

11.2. A ADJUDICATÁRIA perderá em favor da ADJUDICANTE a garantia a que se refere o item 8.1, no caso de recusa injustificada em assinar o contrato.

11.3. Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo as multas nos seguintes percentuais:

11.3.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia, até o trigésimo dia, de atraso, sobre valor dos serviços previstos no cronograma físico não executados;

11.3.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

11.3.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços previstos no Cronograma Físico não executados, no caso de atraso superior a 30(trinta) dias;

11.3.4. 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.

11.3.5. As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes, ressalvada a situação descrita nos itens **11.3.6** e **11.3.7**.

11.3.6. O atraso no cumprimento do Cronograma Físico- Financeiro previsto para execução dos serviços será verificado nas medições mensais, a partir do qual incidirá a multa prevista no item **11.3.1**.

11.3.7. Verificando o atraso, na forma do item anterior, a CONTRATADA será notificada, por escrito, para sanar a irregularidade.

11.3.8. Persistindo a irregularidade prevista no item **11.3.6**, até a medição mensal subsequente, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento da multa prevista no item **11.3.3**, que substituirá aquela constante do item **11.3.1**.

11.4. Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição pela Prefeitura Municipal de Ordens de Início, Reinício ou Paralisão de Serviços.

11.5. As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de idoneidade poderão ser aplicadas comulativamente com a de multa, assegurando-se ao interessado o direito de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de idoneidade, em prazo será de 10 (dez) dias.

11.5.1. Para aplicação das sanções referidas no item anterior, deverá ser instaurado processo administrativo punitivo, seguindo de notificação para defesa, em coformidade com o disposto nos arts. 19 a 22 do Decreto Estadual n° 44.431/06, submetida a aplicação das sanções à decisão do Secretário Municipal, salvo na hipótese de aplicação de sanção de declaração de indoneidade, de competência exclusiva do Prefeito Municipal, ou de autoridade a ele equivalente, nos termos da lei.

11.6. As multas deverão ser recolhidas no Departamento de Fazenda do município de Uiramutã, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contado à partir da decisão definitiva na esfera administrativa.

11.7. Se a multa aplicada for de valor superior ao da garantia prestada, além da sua perda responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda quando for o caso, cobrada judicialmente.

11.8. Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações compensatórias expressandamente concedidas pela CONTRATANTE ou resultante de fato superviniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade da CONTRATADA, tais como o

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 369
Rubrica

estado de calamidade pública, guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas características.

11.9. As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente fundamentedas através de registro no Diário de Obras realizado pela FISCALIZAÇÃO.

XII - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

12.1. A presente licitação poderá ser revogada ou anulada em qualquer das fases, em conformidade com a Lei 8.666/93.

XIII - DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

13.1. Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

13.1.1. Considera-se receita bruta, para fins do disposto no item A.1, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

13.1.2. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o item 13.1 será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.

13.1.3. O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados.

13.1.4. Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item A.1 deste Edital;

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item A.1 deste Edital;

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item A.1 deste Edital;

f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa

EMBRAPA

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
j) constituída sob a forma de sociedade por ações.

13.1.5. O disposto nas alíneas itens d e g do subitem 13.1.4 não se aplica à participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio previsto na Lei Complementar nº 123/2006, e associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.

13.1.6. Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações previstas nas alíneas do subitem 13.1.4 deste Edital, será excluída do regime de que trata a Lei Complementar nº 123/2006, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.

13.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, que participarem desta Concorrência, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

13.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado ao licitante, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que este for declarado o vencedor do presente certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

13.2.1.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 13.2.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1. Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições da Lei Federal Nº 8.666/93 no que couber.

14.2. Este Edital de Licitação, seus anexos e a Proposta de Preços oferecida pela contratada constituirão peças integrantes do Contrato, independentemente de transcrição no instrumento respectivo.

XV - ANEXO

15.1. Fazem parte integrante deste edital:
Anexo I – Relação da equipe técnica básica / Declaração de disponibilidade da equipe.
Anexo II – Declaração de disponibilidade dos equipamentos e instalações.
Anexo III – Modelo de Atestado de Visita Técnica.
Anexo IV – Modelo de credenciamento de participação em visita técnica.
Anexo V – Modelo de credenciamento de participação.
Anexo VI – Modelo de declaração de integral submissão ao edital.
Anexo VII – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo da habilitação.
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.
Anexo IX – Modelo de declaração de enquadramento de microempresa.

EM BR

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 171
Rubrica

Anexo X – Modelo da Proposta de Preços.
Anexo XI – Minuta de Contrato.
Anexo X – Planilha Orçamentária (disponível em mídia);
Anexo XI – Cronograma Físico-Financeiro (disponível em mídia);
Anexo XII – Memorial Descritivo (disponível mídia);Anexo XIII – Projeto (disponível em mídia).

Uiramutã, 30 de setembro de 2022.

Sandro da Silva Mafra
Presidente da Comissão de Licitações

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 179
Rubrica

ANEXO

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA BÁSICA / DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 013/2022
Processo Licitatório nº 135/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

A licitante .....CNPJ:....., declara ter disponibilidade de pessoal técnico especializada e compromete-se a compor a Equipe Técnica Básica aqui relacionada, caso o objeto da licitação venha a ser contratado com a mesma.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA	
NOME	**ESPECIALIZAÇÃO**
OBS:	

Por ser verdade, firmo a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 173
Rubrica

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 013/2022
Processo Licitatório nº 135/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

A licitante .....CNPJ:....., declara ter disponibilidade de, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o adequado cumprimento do objeto da licitação e compromete-se a utilizá-los, caso o objeto venha a ser contratado com a mesma.

Por ser verdade, firmo a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 174 Rubrica

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

PROCESSO Nº 135/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ DECLARA, para fins do disposto no Edital de Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA- COMUNIDADE CARAPARÚ I, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital T.P. nº 013/2022; que a empresa _____, cadastrada com o CNPJ nº_, com sedena_____, n°__, Bairro_____, CEP: _____, no município de_____, vistoriou o local onde seráexecutada a obra, observando o local onde será executado, inteirando-se assim das condicionantes, não cabendo, posteriormente, em hipótese alguma, alegações de desconhecimento ou dúvida no que tange ao referido objeto, sendo de sua inteira responsabilidade, caso seja vencedora do mesmo, quaisquer ônus porventura decorrentes.

Uiramutã,_____de_____de 2022.

_____
Prefeitura Municipal de Uiramutã

Declaramos nossa concordância com os termos acima expostos, dando-nos por satisfeitos com as informações e detalhes obtidos e julgando-nos plenamente capacitados a elaborar nossa proposta de licitação.

_____
Empresa Participante
Representante da empresa
Nº do documento

EM BRANCO

Fls. 175

Rubrica

MODELO DE CREDENCIAMENTO DE VISITA TÉCNICA

Uiramutã/RR,_____de_____de 20---.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 013/2022
Processo Licitatório nº 0135/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

O abaixo assinado, responsável legal pela empresa_____vem pela presente, informar a V. Sas. que o_____, CREA/CAU/CPF/RG Nº_____, é a pessoa designada para representar nossa empresa na visita técnica da Licitação acima referida.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 176
Rubrica

CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO

Uiramutã/RR,_____de_____de 20---.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 013/2022
Processo Licitatório nº 0135/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

O abaixo assinado responsável legal pela empresa_____vem pela presente, informar a V. Sas. que o Sr._____, carteira de identidade nº_____, é pessoa designada para representar nossa empresa na Licitação acima referida, na sessão de entrega, recebimento e abertura dos envelopes contendo documentos e proposta comercial, podendo examinar e rubricar documentos, assinar atas, apresentar impugnações e recursos, inclusive renúncia expressa a recurso.

Atenciosamente,

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 177
Rubrica

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TOTAL SUBMISSÃO AO EDITAL

Uiramutã/RR,_____de_____de 20---.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 013/2022
Processo Licitatório nº 135/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

Declaro, para os devidos fins, a minha total submissão ao Edital Tomada de Preços 013/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I

.

Por ser verdade, firmo a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL - PMUI
Fls. 178
Fábrica

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 013/2022
Processo Licitatório nº 135/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

A empresa....., inscrita no CNPJ sob o nº. ....., DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firma a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 179 Rubrica

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de UiramutãComissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 013/2022
Processo Licitatório nº 135/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

A Empresa....., inscrita no CNPJ sob o nº....., DECLARA, sob as penas da lei, para surtir efeito junto à Prefeitura do Município de Uiramutã, no procedimento licitatório sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, que **não** incide na proibição contida no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.

Por ser verdade, firma a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

Em Branco

MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 013/2022
Processo Licitatório nº 135/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

.....(Razão Social da Empresa) ....., estabelecida na .....(endereço completo) ....., inscrita no CNPJ sob n.º ....., representada pelo....., brasileiro, RG nº....., CPF nº..... residente e domiciliado (endereço) declara para os devidos fins que na presente data a mesma se encontra enquadrada nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 de 14/12/2006, que trata do Regime das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estando apta portanto a sua participação no processo n º....., tomada de preço nº ....., junto ao Município de Uiramutã. Por ser verdade,

firma a presente.

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 181
Rubrica

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Uiramutã/RR,_____de_____de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 013/2022
Processo Licitatório nº 135/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob o nº....., com endereço na Rua ....., por seu representante legal, Sr....., portador da Carteira de Identidade nº ....., DECLARA que concorda e submete-se a todos os termos do edital da Tomada de Preço nº 013/2022 e vem, apresentar PROPOSTA DE PREÇOS conforme planilha em anexo com a discriminação dos quantitativos, valores unitários, valores de mão-de-obra e materiais, valor final de R$..... (.....).

Nos preços apresentados já estão incluídos todos os encargos tributários, previdenciários, trabalhistas e todos os demais custos para a prestação dos serviços objeto da licitação.
O prazo máximo de execução é de 02 (dois) meses, observado o cronograma físico-financeiro da Prefeitura Municipal de Uiramutã.

A presente proposta tem prazo de validade de 60 dias a contar da data da entrega das propostas, excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

Atenciosamente,

_____
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 182
Rubrica

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº .../2022.

PROCESSO Nº 135/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022

Contrato que, entre si, fazem o **MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ**, Estado de Roraima, inscrita no CNPJ sob nº 01.612.681/0001-01, com sua sede administrativa na Rua Cici Mota, s/n – Centro – Uiramutã, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de -----, Sr.(ª) ----------, delegatório(a) autorizado(a) pelo Decreto Municipal n° XX/202X,doravante denominado **CONTRATANTE**, denominada doravante CONTRATANTE e a empresa__, cadastrada no CNPJ sob o n° _____, sediada na_____, telefone_____, e-mail _____, representada por_____, inscrito no CPF sob o n°_____, residente e domiciliado_____, denominada CONTRATADA, de conformidade com a Tomada de Preços 013/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.O presente contrato tem como objeto a execução da obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA- COMUNIDADE CARAPARÚ I, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor inicial deste contrato é de **R$** _____ (_____), correspondente à proposta ofertada pela CONTRATADA, aplicada às quantidades estimadas nas planilhas de orçamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA A EXECUÇÃO

3.1. Como garantia de execução deste contrato a CONTRATADA apresentou antes de sua assinatura, comprovante de garantia na modalidade_____, na importância de R$ _____ (_____), (Guia de Recolhimento acostada ao Processo nº 135/2022 – Tomada de Preços nº 013/2022, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual.

3.2. A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações estipuladas neste Contrato.

3.3. No caso de alteração do valor deste contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

3.3.1. Ocorrendo alteração, dentro dos limites legais, dos valores constantes do contrato ou prorrogação do prazo de execução da obra ou, ainda, qualquer outra causa que impeça a entrega do objeto no prazo avençado, a CONTRATADA deverá providenciar a complementação ou prorrogação, conforme o caso, da garantia prestada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do respectivo termo.

3.4. A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à contratada, podendo ser retida para a satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão dolosa ou culposa da contratada.

EM BRANCO

Fls. 183

3.5. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
3.5.1. Na notificação devem constar as razões da utilização da garantia, com referência ao documento em que a contratada foi cientificada das correções que deveria providenciar e do valor das mesmas.
3.6. Após a execução deste contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída no prazo máximo de 30 (trinta) dias da solicitação da contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DA GESTÃO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

4.1. A gestão e execução do presente contrato será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .
4.2. A fiscalização do objeto da presente contratação pela Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, será exercida pelo servidor **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
4.2.1. É permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
4.2.2. É permitida a substituição do servidor designado neste item sempre que a Administração julgar necessário, devendo a CONTRATADA ser cientificada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
4.3. Além das atividades neste contrato, no edital que originou esse contrato, bem como em seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:
4.3.1. Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;
4.3.2. Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos que envolvem a obra: projetos, licitação, contrato, medições, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como Construído (As Built), termos de recebimento provisório e definitivo e devolução de cauções, etc.
4.3.3. Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra;
4.3.4. Aferir as medições dos serviços executados que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo;
4.3.5. Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;
4.3.6. Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.
4.3.7. Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execução de cada serviço/etapa será aferida, em cada medição, consoante CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, previamente aprovado e que a aferição dos prazos se dará mediante a comparação entre o valor total da etapa prevista no cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 184
RORAIMA

4.4. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
4.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou.

CLÁUSULA QUINTA – DA MEDIÇÃO E DOS PAGAMENTOS

5.1. As medições serão formalizadas e datadas no último dia de cada mês e serão pagas até 30 (trinta) dias da data de sua aceitação, de acordo com o cronograma físico financeiro, pelo valor nominal nela expresso.
5.2. A Prefeitura Municipal de Uiramutã terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da medição para aceitá-la ou não;
5.3. Acompanhando a primeira fatura deverá ser apresentada a "anotação de responsabilidade técnica" - ART no CREA.
5.4. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR até o 10° (décimo) dia útil após aprovada a medição pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos , mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, sendo efetuada a retenção de tributos sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a legislação vigente.
5.4. O pagamento está condicionado à apresentação de:
5.4.1. A comprovação de sua situação regular perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho (CNDT), extrato do Simples Nacional, quando for o caso, bem como quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços.
5.4.2. Deverão ser apresentados também o comprovante de pagamento dos tributos relativos à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) vencidos até a data da nota fiscal – guia recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) de todos os empregados alocados na execução do contrato.
5.4.3. GFIP tendo como tomador a Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, relativo ao CEI da obra.
5.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta tenha comprovado, por antecipação, a matrícula da obra junto ao INSS, ou antes, de paga ou relevada à multa que lhe tenha sido aplicada.
5.6. A última parcela só será paga mediante execução integral da obra, comprovada por relatório, assinado pelo Responsável Técnico pela fiscalização da obra.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

6.1. Durante a vigência do Contrato os preços serão fixos e passíveis de recomposição e reajuste, desde que comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65, bem como, parágrafo 8° do Artigo 65 da Lei n° 8.666/93, respectivamente, ou de redução dos preços praticados no Mercado.
6.2. Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, a Contratada poderá solicitar a atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao Município de Uiramutã, instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido.
6.3. Mesmo comprovada às ocorrências das hipóteses previstas na alínea "d" do inciso II do artigo 65, bem como, parágrafo 8° do Artigo 65 da Lei n° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro Processo Licitatório.
6.4. Comprovada a redução dos preços praticados no Mercado nas mesmas condições do contrato e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, a Contratada será convocada pelo Município de Uiramutã para a alteração, por aditamento, do

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 186
Rubrica

preço contratado, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA SETIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO

7.1. O prazo da presente execução de obras e prestação de serviços é de 60 **(sessenta) dias**, contados da data da "Ordem de Serviço" que autorizar o início das atividades.

CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato terá vigência de XX **(XXXX) meses**, a partir da data de sua assinatura, com termo final em ..... de ..... de ....., podendo ser prorrogado, caso ocorra algumas das hipóteses elencadas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fonte de Recurso: XXXXXX.**

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES

10.1. São Obrigações da contratada:

10.1.1. Apresentar-se ao Município de Uiramutã/rr – Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a ordem de serviço inicial, o seguinte:

a) Apresentar cronograma físico – financeiro compatível com a planilha vencedora;

b) Anotações de Responsabilidade Técnica- ART, no CREA/CAU, em nome do Engenheiro Responsável Técnico pela obra ou serviço;

c) Abertura de Certificado de Matrícula da obra/serviço – CEI INSS junto com a primeira medição;

d) Visto junto ao CREA/CAU/RR, para as empresas que possuírem CRPJ de outros Estados da Federação.

e) Plano de Segurança específico da Obra, elaborado conforme as normas regulamentares da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e alterações posteriores;

f) Plano de sinalização diurna e noturna, aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

g) Apresentar cronograma de utilização da equipe técnica, de acordo com o prazo de execução de cada obra/serviço, observada a mesma ordem e quantidade da relação de que trata o subitem 6.1.3.3, Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 013/2022, devendo ser aprovado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .

h) Apresentar cronograma de utilização de equipamentos e instalações, de acordo com o prazo de execução da obra/serviço, observada a necessidade de cada projeto, devendo ser aprovado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .

10.1.2. Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas.

8.1.3. Assegurar, durante a execução das obras/serviços, a proteção e a conservação dos serviços realizados.

10.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

10.1.5. Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão do Município de Uiramutã/ RR – Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos a inspeção das obras em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 186 RORAIMA

10.1.6. Providenciar as placas da obra com seus dados indicativos, conforme modelo apresentado pela fiscalização, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados à partir da ordem de serviço.
10.1.7. Obedecer ao plano de segurança das obras, conforme as Normas de Segurança do Trabalho.
10.1.8. Participar à fiscalização ou à supervisão do Município de Uiramutã aocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão da obra, no todo o em parte, de acordo com o cronograma da mesma, indicando as medidas para corrigir talsituação.
10.1.9. Executar, conforme a melhor técnica, as obras contratadas, obedecendo rigorosamente às normas ABNT, bem como as instruções, especificações e os detalhes fornecidos ou editados pela Administração.
10.1.10. Manter atualizado "Diário de Obras", nele registrando todas as ocorrências que afetem o prazo de execução ou orçamento das obras.
10.1.11. Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e as posturas municipais sobre a execução de obras em locais públicos.
10.1.12. Manter à frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta ou a que venha a ser aprovada pela Administração, sempre liderada por engenheiro qualificado com capacidade e poderes bastantes para representá-la perante a Fiscalização e resolver problemas referentes às obras em execução.
10.1.13. Manter na obra em bom estado todo o equipamento necessário à perfeita execução dos serviços contratados, objetivando atender ao cronograma físico, à qualidade e às especificações técnicas.
10.1.14. Manter equipe para o acompanhamento topográfico da obra, adequada e compatível com as exigências e qualidades técnicas pertinentes.
10.1.15. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.2. Constitui obrigação do Município:

10.2.1 Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, recebendo seu objeto, conforme especificações constantes dos itens 10 e 11 do presente edital.
10.2.2. Realizar o pagamento conforme cláusula terceira deste contrato.
10.2.3. Notificar a empresa a ser contratada da ocorrência de qualquer descumprimento dos termos do edital da TOMADA DE PREÇOS nº 013/2022 e deste instrumento.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS

11.1. A CONTRATADA será responsável pelos seguintes encargos:

11.1.1. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, as responsabilidades advindas deste Contrato. A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE, desde que não afetem a boa execução do presente instrumento;
11.1.2. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais, e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;
11.1.3. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas relacionados com o objeto deste contrato;
11.1.4. Assumir a responsabilidade exclusiva por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência de falhas decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA.

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 187
Rubrica

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES

12.1. A prática de ato ilícito na licitação ou na execução do contrato e o descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão as sanções previstas nos artis. 81 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei Estadual n° 14.184, de 31 de Janeiro de 2002,e nos arts. 19 a 22 do Decreto Estadual n° 44.431, de 29 de dezembro de 2006.

12.2. A ADJUDICATÁRIA perderá em favor da ADJUDICANTE a garantia a que se refere o item 8.1, no caso de recusa injustificada em assinar o contrato.

12.3. Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo as multas nos seguintes percentuais:

12.3.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia, até o trigésimo dia, de atraso, sobre valor dos serviços previstos no cronograma físico não executados;

12.3.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

12.3.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços previstos no Cronograma Físico não executados, no caso de atraso superior a 30(trinta) dias;

12.3.4. 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.

12.3.5. As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes, ressalvada a situação descrita nos itens **12.3.6** e **12.3.7**.

12.3.6. O atraso no cumprimento do Cronograma Físico- Financeiro previsto para execução dos serviços será verificado nas medições mensais, a partir do qual incidirá a multa prevista no item **12.3.1**.

12.3.7. Verificando o atraso, na forma do item anterior, a CONTRATADA será notificada, por escrito, para sanar a irregularidade.

12.3.8. Persistindo a irregularidade prevista no item **12.3.6**, até a medição mensal subsequente, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento da multa prevista no item **12.3.3**, que substituirá aquela constante do item **12.3.1**.

12.4. Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição pela Prefeitura Municipal de Ordens de Início, Reinício ou Paralisação de Serviços.

12.5. As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de idoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a de multa, assegurando-se ao interessado o direito de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de idoneidade, em prazo será de 10 (dez) dias.

12.5.1. Para aplicação das sanções referidas no item anterior, deverá ser instaurado processo administrativo punitivo, seguindo de notificação para defesa, em conformidade com o disposto nos arts. 19 a 22 do Decreto Estadual n° 44.431/06, submetida a aplicação das sanções à decisão do Secretário Municipal, salvo na hipótese de aplicação de sanção de declaração de inidoneidade, de competência exclusiva do Prefeito Municipal, ou de autoridade a ele equivalente, nos termosda lei.

12.6. As multas deverão ser recolhidas no Departamento de Fazenda do município de Uiramutã, no prazo de 72(setenta e duas) horas, contado à partir da decisão definitiva na esfera administrativa.

12.7. Se a multa aplicada for de valor superior ao da garantia prestada, além da sua perda responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda quando for o caso, cobrada judicialmente.

12.8. Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações compensatórias expressamente concedidas pela CONTRATANTE ou resultante de fato superveniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade da CONTRATADA, tais como o

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 188
Rubrica

estado de calamidade pública, guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas características.

12.9. As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente fundamentadas através de registro no Diário de Obras realizado pela FISCALIZAÇÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1. Operar-se-á de pleno direito a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 013/2022, quando ocorrerem as hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ABSTENÇÃO

14.1. A abstenção pelo CONTRATANTE do uso dos direitos que lhe são assegurados neste contrato não será considerada novação ou renúncia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

15.1. Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93, sempre através de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES

16.1. O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei 8.666/93 e suas modificações supervenientes, complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais constantes da TOMADA DE PREÇOS nº 013/2022 e seus anexos, bem como a proposta de preços, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, apresentados pela CONTRATADA, que fazem parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pacaraima/RR para dirimir as dúvidasoriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo, para os fins de direito.

Uiramutã, -- de ---------- de 2022.

_____

Secretário Municipal de ----------

_____

Contratada

_____ Testemunha

_____ **Testemunha**

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ Fls. 189 Rubrica

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n - Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 132/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Arthur Nabuco de Araújo- Comunidade Maracanã I, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 14:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com.

Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n - Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 135/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva-Comunidade Caraparú I, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/10/2022 às 10:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com.

Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n - Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 134/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno - Comunidade Barreirinha, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/10/2022 às 08:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com.

Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2022 - PMBC - UASG: 988039

COMPRASNET Nº 167/2022. OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, pelo período de 12 (doze) meses, segundo as conveniências da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional. Proposta e Habilitação deverão ser registradas no sistema COMPRASNET, até dia 21 (vinte e um) de outubro de 2022. Horário: 13h30min. Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br. Valor Máximo Aceitável: R$ 2.584.721,16.

Balneário Camboriú, 3 de outubro de 2022.
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2022 - PMBC - UASG: 988039

COMPRASNET Nº 145/2022
OBJETO: Registro de preços para aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (OPME).
VALOR: R$ 141.843,34.
DATA DA SESSÃO ELETRÔNICA: 20 (vinte) de outubro de 2022.
HORÁRIO: 09h00min.
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br.

Em 3 de outubro de 2022
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022 - PREF

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 075/2022 - PREF

O Município de Bela Vista do Toldo, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, na modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO, onde o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÕES DO CONJUNTO BRITAGEM MÓVEL 620mm X 400mm REBOCADO POR PINO REI, PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA ABERTURA DE ENVELOPES: Dia 20/10/2022 às 09h05min, Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL: www.bll.org.br

Informações poderão ser solicitadas pelo e-mail compras.licitacao@pmbvt.sc.gov.br.

Bela Vista do Toldo, 3 de Outubro de 2022.
ALFREDO CEZAR DREHER
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS

AVISO DE ALTERAÇÃO

2ª ALTERAÇÃO DE EDITAL E DATA DE ABERTURA

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ nº. 11.455.005/0001-25, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, torna público, que alterou a data do edital descrito acima. Diante disto, a data de abertura e início da sessão, foi transferida para o dia 20/10/2022, ficando estipulado os seguintes horários: até às 13h45min entrega de envelopes no setor de protocolos, e 14h00min início da sessão. Informações (047) 3621-7705. Cópia do edital no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

WILLIAN GODOY FERREIRA DE SOUZA
Prefeito
interino

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº FMAS Nº 4/2022

O Município de Canoinhas/SC, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ nº. 11.455.005/0001-25, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 19/10/2022, às 09h00min, licitação para AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS, ZERO QUILÔMETROS, CONFORME DESCRIÇÃO INDIVIDUAL DO ITEM, SENDO 01 (UM) VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO DO CRAS "MARIA IRACEMA KOHLER FEDALTO" E 01 (UM) VEÍCULO PARA USO EXCLUSIVO DA APAE. Recebimento de propostas até às 08h00mim, no endereço eletrônico www.bll.org.br do dia 19/10/2022. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site: www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

WILLIAN GODOY FERREIRA DE SOUZA
Prefeito interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 - FMS

Aquisição de Bens

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para possível aquisição de produtos farmacêuticos, correlatos, vitaminas e/ou suplementos vitamínicos para atendimento da demanda existente nas unidades de saúde municipais, referente a programas oficiais e contemplados pela Atenção Básica, determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, setor de Assistência Social e demais programas ofertados pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme descrições constantes nos anexos "A" e "B" do edital. Tipo: Menor Preço Por Item. Recebimento das propostas: até as 08h15min do dia 17/10/2022. Abertura: dia 17/10/2022 as 08h30min. Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2167. Registrado no TCE com a chave: F4450F8D49E1A4CB603AD2245B0883057D26D9AA.

Concórdia-SC, 3 de outubro de 2022.
LEANDRO BOEIRA ZORZAN
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
Em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 571/SMA/SUPLC/2022

A Secretaria Municipal da Administração torna público para o conhecimento dos interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço por lote, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para execução da construção do Centro de Convivência do bairro Ingleses - Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será até as 16h50min do dia 20/10/2022. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 17h, na Secretaria Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC.

O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br

FERNANDA ZIEGLER
Diretora do Sistema de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 582/SMA/SUPLC/2022

A Secretaria Municipal da Administração torna público para o conhecimento dos interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço, tendo como objeto Contratação de empresa especializada para execução da recuperação da Passarela Metálica em frente ao Terminal Rodoviário Rita Maria - Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será até as 14h50min do dia 22/10/2022. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 15h, na Secretaria Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC.

O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.

FERNANDA ZIEGLER
Diretora do Sistema de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 578/SMA/SUPLC/2022

A Secretaria Municipal da Administração torna público para o conhecimento dos interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço, tendo como objeto Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação e drenagem das Servidões Aciomar da Costa, Jari e Lua Grande, Pedro Santos Filho, Rosa Maria das Neves, 20 de Setembro e José Araújo Rabelo - Ingleses do Rio Vermelho - Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será até as 13h20min do dia 22/10/2022. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 13h30min, na Secretaria Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC.

O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br

FERNANDA ZIEGLER
Diretora do Sistema de Licitações e Contratos

EM BRÁNCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 190 Rúbrica

PREFEITURAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 129/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Joaquim de Lima- Comunidade Maturuca, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 08:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 130/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Águida Kasa Wai- Comunidade Willimom, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 10:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 131/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO- COMUNIDADE SÃO LUIZ /RR, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 11:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 132/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Arthur Nabuco de Araújo- Comunidade Maracanã I, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 14:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 133/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Maria- Comunidade São Mateus- Município de Uiramutã/ RR, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 16:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 134/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno - Comunidade Barreirinha, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/10/2022 às 08:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: iramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 135/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva-Comunidade Caraparú I, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/10/2022 às 10:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

OUTRAS PUBLICAÇÕES

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA
CRC/RR

Termo de Inexigibilidade de Licitação n° 006/2022.

Processo de Compras nº: 2022/000025.

Contratante: Conselho Regional de Contabilidade De Roraima, CNPJ: 08.862.643/0001-44. Contratada: Fundação Brasileira De Contabilidade (FBC), CNPJ nº 02.428.413/0001-05. Objeto: locação de espaço (estande) cota Bronze, no evento denominado "5º Encontro Nacional de Jovens Lideranças Contábeis – 5º ENJLC". Fundamento Legal: Art. 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93. Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ratificação da Autoridade Superior: Artigo 26 da Lei Federal nº 8666/93 – Contadora Itajay Maria Soares, Presidente do CRC/RR, em 22 de setembro de 2022.

EM BRANCO

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 135/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva-Comunidade Caraparú 1, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/10/2022 às 10:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 129/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Joaquim de Lima- Comunidade Maturuca, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 08:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 130/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Águida Kasa Wai- Comunidade Willimom, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 10:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 131/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO- COMUNIDADE SÃO LUIZ /RR, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 11:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 132/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Arthur Nabuco de Araújo- Comunidade Maracanã 1, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 14:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 134/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno - Comunidade Barreirinha, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/10/2022 às 08:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.



LICENÇA DE OPERAÇÃO LO Nº. 008/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ-RR
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Mucajaí/RR, através da CPL, torna pública a TP nº 05/2022 - Processo nº 0462/2022, OBJETO: Contratação por menor preço em regime de empreitada global, de empresa especializada em obras e serviços de Reforma, para os serviços de Reforma de Praça, data da apresentação da Documentação e Proposta 21/10/2022 – 08h00min. EDITAL E ANEXOS: Retirar na CPL da Prefeitura Municipal de Mucajaí, situada na Av. Nossa Senhora de Fatima, n. 32W - Centro, no horário das 08h00min s 12h00min, mediante carimbo com CNPJ.

Mucajaí-RR, 04 de outubro de 2022
JEAN CLEBER FREITAS DE LIMA
Presidente da CPL



GOVERNO DE RORAIMA
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
femarh

LICENÇA DE OPERAÇÃO LO Nº 143/2022/DILGA/DLAIIS











EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 242
Rúbrica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 134/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno - Comunidade Barreirinha, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/10/2022 às 08:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com.

Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA.
Presidente da CPL.

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:F3D938CD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 135/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva-Comunidade Caraparú I, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/10/2022 às 10:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com.

Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA.
Presidente da CPL.

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:F17711A5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 132/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Arthur Nabuco de Araújo-Comunidade Maracanã I, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 14:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com.

Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA.
Presidente da CPL.

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:CB8C0BCB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 129/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Joaquim de Lima-Comunidade Maturuca, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 08:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com.

Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA.
Presidente da CPL.

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:D8E32D18

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 131/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO- COMUNIDADE SÃO LUIZ /RR, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 11:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com.

Uiramutã-RR, 30 de setembro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA.
Presidente da CPL.

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:C121D3A5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo n. 133/2022, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Maria-Comunidade São Mateus- Município de Uiramutã/ RR, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/10/2022 às 16:00 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com.

EM BRANCO

Gmail

PREFEITURA MUNICIPAL - PMUI - UIRAMUTÃ
Fls. 193
Rúbrica

cpl uiramuta <cpluiramuta@gmail.com>

Editais

2 mensagens

Edson Coelho <Construtoraanaua@hotmail.com> 6 de outubro de 2022 15:58
Para: "cpluiramuta@gmail.com" <cpluiramuta@gmail.com>

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR

EMPRESA CONSTRUTORA ANAUA Inscrita no CNPJ sob nº 15.285.334.0001-26, com sede a Rua: São Silvestre nº 49, na cidade de Boa vista , Estado de Roraima, neste ato representado pelo Sr (a) Edson Pedroso Coelho, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, solicitar cópias dos Editais/Tomadas de Preço nº07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
13/2022 para fins de participação no certame.

Nestes Termos

P. Deferimento

Boa vista RR, 06 de outubro de 2022.

Obter o Outlook para Android

---

cpl uiramuta <cpluiramuta@gmail.com> 6 de outubro de 2022 19:28
Para: Edson Coelho <Construtoraanaua@hotmail.com>

ANEXO

- **PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...**
- **PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...**
- **Edital_TP_011_2022.zip**
- **PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha.zip
10891K

PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal Indígena Koko Tereza da Silva_Comunidade Caraparú I.zip
10897K

Gmail

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 194
Rúbrica

cpl uiramuta <cpluiramuta@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE EDITAIS

2 mensagens

Ido Beserra <ido.adm@hotmail.com>
Para: cpl uiramuta <cpluiramuta@gmail.com>

6 de outubro de 2022 09:05

Bom Dia,

Venho respeitosamente solicitar os editais, TP07, TP08, TP09,TP10,TP11,TP12, referente a construção de escolas nas comunidades indígenas.

NORTH COM E SERV LTDA
CNPJ:07.164.503/0001-41

IDO FELIPE DA SILVA BESERRA
CRA-RR 3-726

FONE: 95 98406-6211

---

cpl uiramuta <cpluiramuta@gmail.com>
Para: Ido Beserra <ido.adm@hotmail.com>

6 de outubro de 2022 19:24

PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...
PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...
PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...
PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...
PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...

Segue edital.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal Indígena Comunidade Willimom.zip
11308K

Edital_TP_011_2022.zip
8806K

Gmail

cpl uiramuta <cpluiramuta@gmail.com>

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI - RORAIMA
Fls. 195
Rúbrica

SOLICITAÇÃO DE EDITAL

2 mensagens

Vitor Mateus <vkempreendimento@gmail.com>
Para: cpluiramuta@gmail.com

4 de outubro de 2022 23:51

Venho por meio deste solicitar os editais para as seguintes Tomadas de Preços.
TP 007/2022 - Comunidade Maturuca
TP 008/2022 - Comunidade Willimom
TP 009/2022 - Comunidade São Luiz
TP 010/2022 - Comunidade Maracanã I
TP 011/2022 - Comunidade São Mateus
TP 012/2022 - Comunidade Barreirinha
TP 013/2022 - Comunidade Caraparú I

--

Vitor Mateus
CRC-RR 001569/O-6
(95)991265783
vkcontabilidade@gmail.com
Consultoria e assessoria

cpl uiramuta <cpluiramuta@gmail.com>
Para: Vitor Mateus <vkempreendimento@gmail.com>

6 de outubro de 2022 19:20

Segue conforme solicitado.

- **PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...**
- **PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...**
- **PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...**
- **Edital_TP_011_2022.zip**
- **PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal I...**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal Indígena Amooko Roseno_Comunidade Barreirinha.zip
10891K

PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal Indígena Koko Tereza da Silva_Comunidade Caraparú I.zip
10897K

Gmail

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 196
Rubrica

cpl uiramuta <cpluiramuta@gmail.com>

Pedido de edital

2 mensagens

Tk Construções e serviços <tkconstrucoeseservicos@gmail.com> 10 de outubro de 2022 09:46
Para: cpluiramuta@gmail.com

Tomada de preço 13/2022


TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022

Screenshot_20221010-094018_Chrome.jpg
262K

cpl uiramuta <cpluiramuta@gmail.com> 10 de outubro de 2022 12:42
Para: Tk Construções e serviços <tkconstrucoeseservicos@gmail.com>

ANEXO

Em seg., 10 de out. de 2022 às 09:46, Tk Construções e serviços <tkconstrucoeseservicos@gmail.com> escreveu:
> Tomada de preço 13/2022

PROJETO BASICO_Construção da Escola Municipal Indígena Koko Tereza da Silva_Comunidade Caraparú I.zip
10897K

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 197
Rúbrica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
14200137184	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Roraima

Nome: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
RRP2100006730

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

CANTA
Local

22 Março 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/____ _____ Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 524724 em 22/03/2021 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 210031603 - 19/03/2021. Autenticação: C3F56F83F3102B37CAB3579AE82D5056701F7E88. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/003.160-3 e o código de segurança mWS2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU -
Fls. 198
Rúbrica

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/003.160-3	RRP2100006730	19/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
016.228.392-00	LUCAS MAGALHAES BRIGLIA

Junta Comercial do Estado de Roraima

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 524724 em 22/03/2021 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 210031603 - 19/03/2021. Autenticação: C3F50F83F3102B37CAB3579AE82D5056701F7E88. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/003.160-3 e o código de segurança mWS2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 199
Rúbrica

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 38.080.939/0001-86

LUCAS MAGALHÃES BRIGLIA, brasileiro, solteiro, nascido em 07/06/1994, empresário, portador do CPF 016.228.392-00 e RG 361962-1 SSP/RR, residente e domiciliado na cidade de Santa Cecilia – RR, na rua Dalva de Oliveira, S/N, bairro/distrito Santa Cecilia, município de Cantá-RR, CEP: 69.390-000, único sócio da empresa **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA**, situada na TRAVESSA DALVA DE OLIVEIRA, número S/N, bairro / distrito SANTA CECILIA, município CANTA - RR, CEP 69.390-000, inscrito na Junta Comercial do Estado de Roraima sob o **NIRE 14200137184** e no **CNPJ** sob **nº 38.080.939/0001-86**, resolve, na melhor forma alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Promove alteração de endereço, que passa a ser na **rua Dalva de Oliveira, Nº 906, bairro/distrito Santa Cecilia, CEP 69.395-000, Cantá - Roraima**. (**art. 997, II, CC/2002**).

CLÁUSULA SEGUNDA – Promove a alteração das Atividades Econômicas para:

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21 -5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22 -3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 524724 em 22/03/2021 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 210031603 - 19/03/2021. Autenticação: C3F56F83F3102B37CAB3579AE82D5056701F7E88. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/003.160-3 e o código de segurança mWS2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI -
Fls. 200
Rúbrica

condicionamento associada
46.44 -3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45 -1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.61 -3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62 -1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.63 -0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64 -8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65 -6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9529-1/02 – Chaveiros

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto da sociedade passa a ser a exploração de:

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO IMPRESSAO SOB ENCOMENDA CARDAPIOS, DIPLOMAS, CONVITES MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MOBILIARIO ESPECIFICO PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO INSTALACAO DE

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 524724 em 22/03/2021 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 210031603 - 19/03/2021. Autenticação: C3F56F83F3102B37CAB3579AE82D5056701F7E88. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/003.160-3 e o código de segurança mWS2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU -
Fls. 201
Rúbrica

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OBRAS DE SERVICO DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE ALVENARIA COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOES NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL COMERCIO ATACADISTA DE COMPLEMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADORES DE AR PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA ATIVIDADES DE CONTABILIDADE SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO ATIVIDADES DE PRODUCAO MUSICAL, ISTO E, DE PRODUCAO E PROMOCAO DE BANDAS, GRUPOS MUSICAIS, ORQUESTRAS E COMPANHIAS MUSICAIS, DE CONCERTOS E OPERAS PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA CHAVEIROS SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS.

CLÁUSULA QUARTA – Em virtude das alterações havidas fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 524724 em 22/03/2021 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 210031603 - 19/03/2021. Autenticação: C3F56F83F3102B37CAB3579AE82D5056701F7E88. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/003.160-3 e o código de segurança mWS2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 202
Rúbrica

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Á vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social nos termos do novo Código Civil, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA** e tendo como nome fantasia **LMB EMPREENDIMENTOS**, com sede e domicílio na rua Dalva de Oliveira, número 906, bairro/distrito Santa Cecilia, município Cantá/RR, CEP 69.395-000, registrada na Junta Comercial, sob o **NIRE 14200137184** e inscrita no **CNPJ** sob o **nº 38.080.939/0001-86**. (**Art. 997, II, CC/2002**).

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social é R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País. (**Art. 997, III, CC/2002**) (**Art. 1.055, CC/2002**).

Sócio	Nº de Quotas	Percentual %	Valor R$
LUCAS MAGALHÃES BRIGLIA	50.000	100,00	50.000,00
TOTAL	**50.000**	**100,00**	**50.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – Desde sua constituição, a empresa é uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, considerando a disposição constante dos parágrafos 1° e 2° do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº81, de 10 de junho de 2020.

CLÁUSULA QUARTA- As atividades econômicas é:

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21 -5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22 -3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 524724 em 22/03/2021 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 210031603 - 19/03/2021. Autenticação: C3F56F83F3102B37CAB3579AE82D5056701F7E88. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/003.160-3 e o código de segurança mWS2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU -
Fls. 103
Rúbrica

45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.44 -3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45 -1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.61 -3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62 -1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.63 -0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64 -8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65 -6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9529-1/02 – Chaveiros

CLÁUSULA QUINTA - O objeto social da empresa é:

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 524724 em 22/03/2021 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 210031603 - 19/03/2021. Autenticação: C3F56F83F3102B37CAB3579AE82D5056701F7E88. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/003.160-3 e o código de segurança mWS2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 209
Rúbrica

ROUPAS PROFISSIONAIS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO IMPRESSAO SOB ENCOMENDA CARDAPIOS, DIPLOMAS, CONVITES MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MOBILIARIO ESPECIFICO PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OBRAS DE SERVICO DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE ALVENARIA COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOES NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL COMERCIO ATACADISTA DE COMPLEMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADORES DE AR PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA ATIVIDADES DE CONTABILIDADE SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO ATIVIDADES DE PRODUCAO MUSICAL, ISTO E, DE PRODUCAO E PROMOCAO DE BANDAS, GRUPOS MUSICAIS, ORQUESTRAS E COMPANHIAS MUSICAIS, DE CONCERTOS E OPERAS PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA CHAVEIROS SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS.

CLÁUSULA SEXTA – A sociedade iniciou suas atividades em 10/08/2020 e seu prazo de duração é indeterminado. (**Art. 997, II, CC/2002**)

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 524724 em 22/03/2021 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 210031603 - 19/03/2021. Autenticação: C3F56F83F3102B37CAB3579AE82D5056701F7E88. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/003.160-3 e o código de segurança mWS2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO-GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 205
Rúbrica

CLÁUSULA SÉTIMA – As cotas são indivisíveis em relação a sociedade, mas poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente a terceiros, por interesse do sócio único.

CLÁUSULA OITAVA - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas. (**Art. 1.052, CC/2002**)

CLÁUSULA NONA – A administração da sociedade será exercida pelo sócio, **LUCAS MAGALHÃES BRIGLIA**, com os poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(Art. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).**

CLÁUSULA DÉCIMA – O Exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando serão procedidos o levantamento do Balanço Patrimonial e a apuração de resultados, em conformidade com as disposições legais pertinentes. Os Lucros ou Prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelo sócio único. Poderão ser levantados Balanços intermediários, sendo que o seu resultado terá como destino o decidido pelo sócio único.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – As deliberações do sócio único serão refletidas em documento escrito, particular ou público, subscrito pelo próprio sócio ou por procurador com poderes específicos, nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, conforme **Art. 1.078 do CC**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Parágrafo Único - DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICRO EMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio único.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O sócio único na administração da sociedade poderá ter uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será fixado periodicamente, de acordo com a capacidade financeira da empresa

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – falecendo ou interditado o sócio único, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**Art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1°, CC/2002**)

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - **Fica eleito o foro de Cantá/RR,** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 524724 em 22/03/2021 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 210031603 - 19/03/2021. Autenticação: C3F56F83F3102B37CAB3579AE82D5056701F7E88. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/003.160-3 e o código de segurança mWS2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 206
Rúbrica

E, estando o sócio justo e contratado, assina o presente instrumento.

Cantá/RR, 22 de março de 2021.

LUCAS MAGALHÃES BRIGLIA
Sócio administrador

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 524724 em 22/03/2021 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 210031603 - 19/03/2021. Autenticação: C3F56F83F3102B37CAB3579AE82D5056701F7E88. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/003.160-3 e o código de segurança mWS2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 207 Rúbrica

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/003.160-3	RRP2100006730	19/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
016.228.392-00	LUCAS MAGALHAES BRIGLIA

Junta Comercial do Estado de Roraima

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 524724 em 22/03/2021 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 210031603 - 19/03/2021. Autenticação: C3F56F83F3102B37CAB3579AE82D5056701F7E88. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/003.160-3 e o código de segurança mWS2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 208
Rúbrica

Eu, LUCAS MAGALHAES BRIGLIA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 07/06/1994, RG Nº 3619621 SSP-RR, CPF 016.228.392-00, RUA DALVA DE OLIVEIRA, Nº 906, BAIRRO SANTA CECILIA, CEP 69395-000, CANTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Canta, 22 de março de 2021.

LUCAS MAGALHAES BRIGLIA
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 524724 em 22/03/2021 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 210031603 - 19/03/2021. Autenticação: C3F56F83F3102B37CAB3579AE82D5056701F7E88. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/003.160-3 e o código de segurança mWS2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 209
Rúbrica

Junta Comercial do Estado de Roraima

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, de CNPJ 38.080.939/0001-86 e protocolado sob o número 21/003.160-3 em 19/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 524724, em 22/03/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Eduardo Vitor Pereira Barbosa.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Marcos de Meira Lins Filho. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
016.228.392-00	LUCAS MAGALHAES BRIGLIA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
016.228.392-00	LUCAS MAGALHAES BRIGLIA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
016.228.392-00	LUCAS MAGALHAES BRIGLIA

Boa Vista, segunda-feira, 22 de março de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Eduardo Vitor Pereira Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 22/03/2021, às 10:59 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 21/003.160-3.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 210 Rúbrica

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
664.933.154-68	MARCOS DE MEIRA LINS FILHO

Boa Vista, segunda-feira, 22 de março de 2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 524724 em 22/03/2021 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 210031603 - 19/03/2021. Autenticação: C3F56F83F3102B37CAB3579AE82D5056701F7E88. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/003.160-3 e o código de segurança mWS2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 211
Rúbrica

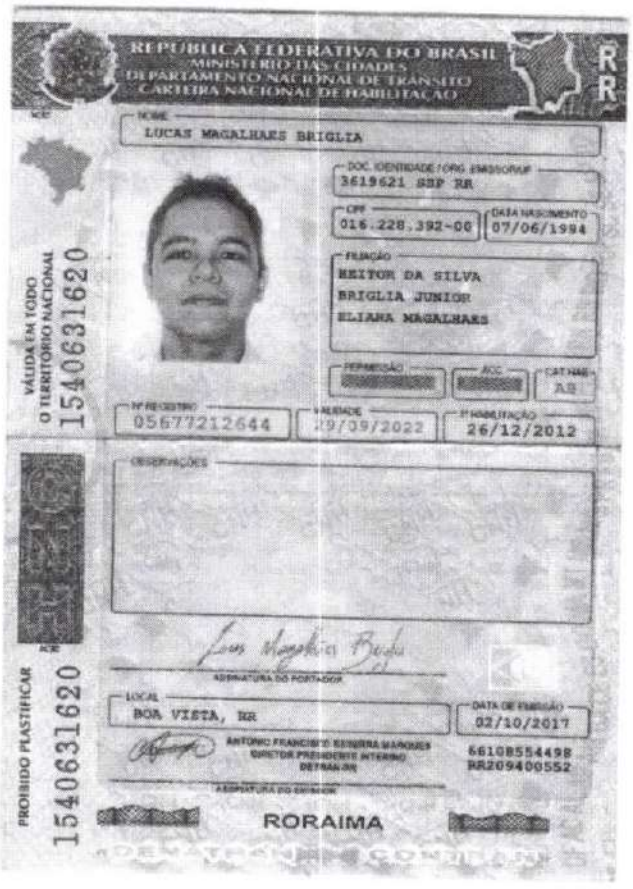
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
RR
NOME
LUCAS MAGALHAES BRIGLIA
DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
3619621 SSP RR
CPF
016.228.392-00
DATA NASCIMENTO
07/06/1984
FILIAÇÃO
HEITOR DA SILVA
BRIGLIA JUNIOR
ELIANA MAGALHAES
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB
Nº REGISTRO
05677212644
VALIDADE
29/09/2022
1ª HABILITAÇÃO
26/12/2012
OBSERVAÇÕES
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
BOA VISTA, RR
DATA DE EMISSÃO
02/10/2017
ANTONIO FRANCISCO TEIXEIRA MARQUES
DIRETOR PRESIDENTE INTERINO
DETRAN-RR
66108554498
RR209400552
ASSINATURA DO EMISSOR
RORAIMA
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1540631620
PROIBIDO PLASTIFICAR
1540631620

Confere com Original

Sandro da Silva Mafra
Presidente da CPL
Portaria nº 003A/2022

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU - Fls. 212 Rúbrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.080.939/0001-86 **MATRIZ**		**13/08/2020**

NOME EMPRESARIAL
L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LMB EMPREENDIMENTOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DALVA DE OLIVEIRA	**906**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.395-000	**SANTA CECILIA**	**CANTA**	**RR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LMBEMPREENDIMENTOS.RR@GMAIL.COM	**(95) 9165-4121**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/08/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/10/2022** às **14:33:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 213
Rúbrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.080.939/0001-86 **MATRIZ**		**13/08/2020**

NOME EMPRESARIAL
L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DALVA DE OLIVEIRA	**906**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.395-000	**SANTA CECILIA**	**CANTA**	**RR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LMBEMPREENDIMENTOS.RR@GMAIL.COM	**(95) 9165-4121**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/08/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/10/2022** às **14:33:01** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 214
Rúbrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.080.939/0001-86 **MATRIZ**		**13/08/2020**

NOME EMPRESARIAL
L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DALVA DE OLIVEIRA	**906**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.395-000	**SANTA CECILIA**	**CANTA**	**RR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LMBEMPREENDIMENTOS.RR@GMAIL.COM	**(95) 9165-4121**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/08/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/10/2022** às **14:33:01** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 215 Rúbrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.080.939/0001-86 **MATRIZ**		**13/08/2020**

NOME EMPRESARIAL
L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
95.29-1-02 - Chaveiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DALVA DE OLIVEIRA	**906**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.395-000	**SANTA CECILIA**	**CANTA**	**RR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LMBEMPREENDIMENTOS.RR@GMAIL.COM	**(95) 9165-4121**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/08/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/10/2022** às **14:33:01** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 216
Rúbrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.080.939/0001-86
Razão Social: L M B EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: TV DALVA DE OLIVEIRA SN / SANTA CECILIA / CANTA / RR / 69390-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/10/2022 a 10/11/2022

Certificação Número: 2022101204003423287290

Informação obtida em 18/10/2022 14:35:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 217
Rúbrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.080.939/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:17:32 do dia 06/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/04/2023.
Código de controle da certidão: **C76D.A906.3041.21BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 218
Rúbrica

Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"

CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND

CGF/CPF/CNPJ	Nome / Razão Social
38.080.939/0001-86	L M B EMPREENDIMENTOS LTDA

É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria SEFAZ/GAB n° 367/2011 publicada no D.O.E n° 1562 do dia 08/06/2011.

Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Data de emissão: 06/10/2022 **Validade:** 04/01/2023

A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de resposabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaría de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, no endereço: https://www.sefaz.rr.gov.br/

Código de Autenticação: 014494

As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Cantá
SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AV RENATO COSTA DE ALMEIDA, 100
CENTRO - CANTÁ - RR CEP: 69390-000
CNPJ: 01.612.682/0001-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 219
Rúbrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000037/2022

Nome/Razão Social: **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **LMB EMPREENDIMENTOS**
Inscrição Municipal: **11441** CPF/CNPJ: **38.080.939/0001-86**
Endereço: **TRA DALVA DE OLIVEIRA, 906**
SANTA CECILIA - CANTÁ - RR 69390000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

****
****
****
****

Esta certidão foi emitida em **13/09/2022** com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **12/12/2022**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **4100008426**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://canta.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 06/10/2022 às 11:36:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 220
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.080.939/0001-86
Certidão nº: 33746985/2022
Expedição: 06/10/2022, às 12:45:10
Validade: 04/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.080.939/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 221
Rúbrica

Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências

(Primeira e Segunda Instâncias)

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima CERTIFICA que, revendo os registros de Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências, nas comarcas deste Estado, até a presente data, NADA CONSTA contra:

NOME: L M B EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 38.080.939/0001-86

OBSERVAÇÕES:
1) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Portaria Presidencial nº 493, do dia 09 de abril de 2014;
2) A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
3) A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;
4) As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça de Roraima, e, ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
5) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RR, pelo endereço http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa, informando o número de autenticidade abaixo.
6) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 2 (dois)anos após a sua expedição.

Número de Autenticidade: 014152345602
Emitida gratuitamente pela internet em: 06/10/2022 as 11:34
Data da última atualização da base de dados: 04/10/2022 as 00:26
Válida até o dia: 05/12/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CREA-RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU -
Fls. 222
Rúbrica

Nº 506906/2022
Emissão: 20/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 578x8

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Roraima - CREA-RR, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 38.080.939/0001-86

Registro: 0001155482

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 50.000,00

Data do Capital: 13/08/2020

Faixa: 1

Objetivo Social: Atividades que a empresa pode desenvolver na modalidade Civil, comparando os objetivos sociais da mesma conforme o INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA e atribuições da profissional Eng. Civ. ARIANE AMORIM como responsável técnica sendo: - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, respeitados os limites de sua formação conforme ART. 7º e 25 DA RESOLUÇÃO N.º 218/73 do CONFEA, com restrições em AEROPORTOS; DIQUES; FERROVIAS; IRRIGAÇÃO; BARRAGENS; E CONCRETO PROTENDIDO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA DALVA DE OLIVEIRA, 906, SANTA CECILIA, CANTÁ, RR, 69395000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/02/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000115574DDRR

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ARIANE AMORIM

Registro: 0918435650

CPF: 515.485.772-00

Data Início: 02/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO, NO QUE DIZ RESPEITO DAS ATIVIDADES DE 01 A 18 DO ART. 1º DESTA RESOLUÇÃO, REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO; PORTOS, RIOS, CANAIS; DRENAGEM; PONTES E GRANDES ESTRUTURAS; SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: 578x8
Impresso em: 20/06/2022 às 11:11:34 por: adapt, ip: 177.209.184.146

LMB
EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 223
Rúbrica

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Tomada de Preço Nº 008/2022
Processo Licitatório Nº 130/2022

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO ÁGUIDA KASA WAI-COMUNIDADE WILLIMOM.

A empresa **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, CNPJ nº 38.080.939/0001-86, estabelecia na Rua Dalva de Oliveira, nº 906. Santa Cecilia, Cantá/RR – CEP: 69.390-000 – Tel. (95) 99165-4121 e e-mail: lmbempreendimentos.rr@gmail.com, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Lucas Magalhães Briglia**, portador da carteira de identidade RG 361962-1 SSP/RR e CPF 016.228.392-00, residente e domiciliado na rua Dalva de Oliveira, nº 906, Santa Cecilia, Cantá-RR, CEP: 69.395-000, para os devidos fins que na presente data a mesma se encontra enquadrada nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 de 14/12/2006, que trata do Regime das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estando apta portanto a sua participação no processo nº 130/2022 tomada de preço n° 008/2022, junto ao Município de Uiramutã. Por ser verdade, firma a presente.

Uiramutã-RR, 21 de outubro de 2022.

LUCAS MAGALHÃES BRIGLIA
Sócio – Administrador
RG: 361962-1 SSP/RR

Lucas Magalhães Briglia
CPF: 016.228.392-00
Sócio-Administrador

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fls 0224
Rubrica

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC Nº 025/2022

VALIDADE: 28/07/2023

RAZÃO SOCIAL: L.M.B. EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.080.939/0001-86 **INSCRIÇÃO ESTADUAL: 24.039710-8** **INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11441**
ENDEREÇO: R DALVA DE OLIVEIRA NR 906 / SANTA CECILIA / CANTÁ / RR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

CÓDICO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: **14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.**

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 95.29-1-02 – Chaveiros .

Uiramutã/RR, 28 de julho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RORAIMA - Fls. 09 - Rubrica

Sandro da Silva Mafra
Presidente da CPL
Portaria nº 003A/2022

Confere com Original

Sandro da Silva Mafra
Presidente da CPL
Portaria nº 003A/2022

Sandro da Silva Mafra
Presidente da CPL

CERTIFICO QUE A EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA CPL DE UIRAMUTÃ/RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA
Fls. 223
Rubrica

ENVELOPE Nº 01 – "DOC

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022 – F
Razão Social: L. M. B. EMPREENDIMI
Rua Dalva de Oliveira, nº 906, Santa C
Tel. (95) 99165-4121 e e-mail: lmbemp

L. M. B. EMPI
CNPJ 3

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 226
Rúbrica

COMPROVANTE DE RETIRADO DE EDITAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL

RECIBO DO ENTREGA DE TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

Razão Social: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 38.080.939/0001-86

Endereço: RUA DALVA DE OLIVEIRA, Nº 906

Cidade: CANTÁ **Estado:** RORAIMA **Telefone:** _____

Fone: (95) 99169-4129

Pessoa para contato: LUCAS BRIGLIA

Recebemos, através da Comissão Permanente de Licitação do Município de Uiramutã, cópia do instrumento convocatório acima identificado e todos os seus anexos.

Data: ____/____/____

Assinatura.: _____

38.080.939/0001-86
L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua: Dalva de Oliveira, Nº 906 - Santa Cecília
CEP 69.358-000
Cantá - RR

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente - CPL/PMUI

001

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU - Fls. 228 Rúbrica

Nº 506906/2022
Emissão: 20/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 578x8

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Roraima - CREA-RR, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 38.080.939/0001-86

Registro: 0001155482

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 50.000,00

Data do Capital: 13/08/2020

Faixa: 1

Objetivo Social: Atividades que a empresa pode desenvolver na modalidade Civil, comparando os objetivos sociais da mesma conforme o INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA e atribuições da profissional Eng. Civ. ARIANE AMORIM como responsável técnica sendo: - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, respeitados os limites de sua formação conforme ART. 7º e 25 DA RESOLUÇÃO N.º 218/73 do CONFEA, com restrições em AEROPORTOS; DIQUES; FERROVIAS; IRRIGAÇÃO; BARRAGENS; E CONCRETO PROTENDIDO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA DALVA DE OLIVEIRA, 906, SANTA CECILIA, CANTÁ, RR, 69395000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/02/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000115574DDRR

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ARIANE AMORIM

Registro: 0918435650

CPF: 515.485.772-00

Data Início: 02/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO, NO QUE DIZ RESPEITO DAS ATIVIDADES DE 01 A 18 DO ART. 1º DESTA RESOLUÇÃO, REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO; PORTOS, RIOS, CANAIS; DRENAGEM; PONTES E GRANDES ESTRUTURAS; SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: 578x8
Impresso em: 20/06/2022 às 11:11:34 por: adapt, ip: 177.209.184.146

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CREA-RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU - Rúbrica

Nº 506125/2022
Emissão: 01/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 1Zx2B

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-RR.

Interessado(a)

Profissional: ARIANE AMORIM

Registro: 0918435650

CPF: 515.485.772-00

Endereço: RUA Rua Cisne, 44, Casa, Cidade Satélite, BOA VISTA, RR, 69317496

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/03/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO, NO QUE DIZ RESPEITO DAS ATIVIDADES DE 01 A 18 DO ART. 1º DESTA RESOLUÇÃO, REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO; PORTOS, RIOS, CANAIS; DRENAGEM; PONTES E GRANDES ESTRUTURAS; SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS.

Restrições: AEROPORTOS; DIQUES; FERROVIAS; IRRIGAÇÃO; BARRAGENS; E CONCRETO PROTENDIDO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

Data de Formação: 23/01/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CYNARA DE FREITAS SANTOS POSSEBON LTDA

Registro: 0000001018

CNPJ: 06.144.995/0001-40

Data Início: 23/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0001155482

CNPJ: 38.080.939/0001-86

Data Início: 02/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CREA-RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 229
Rubrica

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

507327/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo Técnico do profissional **ARIANE AMORIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARIANE AMORIM**
Registro: **0918435650RR** RNP: **0918435650**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **RR20220096024** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/02/2022 Baixada em: 29/07/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ - RR** CPF/CNPJ: **01.612.681/0001-01**
Endereço do contratante: RUA Cici Mota Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: UIRAMUTÃ UF: RR CEP: 69358000
Contrato: 026/2022 Celebrado em: 11/02/2022
Valor do contrato: R$ 326.191,03 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: VILA COMUNIDADE CARAPARU IV Nº: CARAPARU 04
Complemento: Bairro: CARAPARU IV
Cidade: UIRAMUTÃ UF: RR CEP: 69358000
Data de início: 21/02/2022 Conclusão efetiva: 21/05/2022
Finalidade: Rural
Proprietário: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ - RR CPF/CNPJ: 01.612.681/0001-01

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 342.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 342.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 52 - Execução de reforma 342.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 342.00 metro quadrado;

Observações

ART para reforma de escola em área indígena em região do Uiramutã.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 507327/2022
03/08/2022, 13:13
36B6a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: 36B6a

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI - Fls. 230 Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRMUTÃ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBJETO:

Serviço e Reforma e Revitalização da Escola Municipal Domingos Dias - Comunidade Caraparu IV- Uiramuta / RR

PRAZO CONTRATUAL: 90 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO

VALOR DA OBRA: 326.191,03 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS).

Declaramos por meio deste e para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.
Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os projetos, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória, conforme contido nos autos do Processo Administrativo nº 085/2021, na modalidade Carta Convite Contrato nº026/2021, Recurso Próprio.

CONTRATANTE EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	CNPJ:	01.612.681/0001-01
ENDEREÇO:	RUA CICI MOTA, S/N, S/N, CENTRO, UIRAMUTÃ-RR, CEP 69.358-970.		

CONTRATO	
OBJETO:	SERVIÇO E REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS DIAS - COMUNIDADE CARAPARU IV- UIRAMUTA / RR
LOCAL:	COMUNIDADE CARAPARU IV- UIRAMUTA / RR, CEP 69.358-970.
PERÍODO:	DATA DE INÍCIO: 21/02/2022 PREVISÃO DE TÉRMINO: 21/05/2022

CONTRATADO			
NOME/RAZÃO SOCIAL:	L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ:	38.080.939/0001-86
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ENGª. CIVIL ARIANE AMORIM	CREA:	0918435650
ART EXECUÇÃO:	RR20220096024		

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**Administração**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
2			**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**		
2.1	3126	ORSE	Fornecimento de alimentação (quentinha) a pessoal direto de obra	un	1.182,00
2.2	62	ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00
2.3	9203	ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	21.290,35
2.4	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	20.968,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 507327/2022, emitida em 03/08/2022

Certidão nº 507327/2022
03/08/2022, 14:15
Chave de Impressão: 36B6a
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2022 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 231
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRMUTÃ

2.5	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	3,60
2.7	4740	ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	90,45
3			**REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO**		
3.1	97647	SINAPI	35% de REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	136,00
3.2	97650	SINAPI	35% REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	136,00
3.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISCO COM REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	310,51
3.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO PAREDE CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	46,20
3.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	38,00
3.6	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7,00
3.7	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	44,00
3.8	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	310,51
4			**COBERTURA e FORRO**		
4.1	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	136,00
4.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	136,00
4.3	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	310,51
4.4	94451	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	26,00
4.5	3964	ORSE	Imunização de superficies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar	m²	425,02
5			**INSTALAÇÕES E ACESSÓRIOS**		
5.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44,00
5.2	97594	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	38,00
5.3	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
5.4	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
5.5	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 507327/2022, emitida em 03/08/2022

Certidão nº 507327/2022
03/08/2022, 14:15
Chave de Impressão: 36B6a
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2022 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI -
Fls. 232
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRMUTÃ

			INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
5.6	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
5.7	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
5.8	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
5.9	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
5.10	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
6			**ESQUADRIAS E METAIS**		
6.1	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
6.2	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
6.3	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.AF_09/2020	M	35,10
7			**ALVENARIA, PISO, REVESTIMENTO E CALÇADAS**		
7.1	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	310,51
7.2	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	114,54
7.3	87561	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	33,86
7.4	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	67,73
7.5	87747	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	310,51
8			**PINTURA**		
8.1	102227	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	104,40
8.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	67,13
8.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	m²	720,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 507327/2022, emitida em 03/08/2022

Certidão nº 507327/2022
03/08/2022, 14:15
Chave de Impressão: 36B6a
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2022 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 233
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRMUTÃ

			ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		
8.4	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	720,00
9			**DIVERSOS**		
9.1	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00
9.2	00010851	SINAPI	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	7,00
9.3	CPU 01 PMU EMI	Próprio	Kit de Energia Fotovoltaica para 01 Unidade (Escola), Contendo 30 Lâmpadas de 20w, 01 Geladeira de 250w	Un	1,00
9.4	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	315,12

Era o que tínhamos a atestar.

Uiramutã-RR, 28 de julho de 2022

Engº Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA-RR nº 0905404068
Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR
Portaria nº230, 01/07/2021

SILVÂNIO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos
Portaria Nº. 004/2021

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 507327/2022, emitida em 03/08/2022

Certidão nº 507327/2022
03/08/2022, 14:15
Chave de Impressão: 36B6a
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2022 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR

Impresso em: 03/08/2022, às 14:15.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 234
Rubrica

Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências

(Primeira e Segunda Instâncias)

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima CERTIFICA que, revendo os registros de Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências, nas comarcas deste Estado, até a presente data, NADA CONSTA contra:

NOME: L M B EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 38.080.939/0001-86

OBSERVAÇÕES:
1) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Portaria Presidencial nº 493, do dia 09 de abril de 2014;
2) A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
3) A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;
4) As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça de Roraima, e, ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
5) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RR, pelo endereço http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa, informando o número de autenticidade abaixo.
6) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 2 (dois)anos após a sua expedição.

Número de Autenticidade: 014152345602

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/10/2022 as 11:34

Data da última atualização da base de dados: 04/10/2022 as 00:26

Válida até o dia: 05/12/2022

009

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 235 Rúbrica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
14200137184	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Roraima

Nome: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RRE2200074313

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

CANTA
Local

22 Junho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/____ _____ Responsável
Data

☐ NÃO ___/___/____ _____ Responsável
Data

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/____ _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal
Data

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 543135 em 22/06/2022 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 220073856 - 21/06/2022. Autenticação: 165B5EDC33C91A8ACE541FFED1C3797165A1E25. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/007.385-6 e o código de segurança gsbg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Roraima

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 236
Rúbrica

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/007.385-6	RRE2200074313	21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.798.822-85	HERIK K. B. DE ASSUNCAO	22/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

016.228.392-00	LUCAS MAGALHAES BRIGLIA	22/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 543135 em 22/06/2022 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 220073856 - 21/06/2022. Autenticação: 165B5EDC33C91A8ACE541FFED1C3797165A1E25. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/007.385-6 e o código de segurança gsbg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 237
Rúbrica

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA					
NIRE:	1420013718-4	CNPJ:	38.080.939/0001-86	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CANTA			UF:	RORAIMA
Inscrição	240397108		Inscrição Municipal:		11441
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			13/08/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	19
Data	21/06/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
015.798.822-85	HERIK K. B. DE ASSUNCAO	Contador	RR-1982/O
016.228.392-00	LUCAS MAGALHAES BRIGLIA	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/007.345-7 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 238
Rúbrica

Balanço Patrimonial 2021

Empresa: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.080.939/0001-86
Endereço: R DALVA DE OLIVEIRA, Complemento: , N.º: 906,
Bairro: SANTA CECILIA, Cidade: Cantá, Estado: RR, CEP: 69395000, Telefone: (95) 91654121
NIRE: 14200137184 - Data: 13/08/2020

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	120.425,66 D
11	Ativo Circulante	120.425,66 D
111	Disponível	67.781,66 D
11101	Caixa Geral	67.781,66 D
11101.0001	Caixa	67.781,66 D
113	Clientes	52.644,00 D
11301	Duplicatas a Receber	52.644,00 D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	52.644,00 D
Total Ativo		120.425,66 D
2	*** Passivo ***	120.425,66 C
21	Passivo Circulante	5.458,64 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	3.158,64 C
21301	Impostos e Contribuições	3.158,64 C
21301.0010	Simples a Recolher	3.158,64 C
216	Outras Obrigações	2.300,00 C
21601	Outras Obrigações	2.300,00 C
21601.0011	Internet a Pagar	200,00 C
21601.0012	Energia a Pagar	500,00 C
21601.0013	Consumo Água a Pagar	100,00 C
21601.0015	Alugueis a Pagar	1.500,00 C
24	Patrimônio Liquido	114.967,02 C
241	Capital Social Integralizado	50.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	50.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	50.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	64.967,02 C
24301	Lucros Acumulados	64.967,02 C
24301.0001	Lucros Acumulados	64.967,02 C
Total Passivo		120.425,66 C

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 120.425,66 (Cento e Vinte Mil Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos) .

Cantá-RR, 31 de Dezembro de 2021

LUCAS MAGALHÃES BRIGLIA
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 016.228.392-00

HERIK K. B. DE ASSUNÇÃO
CONTADOR CRC: RR-1982/O
CPF: 015.798.822-85

Fim

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 543135 em 22/06/2022 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 220073856 - 21/06/2022. Autenticação: 165B5EDC33C91A8ACE541FFED1C3797165A1E25. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/007.385-6 e o código de segurança gsbg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 239
Rúbrica

Demonstração do Resultado do Exercício 2021

Fortes Contábil

Empresa: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.080.939/0001-86
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: R DALVA DE OLIVEIRA, Complemento: , N.º: 906,
Bairro: SANTA CECILIA, Cidade: Cantá, Estado: RR, CEP: 69395000, Telefone: (95) 91654121

Conta		Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+)	010	Receita Bruta Operacional	288.641,00
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	288.641,00
	010.01.02	Vendas de Mercadorias	98.803,00
	41103	Vendas de Mercadorias	98.803,00
	41103.0003	Venda de Mercadorias	98.803,00
	010.01.03	Vendas de Serviços	189.838,00
	41105	Vendas de Serviços	189.838,00
	41105.0001	Vendas de Serviços	189.838,00
(-)	020	Deduções da Receita	17.313,46
	020.01	Impostos Faturados	17.313,46
	020.01.05	Simples	17.313,46
	31101.0005	Simples	17.313,46
(=)	030	Receita Liquida	271.327,54
(=)	060	Lucro Bruto	271.327,54
(-)	070	Despesas Operacionais	29.900,00
	070.02	Despesas Administrativas	29.900,00
	342	Despesas Administrativas	29.900,00
	34201	Despesas Administrativas	29.900,00
	34201.0011	Alugueis	19.500,00
	34201.0013	Energia Elétrica	6.500,00
	34201.0014	Água	1.300,00
	34201.0015	Internet	2.600,00
(=)	110	Lucro Operacional	241.427,54
(-)	140	Despesas Não Operacionais	162.060,52
	35	Despesas Não Operacionais	162.060,52
	351	Despesas Não Operacionais	162.060,52
	35101	Despesas Não Operacionais	162.060,52
	35101.0007	Adiantamentos a Terceiros	162.060,52
(=)	150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	79.367,02
(=)	180	Res. Antes das Participações e Contrib.	79.367,02
(=)	200	Resultado Liquido do Exercício	79.367,02

Cantá-RR, 31 de Dezembro de 2021

LUCAS MAGALHÃES BRIGLIA
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 016.228.392-00

HERIK K. B. DE ASSUNÇÃO
CONTADOR CRC: RR-1982/O
CPF: 015.798.822-85

Fim

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 543135 em 22/06/2022 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 220073856 - 21/06/2022. Autenticação: 165B5EDC33C91A8ACE541FFED1C3797165A1E25. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/007.385-6 e o código de segurança gsbg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

014

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 240
Rúbrica

Análise pelos Índices do Balanço

Fortes Contábil

Empresa: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.080.939/0001-86
Mês/Ano: 12/2021
Endereço: R DALVA DE OLIVEIRA, Complemento: , N.º: 906,
Bairro: SANTA CECILIA, Cidade: Cantá, Estado: RR, CEP: 69395000, Telefone: (95) 91654121

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
IEG	Indice de Endividamento Geral (5.458,64 + 0,00)/ 120.425,66 Quanto menor melhor.	(c21+c22)/c1	0,05
ISG	Indice de Solvencia Geral 120.425,66 / 5.458,64 Quanto maior melhor.	c1/c21	22,06
LC	Liquidez Corrente 120.425,66 / 5.458,64 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	22,06
LG	Liquidez Geral (120.425,66 + 0,00)/(5.458,64 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c11+c12)/(c21+c22)	22,06

Cantá-RR, 31 de Dezembro de 2021

LUCAS MAGALHÃES BRIGLIA
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 016.228.392-00

HERIK K. B. DE ASSUNÇÃO
CONTADOR CRC: RR-1982/O
CPF: 015.798.822-85

Fim

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 543135 em 22/06/2022 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 220073856 - 21/06/2022. Autenticação: 165B5EDC33C91A8ACE541FFED1C3797165A1E25. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/007.385-6 e o código de segurança gsbg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

015

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 241
Rúbrica

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA					
NIRE:	1420013718-4	CNPJ:	38.080.939/0001-86	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CANTA			UF:	RORAIMA
Inscrição	240397108		Inscrição Municipal:		11441
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			13/08/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	21/06/2022
Quantidade de páginas:	19		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
015.798.822-85	HERIK K. B. DE ASSUNCAO	Contador	RR-1982/O
016.228.392-00	LUCAS MAGALHAES BRIGLIA	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/007.345-7 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

016

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 242
Rúbrica

DECLARACAO

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.
B - As informações foram extraídas das folhas nº 16 a 18 do Livro Diário nº 2, registrado na Junta Comercial do Estado de Roraima, sob nº 20005396 em 21/06/2022.
C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Cantá-RR, 22 de Junho de 2022

LUCAS MAGALHÃES BRIGLIA
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 016.228.392-00

HERIK K. B. DE ASSUNÇÃO
CONTADOR CRC: RR-1982/O
CPF: 015.798.822-85

Fim

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 543135 em 22/06/2022 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 220073856 - 21/06/2022. Autenticação: 165B5EDC33C91A8ACE541FFED1C3797165A1E25. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/007.385-6 e o código de segurança gsbg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

017

Junta Comercial do Estado de Roraima

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 243
Rúbrica

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/007.385-6	RRE2200074313	21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.798.822-85	HERIK K. B. DE ASSUNCAO	22/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

016.228.392-00	LUCAS MAGALHAES BRIGLIA	22/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 543135 em 22/06/2022 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 220073856 - 21/06/2022. Autenticação: 165B5EDC33C91A8ACE541FFED1C3797165A1E25. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/007.385-6 e o código de segurança gsbg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO GERAL

018

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 2424 Rúbrica

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, LUCAS MAGALHAES BRIGLIA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 07/06/1994, RG Nº 3619621 SSP-RR, CPF 016.228.392-00, RUA DALVA DE OLIVEIRA, Nº SN, BAIRRO SANTA CECILIA, CEP 69390-000, CANTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 22 de junho de 2022.

LUCAS MAGALHAES BRIGLIA
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 543135 em 22/06/2022 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 220073856 - 21/06/2022. Autenticação: 165B5EDC33C91A8ACE541FFED1C3797165A1E25. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/007.385-6 e o código de segurança gsbg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO GERAL

029

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 246
Rúbrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, de CNPJ 38.080.939/0001-86 e protocolado sob o número 22/007.385-6 em 21/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 543135, em 22/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fyama Maria Pimentel Barreiros.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, MARCOS DE MEIRA LINS FILHO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.228.392-00	LUCAS MAGALHAES BRIGLIA	22/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
015.798.822-85	HERIK K. B. DE ASSUNCAO	22/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.228.392-00	LUCAS MAGALHAES BRIGLIA	22/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
015.798.822-85	HERIK K. B. DE ASSUNCAO	22/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.228.392-00	LUCAS MAGALHAES BRIGLIA	22/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/06/2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 22/007.385-6.

Junta Comercial do Estado de Roraima

020

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 246
Rúbrica

Junta Comercial do Estado de Roraima

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Fyama Maria Pimentel Barreiros, Servidor(a) Público(a), em 22/06/2022, às 10:04.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 22/007.385-6.

Junta Comercial do Estado de Roraima

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU -
Fls. 247
Rúbrica

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
664.933.154-68	MARCOS DE MEIRA LINS FILHO

Boa Vista. quarta-feira, 22 de junho de 2022

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 543135 em 22/06/2022 da Empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38080939000186 e protocolo 220073856 - 21/06/2022. Autenticação: 165B5EDC33C91A8ACE541FFED1C3797165A1E25. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/007.385-6 e o código de segurança gsbg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.

022

Fls. ____
Rúbrica

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 95.29-1-02 – Chaveiros .

Uiramutã/RR, 28 de julho de 2022

Sandro da Silva Mafra
Presidente da CPL
Portaria nº 003A/2022

Confere com Original

Sandro da Silva Mafra
Presidente da CPL
Portaria nº 003A/2022

Sandro da Silva Mafra
Presidente da CPL

CERTIFICO QUE A EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA CPL DE UIRAMUTÃ/RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 218
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC Nº 025/2022

VALIDADE: 28/07/2023

RAZÃO SOCIAL: L.M.B. EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.080.939/0001-86 **INSCRIÇÃO ESTADUAL: 24.039710-8** **INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11441**
ENDEREÇO: R DALVA DE OLIVEIRA NR 906 / SANTA CECILIA / CANTÁ / RR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

CÓDICO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: **14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.**

LMB
EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 249
Rúbrica

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Tomada de Preço Nº 013/2022
Processo Licitatório Nº 135/2022

CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

O abaixo assinado responsável legal pela empresa **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, CNPJ nº 38.080.939/0001-86, estabelecia na Rua Dalva de Oliveira, nº 906, Santa Cecilia, Cantá/RR – CEP: 69.390-000 – Tel. (95) 99165-4121 e e-mail: lmbempreendimentos.rr@gmail.com, vem pela presente, informar a V. Sas. que o Sr., **Lucas Magalhães Briglia**, portador da carteira de identidade RG 361962-1 SSP/RR e CPF 016.228.392-00 é pessoa designada para representar nossa empresa na Licitação acima referida, na sessão de entrega, recebimento e abertura dos envelopes contendo documentos e proposta comercial, podendo examinar e rubricar documentos, assinar atas, apresentar impugnações e recursos, inclusive renúncia expressa a recurso.

Uiramutã-RR, 24 de outubro de 2022.

LUCAS MAGALHÃES BRIGLIA
Sócio – Administrador
RG: 361962-1 SSP/RR

Lucas Magalhães Briglia
CPF: 016.228.392-00
Sócio-Administrador

024

LMB
EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI - Fls. 250 Rúbrica

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Tomada de Preço Nº 013/2022
Processo Licitatório Nº 135/2022

DECLARAÇÃO DE TOTAL SUBMISSÃO AO EDITAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

DECLARO, para os devidos fins, a minha total submissão ao Edital Tomada de Preços 013/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I

Por ser verdade, firmo a presente.

Uiramutã-RR, 24 de outubro de 2022.

LUCAS MAGALHÃES BRIGLIA
Sócio – Administrador
RG: 361962-1 SSP/RR

Lucas Magalhães Briglia
CPF: 016.228.392-00
Sócio-Administrador

025

LMB
EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 251
Rúbrica

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Tomada de Preço Nº 013/2022
Processo Licitatório Nº 135/2022

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

A empresa **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, **CNPJ** nº **38.080.939/0001-86**, estabelecia na rua Dalva de Oliveira, nº 906, Santa Cecilia, Cantá/RR – CEP: 69.395-000 – Tel. (95) 99165-4121 e e-mail: lmbempreendimentos.rr@gmail.com, **DECLARA**, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firma a presente.

Uiramutã-RR, 24 de outubro de 2022.

LUCAS MAGALHÃES BRIGLIA
Sócio – Administrador
RG: 361962-1 SSP/RR

Lucas Magalhães Briglia
CPF: 016.228.392-00
Sócio-Administrador

LMB
EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 252
Rúbrica

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Tomada de Preço Nº 013/2022
Processo Licitatório Nº 135/2022

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

A empresa **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ** sob nº **38.080.939/0001-86**, estabelecia na rua Dalva de Oliveira, nº 906, Santa Cecilia, Cantá/RR – CEP: 69.395-000 – Tel. (95) 99165-4121 e e-mail: lmbempreendimentos.rr@gmail.com, por intermédio de seu Representante o Sr. **Lucas Magalhães Briglia**, portador da Carteira de Identidade RG Nº 361962-1 SSP/RR e de CPF nº 016.228.392-00, DECLARA, sob as penas da lei, para surtir efeito junto à Prefeitura do Município de Uiramutã, no procedimento licitatório sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, que **não** incide na proibição contida no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.

Por ser verdade, firma a presente.

Uiramutã-RR, 24 de outubro de 2022.

LUCAS MAGALHÃES BRIGLIA
Sócio – Administrador
RG: 361962-1 SSP/RR

Lucas Magalhães Briglia
CPF: 016.228.392-00
Sócio-Administrador

027

LMB
EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 253
Rúbrica

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Tomada de Preço Nº 013/2022
Processo Licitatório Nº 135/2022

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.

A empresa **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, CNPJ nº 38.080.939/0001-86, estabelecia na Rua Dalva de Oliveira, nº 906, Santa Cecilia, Cantá/RR – CEP: 69.390-000 – Tel. (95) 99165-4121 e e-mail: lmbempreendimentos.rr@gmail.com, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Lucas Magalhães Briglia**, portador da carteira de identidade RG 361962-1 SSP/RR e CPF 016.228.392-00, residente e domiciliado na rua Dalva de Oliveira, nº 906, Santa Cecilia, Cantá-RR, CEP: 69.395-000, para os devidos fins que na presente data a mesma se encontra enquadrada nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 de 14/12/2006, que trata do Regime das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estando apta portanto a sua participação no processo nº 135/2022 tomada de preço n° 013/2022, junto ao Município de Uiramutã. Por ser verdade, firma a presente.

Uiramutã-RR, 24 de outubro de 2022.

LUCAS MAGALHÃES BRIGLIA
Sócio – Administrador
RG: 361962-1 SSP/RR

Lucas Magalhães B.
CPF: 016.228.392-
Sócio-Administrador

028

Junta Comercial do Estado de Roraima

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Roraima
Junta Comercial do Estado de Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU - Fls. 254 Rúbrica

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1420013718-4	38.080.939/0001-86	13/08/2020	10/08/2020

Endereço Completo:

RUA DALVA DE OLIVEIRA 906 - BAIRRO SANTA CECILIA CEP 69395-000 - CANTA/RR

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO IMPRESSAO SOB ENCOMENDA CARDAPIOS, DIPLOMAS, CONVITES MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MOBILIARIO ESPECIFICO PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO INSTALACAO DE 3
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OBRAS DE SERVICO DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE ALVENARIA COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOES NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL COMERCIO ATACADISTA DE COMPLEMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE AR CONDICIONADO, CONDICIONADORES DE AR PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCERR (http://www.jucerr.rr.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220000322494 e visualize a certidão)

22/009.329-6

029

Junta Comercial do Estado de Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 255
Rúbrica

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Roraima
Junta Comercial do Estado de Roraima

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA ATIVIDADES DE CONTABILIDADE SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO ATIVIDADES DE PRODUCAO MUSICAL, ISTO E, DE PRODUCAO E PROMOCAO DE BANDAS, GRUPOS MUSICAIS, ORQUESTRAS E COMPANHIAS MUSICAIS, DE CONCERTOS E OPERAS PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA CHAVEIROS SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS

Capital Social: R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
016.228.392-00	LUCAS MAGALHAES BRIGLIA	xxxxxxx	R$ 50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 22/06/2022 Número: 543135

Ato 223 - BALANCO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Boa Vista, 04 de Agosto de 2022 14:18

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCERR (http://www.jucerr.rr.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220000322494 e visualize a certidão)

22/009.329-6

030

LMB
EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 256
Rúbrica

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Tomada de Preço Nº 013/2022
Processo Licitatório Nº 135/2022

DECLARAÇÃO

A empresa **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, **CNPJ** nº **38.080.939/0001-86**, estabelecia na rua Dalva de Oliveira, nº 906, Santa Cecilia, Cantá/RR – CEP: 69.395-000 – Tel. (95) 99165-4121 e e-mail: lmbempreendimentos.rr@gmail.com, por intermédio de seu representante legal o sócio administrador**, Sr. Lucas Magalhães Briglia**, portador da Carteira de Identidade RG Nº 361962-1 SSP/RR e de CPF nº 016.228.392-00, **DECLARA**, os equipamentos necessários para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião e sua utilização.

Uiramutã-RR, 24 de outubro de 2022.

LUCAS MAGALHÃES BRIGLIA
Sócio – Administrador

Lucas Magalhães Briglia
CPF: 016.228.392-00
Sócio-Administrador

LMB
EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI -
Fls. 257
Rúbrica

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Tomada de Preço Nº 013/2022
Processo Licitatório Nº 135/2022

RESPONSAVEL TÉCNICO

ARIANE AMORIM, Engenheira Civil, CREA-RR 0918435650, portadora da Carteira de Identidade nº 404786-9 - órgão emissor: SSP/RR e do CPF nº 515.485.772-00, Telefone celular: (95)98127-1258. E-mail corporativo: lmbempreendimentos.rr@gmail.com**, DECLARA**, que autoriza sua inclusão na equipe técnica e assumindo os deveres de desempenhar suas atividades de modo a assegurar a execução satisfatória do objeto licitado.

Uiramutã-RR, 24 de outubro de 2022.

ARIANE AMORIM
Engenheira Civil

CPF nº 515.485.772-00 CREA-RR 0918435650

LMB
EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 258
Rúbrica

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Tomada de Preço Nº 013/2022
Processo Licitatório Nº 135/2022

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A empresa **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, **CNPJ** nº **38.080.939/0001-86**, estabelecia na rua Dalva de Oliveira, nº 906, Santa Cecilia, Cantá/RR – CEP: 69.395-000 – Tel. (95) 99165-4121 e e-mail: lmbempreendimentos.rr@gmail.com, representada pelo o sócio administrador, Sr. **Lucas Magalhães Briglia**, portador da Carteira de Identidade RG Nº 361962-1 SSP/RR e de CPF nº 016.228.392-00, **DECLARA**, para fins de participação na licitação modalidade **Tomada de Preços Nº 013/2022**, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA- COMUNIDADE CARAPARÚ I, por intermédio do seu responsável técnico a Sra. **Ariane Amorim**, CREA-RR 0918435650, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras.

Uiramutã-RR, 24 de outubro de 2022.

LUCAS MAGALHÃES BRIGLIA
Sócio – Administrador

Lucas Magalhães Briglia
CPF: 016.228.392-00
Sócio-Administrador

ARIANE AMORIM
Engenheira Civil
CREA-RR 0918435650

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 259
Rubrica

LMB
EMPREENDIMENTOS

ENVELOPE Nº 02 – "PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS"

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÂ/RR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022 – PROCESSO LICITATORIO Nº 135/2022.
Razão Social: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.080.939/0001-86
Rua Dalva de Oliveira, nº 906, Santa Cecilia, Cantá/RR - CEP: 69.395-000.
Tel. (95) 99165-4121 e e-mail: lmbempreendimentos.rr@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 260 Rúbrica

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Uiramutã
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Tomada de Preço Nº 013/2022
Processo Licitatório Nº 135/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA- COMUNIDADE CARAPARÚ I.

Prezados Senhores,

A empresa **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, **CNPJ** nº **38.080.939/0001-86**, estabelecia na rua Dalva de Oliveira, nº 906, Santa Cecilia, Cantá/RR – CEP: 69.395-000 – Tel. (95) 99165-4121 e e-mail: lmbempreendimentos.rr@gmail.com, através de seu representante, o sócio administrador, Sr. **Lucas Magalhães Briglia**, portador da Carteira de Identidade RG Nº 361962-1 SSP/RR e de CPF nº 016.228.392-00, **DECLARA,** que concorda e submete-se a todos os termos do edital da Tomada de Preço nº 013/2022 e vem, apresentar PROPOSTA DE PREÇOS conforme planilha em anexo com a discriminação dos quantitativos, valores unitários, valores de mão-de-obra e materiais, valor final de **R$ 516.468,16** (QUINHENTOS E DESSESEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DESSESEIS CENTAVOS).

Nos preços apresentados já estão incluídos todos os encargos tributários, previdenciários, trabalhistas e todos os demais custos para a prestação dos serviços objeto da licitação.
O prazo máximo de execução é de 02 (dois) meses, observado o cronograma físico-financeiro da Prefeitura Municipal de Uiramutã.
A presente proposta tem prazo de validade de 60 dias a contar da data da entrega das propostas, excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.
O pagamento deve ser efetuado na **Conta Corrente n.º 59155-6** da **Agência 2617-4** do **Banco do Brasil.**

Atenciosamente,

Uiramutã-RR, 24 de outubro de 2022.

LUCAS MAGALHÃES BRIGLIA
Sócio – Administrador
RG: 361962-1 SSP/RR

Lucas Magalhães Briglia
CPF: 016.228.392-00
Sócio-Administrador

261

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU -
Fls. 261
Rúbrica

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Koko Águida Kasa Wai- Comunidade Willimom Município de Uiramutã/ RR

Bancos
B.D.I.
SINAPI - 07/2022 - Roraima
ORSE - 07/2022 - Sergipe
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					21.819,22	4,45 %
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64	107,36	134,15	8.585,60	1,75 %
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	5.295,15	6.616,81	13.233,62	2,70 %
2			ALIMENTAÇÃO CANTEIRO					20.673,18	4,21 %
2.1	3126	ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	1182	14,00	17,49	20.673,18	4,21 %
3			DIVERSOS					14.924,32	3,04 %
3.1	00010848	SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	UN	1	1.341,68	1.676,56	1.676,56	0,34 %
3.2	00010851	SINAPI	Placa de acrilico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	UN	6	70,83	88,50	531,00	0,11 %
3.3	11397	ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3.50x0.85m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	un	1	750,00	937,20	937,20	0,19 %
3.4	00010527	SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	90,45	13,20	16,49	1.491,52	0,30 %
3.5	2412	ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	un	8	783,36	978,88	7.831,04	1,60 %
3.6	2450	ORSE	Limpeza geral (final da obra)	m²	900	2,19	2,73	2.457,00	0,50 %
4			MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					41.177,47	8,39 %
4.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	3,6	550,87	688,36	2.478,09	0,51 %
4.2	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	613,28	766,35	766,35	0,16 %
4.3	11125	ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1	2.205,77	2.756,33	2.756,33	0,56 %
4.4	62	ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em	un	1	14.992,56	18.734,70	18.734,70	3,82 %
4.5	99059	SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	35	42,57	53,19	1.861,65	0,38 %
4.6	98524	SINAPI	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m²	900	2,60	3,24	2.916,00	0,59 %
4.7	9203	ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	12391,8	0,50	0,62	7.682,88	1,57 %
4.8	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3492,52	0,92	1,14	3.981,47	0,81 %
5			INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES					22.718,58	4,63 %
5.1	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	7,8	68,75	85,91	670,09	0,14 %
5.2	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	2	41,68	52,08	104,16	0,02 %
5.3	92263	SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	26,2	147,28	184,04	4.821,84	0,98 %
5.4	92415	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	26,2	119,45	149,26	3.910,61	0,80 %
5.5	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	14,8	37,80	47,23	699,00	0,14 %
5.6	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,8	726,75	908,14	4.359,07	0,89 %
5.7	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,8	191,34	239,09	1.147,63	0,23 %
5.8	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	39,76	21,73	27,15	1.079,48	0,22 %
5.9	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	273,12	17,37	21,70	5.926,70	1,21 %
6			INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME					24.532,96	5,00 %
6.1	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	1,66	68,75	85,91	142,61	0,03 %
6.2	96539	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	36,78	111,41	139,21	5.120,14	1,04 %
6.3	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	13,4	37,80	47,23	632,88	0,13 %
6.4	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,87	726,75	908,14	4.422,84	0,90 %
6.5	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,87	191,34	239,09	1.164,36	0,24 %
6.6	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	62,97	21,73	27,15	1.709,63	0,35 %
6.7	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	148,7	19,41	24,25	3.605,97	0,73 %
6.8	87502	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	25,93	160,45	200,49	5.198,70	1,06 %
6.9	98557	SINAPI	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfáltica, duas demãos	m²	53,65	37,83	47,27	2.536,03	0,52 %
7			SUPERESTRUTURA - PILARES					30.051,78	6,12 %
7.1	92263	SINAPI	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44	147,28	184,04	11.307,41	2,30 %
7.2	92415	SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44	119,45	149,26	9.170,53	1,87 %
7.3	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	3,34	726,75	908,14	3.033,18	0,62 %
7.4	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,34	191,34	239,09	798,56	0,16 %

002

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 282
Rúbrica

7.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	65,63	21,73	27,15	1.781,85	0,36 %
7.6	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	182,5	17,37	21,70	3.960,25	0,81 %
8			**SUPERESTRUTURA - VIGAS**					**21.246,57**	**4,33 %**
8.1	92265	SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	38,88	117,63	146,99	5.714,97	1,16 %
8.2	92455	SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	38,88	128,86	161,02	6.260,45	1,28 %
8.3	94965	SINAPI	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	3,74	726,75	908,14	3.396,44	0,69 %
8.4	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,74	191,34	239,09	894,19	0,18 %
8.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	65,43	21,73	27,15	1.776,42	0,36 %
8.6	92776	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	124,19	20,65	25,80	3.204,10	0,65 %
9			**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**					**35.019,46**	**7,14 %**
9.1	87515	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de	m²	203,04	116,45	145,51	29.544,35	6,02 %
9.2	93201	SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	55,83	6,24	7,79	434,91	0,09 %
9.3	93186	SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	23	66,32	82,87	1.906,01	0,39 %
9.4	93188	SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	22	57,57	71,93	1.582,46	0,32 %
9.5	93196	SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	19	65,36	81,67	1.551,73	0,32 %
10			**REVESTIMENTO**					**41.475,24**	**8,45 %**
10.1	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	406,08	7,65	9,55	3.878,06	0,79 %
10.2	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	406,08	36,80	45,98	18.671,55	3,81 %
10.3	87528	SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	m²	111,36	43,62	54,50	6.069,12	1,24 %
10.4	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	111,36	92,39	115,45	12.856,51	2,62 %
11			**PINTURA**					**16.190,39**	**3,30 %**
11.1	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	406,08	2,30	2,87	1.165,44	0,24 %
11.2	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	m²	203,04	14,27	17,83	3.620,20	0,74 %
11.3	8624	ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	203,04	17,44	21,79	4.424,24	0,90 %
11.4	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta acetinada em paredes, duas demãos.	m²	406,08	13,76	17,19	6.980,51	1,42 %
12			**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**					**2.896,19**	**0,59 %**
12.1	87515	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	1,2	116,45	145,51	174,61	0,04 %
12.2	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	2,6	7,65	9,55	24,83	0,01 %
12.3	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	2,6	36,80	45,98	119,54	0,02 %
12.4	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	3,98	2,30	2,87	11,42	0,00 %
12.5	8624	ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	3,98	17,44	21,79	86,72	0,02 %
12.6	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	3,98	13,76	17,19	68,41	0,01 %
12.7	94965	SINAPI	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	1,46	726,75	908,14	1.325,88	0,27 %
12.8	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,46	191,34	239,09	349,07	0,07 %
12.9	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA. COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1	588,76	735,71	735,71	0,15 %
13			**COBERTURA**					**42.002,35**	**8,56 %**
13.1	283	ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	185,13	61,23	76,51	14.164,29	2,89 %
13.2	92540	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas aguas, incluso transporte vertical	m²	185,13	54,03	67,51	12.498,12	2,55 %
13.3	94223	SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	M	32,24	111,49	139,31	4.491,35	0,92 %
13.4	55960	SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	185,13	6,03	7,53	1.394,02	0,28 %
13.5	4449	ORSE	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro.	m²	130,57	57,95	72,41	9.454,57	1,93 %
14			**PAVIMENTAÇÃO**					**42.873,37**	**8,74 %**
14.1	96995	SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	19,57	41,68	52,08	1.019,20	0,21 %
14.2	87690	SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	130,57	58,26	72,80	9.505,49	1,94 %
14.3	87630	SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	130,57	46,39	57,96	7.567,83	1,54 %
14.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	130,57	137,82	172,21	22.485,45	4,58 %
14.5	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	92	19,97	24,95	2.295,40	0,47 %
15			**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**					**4.705,55**	**0,96 %**
15.1	98689	SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	M	4,5	112,21	140,21	630,94	0,13 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 263
Rúbrica

15.2	88648	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	M	96,06	8,95	11,18	1.073,95	0,22 %
15.3	101965	SINAPI	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	M	18,8	127,73	159,61	3.000,66	0,61 %
16			**CALÇADA DE PROTEÇÃO**					**18.594,36**	**3,79 %**
16.1	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	3,97	68,75	85,91	341,06	0,07 %
16.2	96995	SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	2,78	41,68	52,08	144,78	0,03 %
16.3	87502	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	19,9	160,45	200,49	3.989,75	0,81 %
16.4	94994	SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	72,77	139,44	174,24	12.679,44	2,58 %
16.5	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	25,92	7,65	9,55	247,53	0,05 %
16.6	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	25,92	36,80	45,98	1.191,80	0,24 %
17			**ESQUADRIAS**					**20.005,04**	**4,08 %**
17.1	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	5	310,43	387,91	1.939,55	0,40 %
17.2	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	18	781,55	976,62	17.579,16	3,58 %
17.3	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	0,48	810,82	1.013,20	486,33	0,10 %
18			**LOUÇAS E METAIS**					**8.620,67**	**1,76 %**
18.1	2390	ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	un	2	188,30	235,29	470,58	0,10 %
18.2	8974	ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	un	2	1.065,16	1.331,02	2.662,04	0,54 %
18.3	95546	SINAPI	Kit de acessonos para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	UN	2	141,76	177,14	354,28	0,07 %
18.4	86931	SINAPI	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2	452,91	565,95	1.131,90	0,23 %
18.5	00000377	SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	UN	2	35,25	44,04	88,08	0,02 %
18.6	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	3	209,09	261,27	783,81	0,16 %
18.7	2050	ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	un	2	25,21	31,50	63,00	0,01 %
18.8	2103	ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	un	1	823,50	1.029,04	1.029,04	0,21 %
18.9	2093	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	un	1	1.630,88	2.037,94	2.037,94	0,42 %
19			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**12.244,54**	**2,50 %**
19.1	93243	SINAPI	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saída, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	UN	1	6.872,09	8.587,36	8.587,36	1,75 %
19.2	89446	SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	M	28,9	5,76	7,19	207,79	0,04 %
19.3	89448	SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	M	30,1	17,32	21,64	651,36	0,13 %
19.4	90443	SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	19,75	12,41	15,50	306,12	0,06 %
19.5	89362	SINAPI	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	UN	8	8,20	10,24	81,92	0,02 %
19.6	89364	SINAPI	Curva 90° soldável 25 mm água fria	UN	2	11,16	13,94	27,88	0,01 %
19.7	90373	SINAPI	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	11	14,02	17,51	192,61	0,04 %
19.8	1144	ORSE	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	un	6	13,26	16,56	99,36	0,02 %
19.9	89497	SINAPI	Joelho 90° soldável 40mm água fria	UN	3	12,29	15,35	46,05	0,01 %
19.10	1466	ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	3	102,73	128,37	385,11	0,08 %
19.11	89383	SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	UN	14	5,81	7,26	101,64	0,02 %
19.12	1470	ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	1	80,52	100,61	100,61	0,02 %
19.13	89395	SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	6	11,40	14,24	85,44	0,02 %
19.14	89420	SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	1	9,31	11,63	11,63	0,00 %
19.15	89623	SINAPI	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	UN	5	19,33	24,15	120,75	0,02 %
19.16	3147	ORSE	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	1	19,02	23,76	23,76	0,00 %
19.17	94491	SINAPI	Registro de esfera soldável 40mm	UN	1	43,62	54,50	54,50	0,01 %
19.18	94489	SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	UN	1	21,79	27,22	27,22	0,01 %
19.19	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	752,69	940,56	940,56	0,19 %
19.20	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3	51,45	64,29	192,87	0,04 %
20			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**19.461,49**	**3,97 %**
20.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	M	9,1	18,38	22,96	208,93	0,04 %
20.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	12,4	26,93	33,65	417,26	0,09 %
20.3	89714	SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	28	51,65	64,54	1.807,12	0,37 %
20.4	90443	SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	8,4	12,41	15,50	130,20	0,03 %
20.5	89796	SINAPI	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	3	37,24	46,53	139,59	0,03 %
20.6	1588	ORSE	Tê sanitário em PVC rigido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	un	1	48,25	60,29	60,29	0,01 %
20.7	89785	SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	1	19,93	24,90	24,90	0,01 %
20.8	1603	ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	un	10	11,22	14,02	140,20	0,03 %
20.9	1554	ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	un	10	10,84	13,54	135,40	0,03 %
20.10	89744	SINAPI	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	UN	4	22,56	28,19	112,76	0,02 %
20.11	89732	SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	UN	1	10,64	13,29	13,29	0,00 %
20.12	89726	SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	UN	2	6,51	8,13	16,26	0,00 %
20.13	89750	SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	2	59,30	74,10	148,20	0,03 %
20.14	89735	SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	2	18,05	22,55	45,10	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 264
Rúbrica

20.15	89709 SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	3	9,98	12,47	37,41	0,01 %
20.16	89707 SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no mínimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	UN	3	27,35	34,17	102,51	0,02 %
20.17	1536 ORSE	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	2	18,57	23,20	46,40	0,01 %
20.18	98078 SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	1	4.377,10	5.469,62	5.469,62	1,11 %
20.19	98082 SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	1	4.060,16	5.073,57	5.073,57	1,03 %
20.20	2798 ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforçada, revestida internamente com barra lisa e fundo em concreto	un	8	533,42	666,56	5.332,48	1,09 %
21		**COMBATE A INCÊNDIO**					**641,21**	**0,13 %**
21.1	101909 SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	2	215,71	269,55	539,10	0,11 %
21.2	10363 ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	2	24,97	31,20	62,40	0,01 %
21.3	11852 ORSE	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Un	1	31,78	39,71	39,71	0,01 %
22		**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**28.832,80**	**5,88 %**
22.1	91940 SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	46	14,35	17,93	824,78	0,17 %
22.2	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	62,6	2,81	3,51	219,72	0,04 %
22.3	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: BRANCO.	M	76,6	2,81	3,51	268,86	0,05 %
22.4	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	52,6	2,81	3,51	184,62	0,04 %
22.5	91924 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	142,2	2,81	3,51	499,12	0,10 %
22.6	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	142,2	4,13	5,16	733,75	0,15 %
22.7	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama.	M	82,6	4,13	5,16	426,21	0,09 %
22.8	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama.	M	188,3	4,13	5,16	971,62	0,20 %
22.9	91926 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama.	M	153,9	4,13	5,16	794,12	0,16 %
22.10	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama.	M	40	25,10	31,36	1.254,40	0,26 %
22.11	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama.	M	40	25,10	31,36	1.254,40	0,26 %
22.12	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama.	M	40	25,10	31,36	1.254,40	0,26 %
22.13	91935 SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama.	M	40	25,10	31,36	1.254,40	0,26 %
22.14	2794 ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	un	3	274,28	342,74	1.028,22	0,21 %
22.15	91993 SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	UN	14	38,99	48,72	682,08	0,14 %
22.16	91973 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	81,59	101,95	203,90	0,04 %
22.17	91957 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	43,47	54,32	108,64	0,02 %
22.18	91969 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	68,66	85,79	171,58	0,03 %
22.19	91953 SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	2	23,95	29,92	59,84	0,01 %
22.20	91959 SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	1	37,84	47,28	47,28	0,01 %
22.21	12241 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	275,71	344,52	344,52	0,07 %
22.22	10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	un	2	122,14	152,62	305,24	0,06 %
22.23	93662 SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	UN	6	55,41	69,24	415,44	0,08 %
22.24	93655 SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	UN	8	12,28	15,34	122,72	0,03 %
22.25	91863 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	M	75	11,60	14,49	1.086,75	0,22 %
22.26	91864 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	M	9,4	15,35	19,18	180,29	0,04 %
22.27	91871 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	M	50,3	12,29	15,35	772,10	0,16 %
22.28	91872 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	M	6	16,03	20,03	120,18	0,02 %
22.29	91873 SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	M	36	19,71	24,62	886,32	0,18 %
22.30	90447 SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	M	57,8	6,19	7,73	446,79	0,09 %
22.31	8324 ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 100W.	un	29	9,67	12,08	350,32	0,07 %
22.32	97607 SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W.	UN	5	137,10	171,32	856,60	0,17 %

005

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 265
Rúbrica

22.33	11857	ORSE	Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt	un	31	27,49	34,35	1.064,85	0,22 %
22.34	97599	SINAPI	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	UN	3	26,61	33,25	99,75	0,02 %
22.35	96985	SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por eletrodeposição anódica e pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco.	UN	3	81,94	102,39	307,17	0,06 %
22.36	96977	SINAPI	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR 5111.	M	10	59,24	74,02	740,20	0,15 %
22.37	4192	ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	un	2	11,95	14,93	29,86	0,01 %
22.38	4014	ORSE	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20 (vinte) metros de comprimento, conforme norma ABNT NBR NM 60454-3, tipo 5.	Un	3	8,78	10,97	32,91	0,01 %
22.39	4015	ORSE	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação, cor preta, espessura de 0,76mm, para isolação até 69kV. Rolos de 19mm de largura	Un	3	12,60	15,74	47,22	0,01 %
22.40	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	4,5	68,75	85,91	386,59	0,08 %
22.41	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	3,5	41,68	52,08	182,28	0,04 %
22.42	101502	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.728,29	2.159,67	2.159,67	0,44 %
22.43	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	585,13	731,17	1.462,34	0,30 %
22.44	12628	ORSE	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1	3.353,68	4.190,75	4.190,75	0,85 %

Tipo de Licitação	Convite	**Total sem BDI**	**392.808,05**
Abertura da Licitação		**Total do BDI**	**97.898,69**
Número do Processo Licitatório	Processo Administrativo n°	**Total Geral**	**490.706,74**

Engº Civil, Eng. Civil Ariane Amorim
CREA-RR nº 091843565-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 268
Rúbrica

Obra	Bancos	
Construção da Escola Municipal Indígena Koko Águida Kasa Wai-Comunidade Willimom Município de Uiramutã/ RR	SINAPI 07/22 RR ORSE 07/22 SE	24,96% Não Desonerado: Horista: 114,78% Mensalista: 70,64%

	ITENS PASSÍVEIS DE ACEITAÇÃO NO BDI	Índices mínimo	Índices médio	Índices máximo	ÍNDICE ADOTADO
X	Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
	Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
	Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,10%
	Total				**4,90%**
Y	Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%
	Total				**1,23%**
Z	Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,50%
	Total				**7,50%**
I	**Tributos**				
	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
	ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	CPRB	0,00%	4,50%	4,50%	0,00%
	Total				**8,65%**
				% DE BDI A SER UTILIZADO =	**24,96%**

LEGENDA	
X =	Despesas indiretas (exceto tributos e despesas financeiras)
Y =	Despesas financeiras
Z =	Lucro
I =	Taxa representativa da incidência de impostos

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1 + 0{,}04900) \times (1 + 0{,}01230) \times (1 + 0{,}07500)}{(1 - 0{,}08650)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1{,}04900) \times (1{,}01230) \times (1{,}07500)}{(0{,}91350)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1{,}14155)}{(0{,}91350)} - 1$$

$$BDI = 1{,}24964 - 1$$

BDI= 24,96%

A FÓRMULA ADOTADA PARA CÁLCULO DO BDI, SEGUE RECOMENDAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013- TCU.

1. Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

2. Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Eng. Civil Ariane Amorim
CREA RR 091843565-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 267
Rúbrica

L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 38.080.939/0001-86

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Koko Águida Kasa Wai- Comunidade Willimom Município de Uiramutã/ RR

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Roraima
ORSE - 07/2022 - Sergipe

B.D.I.
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		21.819,22	5.454,81	5.454,81	5.454,81	5.454,81
2	ALIMENTAÇÃO CANTEIRO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		20.673,18	5.168,30	5.168,30	5.168,30	5.168,30
3	DIVERSOS	100,00%	100,00%			
		14.924,32	14.924,32			
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	100,00%	100,00%			
		41.177,47	41.177,47			
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	100,00%	100,00%			
		22.718,58	22.718,58			
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	100,00%		100,00%		
		24.532,96		24.532,96		
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	100,00%		25,00%	75,00%	
		30.051,78		7.512,95	22.538,84	
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	100,00%			60,00%	40,00%
		21.246,57			12.747,94	8.498,63
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	100,00%				100,00%
		35.019,46				35.019,46
10	REVESTIMENTO	100,00%				100,00%
		41.475,24				41.475,24
11	PINTURA	100,00%			20,00%	80,00%
		16.190,39			3.238,08	12.952,31
12	ABRIGO DO GÁS DE COZINHA	100,00%			75,00%	25,00%
		2.896,19			2.172,14	724,05
13	COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%		
		42.002,35	21.001,18	21.001,18		
14	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		25,00%	75,00%	
		42.873,37		10.718,34	32.155,03	
15	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	100,00%			100,00%	
		4.705,55			4.705,55	
16	CALÇADA DE PROTEÇÃO	100,00%		50,00%	50,00%	
		18.594,36		9.297,18	9.297,18	
17	ESQUADRIAS	100,00%			100,00%	
		20.005,04			20.005,04	
18	LOUÇAS E METAIS	100,00%			50,00%	50,00%
		8.620,67			4.310,34	4.310,34
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%		15,00%	45,00%	40,00%
		12.244,54		1.836,68	5.510,04	4.897,82
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%		15,00%	45,00%	40,00%
		19.461,49		2.919,22	8.757,67	7.784,60
21	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%				100,00%
		641,21				641,21
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%		15,00%	45,00%	40,00%
		28.832,80		4.324,92	12.974,76	11.533,12
Porcentagem			22,51%	18,9%	30,37%	28,22%
Custo			110.444,65	92.766,53	149.035,70	138.459,86
Porcentagem Acumulado			22,51%	41,41%	71,78%	100,0%
Custo Acumulado			110.444,64	203.211,17	352.246,87	490.706,74

Engº Civil. Eng. Civil Ariane Amorim
CREA-RR nº 091843565-0

008

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PM
Fls. 268
Rúbrica

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Construção da Escola Municipal Indígena Koko Águida Kasa Wai- Comunidade Willimom Município de Uiramutã/ RR	SINAPI 07/22 RR ORSE 07/22 SE		24,90% Não Desonerado: Horista: 114,78% Mensalista: 70,64%

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
A -	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	% SOBRE OS	% SOBRE OS SALÁRIOS
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	20,00%	20,00%
A2	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1,50%	1,50%
A3	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	1,00%	1,00%
A4	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA	0,20%	0,20%
A5	SERVIÇO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8,00%	8,00%
A9	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO - SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ÍTEM	36,80%	36,80%
B -	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DE	% SOBRE OS	% SOBRE OS SALÁRIOS
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,07%	Não incide
B2	FERIADOS	5,08%	Não incide
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13° SALÁRIO	10,91%	8,33%
B5	LICENÇA À PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,49%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,50%	6,49%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
	TOTAL DO ÍTEM "B"	45,90%	16,25%
C -	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,14%	3,93%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3	5,20%	3,97%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,84%	2,94%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43%	0,33%
	TOTAL DO ÍTEM	14,73%	11,26%
D -	TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REICIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE GRUPO "B"	16,89%	5,98%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
	TOTAL DO ÍTEM "D"	17,35%	6,33%
PERCENTUAL TOTAL		114,78%	70,64%

*OBS.: * Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto.*
FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVAS - INMET

Eng. Civil Ariane Amorim
CREA RR 091843565-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 269
Rúbrica

L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 38.080.939/0001-86

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Koko Águida Kasa Wai- Comunidade Willimom Município de Uiramutã/ RR

Bancos | **B.D.I.**
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.819,22	4,45 %
2	ALIMENTAÇÃO CANTEIRO	20.673,18	4,21 %
3	DIVERSOS	14.924,32	3,04 %
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	41.177,47	8,39 %
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	22.718,58	4,63 %
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	24.532,96	5,00 %
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	30.051,78	6,12 %
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	21.246,57	4,33 %
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	35.019,46	7,14 %
10	REVESTIMENTO	41.475,24	8,45 %
11	PINTURA	16.190,39	3,30 %
12	ABRIGO DO GÁS DE COZINHA	2.896,19	0,59 %
13	COBERTURA	42.002,35	8,56 %
14	PAVIMENTAÇÃO	42.873,37	8,74 %
15	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	4.705,55	0,96 %
16	CALÇADA DE PROTEÇÃO	18.594,36	3,79 %
17	ESQUADRIAS	20.005,04	4,08 %
18	LOUÇAS E METAIS	8.620,67	1,76 %
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	12.244,54	2,50 %
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	19.461,49	3,97 %
21	COMBATE A INCÊNDIO	641,21	0,13 %
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	28.832,80	5,88 %

Tipo de Licitação Convite
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório Processo Administrativo nº

Total sem BDI 392.808,05
Total do BDI 97.898,69
Total Geral 490.706,74

Engº Civil. Eng. Civil Ariane Amorim
CREA-RR nº 081843565-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 270
Rúbrica

Obra
Construção da Escola Municipal Indígena Koko Águida Kasa Wai- Comunidade Willimom Município de Uiramutã/ RR

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Roraima
ORSE - 07/2022 - Sergipe

B.D.I.
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Planilha Orçamentária Analítica

1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						21.819,22
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,00	107,36	107,36
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,00	1,25	1,25
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra		H	1,00	104,62	104,62
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,00	0,66	0,66
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,00	0,81	0,81
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,00	0,01	0,01
				MO sem LS =>	49,29	LS =>	56,58	MO com LS =>	105,87
				Valor do BDI =>	26,79			Valor com BDI =>	134,15
						Quant. =>	64,00	Preço Total =>	8.585,60

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,00	5.295,15	5.295,15
Composição Auxiliar	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,00	63,63	63,63
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS [illegible]	Equipamento		MES	1,00	202,94	202,94
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,00	18,58	18,58
Insumo	00040883	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material		MES	1,00	152,35	152,35
Insumo	00040884	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material		MES	1,00	0,01	0,01
				MO sem LS =>	2.291,31	LS =>	2.629,96	MO com LS =>	4.921,27
				Valor do BDI =>	1.321,66			Valor com BDI =>	6.616,81
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	13.233,62

2			ALIMENTAÇÃO CANTEIRO						20.673,18
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3126	ORSE	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	Alimentação		un	1,00	14,00	14,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	1,00	14,00	14,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,49			Valor com BDI =>	17,49
						Quant. =>	1.182,00	Preço Total =>	20.673,18

3			DIVERSOS						14.924,32
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010848	SINAPI	Placa de inauguração metálica 0.40 x 0.60m, fornecimento e colocação	Material		UN	1,00	1.341,68	1.341,68
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	334,88			Valor com BDI =>	1.676,56
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.676,56

Insumo	00010851	SINAPI	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas [illegible]	Material		UN	1,00	70,83	70,83
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	17,67			Valor com BDI =>	88,50
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	531,00

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11397	ORSE	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização		un	1,00	750,00	750,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	187,20			Valor com BDI =>	937,20
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	937,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010527	SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	Equipamento		MXMES	1,00	13,20	13,20
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Quant. =>	90,45	Preço Total =>	1.491,52

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2412	ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	Mobiliário		un	1,00	783,36	783,36
Insumo	2509	ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm, natural (sem verniz) un	0		un	1,00	783,36	783,36
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	195,52			Valor com BDI =>	978,88
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	7.831,04

011

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 271
Rúbrica

Composição	2450	ORSE	Limpeza geral (final da obra)	Limpeza	m²	1,00	2,19	2,19
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,10	3,74	0,37
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó kg	0	kg	0,01	9,45	0,04
Insumo	2414	ORSE	Vassoura piaçava un	0	un	0,05	11,80	0,59
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,10	11,96	1,19
				MO sem LS => 0,55	LS =>	0,64	MO com LS =>	1,19
				Valor do BDI => 0,54			Valor com BDI =>	2,73

4			MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					43.557,47
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	51	ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,00	550,87	550,87
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,00	3,74	7,48
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,00	3,63	3,63
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	4,00	10,99	43,96
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,00	19,81	19,81
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2.4 X 1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,00	445,00	445,00
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,15	21,22	3,18
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,00	11,96	23,92
				MO sem LS => 20,36	LS =>	23,37	MO com LS =>	43,73
				Valor do BDI => 137,49			Valor com BDI =>	688,36
					Quant. =>	3,60	Preço Total =>	2.478,09

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro. Rede DN 50mm	Conversão InfoWOrca	UN	1,00	613,28	613,28
Composição Auxiliar	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	Demolições / Remoções	m³	0,02	15,70	0,32
Composição Auxiliar	76	ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,33	15,70	20,81
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,35	47,10	63,44
Composição	6083	ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	Conversão InfoWOrca	un	1,00	260,64	260,64
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,00	3,74	3,74
Insumo	980	ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	Material	m	20,00	0,22	4,40
Insumo	2260	ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Torneira plastica	Material	un	1,00	2,13	2,13
Insumo	2360	ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	Material	un	2,00	8,06	16,12
Insumo	5161	ORSE	Adeptador pead 20mm x 1/2"	Material	un	2,00	5,00	10,00
Insumo	5240	ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saida roscável de = 60mm x 1/2"	Material	un	1,00	12,29	12,29
Insumo	6313	ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	Material	UN	1,00	0,83	0,83
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	1,00	19,81	19,81
Insumo	00004895	SINAPI	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00	0,69	0,69
Insumo	00006036	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	Material	UN	1,00	11,49	11,49
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,00	11,96	11,96
Insumo	00007098	SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	3,90	3,90
Insumo	00009856	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	1,00	8,95	8,95
Insumo	00012773	SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2"	Material	UN	1,00	123,85	123,85
				MO sem LS => 65,27	LS =>	74,92	MO com LS =>	140,19
				Valor do BDI => 153,07			Valor com BDI =>	766,35
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	766,35

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11125	ORSE	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	Entrada em Baixa Tensão	un	1,00	2.205,77	2.205,77
Composição Auxiliar	338	ORSE	Quadro de medição bifásica (de 5 a 10 kva) com caixa em nori	Entrada em Baixa Tensão	un	1,00	491,52	491,52
Composição Auxiliar	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,50	12,71	19,06
Composição Auxiliar	354	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	6,00	16,25	97,50
Composição Auxiliar	363	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	2,00	9,66	19,32
Composição Auxiliar	372	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	4,00	3,77	15,08
Composição	681	ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	Pontos de Suprimento de Telefone	un	1,00	6,16	6,16
Composição Auxiliar	2892	ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e	un	1,00	5,01	5,01
Composição	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria	un	1,00	160,63	160,63
Composição Auxiliar	7925	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	4,00	2,30	9,20
Composição Auxiliar	7995	ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,00	71,54	71,54

012

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 272
Rúbrica

Composição Auxiliar	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão InfoWOrca		un	1,00	998,49	998,49
Composição Auxiliar	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	Conversão InfoWOrca		un	1,00	41,31	41,31
Composição Auxiliar	12370	ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	Pára-raios		kg	0,18	113,86	20,95
				MO sem LS =>	206,83	LS =>	237,40	MO com LS =>	444,23
				Valor do BDI =>	550,56			Valor com BDI =>	2.756,33
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.756,33

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	62	ORSE	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e	Mobilização / Instalações		un	1,00	14.992,56	14.992,56
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações		m³	1,30	712,60	926,38
Composição	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha	Madeiramento		m²	52,92	56,35	2.982,04
Composição Auxiliar	234	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento		m²	52,92	36,33	1.922,58
Composição Auxiliar	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais		un	2,00	223,87	447,74
Composição Auxiliar	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores		un	2,00	20,34	40,68
Composição Auxiliar	3297	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rigido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca		pt	1,00	264,06	264,06
Composição	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas		m²	56,00	15,63	875,28
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	16,00	3,74	59,84
Insumo	425	ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material		un	2,00	25,40	50,80
Insumo	629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material		m²	77,00	36,36	2.799,72
Insumo	848	ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material		un	4,00	3,60	14,40
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material		m	87,00	10,99	956,13
Insumo	1803	ORSE	Porta cadeado médio	Material		un	2,00	8,00	16,00
Insumo	1886	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material		kg	1,20	25,07	30,08
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	16,00	19,81	316,96
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	16,00	11,96	191,36
				Valor do BDI =>	3.742,14			Valor com BDI =>	18.734,70
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	18.734,70

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059	SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		M	1,00	42,57	42,57
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,00	28,29	0,11
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,02	27,33	0,45
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,00	576,22	2,65
Composição	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		UN	1,50	2,28	3,42
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,36	18,28	6,51
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	0,41	11,40	4,70
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,11	21,22	2,35
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,74	3,17	2,36
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,55	3,10	1,70
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,03	14,45	0,36
				MO sem LS =>	10,36	LS =>	11,89	MO com LS =>	22,25
				Valor do BDI =>	10,62			Valor com BDI =>	53,19
						Quant. =>	35,00	Preço Total =>	1.861,65

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,38	1,24
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	19,01	1,36
				MO sem LS =>	0,86	LS =>	0,99	MO com LS =>	1,85
				Valor do BDI =>	0,64			Valor com BDI =>	3,24
						Quant. =>	900,00	Preço Total =>	2.916,00

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 279
Rúbrica

Composição	9203	ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Conversão InfoWOrca		tkm	1,00	0,50	0,50
Insumo	9483	ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Equipamento		tkm	1,00	0,50	0,50
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Quant. =>	**14.391,75**	**Preço Total =>**	**8.922,88**

4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100946	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS		TXKM	1,00	0,92	0,92
Composição Auxiliar	5824	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,00	232,08	0,85
Composição Auxiliar	5826	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,00	47,25	0,07
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,14
						Quant. =>	**4.492,52**	**Preço Total =>**	**5.121,47**

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,00	68,75	68,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,96	17,38	68,75
				MO sem LS =>	22,40	LS =>	25,70	MO com LS =>	48,10
				Valor do BDI =>	17,16			Valor com BDI =>	85,91
						Quant. =>	**7,80**	**Preço Total =>**	**670,09**

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,00	41,68	41,68
				MO sem LS =>	13,58	LS =>	15,58	MO com LS =>	29,16
				Valor do BDI =>	10,40			Valor com BDI =>	52,08
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**104,16**

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263	SINAPI	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	147,28	147,28
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,06	28,29	1,78
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,26	27,33	6,96
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,18	25,21	29,74
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material		m²	1,34	63,36	84,64
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,31	2,74	6,32
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,21	21,22	4,41
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	9,24	0,96	8,86
				MO sem LS =>	15,89	LS =>	18,24	MO com LS =>	34,13
				Valor do BDI =>	36,76			Valor com BDI =>	184,04
						Quant. =>	**26,20**	**Preço Total =>**	**4.821,84**

Composição	92415	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,00	119,45	119,45
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	0,53	147,28	77,32
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,21	18,28	3,76
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,13	25,21	28,36
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,01	7,10	0,07
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento		MES	0,20	8,58	1,68
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento		MES	0,79	3,30	2,59
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento		MES	0,39	13,20	5,18
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,02	26,19	0,49
				MO sem LS =>	20,06	LS =>	23,02	MO com LS =>	43,08
						Quant. =>	**26,20**	**Preço Total =>**	**3.910,61**

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	37,80	37,80
Composição Auxiliar	94958	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,06	523,95	29,60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,27	25,49	6,92
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,38	1,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAMUTA
Fls. 274
Rúbrica

				MO sem LS =>	4,21	LS =>	4,83	MO com LS =>	9,04
						Quant. =>	14,80	Preço Total =>	699,00

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,67	1,25
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,36	493,21
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	208,90	123,96
				MO sem LS =>	24,22	LS =>	27,80	MO com LS =>	52,02
				Valor do BDI =>	181,39			Valor com BDI =>	908,14
						Quant. =>	4,80	Preço Total =>	4.359,07

5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	191,34	191,34
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,21	46,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,49	47,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	17,36	96,25
				MO sem LS =>	65,85	LS =>	75,58	MO com LS =>	141,43
				Valor do BDI =>	47,75			Valor com BDI =>	239,09
						Quant. =>	4,80	Preço Total =>	1.147,63

5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	21,73	21,73
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,17	0,63
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	25,33	5,68
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,22	0,26
				MO sem LS =>	3,05	LS =>	3,51	MO com LS =>	6,56
				Valor do BDI =>	5,42			Valor com BDI =>	27,15
						Quant. =>	39,76	Preço Total =>	1.079,48

5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,00	13,91	13,91
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	17,17	0,26
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	25,33	2,42
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,54	0,22	0,11
				MO sem LS =>	1,09	LS =>	1,26	MO com LS =>	2,35
				Valor do BDI =>	4,33			Valor com BDI =>	21,70
						Quant. =>	273,12	Preço Total =>	5.926,70

6			INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME					24.532,96
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	17,38	68,75
				MO sem LS =>	22,40	LS =>	25,70	MO com LS =>	48,10
				Valor do BDI =>	17,16			Valor com BDI =>	85,91
						Quant. =>	1,66	Preço Total =>	142,61

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96539	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,00	111,41	111,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 275
Rúbrica

Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,03	28,29	0,73
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,76	18,28	13,94
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,94	25,21	48,85
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m²	0,59	63,38	37,57
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	7,10	0,07
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,29	2,74	6,28
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,01	26,19	0,26
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,01	23,49	0,16
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,04	21,63	0,75
				MO sem LS =>	23,54	LS =>	27,01	MO com LS => 50,55
				Valor do BDI =>	27,80			Valor com BDI => 139,21
						Quant. =>	36,78	Preço Total => 5.120,14

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	37,80	37,80
Composição Auxiliar	94966	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,06	523,95	29,60
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27	25,49	6,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,38	1,28
				Valor do BDI =>	9,43			Valor com BDI => 47,23
						Quant. =>	13,40	Preço Total => 632,88

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,67	1,25
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,36	493,21
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	208,90	123,96
				MO sem LS =>	24,22	LS =>	27,80	MO com LS => 52,02
				Valor do BDI =>	181,39			Valor com BDI => 908,14
						Quant. =>	4,87	Preço Total => 4.422,64

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,21	46,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	25,49	47,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	17,38	96,25
				MO sem LS =>	65,85	LS =>	75,58	MO com LS => 141,43
				Valor do BDI =>	47,75			Valor com BDI => 239,09

6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	21,73	21,73
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	14,49	14,49
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	17,17	0,63
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	25,33	5,68
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,22	0,26
				MO sem LS =>	3,05	LS =>	3,51	MO com LS => 6,56

016

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU -
Fls. 276
Rúbrica

				Valor do BDI =>	5,42		Valor com BDI =>	27,15
						Quant. => 62,97	Preço Total =>	1.709,63
6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	19,41	19,41
Composição Auxiliar	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	15,00	15,00
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	17,17	0,35
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	25,33	3,23
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,74	0,22	0,16
				MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,26
				Valor do BDI =>	4,84			Valor com BDI =>	24,25
						Quant. => 148,70	Preço Total =>	3.605,97
6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87502	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,00	160,45	160,45
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,01	669,88	9,04
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,00	25,49	76,41
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS,	Material		UN	55,85	0,68	37,97
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,04	40,33	1,46
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material		M	1,51	6,31	9,52
				MO sem LS =>	37,45	LS =>	42,99	MO com LS =>	80,44
				Valor do BDI =>	40,04			Valor com BDI =>	200,49
						Quant. => 25,93	Preço Total =>	5.198,70
6.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,09	18,49	1,67
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,42	25,73	10,85
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO	Material		KG	1,50	16,94	25,41
				MO sem LS =>	4,53	LS =>	5,19	MO com LS =>	9,72
				Valor do BDI =>	9,44			Valor com BDI =>	47,27
						Quant. => 53,65	Preço Total =>	2.536,03
7			SUPERESTRUTURA - PILARES						30.051,78
Composição	92263	SINAPI	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	147,28	147,28
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,06	28,29	1,78
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,26	27,33	6,96
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	18,28	4,57
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,18	25,21	29,74
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material		m²	1,34	63,36	84,64
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,31	2,74	6,32
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,21	21,22	4,41
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	9,24	0,96	8,86
				Valor do BDI =>	36,76			Valor com BDI =>	184,04
						Quant. => 61,44	Preço Total =>	11.307,41
7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92415	SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	119,45	119,45
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	0,53	147,28	77,32
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,21	18,28	3,76
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,13	25,21	28,36
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,01	7,10	0,07
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento		MES	0,20	8,58	1,68
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,60 A 1,20 M DE EXTENSAO,	Equipamento		MES	0,79	3,30	2,59

077

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - PMC
Fls. 277
Rúbrica

Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "5" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento		MES	0,39	13,20	5,18
				MO sem LS =>	20,06	LS =>	23,02	MO com LS =>	43,08
				Valor do BDI =>	29,81			Valor com BDI =>	149,26
						Quant. =>	**61,44**	**Preço Total =>**	**9.170,53**

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,75	1,67	1,25
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,46	20,62	30,18
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,72	52,14	37,69
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,59	208,90	123,96
				MO sem LS =>	24,22	LS =>	27,80	MO com LS =>	52,02
				Valor do BDI =>	181,39			Valor com BDI =>	908,14
						Quant. =>	**3,34**	**Preço Total =>**	**3.033,18**

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,21	46,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,49	47,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,54	17,38	96,25
				MO sem LS =>	65,85	LS =>	75,58	MO com LS =>	141,43
				Valor do BDI =>	47,75			Valor com BDI =>	239,09
						Quant. =>	**3,34**	**Preço Total =>**	**798,56**

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	21,73	21,73
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	14,49	14,49
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,04	17,17	0,63
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,22	25,33	5,68
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,015 KG/M) OU 18 BWG, D =	Material		KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	1,19	0,22	0,26
				Valor do BDI =>	5,42			Valor com BDI =>	27,15
						Quant. =>	**65,63**	**Preço Total =>**	**1.781,85**

7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	17,37	17,37
Composição	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,00	13,91	13,91
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	17,17	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,015 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,54	0,22	0,11
				MO sem LS =>	1,09	LS =>	1,26	MO com LS =>	2,35
				Valor do BDI =>	4,33			Valor com BDI =>	21,70
						Quant. =>	**182,50**	**Preço Total =>**	**3.960,25**

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92265	SINAPI	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	117,63	117,63
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,05	28,29	1,41
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,24	27,33	6,47
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,20	18,28	3,69
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE	Material		m²	1,15	63,36	72,51
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,17	2,74	0,45
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,16	21,22	3,37
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	6,95	0,95	6,67
				MO sem LS =>	12,77	LS =>	14,65	MO com LS =>	27,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ - PMU -
Fls. 278
Rúbrica

				Valor do BDI =>	29,36		Valor com BDI =>	146,99
						Quant. =>	38,88	Preço Total => 5.714,97

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92455	SINAPI	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,00	128,86	128,86
Composição Auxiliar	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	0,41	117,63	48,69
Composição	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA,	FUES - FUNDAÇÕES E		M	1,73	26,94	46,57
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,19	18,28	3,47
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,01	7,10	0,07
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,05	26,19	1,28
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,33	8,23	2,69
				MO sem LS =>	19,75	LS =>	22,67	MO com LS =>	42,42
				Valor do BDI =>	32,16			Valor com BDI =>	161,02
						Quant. =>	38,88	Preço Total =>	6.260,45

Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,71	0,42	0,28
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,75	1,67	1,25
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,72	52,14	37,69
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,66	1,36	493,21
				MO sem LS =>	24,22	LS =>	27,80	MO com LS =>	52,02
				Valor do BDI =>	181,39			Valor com BDI =>	908,14
						Quant. =>	3,74	Preço Total =>	3.396,44

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,67	1,29	0,86
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,21	46,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,49	47,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,54	17,38	96,25
				MO sem LS =>	65,85	LS =>	75,58	MO com LS =>	141,43
				Valor do BDI =>	47,75			Valor com BDI =>	239,09
						Quant. =>	3,74	Preço Total =>	894,19

Composição	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,00	21,73	21,73
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	14,49	14,49
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,04	17,17	0,63
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,22	25,33	5,68
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,19	0,22	0,26
				MO sem LS =>	3,05	LS =>	3,51	MO com LS =>	6,56
						Quant. =>	65,43	Preço Total =>	1.776,42

8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92776	SINAPI	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	20,65	20,65
Composição Auxiliar	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,00	14,96	14,96
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	17,17	0,48
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	25,33	4,33
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,03	27,00	0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,97	0,22	0,21
				MO sem LS =>	2,16	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,64
				Valor do BDI =>	5,15			Valor com BDI =>	25,80
						Quant. =>	124,19	Preço Total =>	3.204,10

9			ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO						35.019,46
9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87515	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,00	116,45	116,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU -
Fls. 279
Rúbrica

Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,01	581,25	6,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,33	25,49	59,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,17	17,38	20,26
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	37,74	0,68	25,66
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,01	40,33	0,52
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	Material		M	1,09	3,99	4,34
				MO sem LS =>	28,86	LS =>	33,13	MO com LS =>	61,99
				Valor do BDI =>	29,06			Valor com BDI =>	145,51
						Quant. =>	203,04	Preço Total =>	29.544,35

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93201	SINAPI	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		M	1,00	6,24	6,24
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,00	543,88	1,90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,15	25,49	3,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	17,38	0,52
				MO sem LS =>	1,69	LS =>	1,93	MO com LS =>	3,62
				Valor do BDI =>	1,55			Valor com BDI =>	7,79
						Quant. =>	55,83	Preço Total =>	434,91

9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93186	SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		M	1,00	66,32	66,32
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	0,49	14,66	7,18
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,02	671,35	12,08
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	0,35	91,15	31,90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,38	25,49	9,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,19	17,38	3,26
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,01	7,10	0,04
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	6,00	0,22	1,32
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,35	2,74	0,96
				MO sem LS =>	9,12	LS =>	10,46	MO com LS =>	19,58
				Valor do BDI =>	16,55			Valor com BDI =>	82,87
						Quant. =>	23,00	Preço Total =>	1.906,01

9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93188	SINAPI	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		M	1,00	57,57	57,57
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	0,31	14,00	4,31
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,01	671,35	8,05
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	0,30	91,15	27,34
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,39	25,49	9,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,19	17,38	3,35
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,01	7,10	0,03
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	6,00	0,22	1,32
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,22	2,74	3,34
				MO sem LS =>	8,57	LS =>	9,84	MO com LS =>	18,41
				Valor do BDI =>	14,36			Valor com BDI =>	71,93
						Quant. =>	22,00	Preço Total =>	1.582,46

9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93196	SINAPI	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		M	1,00	65,36	65,36
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	0,49	14,66	7,18
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,02	671,35	12,08
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	0,35	91,15	31,90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,38	25,49	9,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,19	17,38	3,26
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,01	7,10	0,04
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	6,00	0,22	1,32
				MO sem LS =>	9,12	LS =>	10,46	MO com LS =>	19,58
				Valor do BDI =>	16,31			Valor com BDI =>	81,67
						Quant. =>	19,00	Preço Total =>	1.551,73

10			REVESTIMENTO						41.475,24
10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU -
Fls. 230
Rúbrica

Composição	87893 SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	7,65	7,65
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	815,94	3,42
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	25,49	3,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	17,38	1,07
			MO sem LS => 1,77	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,80
			Valor do BDI => 1,90			Valor com BDI =>	9,55
				Quant. =>	406,08	Preço Total =>	3.878,06

10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87528 SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	36,80	36,80
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	581,25	21,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47	25,49	11,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	17,38	2,97
		MO sem LS => 6,66		LS =>	7,64	MO com LS =>	14,30
		Valor do BDI => 9,18				Valor com BDI =>	45,98
				Quant. =>	406,08	Preço Total =>	18.671,55

10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87528 SINAPI	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de taliscа	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	43,62	43,62
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	669,88	25,18
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,58	25,49	14,78
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	17,38	3,66
		MO sem LS => 8,99		LS =>	10,32	MO com LS =>	19,31
		Valor do BDI => 10,88				Valor com BDI =>	54,50
				Quant. =>	111,36	Preço Total =>	6.069,12

10.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87274 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	92,39	92,39
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,02	29,15	29,73
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,50	17,38	8,69
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,14	1,25	7,67
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,22	7,34	1,61
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,09	41,00	44,69
		MO sem LS => 14,14		LS =>	16,22	MO com LS =>	30,36
		Valor do BDI => 23,06				Valor com BDI =>	115,45
				Quant. =>	111,36	Preço Total =>	12.856,51

11		PINTURA					16.190,39
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485 SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	PINT - PINTURAS	m²	1,00	2,30	2,30
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	26,53	1,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01	17,38	0,24
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	0,16	6,49	1,03
		MO sem LS => 0,44		LS =>	0,51	MO com LS =>	0,95
		Valor do BDI => 0,57				Valor com BDI =>	2,87
				Quant. =>	406,08	Preço Total =>	1.165,44

11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497 SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	PINT - PINTURAS	m²	1,00	14,27	14,27
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31	26,53	8,27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11	17,38	1,98
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,10	0,86	0,08
Insumo	00043626 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,56	2,54	3,94
		MO sem LS => 3,55		LS =>	4,08	MO com LS =>	7,63
		Valor do BDI => 3,56				Valor com BDI =>	17,83
				Quant. =>	203,04	Preço Total =>	3.620,20

11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8624 ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	Latex PVA	m²	1,00	17,44	17,44
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,25	3,74	0,93
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,35	3,81	1,33
Insumo	1602 ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material	l	0,72	6,72	4,83
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,50	0,86	0,43
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,35	19,81	6,93
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,25	11,96	2,99
		MO sem LS => 4,62		LS =>	5,30	MO com LS =>	9,92
		Valor do BDI => 4,35				Valor com BDI =>	21,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 231
Rúbrica

						Quant. =>	203,04	Preço Total =>		4.424,24
11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta acetinada em paredes, duas demãos.	PINT - PINTURAS		m²	1,00	13,76		13,76
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	26,53		3,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,05	17,38		0,83
Insumo	00007345	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material		L	0,33	28,76		9,49
				MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,70	MO com LS =>		3,18
				Valor do BDI =>	3,43			Valor com BDI =>		17,19
						Quant. =>	406,08	Preço Total =>		6.980,51
12			ABRIGO DO GÁS DE COZINHA							2.896,19
12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	87515	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,00	116,45		116,45
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,01	581,25		6,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,33	25,49		59,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,17	17,38		20,28
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	37,74	0,68		25,66
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,01	40,33		0,52
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	1,09	3,99		4,34
				MO sem LS =>	28,86	LS =>	33,13	MO com LS =>		61,99
				Valor do BDI =>	29,06			Valor com BDI =>		145,51
						Quant. =>	1,20	Preço Total =>		174,61
12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,00	7,65		7,65
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,00	815,94		3,42
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,12	25,49		3,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,06	17,38		1,07
				MO sem LS =>	1,77	LS =>	2,03	MO com LS =>		3,80
				Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI =>		9,55
						Quant. =>	2,60	Preço Total =>		24,83
12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,00	36,80		36,80
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,04	581,25		21,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,47	25,49		11,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	17,38		2,97
				MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,64	MO com LS =>		14,30
				Valor do BDI =>	9,18			Valor com BDI =>		45,98
						Quant. =>	2,60	Preço Total =>		119,54
12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	PINT - PINTURAS		m²	1,00	2,30		2,30
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,04	26,53		1,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,01	17,38		0,24
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material		L	0,16	6,49		1,03
				MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,51	MO com LS =>		0,95
				Valor do BDI =>	0,57			Valor com BDI =>		2,87
						Quant. =>	3,98	Preço Total =>		11,42
12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	8624	ORSE	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	Latex PVA		m²	1,00	17,44		17,44
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,25	3,74		0,93
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios		h	0,35	3,81		1,33
Insumo	1602	ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material		l	0,72	6,72		4,83
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material		UN	0,50	0,86		0,43
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra		H	0,35	19,81		6,93
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,25	11,96		2,99
				MO sem LS =>	4,62	LS =>	5,30	MO com LS =>		9,92
				Valor do BDI =>	4,35			Valor com BDI =>		21,79
						Quant. =>	3,98	Preço Total =>		86,72
12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88487	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	PINT - PINTURAS		m²	1,00	13,76		13,76
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	26,53		3,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,05	17,38		0,83

6

022

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ - PMU -
Fls. 282
Rúbrica

Insumo	00007345	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material		L	0,33	28,76	9,49
				MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,70	MO com LS =>	3,18
				Valor do BDI =>	3,43			Valor com BDI =>	17,19
						Quant. =>	3,98	Preço Total =>	68,41

12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira (laje de abrigo)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	726,75	726,75
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,71	0,42	0,29
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,75	1,67	1,25
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,46	20,62	30,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,31	17,38	40,17
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,72	52,14	37,69
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,66	1,36	493,21
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,59	208,80	123,96
				MO sem LS =>	24,22	LS =>	27,80	MO com LS =>	52,02
				Valor do BDI =>	181,39			Valor com BDI =>	908,14
						Quant. =>	1,46	Preço Total =>	1.325,88

12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92873	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,00	191,34	191,34
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,67	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,17	0,56	0,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,21	46,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,85	25,49	47,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,54	17,38	96,25
				MO sem LS =>	65,85	LS =>	75,58	MO com LS =>	141,43
				Valor do BDI =>	47,75			Valor com BDI =>	239,09
						Quant. =>	1,46	Preço Total =>	349,07

12.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MDR		m²	1,00	588,76	588,76
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,01	742,05	8,90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,46	25,49	11,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,23	17,38	3,98
Insumo	00004930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material		m²	1,00	564,24	564,24
				MO sem LS =>	6,17	LS =>	7,09	MO com LS =>	13,26
				Valor do BDI =>	146,95			Valor com BDI =>	735,71
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	735,71

13			COBERTURA						42.002,35
13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	283	ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina 2,30x 0,88 x 0,028 m	Telhamento		m²	1,00	61,23	61,23
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,22	3,74	0,82
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	0,22	3,63	0,79
Insumo	667	ORSE	Kit de fixação (prego/anilha) para telhas onduline (20 pregos e 20 anilhas)	Material		un	0,50	8,69	4,34
Insumo	2191	ORSE	Telha ecológica onduline 2,00 x 0,95 x 0,028 m	Material		un	0,65	73,90	48,30
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	0,22	19,81	4,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,22	11,96	2,63
				MO sem LS =>	3,25	LS =>	3,73	MO com LS =>	6,98
				Valor do BDI =>	15,28			Valor com BDI =>	76,51
						Quant. =>	185,13	Preço Total =>	14.164,29

13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92540	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	COBE - COBERTURA		m²	1,00	54,03	54,03
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,06	22,30	1,34
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,04	23,11	1,00
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,48	18,28	8,84
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,64	25,21	16,15
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,98	5,83	11,52
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,07	23,49	1,64
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material		KG	0,05	21,20	1,06
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material		KG	0,03	21,38	0,64
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,31	1,11	3,67
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,66	12,33	8,17
				MO sem LS =>	9,75	LS =>	11,20	MO com LS =>	20,95
				Valor do BDI =>	13,48			Valor com BDI =>	67,51
						Quant. =>	185,13	Preço Total =>	12.498,12

13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

023

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU -
Fls. 283
Rúbrica

Composição	94223	SINAPI	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	COBE - COBERTURA	M	1,00	111,49	111,49
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00	23,11	0,04
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00	22,30	0,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	17,38	1,26
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	24,97	1,49
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	4,20	0,24	1,00
Insumo	00007219	SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	1,03	89,72	92,32
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	4,20	3,65	15,33
				MO sem LS => 0,99	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,13
				Valor do BDI => 27,82			Valor com BDI =>	139,31
					Quant. =>	32,24	Preço Total =>	4.491,35

13.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	55960	SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	COBE - COBERTURA	m²	1,00	6,03	6,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	17,38	3,47
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,10	25,61	2,56
				MO sem LS => 1,13	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,43
				Valor do BDI => 1,50			Valor com BDI =>	7,53
					Quant. =>	185,13	Preço Total =>	1.394,02

13.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4449	ORSE	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro.	Forros	m²	1,00	57,95	57,95
Insumo	1019	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref.Araforros ou similar	Material	m²	1,00	57,95	57,95
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 14,46			Valor com BDI =>	72,41
					Quant. =>	130,57	Preço Total =>	9.454,57

14			PAVIMENTAÇÃO					42.873,37
14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	41,68	41,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	17,38	41,68
				MO sem LS => 13,58	LS =>	15,58	MO com LS =>	29,16
				Valor do BDI => 10,40			Valor com BDI =>	52,08
					Quant. =>	19,57	Preço Total =>	1.019,20

14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87690	SINAPI	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	PISO - PISOS	m²	1,00	58,26	58,26
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,06	799,74	48,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,29	25,49	7,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	17,38	2,46
				MO sem LS => 5,71	LS =>	6,55	MO com LS =>	12,26
				Valor do BDI => 14,54			Valor com BDI =>	72,80
					Quant. =>	130,57	Preço Total =>	9.505,49

14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87630	SINAPI	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	PISO - PISOS	m²	1,00	46,39	46,39
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	799,74	34,46
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	25,49	6,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	17,38	2,13
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,21	13,72	2,88
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,50	1,36	0,68
				MO sem LS => 4,58	LS =>	5,25	MO com LS =>	9,83
				Valor do BDI => 11,57			Valor com BDI =>	57,96
					Quant. =>	130,57	Preço Total =>	7.567,83

14.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1,00	137,82	137,82
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,93	29,15	27,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,34	17,38	5,90
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	8,62	1,25	10,77
Insumo	00001282	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,12	83,07	93,03
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,14	7,34	1,02
				MO sem LS => 12,23	LS =>	14,04	MO com LS =>	26,27
				Valor do BDI => 34,39			Valor com BDI =>	172,21
					Quant. =>	130,57	Preço Total =>	22.485,45

14.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	PISO - PISOS	M	1,00	19,97	19,97
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	29,15	2,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	17,38	0,53

024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 284
Rúbrica

Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	0,60	1,25	0,75
Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material		m²	0,19	83,07	15,61
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,08	7,34	0,61
			MO sem LS =>	1,11	LS =>	1,28	MO com LS =>	2,39
			Valor do BDI =>	4,98			Valor com BDI =>	24,95
					Quant. =>	92,00	Preço Total =>	2.295,40

15			SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL					4.705,55
15.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98689	SINAPI	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm, AF 06/2018	PISO - PISOS	M	1,00	112,21	112,21
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,55	26,63	14,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27	17,38	4,74
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,29	3,84	4,95
Insumo	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	Material	M	1,00	87,96	87,96
			MO sem LS =>	6,96	LS =>	7,99	MO com LS =>	14,95
			Valor do BDI =>	28,00			Valor com BDI =>	140,21
					Quant. =>	4,50	Preço Total =>	630,94

15.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88648	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	PISO - PISOS	M	1,00	8,95	8,95
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	29,15	2,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	17,38	0,53
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,60	1,25	0,75
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	0,12	40,75	5,01
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,09	7,34	0,62
			MO sem LS =>	0,95	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,03
			Valor do BDI =>	2,23			Valor com BDI =>	11,18
					Quant. =>	96,06	Preço Total =>	1.073,95

15.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101965	SINAPI	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,00	127,73	127,73
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,02	28,29	0,59
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,40	27,33	10,87
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	544,85	3,26
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42	26,63	11,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	17,38	3,63
Insumo	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0" CM, COM PINGADEIRA	Material	M	1,04	94,46	98,23
			MO sem LS =>	10,01	LS =>	11,49	MO com LS =>	21,50
			Valor do BDI =>	31,88			Valor com BDI =>	159,61
					Quant. =>	18,80	Preço Total =>	3.000,66

16			CALÇADA DE PROTEÇÃO					18.594,36
16.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	68,75	68,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	17,38	68,75
			MO sem LS =>	22,40	LS =>	25,70	MO com LS =>	48,10
			Valor do BDI =>	17,16			Valor com BDI =>	85,91
					Quant. =>	3,97	Preço Total =>	341,06

16.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	41,68	41,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	17,38	41,68
			MO sem LS =>	13,58	LS =>	15,58	MO com LS =>	29,16
			Valor do BDI =>	10,40			Valor com BDI =>	52,08
					Quant. =>	2,78	Preço Total =>	144,78

16.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87502	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00	160,45	160,45
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	669,88	9,04
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,00	25,49	76,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	17,38	26,05
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	55,85	0,68	37,97
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,04	40,33	1,46
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 12" CM	Material	M	1,51	6,31	9,52
			MO sem LS =>	37,45	LS =>	42,99	MO com LS =>	80,44
			Valor do BDI =>	40,04			Valor com BDI =>	200,49
					Quant. =>	19,90	Preço Total =>	3.989,75

16.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94994	SINAPI	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	PISO - PISOS	m²	1,00	139,44	139,44
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,10	680,09	65,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 235
Rúbrica

Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	25,21	4,55
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,28	25,49	7,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	17,38	7,94
Insumo	00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1,13	1,90	2,14
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,20	0,96	0,19
Insumo	00004460	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,25	4,11	1,02
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,12	45,08	50,59
				MO sem LS => 9,42	LS =>	10,82	MO com LS =>	20,24
				Valor do BDI => 34,80			Valor com BDI =>	174,24
					Quant. =>	72,77	Preço Total =>	12.679,44

16.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	7,65	7,65
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	815,84	3,42
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	25,49	3,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	17,38	1,07
				MO sem LS => 1,77	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,80
				Valor do BDI => 1,90			Valor com BDI =>	9,55
					Quant. =>	25,92	Preço Total =>	247,53

16.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	36,80	36,80
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	581,25	21,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47	25,49	11,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	17,38	2,97
				MO sem LS => 6,66	LS =>	7,64	MO com LS =>	14,30
				Valor do BDI => 9,18			Valor com BDI =>	45,98
					Quant. =>	25,92	Preço Total =>	1.191,80

17			ESQUADRIAS					20.005,04
17.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,00	310,43	310,43
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,68	24,08	40,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,84	17,38	14,58
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,00	16,06	48,18
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,80	0,07	1,38
Insumo	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,00	205,89	205,89
				MO sem LS => 19,48	LS =>	22,36	MO com LS =>	41,84
				Valor do BDI => 77,48			Valor com BDI =>	387,91
					Quant. =>	5,00	Preço Total =>	1.939,55

17.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS. ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,00	781,55	781,55
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	861,54	6,89
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,10	25,49	53,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,05	17,38	18,23
Insumo	00011199	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ., PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS 120 X 150 CM (A X L)	Material	UN	0,56	1.264,72	702,93
				MO sem LS => 26,01	LS =>	29,86	MO com LS =>	55,87
				Valor do BDI => 195,07			Valor com BDI =>	976,62
					Quant. =>	18,00	Preço Total =>	17.579,16

17.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,00	810,82	810,82
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,02	861,54	18,09
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,58	25,49	116,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,29	17,38	39,81
Insumo	00011190	SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	2,78	229,00	636,16
				MO sem LS => 56,96	LS =>	65,37	MO com LS =>	122,33
				Valor do BDI => 202,38			Valor com BDI =>	1.013,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 286
Rúbrica

						Quant. =>	0,48	Preço Total =>	486,33
18			LOUÇAS E METAIS						8.620,67
18.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2390	ORSE	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	Alambrados e Gradis		un	1,00	188,30	188,30
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,30	3,60	1,08
Insumo	2063	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2" - Jackwal ou similar	Material		un	1,00	181,28	181,28
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,30	19,81	5,94
				MO sem LS =>	2,77	LS =>	3,17	MO com LS =>	5,94
				Valor do BDI =>	46,99			Valor com BDI =>	235,29
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	470,58
18.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8974	ORSE	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	Louças e Metais Sanitários		un	1,00	1.065,16	1.065,16
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,03	734,10	22,02
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,30	3,60	1,08
Insumo	9262	ORSE	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) - em placa sólida de fórmica, sistema de travamento na vertical e ferragens em latão	Material		un	1,00	1.036,12	1.036,12
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,30	19,81	5,94
				MO sem LS =>	3,43	LS =>	3,94	MO com LS =>	7,37
				Valor do BDI =>	265,86			Valor com BDI =>	1.331,02
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	2.662,04
18.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95546	SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	141,76	141,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,90	24,86	47,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,60	17,38	10,38
Insumo	00039398	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Material		UN	1,00	84,23	84,23
				MO sem LS =>	21,12	LS =>	24,25	MO com LS =>	45,37
				Valor do BDI =>	35,38			Valor com BDI =>	177,14
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	354,28
18.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86931	SINAPI	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	452,91	452,91
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	442,00	442,00
Composição Auxiliar	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	10,91	10,91
				MO sem LS =>	11,46	LS =>	13,16	MO com LS =>	24,62
				Valor do BDI =>	113,04			Valor com BDI =>	565,95
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.131,90
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000377	SINAPI	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	Material		UN	1,00	35,25	35,25
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,79			Valor com BDI =>	44,04
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	88,08
18.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	209,09	209,09
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 " X 1.1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	10,64	10,64
Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	134,17	134,17
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	49,32	49,32
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	6,69	6,69
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	8,27	8,27
				MO sem LS =>	9,74	LS =>	11,19	MO com LS =>	20,93
				Valor do BDI =>	52,18			Valor com BDI =>	261,27
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	783,81
18.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2050	ORSE	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	Louças e Metais Sanitários		un	1,00	25,21	25,21
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,40	3,65	1,46
Insumo	00002695	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,40	19,81	7,92
Insumo	00007608	SINAPI	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	Material		UN	1,00	6,49	6,49
Insumo	00011680	SINAPI	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	Material		UN	1,00	9,34	9,34
				MO sem LS =>	3,69	LS =>	4,23	MO com LS =>	7,92
				Valor do BDI =>	6,29			Valor com BDI =>	31,50
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	63,00
18.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2103	ORSE	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	Louças e Metais Sanitários		un	1,00	823,50	823,50
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples		m³	0,04	762,70	27,45
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 50 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	2,88	14,07	40,52
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	2,00	3,74	7,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU
Fls. 287
Rúbrica

Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	2,00	3,60	7,20
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	2,00	3,65	7,30
Insumo	245	ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	Material		un	1,00	188,88	188,88
Insumo	2016	ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	Material		un	1,00	178,60	178,60
Insumo	9964	ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material		m	1,20	19,61	23,53
Insumo	14004	ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar) un	0		un	1,00	186,45	186,45
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	2,00	19,81	39,62
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	2,00	19,81	39,62
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	2,00	11,96	23,92
Insumo	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Material		UN	1,00	52,93	52,93
				MO sem LS =>	52,82	LS =>	60,62	MO com LS =>	113,44
				Valor do BDI =>	205,54			Valor com BDI =>	1.029,04
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.029,04

18.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2093	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,valvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	Louças e Metais Sanitários		un	1,00	1.630,88	1.630,88
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples		m³	0,06	762,70	45,76
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	4,80	14,07	67,53
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	4,00	3,74	14,96
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	4,00	3,60	14,40
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	4,00	3,65	14,60
Insumo	246	ORSE	Pia de cozinha em aço inox 2,00x0,60m c/ 2 cubas, sem valvula (padrão comercial) un	0		un	1,00	407,82	407,82
Insumo	2016	ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	Material		un	2,00	178,60	357,20
Insumo	9964	ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material		m	1,20	19,61	23,53
Insumo	14004	ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar) un	0		un	2,00	186,45	372,90
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	4,00	19,81	79,24
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	4,00	19,81	79,24
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	4,00	11,96	47,84
Insumo	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Material		UN	2,00	52,93	105,86
				MO sem LS =>	104,04	LS =>	119,41	MO com LS =>	223,45
				Valor do BDI =>	407,06			Valor com BDI =>	2.037,94
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.037,94

19			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						12.244,54
19.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93243	SINAPI	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saida, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		UN	1,00	6.872,09	6.872,09
Composição Auxiliar	98462	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		UN	1,00	5.470,89	5.470,89
Composição Auxiliar	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	3,00	7,50	22,50
Composição Auxiliar	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	20,00	10,57	211,40
Composição Auxiliar	94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	2,00	9,99	19,98
Composição Auxiliar	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	21,17	21,17
Composição Auxiliar	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	42,72	42,72
Composição Auxiliar	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	34,02	34,02
Insumo	00034640	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	Material		UN	1,00	1.049,41	1.049,41
				MO sem LS =>	196,64	LS =>	225,70	MO com LS =>	422,34
				Valor do BDI =>	1.715,27			Valor com BDI =>	8.587,36
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	8.587,36

19.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89446	SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	5,76	5,76
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	17,86	0,34
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	24,86	0,48
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,00	2,30	0,01
Insumo	00009865	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,05	4,70	4,93
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,64
				Valor do BDI =>	1,43			Valor com BDI =>	7,19
						Quant. =>	28,90	Preço Total =>	207,79

19.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89448	SINAPI	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	17,32	17,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	17,86	0,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	24,86	0,70
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,01	2,30	0,01
Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,05	15,36	16,11
				MO sem LS =>	0,43	LS =>	0,49	MO com LS =>	0,92
				Valor do BDI =>	4,32			Valor com BDI =>	21,64
						Quant. =>	30,10	Preço Total =>	651,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 281
Rúbrica

19.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443	SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	12,41	12,41
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,86	1,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,45	24,86	11,16
				MO sem LS =>	4,62	LS =>	5,31	MO com LS =>	9,93
				Valor do BDI =>	3,09			Valor com BDI =>	15,50
						Quant. =>	19,75	Preço Total =>	306,12

19.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362	SINAPI	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	8,20	8,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,15	17,86	2,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,15	24,86	3,77
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,32
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,00	0,93	0,93
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,03	2,30	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,40
				MO sem LS =>	2,34	LS =>	2,69	MO com LS =>	5,03
				Valor do BDI =>	2,04			Valor com BDI =>	10,24
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	81,92

19.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89364	SINAPI	Curva 90° soldável 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	11,16	11,16
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,15	17,86	2,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,15	24,86	3,77
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,32
Insumo	00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,00	3,89	3,89
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,03	2,30	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,40
				MO sem LS =>	2,34	LS =>	2,69	MO com LS =>	5,03
				Valor do BDI =>	2,78			Valor com BDI =>	13,94
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	27,88

19.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373	SINAPI	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	14,02	14,02
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	17,86	2,34
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	24,86	3,26
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,26
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,00	7,74	7,74
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,03	2,30	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,35
				MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,32	MO com LS =>	4,34
				Valor do BDI =>	3,49			Valor com BDI =>	17,51
						Quant. =>	11,00	Preço Total =>	192,61

19.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1144	ORSE	Joelho de redução 90º soldável 40 x 25mm água fria	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável		un	1,00	13,26	13,26
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,18	3,74	0,67
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,18	3,65	0,65
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,01	81,38	0,48
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,01	78,37	0,78
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,18	19,81	3,56
Insumo	00003538	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,00	4,97	4,97
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,18	11,96	2,15
				MO sem LS =>	2,66	LS =>	3,05	MO com LS =>	5,71
				Valor do BDI =>	3,30			Valor com BDI =>	16,56
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	99,36

19.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89497	SINAPI	Joelho 90° soldável 40mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	12,29	12,29
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	17,86	1,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	24,86	2,60
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,53
Insumo	00003535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,00	6,56	6,56
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,02	2,30	0,03
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,71
				MO sem LS =>	1,62	LS =>	1,85	MO com LS =>	3,47
				Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	15,35
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	46,05

19.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1466	ORSE	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	Registros e Válvulas		un	1,00	102,73	102,73
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,61	3,74	2,28
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,61	3,65	2,22
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	1,20	0,22	0,26
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,61	19,81	12,08
Insumo	00006013	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	Material		UN	1,00	78,60	78,60
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,61	11,96	7,29
				MO sem LS =>	9,02	LS =>	10,35	MO com LS =>	19,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU -
Fls. 289
Rúbrica

				Valor do BDI =>	25,64			Valor com BDI =>	128,37
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	385,11
19.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383	SINAPI	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	5,81	5,81
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,09	17,86	1,68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,09	24,86	2,34
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material		UN	1,00	1,11	1,11
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,26
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,03	2,30	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,35
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,67	MO com LS =>	3,12
				Valor do BDI =>	1,45			Valor com BDI =>	7,26
						Quant. =>	14,00	Preço Total =>	101,64
19.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1470	ORSE	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	Registros e Válvulas		un	1,00	80,52	80,52
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,61	3,74	2,28
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,61	3,65	2,22
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,94	0,22	0,20
Insumo	1966	ORSE	Registro pressão 3/4" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	Material		un	1,00	56,45	56,45
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,61	19,81	12,08
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,61	11,96	7,29
				MO sem LS =>	9,02	LS =>	10,35	MO com LS =>	19,37
				Valor do BDI =>	20,09			Valor com BDI =>	100,61
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	100,61
19.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395	SINAPI	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	11,40	11,40
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,20	17,86	3,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,20	24,86	5,03
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,47
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,05	2,30	0,11
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,61
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,00	1,57	1,57
				MO sem LS =>	3,13	LS =>	3,59	MO com LS =>	6,72
				Valor do BDI =>	2,84			Valor com BDI =>	14,24
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	85,44
19.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89420	SINAPI	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	9,31	9,31
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,05	17,86	0,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,05	24,86	1,29
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,27
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,03	2,30	0,05
Insumo	00003855	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	Material		UN	1,00	6,48	6,48
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,30
				MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,92	MO com LS =>	1,72
				Valor do BDI =>	2,32			Valor com BDI =>	11,63
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	11,63
19.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89623	SINAPI	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	19,33	19,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,14	17,86	2,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,14	24,86	3,48
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,02	45,08	0,79
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,02	2,30	0,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,02	51,08	1,07
Insumo	00007141	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,00	11,44	11,44
				MO sem LS =>	2,16	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,64
				Valor do BDI =>	4,82			Valor com BDI =>	24,15
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>	120,75
19.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3147	ORSE	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm agua fria	Conversão InfoWOrca		un	1,00	19,02	19,02
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,30	3,74	1,12
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,30	3,65	1,09
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,01	81,38	1,13
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,02	78,37	1,56
Insumo	2572	ORSE	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm	Material		un	1,00	4,60	4,60
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,30	19,81	5,94
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,30	11,96	3,58
				MO sem LS =>	4,43	LS =>	5,09	MO com LS =>	9,52
				Valor do BDI =>	4,74			Valor com BDI =>	23,76
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	23,76
19.17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94491	SINAPI	Registro de esfera soldável 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	43,62	43,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,11	17,86	2,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA - PMU -
Fls. 290
Rúbrica

Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11	24,86	2,81
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,07	14,71	1,05
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01	2,30	0,02
Insumo	00011676 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,00	36,81	36,81
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02	51,08	0,91
			MO sem LS => 1,75	LS =>	2,00	MO com LS =>	3,75
			Valor do BDI => 10,88			Valor com BDI =>	54,50
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	54,50

19.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94489 SINAPI	Registro de esfera soldável 25mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	21,79	21,79
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08	17,86	1,41
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08	24,86	1,97
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,04	14,71	0,58
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01	2,30	0,01
Insumo	00011674 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,00	17,34	17,34
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	51,08	0,48
			MO sem LS => 1,22	LS =>	1,41	MO com LS =>	2,63
			Valor do BDI => 5,43			Valor com BDI =>	27,22
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	27,22

19.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74166/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	752,69	752,69
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	17,86	17,86
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	24,86	24,86
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	25,49	38,23
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	17,38	26,07
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,00	52,14	0,10
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,00	1,36	2,72
Insumo	00003279 SINAPI	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60" CM, H= 60" CM	Material	UN	2,92	220,42	642,85
			MO sem LS => 38,01	LS =>	43,63	MO com LS =>	81,64
			Valor do BDI => 187,87			Valor com BDI =>	940,56
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	940,56

19.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2082 ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,00	51,45	51,45
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,34	3,74	1,27
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,34	3,65	1,24
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,30	0,22	0,06
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,34	19,81	6,73
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,34	11,96	4,06
Insumo	00011762 SINAPI	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)	Material	UN	1,00	38,09	38,09
			MO sem LS => 5,02	LS =>	5,77	MO com LS =>	10,79
			Valor do BDI => 12,84			Valor com BDI =>	64,29
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	192,87

20		INSTALAÇÃO SANITÁRIA					19.461,49
20.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	18,38	18,38
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30	17,86	5,35
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30	24,86	7,45
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,10	2,30	0,23
Insumo	00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,05	5,10	5,35
			MO sem LS => 4,63	LS =>	5,31	MO com LS =>	9,94
			Valor do BDI => 4,58			Valor com BDI =>	22,96
				Quant. =>	9,10	Preço Total =>	208,93

20.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	26,93	26,93
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	17,86	6,78
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	24,86	9,44
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,01	45,08	0,48
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,13	2,30	0,29
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02	51,08	0,83
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,05	8,68	9,11
			MO sem LS => 5,87	LS =>	6,73	MO com LS =>	12,60
			Valor do BDI => 6,72			Valor com BDI =>	33,65
				Quant. =>	12,40	Preço Total =>	417,26

20.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714 SINAPI	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00	51,65	51,65
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,74	17,86	13,21
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,74	24,86	18,39
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,04	45,08	1,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU -
Fls. 241
Rúbrica

Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,25	2,30	0,56
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,06	51,08	3,02
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,05	14,14	14,84
				MO sem LS =>	11,43	LS =>	13,11	MO com LS =>	24,54
				Valor do BDI =>	12,89			Valor com BDI =>	64,54
						Quant. =>	28,00	Preço Total =>	1.807,12

20.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443	SINAPI	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitarios	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	12,41	12,41
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,86	1,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,45	24,86	11,16
				MO sem LS =>	4,62	LS =>	5,31	MO com LS =>	9,93
				Valor do BDI =>	3,09			Valor com BDI =>	15,50
						Quant. =>	8,40	Preço Total =>	130,20

20.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89796	SINAPI	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	37,24	37,24
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,33	17,86	5,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,33	24,86	8,20
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,00	3,00	6,00
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,09	18,61	1,71
Insumo	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	15,44	15,44
				MO sem LS =>	5,09	LS =>	5,84	MO com LS =>	10,93
				Valor do BDI =>	9,29			Valor com BDI =>	46,53
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	139,59

20.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1588	ORSE	Tê sanitário em PVC rígido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		un	1,00	48,25	48,25
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,46	3,74	1,72
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,46	3,65	1,67
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,05	81,38	6,10
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,12	78,37	9,40
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,46	19,81	9,11
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,46	11,96	5,50
Insumo	00011655	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	14,75	14,75
				MO sem LS =>	6,80	LS =>	7,81	MO com LS =>	14,61
				Valor do BDI =>	12,04			Valor com BDI =>	60,29
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	60,29

20.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89785	SINAPI	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	19,93	19,93
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	17,86	3,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	24,86	4,22
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,00	1,69	3,38
Insumo	00003662	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	8,56	8,56
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,04	18,61	0,74
				MO sem LS =>	2,62	LS =>	3,01	MO com LS =>	5,63
				Valor do BDI =>	4,97			Valor com BDI =>	24,90
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	24,90

20.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1603	ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		un	1,00	11,22	11,22
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,12	3,74	0,44
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,12	3,65	0,43
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,02	81,38	1,30
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,02	78,37	1,72
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,12	19,81	2,37
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	3,53	3,53
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,12	11,96	1,43
				MO sem LS =>	1,77	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,80
				Valor do BDI =>	2,80			Valor com BDI =>	14,02
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>	140,20

20.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1554	ORSE	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		un	1,00	10,84	10,84
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,14	3,74	0,52
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,14	3,65	0,51
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,02	81,38	1,22
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,02	78,37	1,72
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,14	19,81	2,77
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	2,43	2,43
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,14	11,96	1,67
				MO sem LS =>	2,07	LS =>	2,37	MO com LS =>	4,44
				Valor do BDI =>	2,70			Valor com BDI =>	13,54
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>	135,40

20.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 292
Rúbrica

Composição	89744	SINAPI	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	22,56	22,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	17,86	4,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	24,86	6,21
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,00	3,00	3,00
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	8,04	8,04
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,05	18,61	0,85
				MO sem LS =>	3,86	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,29
				Valor do BDI =>	5,63			Valor com BDI =>	28,19
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>	112,76

20.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732	SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	10,64	10,64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	17,86	2,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	24,86	3,23
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,00	1,69	1,69
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	3,03	3,03
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,02	18,61	0,37
				MO sem LS =>	2,01	LS =>	2,30	MO com LS =>	4,31
				Valor do BDI =>	2,65			Valor com BDI =>	13,29
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	13,29

20.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89726	SINAPI	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	6,51	6,51
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	17,86	1,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,10	24,86	2,48
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,44
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	1,01	1,01
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,02	2,30	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,02	51,08	0,76
				MO sem LS =>	1,54	LS =>	1,76	MO com LS =>	3,30
				Valor do BDI =>	1,62			Valor com BDI =>	8,13
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	16,26

20.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89750	SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	59,30	59,30
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	17,86	4,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	24,86	6,21
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,00	3,00	3,00
Insumo	00001970	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	44,78	44,78
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,05	18,61	0,85
				MO sem LS =>	3,86	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,29
				Valor do BDI =>	14,80			Valor com BDI =>	74,10
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	148,20

20.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89735	SINAPI	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	18,05	18,05
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	17,86	2,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	24,86	3,23
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,00	1,69	1,69
Insumo	00001968	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	10,44	10,44
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,02	18,61	0,37
				MO sem LS =>	2,01	LS =>	2,30	MO com LS =>	4,31
				Valor do BDI =>	4,50			Valor com BDI =>	22,55
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	45,10

20.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89709	SINAPI	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	9,98	9,98
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	17,86	1,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	24,86	1,74
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,00	45,08	0,22
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,02	2,30	0,03
Insumo	00011741	SINAPI	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material		UN	1,00	6,36	6,36
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,01	51,08	0,38
				MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,31
				Valor do BDI =>	2,49			Valor com BDI =>	12,47
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	37,41

20.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707	SINAPI	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no minimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	27,35	27,35
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	17,86	4,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	24,86	6,21
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,00	1,69	1,69
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material		UN	0,01	45,08	0,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA - PMU
Fls. 293
Rúbrica

Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material		UN	1,00	12,68	12,68
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,06	2,30	0,14
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material		UN	0,02	18,61	0,37
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,02	51,08	1,14
				MO sem LS =>	3,86	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,29
				Valor do BDI =>	6,82			Valor com BDI =>	34,17
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	102,51

20.17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1536	ORSE	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto		un	1,00	18,57	18,57
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,12	3,74	0,44
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0,12	3,65	0,43
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0,03	81,38	2,03
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0,04	78,37	3,13
Insumo	00001200	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,00	8,74	8,74
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,12	19,81	2,37
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,12	11,96	1,43
				MO sem LS =>	1,77	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,80
				Valor do BDI =>	4,63			Valor com BDI =>	23,20
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	46,40

20.18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98078	SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	4.377,10	4.377,10
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,24	54,71	13,30
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,12	151,78	18,12
Composição Auxiliar	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,10	1.285,17	133,65
Composição Auxiliar	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	3,21	14,01	44,94
Composição Auxiliar	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,04	54,19	56,35
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,13	2.675,67	337,13
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,03	3.113,31	78,45
Composição Auxiliar	101625	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,19	108,44	20,27
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,02	940,90	959,81
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	31,15	25,49	793,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	24,47	17,38	425,31
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,37	241,18	89,14
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	2.198,02	0,64	1.406,73
				MO sem LS =>	571,22	LS =>	655,64	MO com LS =>	1.226,86
				Valor do BDI =>	1.092,52			Valor com BDI =>	5.469,62
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	5.469,62

20.19	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98082	SINAPI	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,00	4.060,16	4.060,16
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,14	54,71	7,66
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,07	151,78	10,70
Composição Auxiliar	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,10	1.317,88	137,85
Composição Auxiliar	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,10	1.285,17	134,42
Composição Auxiliar	89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	3,46	14,46	50,03
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,75	671,35	506,13
Composição Auxiliar	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	4,20	14,01	58,78
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	20,01	19,23	384,83
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,24	2.675,67	629,31
Composição Auxiliar	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,30	330,55	98,83
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,09	620,01	54,68
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,47	786,56	373,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	21,99	25,49	560,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	17,26	17,38	300,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU -
Fls. 294
Rúbrica

Insumo	00025067	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material		UN	106,89	5,71	610,36
Insumo	00000660	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material		UN	35,70	3,54	126,37
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,02	7,10	0,13
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,42	2,74	1,15
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,04	21,63	0,96
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,50	0,96	0,48
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,57	8,23	12,94
				MO sem LS =>	527,69	LS =>	605,68	MO com LS =>	1.133,37
				Valor do BDI =>	1.013,41			Valor com BDI =>	5.073,57
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	5.073,57

20.20	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2798	ORSE	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforçada, revestida internamente com barra lisa e fundo em concreto	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços		un	1,00	533,42	533,42
Composição Auxiliar	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações		m²	0,78	87,37	68,14
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples		m³	0,11	762,70	83,13
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm. Inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	3,20	15,06	48,19
Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação		m²	2,24	101,14	226,55
Composição Auxiliar	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas		m²	1,92	34,25	65,76
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana		m³	0,58	47,10	27,12
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca		m²	1,92	7,57	14,53
				MO sem LS =>	100,32	LS =>	115,14	MO com LS =>	215,46
				Valor do BDI =>	133,14			Valor com BDI =>	666,56
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	5.332,48

21			COMBATE A INCÊNDIO						641,21
21.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101909	SINAPI	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,00	215,71	215,71
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,46	17,86	8,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,46	24,86	11,37
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material		UN	2,00	0,59	1,18
Insumo	00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material		UN	1,00	195,00	195,00
				MO sem LS =>	7,06	LS =>	8,10	MO com LS =>	15,16
				Valor do BDI =>	53,84			Valor com BDI =>	269,55
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	539,10

21.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10363	ORSE	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	Sinalização Vertical		un	1,00	24,97	24,97
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	0,25	3,63	0,90
Insumo	2682	ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	Material		un	4,00	0,14	0,56
Insumo	11143	ORSE	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2,mm	Material		un	1,00	18,56	18,56
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	0,25	19,81	4,95
				MO sem LS =>	2,30	LS =>	2,65	MO com LS =>	4,95
				Valor do BDI =>	6,23			Valor com BDI =>	31,20
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	62,40

21.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11852	ORSE	Placa de sinalização padrão para saída de emergência 400x120mm	Sinalização Vertical		Un	1,00	31,78	31,78
Insumo	00037559	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Material		UN	1,00	31,78	31,78
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,93			Valor com BDI =>	39,71
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	39,71

22			INSTALAÇÃO ELÉTRICA						28.832,80
22.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940	SINAPI	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,00	14,35	14,35
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,00	861,54	0,77
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	18,65	4,60
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	25,76	6,36
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1,00	2,62	2,62
				MO sem LS =>	3,91	LS =>	4,49	MO com LS =>	8,40
				Valor do BDI =>	3,58			Valor com BDI =>	17,93
						Quant. =>	46,00	Preço Total =>	824,78

22.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível, isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	2,81	2,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	18,65	0,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	25,76	0,61
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,19	1,47	1,74

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 295
Rúbrica

Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,79
				Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,51
						Quant. =>	62,60	Preço Total =>	219,72

22.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: BRANCO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	2,81	2,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	18,65	0,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	25,76	0,61
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,19	1,47	1,74
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,79
				Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,51
						Quant. =>	76,60	Preço Total =>	268,86

22.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	2,81	2,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	18,65	0,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	25,76	0,61
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,19	1,47	1,74
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,79
				Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,51
						Quant. =>	52,60	Preço Total =>	184,62

22.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe termica 70°C. COR: VERMELHO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	2,81	2,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	18,65	0,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,02	25,76	0,61
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,19	1,47	1,74
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,79
				Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,51
						Quant. =>	142,20	Preço Total =>	499,12

22.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe termica 70°C. COR: AZUL CLARO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	4,13	4,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,65	0,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	25,76	0,77
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,19	2,35	2,79
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
				MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>	5,16
						Quant. =>	142,20	Preço Total =>	733,75

22.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	4,13	4,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,65	0,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	25,76	0,77
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,19	2,35	2,79
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02
				MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>	5,16
						Quant. =>	82,60	Preço Total =>	426,21

22.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERDE.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	4,13	4,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,65	0,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	25,76	0,77
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,19	2,35	2,79
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,01	3,32	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA - PMU
Fls. 296
Rúbrica

				MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>	5,16
						Quant. =>	188,30	Preço Total =>	971,62

22.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe termica 70°C. COR: VERMELHO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	4,13	4,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	18,65	0,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	25,76	0,77
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,19	2,35	2,79
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,32	0,02
				MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>	5,16
						Quant. =>	153,90	Preço Total =>	794,12

22.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	25,10	25,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,65	2,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	25,76	2,96
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	16,79	19,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,32	0,02
				MO sem LS =>	1,80	LS =>	2,06	MO com LS =>	3,86
				Valor do BDI =>	6,26			Valor com BDI =>	31,36
						Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.254,40

22.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	25,10	25,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,65	2,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	25,76	2,96
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	16,79	19,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,32	0,02
				MO sem LS =>	1,80	LS =>	2,06	MO com LS =>	3,86
				Valor do BDI =>	6,26			Valor com BDI =>	31,36
						Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.254,40

22.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERDE.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	25,10	25,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,65	2,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	25,76	2,96
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	16,79	19,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,32	0,02
				MO sem LS =>	1,80	LS =>	2,06	MO com LS =>	3,86
				Valor do BDI =>	6,26			Valor com BDI =>	31,36
						Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.254,40

22.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	25,10	25,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	18,65	2,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	25,76	2,96
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,19	16,79	19,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,32	0,02
				MO sem LS =>	1,80	LS =>	2,06	MO com LS =>	3,86
				Valor do BDI =>	6,26			Valor com BDI =>	31,36
						Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.254,40

22.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2794	ORSE	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,00	274,28	274,28
Composição Auxiliar	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,44	87,37	38,79
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,06	762,70	43,93
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 50 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,29	14,07	18,20
Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 1S - 1:2,8 (cimento / cal / areia) e junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,20	101,14	121,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ... - PMBV
Fls. 297
Rúbrica

Composição Auxiliar	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t1 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	0,96	34,25	32,88
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,25	47,10	11,86
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,96	7,57	7,26
				MO sem LS => 51,86	LS =>	59,52	MO com LS =>	111,38
				Valor do BDI => 68,46			Valor com BDI =>	342,74
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	1.028,22

22.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993	SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	38,99	38,99
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	7,41	7,41
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	31,58	31,58
				MO sem LS => 8,95	LS =>	10,27	MO com LS =>	19,22
				Valor do BDI => 9,73			Valor com BDI =>	48,72
					Quant. =>	14,00	Preço Total =>	682,08

22.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91973	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	81,59	81,59
Composição Auxiliar	91950	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	11,77	11,77
Composição Auxiliar	91972	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	69,82	69,82
				MO sem LS => 15,37	LS =>	17,64	MO com LS =>	33,01
				Valor do BDI => 20,36			Valor com BDI =>	101,95
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	203,90

22.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	43,47	43,47
Composição Auxiliar	91956	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	36,06	36,06
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	7,41	7,41
				MO sem LS => 8,57	LS =>	9,84	MO com LS =>	18,41
				Valor do BDI => 10,85			Valor com BDI =>	54,32
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	108,64

22.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	68,66	68,66
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	7,41	7,41
Composição Auxiliar	91968	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	61,25	61,25
				MO sem LS => 13,75	LS =>	15,78	MO com LS =>	29,53
				Valor do BDI => 17,13			Valor com BDI =>	85,79
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	171,58

22.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	23,95	23,95
Composição Auxiliar	91945	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	7,41	7,41
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	16,54	16,54
				MO sem LS => 4,70	LS =>	5,40	MO com LS =>	10,10
				Valor do BDI => 5,97			Valor com BDI =>	29,92
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	59,84

22.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959	SINAPI	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	37,84	37,84
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	7,41	7,41
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	30,43	30,43
				MO sem LS => 7,29	LS =>	8,36	MO com LS =>	15,65
				Valor do BDI => 9,44			Valor com BDI =>	47,28
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	47,28

22.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12241	ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	1,00	275,71	275,71
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,80	3,59	17,23
Insumo	558	ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplastica p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	Material	un	1,00	163,40	163,40
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,80	19,81	95,08
				MO sem LS => 44,27	LS =>	50,81	MO com LS =>	95,08
				Valor do BDI => 68,81			Valor com BDI =>	344,52
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	344,52

22.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10237	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,00	122,14	122,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - PMC
Fls. 290
Rúbrica

Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,60	3,74	2,24
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	0,60	3,59	2,15
Insumo	3692	ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material		un	1,00	98,70	98,70
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,60	19,81	11,88
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,60	11,96	7,17
				MO sem LS =>	8,87	LS =>	10,18	MO com LS =>	19,05
				Valor do BDI =>	30,45			Valor com BDI =>	152,62
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	305,24

22.23	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93662	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	55,41	55,41
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	18,65	2,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,13	25,76	3,41
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,00	47,35	47,35
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	2,00	1,09	2,18
				MO sem LS =>	2,08	LS =>	2,38	MO com LS =>	4,46
				Valor do BDI =>	13,83			Valor com BDI =>	59,24
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	415,44

22.24	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	12,28	12,28
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	18,65	1,23
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	25,76	1,70
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,00	8,26	8,26
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	1,00	1,09	1,09
				MO sem LS =>	1,04	LS =>	1,19	MO com LS =>	2,23
				Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	15,34
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	122,72

22.25	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91863	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		M	1,00	11,60	11,60
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	3,22	3,22
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,08	18,65	1,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,08	25,76	2,11
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material		M	1,02	4,68	4,75
				MO sem LS =>	1,98	LS =>	2,28	MO com LS =>	4,26
				Valor do BDI =>	2,89			Valor com BDI =>	14,49
						Quant. =>	75,00	Preço Total =>	1.086,75

22.26	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91864	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		M	1,00	15,35	15,35
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	3,22	3,22
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,11	18,65	1,97
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,11	25,76	2,73
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material		M	1,02	7,31	7,43
				MO sem LS =>	2,36	LS =>	2,71	MO com LS =>	5,07
				Valor do BDI =>	3,83			Valor com BDI =>	19,18
						Quant. =>	9,40	Preço Total =>	180,29

22.27	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91871	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		M	1,00	12,29	12,29
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	18,65	3,17
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,17	25,76	4,37
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material		M	1,02	4,68	4,75
				MO sem LS =>	2,66	LS =>	3,05	MO com LS =>	5,71
				Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	15,35
						Quant. =>	50,30	Preço Total =>	772,10

22.28	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		M	1,00	16,03	16,03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,19	18,65	3,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,19	25,76	4,89
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material		M	1,02	7,31	7,43
				MO sem LS =>	3,04	LS =>	3,48	MO com LS =>	6,52
				Valor do BDI =>	4,00			Valor com BDI =>	20,03
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	120,18

22.29	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91873	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		M	1,00	19,71	19,71
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,22	18,65	4,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - PMBV
Fls. 299
Rúbrica

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,22	25,76	5,66
Insumo	00002684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	Material		M	1,02	9,74	9,90
				MO sem LS =>	3,46	LS =>	3,97	MO com LS =>	7,43
				Valor do BDI =>	4,91			Valor com BDI =>	24,62
						Quant. =>	36,00	Preço Total =>	886,32

22.30	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447	SINAPI	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,00	6,19	6,19
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,65	0,63
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,22	25,76	5,56
				MO sem LS =>	2,26	LS =>	2,59	MO com LS =>	4,85
				Valor do BDI =>	1,54			Valor com BDI =>	7,73
						Quant. =>	57,80	Preço Total =>	446,79

22.31	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8324	ORSE	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 100W.	Luminárias Internas		un	1,00	9,67	9,67
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	0,20	3,59	0,71
Insumo	8518	ORSE	Plafon plastico branco com soquete E-27	Material		un	1,00	5,00	5,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,20	19,81	3,96
				MO sem LS =>	1,84	LS =>	2,12	MO com LS =>	3,96
				Valor do BDI =>	2,41			Valor com BDI =>	12,08
						Quant. =>	29,00	Preço Total =>	350,32

22.32	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97607	SINAPI	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	137,10	137,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,23	18,65	4,28
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,55	25,76	14,21
Insumo	00038193	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material		UN	1,00	7,12	7,12
Insumo	00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material		UN	1,00	111,49	111,49
				MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,64	MO com LS =>	14,30
				Valor do BDI =>	34,22			Valor com BDI =>	171,32
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>	856,60

22.33	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11857	ORSE	Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt	Luminárias Internas		un	1,00	27,49	27,49
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	0,15	3,59	0,53
Insumo	12689	ORSE	Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt un	0		un	1,00	23,99	23,99
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,15	19,81	2,97
				MO sem LS =>	1,38	LS =>	1,59	MO com LS =>	2,97
				Valor do BDI =>	6,86			Valor com BDI =>	34,35
						Quant. =>	31,00	Preço Total =>	1.064,85

22.34	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97599	SINAPI	Luminaria de Emergência bivolt, com 30 LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,00	26,61	26,61
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,07	18,65	1,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,18	25,76	4,62
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material		UN	1,00	20,60	20,60
				MO sem LS =>	2,17	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,65
				Valor do BDI =>	6,64			Valor com BDI =>	33,25
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	99,75

22.35	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985	SINAPI	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 mícrons de espessura por eletrodeposição anódica e pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco, diâmetro de 5/8" e comprimento de 3,0m. Conforme as normas NBR 13571/96 e UL-467.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00	81,94	81,94
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	18,65	4,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,25	25,76	6,51
Insumo	00003379	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material		UN	1,00	70,71	70,71
				MO sem LS =>	3,97	LS =>	4,55	MO com LS =>	8,52
				Valor do BDI =>	20,45			Valor com BDI =>	102,39
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	307,17

22.36	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96977	SINAPI	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR 5111.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,00	59,24	59,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	18,65	0,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,03	25,76	0,86
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1,10	52,51	57,76
				MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,60	MO com LS =>	1,12
				Valor do BDI =>	14,78			Valor com BDI =>	74,02
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>	740,20

22.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMIRIM - PMU
Fls. 300
&
Rúbrica

Composição	4192	ORSE	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	Subestação Transformadora em Poste	un	1,00	11,95	11,95
Insumo	00011862	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	Material	UN	1,00	11,95	11,95
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,98			Valor com BDI =>	14,93
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	29,86

22.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4014	ORSE	Fita isolante tipo 33+ plastica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20 (vinte) metros de comprimento, conforme norma ABNT NBR NM 60454-3, tipo 5, Classe A, 90°C, espessura de 0,19mm e isolação para até 750V.	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	Un	1,00	8,78	8,78
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	1,00	8,78	8,78
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,19			Valor com BDI =>	10,97
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	32,91

22.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4015	ORSE	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação, cor preta, espessura de 0,76mm, para isolação até 69kV. Rolos de 19mm de largura com 10 (dez) metros de comprimento	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	Un	1,00	12,60	12,60
Insumo	2643	ORSE	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	Material	un	1,00	12,60	12,60
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3,14			Valor com BDI =>	15,74
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	47,22

22.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	68,75	68,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	17,38	68,75
				MO sem LS => 22,40	LS =>	25,70	MO com LS =>	48,10
				Valor do BDI => 17,16			Valor com BDI =>	85,91
					Quant. =>	4,50	Preço Total =>	386,59

22.41	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	41,68	41,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	17,38	41,68
				MO sem LS => 13,58	LS =>	15,58	MO com LS =>	29,16
				Valor do BDI => 10,40			Valor com BDI =>	52,08
					Quant. =>	3,50	Preço Total =>	182,28

22.42	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101502	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	1.728,29	1.728,29
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,05	16,03	96,98
Composição Auxiliar	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	9,91	9,91
Composição Auxiliar	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	16,72	16,72
Composição Auxiliar	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	16,93	16,93
Composição Auxiliar	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	16,65	25,10	417,91
Composição Auxiliar	93686	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	66,74	66,74
Composição Auxiliar	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	488,96	488,96
Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,95	59,24	115,51
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	122,17	122,17
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,02	717,74	11,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,32	18,65	6,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,91	25,76	74,96
Insumo	00001094	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,00	27,21	27,21
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	Material	UN	2,00	1,11	2,22
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	Material	UN	1,00	23,07	23,07
Insumo	00039809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,00	164,11	164,11
Insumo	00011864	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	1,00	26,97	26,97
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,06	55,49	3,32
Insumo	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	1,00	5,01	5,01
Insumo	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,00	9,42	28,26
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,00	0,28	0,56
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	0,17	5,07	0,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ... - PMUI -
Fls. 301
Rúbrica

		MO sem LS =>	149,98	LS =>	172,14	MO com LS =>	322,12
		Valor do BDI =>	431,38			Valor com BDI =>	2.159,67
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.159,67

22.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	585,13	585,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,06	18,65	19,70
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,44	25,76	88,53
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	2,00	37,70	75,40
Insumo	00011975	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	Material	UN	4,00	21,83	87,32
Insumo	00012388	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINÁRIA, H = *2,5* M	Material	UN	1,00	314,15	314,15
				MO sem LS =>	39,19	LS =>	44,98	MO com LS =>	84,17
				Valor do BDI =>	146,04			Valor com BDI =>	731,17
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.462,34

22.44	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12628	ORSE	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,00	3.353,68	3.353,68
Composição Auxiliar	80	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12 mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	3,70	101,99	377,36
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,70	47,10	32,97
Composição Auxiliar	10603	ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios	h	1,00	4,20	4,20
Composição Auxiliar	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 20% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,51	733,13	1.107,02
Insumo	8904	ORSE	Máquina de solda elétrica	Equipamento	h	0,85	3,86	3,28
Insumo	13424	ORSE	Roldana de aço, com rolamento, Ø =30mm	Material	un	3,00	50,99	152,97
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR	Mão de Obra	H	1,00	21,65	21,65
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,85	22,08	18,76
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	6,60	68,64	453,02
Insumo	00021013	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	Material	M	13,20	89,58	1.182,45
				MO sem LS =>	212,40	LS =>	243,80	MO com LS =>	456,20
				Valor do BDI =>	837,07			Valor com BDI =>	4.190,75
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	4.190,75

Tipo de Licitação Convite
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório Processo Administrativo nº

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Engº Civil. Engª Civil Ariane Amorim
CREA-RR nº 091843565-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 202
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ

ATA DE CREDENCIAMENTO, HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO 013/2022. PROCESSO Nº 135/2022

Na data de 24 (vinte e quatro) de outubro de 2022, às 10h:30, reuniu-se na Sala de Reuniões da CPL, a Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 003-A/2022, com a seguinte composição: Presidente da Comissão Permanente de Licitação – SANDRO DA SILVA MAFRA, Membros da Comissão Permanente de Licitação: JULIANA SOUZA DA SILVA; CLEICIANE PINHO DE ASSIS, e Engenheiro: MARCOS DOMINGOS DA SILVA com a finalidade de proceder a abertura do processo licitatórioTomada de Preço Nº 013/2022, tendo como objeto: **" CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO´KO TEREZA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ I - UIRAMUTÃ/RR,** conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital T.P. nº 013/2022**".** Para credenciamento da empresa presente, nos termos do Edital e abertura dos envelopes n° 1, e do envelope n° 2. Aberta a sessão pelo Presidente da CPL, o representante da licitante presente na sessão foi identificado, credenciado e colhida sua assinatura. Compareceu à sessão: **LUCAS MAGALHÃES BRIGLIA** brasileiro, CPF n° 016.228.392-00, RG n° 361962-1 SSP/RR credenciado legal da empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ n° 38.080.939/0001-86. Seguidamente, o presidente da CPL, dando continuidade aos trabalhos da Comissão passa a análise dos documentos de habilitação da empresa participante, nos termos do art. 43 da Lei 8666/93, quanto a habilitação da empresa participante da licitação em epígrafe**.** Pois bem, quanto a habilitação jurídica, a empresa licitante apresentou as cédulas de identidade de seus representantes e o comprovante de registro comercial. Referente a regularidade fiscal e trabalhista as licitantes foram avaliadas, e, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, sendo considerada apta também neste quesito.Quanto à análise da qualificação técnica e aos documentos de qualificação econômica e financeira, foi considerado que a empresa comprovou a qualificação técnica solicitada no instrumento convocatório bem como a comprovou a qualificação econômica e financeira. Por esta razão, esta Comissão Permanente de Licitação delibera de forma unânime pela habilitação da empresa**:** L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ n° 38.080.939/0001-86. Questionado sobre a intenção de interpor recurso quanto a fase de habilitação nos termos do artigo 109 da lei 8.666/93, o representante da licitante renunciou expressamente o direito. Dessa forma, dando continuidade, foi realizado a abertura do envelope de Proposta de Preço, tendo a empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ n° 38.080.939/0001-86.apresentado o valor de R$516.468,16 (Quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos). Após a análise da proposta pelo Engenheiro: MARCOS DOMINGOS DA SILVA, foi considerada classificada. Questionado sobre a intenção de interpor recurso quanto a fase de classificação da proposta nos termos do artigo 109 da lei 8.666/93, o representante da licitante renunciou expressamente o direito.

Diante do exposto, a CPL considera vencedora do certame a licitante **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ n° 38.080.939/0001-86**, que

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 303
Rúbrica

apresentou proposta de preço no valor de **R$516.468,16 (Quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos).** Dessa forma a Comissão publicará o resultado por meio dos sites oficiais. Assim nada mais havendo a tratar o Presidente declarou encerrada a sessão. Determinou a lavratura da presente Ata, que lida e achada conforme foi aprovada e assinado pela comissão.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da C.P.L.

JULIANA SOUZA DA SILVA
Membro da C.P.L.

CLEICIANE PINHO DE ASSIS
Membro da C.P.L.

MARCOS DOMINGOS DA SILVA
Engenheiro

LICITANTE:

L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ n° 38.080.939/0001-86.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 304
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ao: Engenheiro Marcos Domingos da Silva

Remetemos aos autos para análise e emissão do Parecer do Engenheiro para procedimento da parte técnica.

Uiramutã – RR, 24 de outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 135/2022 E DISPENSA N°013/2022

Este relatório trata da análise técnica referente às propostas da dispensa de licitação, processo nº 135/2022, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia responsável para da CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA-COMUNIDADE CARAPARÚ I.
Após a entrega dos envelopes 'Proposta de Preços" das empresas convidadas, realizou-se a análise técnica conforme segue.

1. Valor das Propostas

EMPRESAS (em ordem alfabética)	VALOR DAS PROPOSTAS (R$)	DESCONTO (%)	VALOR DO DESCONTO (R$)
L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA	516.468,16	0,0%	0,00

Todas as propostas estão com valor global igual ou abaixo do valor estimado pelo órgão, que é de R$ 516.468,16 (quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos). Conforme art. 48 § 1º, alínea "b" da Lei 8.666/93, não há proposta inferior a 70 % do valor orçado pela Administração.

2. Planilha de Composição do BDI

EMPRESAS (em ordem alfabética)	BDI (%)
L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA	24,96%

A empresa L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou em sua composição de BDI os tributos referentes aos TRIBUTOS conforme tabela abaixo.

PIS	**0,65%**
COFINS	**3,00%**
ISS	**3,00%**

PREFEITURA MUNICIPAL - PMUI - UIRAMUTÃ
Fls. 306
Rúbrica

3. Planilhas Orçamentárias, composição unitária de preços e declarações complementares

Foram analisadas as planilhas apresentadas pelas empresas, e segue abaixo análise quanto às especificações do Edital.

3.1 A. L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA

Com relação aos quantitativos apresentados na planilha orçamentária, os itens estão em conformidade. Todos os preços de serviços, das etapas e preço global estão abaixo do preço orçado pelo valor de ref. do SINAPI

4. Conclusão

Diante da análise técnica, conclui-se que todas as propostas estão abaixo do valor global estimado pelo órgão e em conformidade com o art. 48 § 1º, alínea "b" da Lei 8.666/93. Todos os valores unitários dos serviços apresentados pelas Licitantes encontram-se com os preços abaixo do valor orçado pela Administração, estando classificadas conforme quadro a seguir:

EMPRESAS (CLASSIFICADAS PELO PREÇO)	VALOR DAS PROPOSTAS (R$)	DESCONTO (%)	VALOR DO DESCONTO (R$)	CLASSIFICAÇÃO
L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA	516.468,16	0,0%	0,00	1ª Classificada

Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022

Engº Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA-RR nº 0905404068
Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI - Fls. 307 Rúbrica

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 013/2022, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO´KO TEREZA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ I - UIRAMUTÃ/RR,** conforme o projeto **básico. O** certame teve como vencedora a empresa: **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ n° 38.080.939/0001-86,** totalizando o valor de **R$516.468,16 (Quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos).**

Uiramutã/RR, 25 de outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 308
Rúbrica

AO CONTROLE INTERNO

Remetemos aos autos para análise e emissão de parecer do controle interno quanto a regularidade dos procedimentos licitatórios.

UIRAMUTÃ – RR, 25 de Outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls 309
Rúbrica

PARECER CONTROLE INTERNO

ORIGEM: Processo de Licitação nº 0135/2022– Tomada de Preço nº 013/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KOKO TEREZA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ, NO MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ.

EMENTA: O Processo em análise por esse controle é referente a abertura do procedimento licitatório realizado na modalidade de Tomada de Preço, do tipo "menor preço", objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KOKO TEREZA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ, NO MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ.**

O Procedimento ocorreu dentro das formalidades legais, conforme detalhado no processo, baseado na Lei 8.666/1993.

É o relatório.

DO CONTROLE INTERNO:

Os Artigos 31, 70 e 74 da CF/88, determinam as competências do controle interno na administração pública municipal, surgiu da necessidade de assegurar aos gestores o cumprimento das leis, normas e políticas vigentes, através do estabelecimento de mecanismos de controle que possibilitem informações à sociedade, impedindo a ocorrência de fraudes e desperdícios, servindo de instrumento que visa garantir a efetividade, a produtividade, a economicidade e a rapidez na prestação do serviço público.

O controle interno é fundamental para se atingir resultados favoráveis em qualquer organização. Na gestão pública os mecanismos de controle existentes previnem o erro, a fraude e odesperdício, trazendo benefícios à população.

DA MODALIDADE ADOTADA

Conforme o Art. 22, Inc II, § 2º da Lei nº 8.666/93, Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

DA ANÁLISE PROCEDIMENTAL

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls 310
Rúbrica

Em exame, quanto aos atos procedimentais na fase interna verificou-se que:

1. Consta nos autos a solicitação que motivação e gerou a despesa com seus devidos anexos,planilhas e cronogramas;
2. O Senhor Prefeito declarou que há adequação orçamentaria e autorizou abertura do processo administrativo de Licitação;
3. Consta o Decreto n.º 003A/2022 e 351A/2022-GAB que nomeia os membros da Comissão de Licitação;
4. O Presidente da Comissão de Licitação Autuou o processo administrativo nº 0135/2022;
5. Consta o despacho enviando as minutas do Edital e seus Anexos e Minuta do Contrato paraanálise do parecer jurídico;
6. Consta o parecer Jurídico, dando ciência que foram analisadas as minutas do Edital e seusAnexos, e Minuta do Contrato, quanto as suas legalidades previstas na Lei;
7. O edital está composto das cláusulas e anexos, concernentes ao que prever a legislação emvigor, visto que atende os requisitos legais e regimentais desta lei;
8. Documentos de Hbalitaçã e proposta de Preço;
9. Ata de Credenciamento, Habilitação e Julgamento;
10. Parecer da engenharia.

Não obstante, observo que a Comissão de Licitação adotou as seguintes Leis:

Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações; Lei Complementar n ° 123 de 14 de dezembro de 2006; Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; Instrução Normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Instrução Normativa nº 5 de 25 de maio de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Instrução Normativa nº 6 de 6 de julho de 2018 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão demais normas complementares, bem como pelas condições constantes do presente Edital.

DA PUBLICAÇÃO E DOS PRAZOS

Consta a publicação do Aviso da Licitação, no Diário do Oficial do Estado de Roraima, Imprensa Oficial da União,

EM BRANCO

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls 311
Rúbrica

Diário Oficial dos Municípios de Roraima e Jornal de grande circulação, conforme estabelece a legislação em vigor; Com relação aos prazos que se refere à modalidade adotada, entre a publicação do aviso e aberturado certame foi cumprido o prazo estabelecido é de no mínimo 15 dias, para recebimentos dos envelopes de documentos de Habilitação e Proposta de Preços;

DOS FATOS

O Controle Interno, em suas considerações, faz saber que, após exames detalhados dos atos procedimentais pela Comissão de Licitação, conclui-se, que nenhuma irregularidade foi levantada, entendo que o procedimento realizado está de acordo com a legislação vigente, opto para que sejadado prosseguimento as demais etapas subsequentes, evidenciando a presença efetiva de publicidade de todos os atos realizados.

CONCLUSÃO

A Comissão de Licitação atendeu os requisitos das leis nas atividades realizadas, e sem nenhuma anormalidade, nota-se, que o procedimento licitatório cumpriu seu objetivo, tendo alcançado seu êxito.

É o parecer,

Uiramutã/RR, 25 de outubro de 2022.

CNPJ. 01.612.681/0001-01
Rua Cici Mota, s/n, Centro – Uiramutã –Roraima
cpluiramuta@gmail.com

EM BRANCO

Publicado por:
Elryson do Carmo Lima
Código Identificador:6595FA0A

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE UIRAMUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO.

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022.
A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 013/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO´KO TEREZA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ I - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ nº 38.080.939/0001-86, totalizando o valor de R$516.468,16 (Quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos).

Uiramutã-RR, 25 de outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:128F0B80

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR

PORTARIA Nº 538/2022

Dispõe sobre a autorização de deslocamento de servidor em serviço e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "g", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.
RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR o deslocamento e afastamento da sede do Município de Uiramutã – RR, o (a) servidor (a) **ZELANDES ALBERTO OLIVEIRA,**ocupante do cargo de **Secretário Municipal de Saúde**, para viajar com destino a Aracaju / SE , no período de 03/11a 08/11/2022, deslocamento paraparticipar da 5º Reunião Ordinária do COMEMS -RR no 8° Congresso Norte e Nordeste..
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito, Uiramutã-RR, 03 de Novembro de 2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito do Município de Uiramutã

Publicado por:
Eloiza Cavalcante de Lima
Código Identificador:08FC980E

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR

PORTARIA Nº 539/2022

Dispõe sobre a autorização de deslocamento de servidor em serviço e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "g", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.
RESOLVE:
Art. 1° AUTORIZAR o deslocamento e afastamento da sede do Município de Uiramutã – RR, o (a) servidor (a) **Janary Souza Cunha,**ocupante do cargo de **Motorista da Secretaria de Saúde,**para viajar com destino a Boa Vista – RR, no período de 03/11a 04/11/2022, deslocamento para realizar translado de paciente para a Maternidade Nossa Senhora de Nazaré e no retorno irá transporta Combustivel.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito, Uiramutã-RR, 03 de Novembro de 2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito do Município de Uiramutã

Fls. 312
Rubrica

Publicado por:
Eloiza Cavalcante de Lima
Código Identificador:D7EC600B

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA DO DECRETO Nº 173/2022

ERRATA DO DECRETO Nº173/2022 DE, 21 OUTUBRO DE 2022.

Tendo em vista, o erro material na publicação do "**Decreto nº 173/2022, de 21 de outubro de 2022"**, em razão da primeira publicação, veiculada no Diário Oficial dos Municípios de Roraima, no dia 25 de outubro de 2022, ANO VIII, nº 1756, folhas 3. Segue a publicação do Decreto com as devidas correções.

Onde se lê:

"**Art. 2º:** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de outubro de 2022. "

Leia-se:

"**Art. 2º:** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de outubro de 2022. "

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NÚBIA COSTA LIMA
Prefeita de Amajari

Publicado por:
Jordao Magalhaes de Azevedo
Código Identificador:1A589179

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXONERAÇÃO A PEDIDO

DECRETO Nº178/2022 DE, 27 DE OUTUBRO DE 2022.

Exonera a pedido, do Cargo Comissionado de Gerente e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas **RESOLVE:**

DECRETA:

Art.1º: Exonera a pedido, a Senhora, **Damara Ferreira da Silva,** CPF nº 024.517.872-44, do **CARGO COMISSIONADO DE GERENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA-PMA.**

Art. 2º: Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de outubro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 313 Rubrica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022-CPL/PMC
REPETIÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 050/2022-SEMEC/PMC
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ-RR por intermédio da Comissão Permanente de Licitação -CPL/PMC torna público aos interessados, que realizará Processo Licitatório na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA N º 026/2022, do MENOR PREÇO POR GRUPO, para Registro de Preços para eventual Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE APOIO ADMINISTRATIVO EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANTÁ/RR. REABERTURA DA LICITAÇÃO: Às 10h00min (horário de Brasília) do dia 16/11/2022, por meio do site: https://www.gov.br/compras/pt-br - UASG 980028, O Edital encontra-se a disposição dos interessados, para retirada no mesmo endereço a partir do dia 03/11/2022 (quinta-feira).

Cantá-RR, 1º de novembro de 2022.
BRUNNO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA
Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação - CPL/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 083/2022. Nº Processo: 017/2022.Pregão Presencial SRP Nº 006/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE PACARAIMA- RR. Contratado: 18.344.733/0001-09 - PRRIME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE KIT DE UTENSÍLIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUSIVE UNIDADES EDUCACIONAIS EM ÁREAS INDÍGENAS. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: 26/10/2022 a 26/04/2023. Fonte de Recurso: FUNDEB. Valor Total: R$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais). Data de Assinatura: 26/10/2022. Juliano Torquato dos Santos. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

EXTRATO DO CONTRATO

A Prefeitura Municipal de São Luiz/RR, CNPJ n° 04.056.230/0001-23, em cumprimento ao disposto na Lei federal n° 8.666/93 de junho de 1993. Torna público aos interessados o Extrato de Contrato n° 005/2022-TP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ - ESTADO DE RORAIMA, conforme Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físicos Financeiro, Memória de Cálculo, Curva ABC, Memórias Descritivos, Composição Analítica do BDI, Composição de Preços Unitários, Relatório Fotográfico, ART e Projetos Técnicos de Engenharia, oriundo do Processo Administrativo n° 071/2022, Tomada de Preços n° 005/2022 e Convênio nº 81/2022/ESTADO DE RORAIMA/SEINF/MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ com o valor estimado de R$ 1.146.685,44 (Um Milhões, Cento e quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos) . Entre a PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO LUIZ e a empresa ATENAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n° 19.028.541/0001-56, com vigência de 120 (cento e vinte) dias. Esta publicação entrara em vigor na data de sua publicação.

AVISODE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 5/2022

PROCESSO N ° 071/2022 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ - ESTADO DE RORAIMA
O Prefeito Municipal de São Luiz, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, bem como na legislação vigente aplicada ao caso e, no interesse da Administração, DECIDIU HOMOLOGAR E ADJUDICAR o Processo Licitatório n° 071/2022. Edital de Tomada de Preços n° 005/2022 , tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ - ESTADO DE RORAIMA ,conforme Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físicos Financeiro, Memória de Cálculo, Curva ABC, Memórias Descritivos, Composição Analitica do BDI, Composição de Preços Unitários, Relatório Fotográfico, ART e Projetos Técnicos de Engenharia, em favor da empresa ATENAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , (CNPJ n° 19.028.541/0001-56), por ter apresentado proposta no valor de R$ 1.146.68544 (Hum Milhão, Cento e Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos). DETERMINO a adoção das medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.

São Luiz/RR, 27 de setembro de 2022.
JAMES MOREIRA BATISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 10/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 010/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ARTHUR NABUCO DE ARAÚJO - COMUNIDADE MARACANÃ I - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: E. DA S. CASTOLDI LTDA, CNPJ n° 17.759.716/0001-70, totalizando o valor de R$512.328,16 (Quinhentos e doze mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos).

Uiramutã-RR, 24 de outubro de 2022.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 008/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO ÁGUIDA KASA WAI - COMUNIDADE WILLIMOM - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ n°38.080.939/0001-86, totalizando o valor de R$ 490.706,74 (Quatrocentos e noventa mil setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos).

Uiramutã-RR, 24 de outubro de 2022.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 011/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO MARIA - COMUNIDADE SÃO MATEUS - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME, CNPJ n° 37.170.418/0001-57, totalizando o valor de R$493.086,74 (Quatrocentos e noventa e três mil e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Uiramutã-RR, 24 de outubro de 2022.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 012/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO - COMUNIDADE BARREIRINHA-UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME, CNPJ n° 37.170.418/0001-57, totalizando o valor de R$494.948,16 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos).

Uiramutã-RR, 25 de outubro de 2022.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 007/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO JOAQUIM DE LIMA - COMUNIDADE MATURUCA - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n°13.808.507/0001-18, totalizando o valor R$ 498.048,16 (Quatrocentos e noventa e oito mil, quarenta e oito reais e dezesseis centavos).

Uiramutã-RR, 24 de outubro de 2022.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 009/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO - COMUNIDADE SÃO LUIZ - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME, CNPJ n°37.170.418/0001-57, totalizando o valor de R$493.917,96 (Quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e dezessete reais e noventa e seis centavos).

Uiramutã-RR, 24 de outubro de 2022.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 013/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA - COMUNIDADE CARAPARÚ I - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ n° 38.080.939/0001-86, totalizando o valor de R$516.468,16 (Quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos).

Uiramutã-RR, 25 de outubro de 2022.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 57/2022

PROCESSO LICITATORIO N° 80/2022
Registro de preço para aquisição parcelada de pedra ardósia para o município de Agronômica. Maiores informações (47) 3542-0166 ou no e-mail: licitacao@agronomica.sc.gov.br.

Agronômica, SC, 1º de novembro de 2022
CÉSAR LUIZ CUNHA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ

AVISO DE CREDENCIAMENTO

LICITAÇÃO Nº 38/2022 - SAÚDE
O prefeito municipal comunica aos interessados abertura de credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde na especialidade de laboratório clínico, para atendimento aos usuários do SUS - Sistema único de Saúde, nos termos das condições estabelecidas no presente instrumento de chamamento. Os interessados deverão apresentar a documentação exigida no edital, no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Araranguá, sito à Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200, centro. Abertura 1ª sessão de analise de credenciados: A sessão para abertura dos envelopes contendo a documentação será as 09h00 do dia 23 de novembro de 2022, na sala de reuniões do de Licitação da Prefeitura Municipal de Araranguá. EDITAL COMPLETO E INFORMAÇÕES: Está à disposição dos interessados no horário de expediente na Prefeitura, no endereço eletrônico; www.ararangua.sc.gov.br, e afixado no mural, localizado no hall de entrada da sala do Departamento de Licitações da Prefeitura. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 0XX48 3521-0929 ou pelo e-mail: licitacao@ararangua.sc.gov.br.

Araranguá - SC, 1º de novembro de 2022.
CESAR ANTONIO CESA
Prefeito

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 008/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO´KO ÁGUIDA KASA WAI – COMUNIDADE WILLIMOM - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ n°38.080.939/0001-86, totalizando o valor de R$ 490.706,74 (Quatrocentos e noventa mil setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos). Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 009/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO – COMUNIDADE SÃO LUIZ - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME, CNPJ n°37.170.418/0001-57, totalizando o valor de R$493.917,96 (Quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e dezessete reais e noventa e seis centavos). Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 010/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ARTHUR NABUCO DE ARAÚJO – COMUNIDADE MARACANÃ I - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: E. DA S. CASTOLDI LTDA, CNPJ nº 17.759.716/0001-70, totalizando o valor de R$512.328,16 (Quinhentos e doze mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos). Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 011/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO´KO MARIA – COMUNIDADE SÃO MATEUS - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME, CNPJ nº 37.170.418/0001-57, totalizando o valor de R$493.086,74 (Quatrocentos e noventa e três mil e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 012/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARREIRINHA-UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME, CNPJ nº 37.170.418/0001-57, totalizando o valor de R$494.948,16 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos). Uiramutã/RR, 25 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 013/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO´KO TEREZA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ I - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ nº 38.080.939/0001-86, totalizando o valor de R$516.468,16 (Quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos). Uiramutã/RR, 25 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI - Fls. 314 Rúbrica

OUTRAS PUBLICAÇÕES

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE RORAIMA - FEMARH

LICENÇA DE OPERAÇÃO **LO N.° 135/2021/DLGA**

A Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Estadual n ° 001. Art.46. Inciso III e Art.02 de 26 de janeiro de 1991, e regulamentada pela Lei Delegada nº 04 de 16 de janeiro de 2003 e da Lei Estadual nº 815 de 07 de Julho de 2011, de acordo com o Sistema de Licenciamento de Atividades Potencialmente Poluidoras, instituído através da Lei Complementar nº 007 de 26 de Agosto de 1994 concede a presente **LICENÇA DE OPERAÇÃO**, referente ao Processo **Nº PR-00464-01/2021**, Parecer Técnico do Controle Interno Nº **PAR-00234-01/2022**, registrada na **FEMARH-RR** sob o código **E-02-02** ao Empreendedor.

NOME: AZULÃO GERAÇÃO DE ENERGIA S.A (RORAIMA)

CPF/CNPJ: 30.185.130/0003-79

ENDEREÇO: RODOVIA BR-174, S/N, GLEBA MURUPU, BAIRRO SAID SALOMÃO.

MUNICÍPIO: BOA VISTA - RR

ATIVIDADE: USINA TERMELÉTRICA A GÁS NATURAL, COM CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA DE 140,83 MW, EM CICLO COMBINADO; LINHA DE TRANSMISSÃO (LT) EM 230 KV LIGANDO A UTE JAGUATIRICA II À S.E. BOA VISTA II, QUE SERÁ CONECTADA AO SISTEMA ISOLADO DE RORAIMA.

Endereço do Empreendimento: GLEBA MURUPU, REGIÃO DO BOM INTENTO, FAZENDA CAROLINA- REMANESCENTE (GLEBA C) - BOA VISTA/RR.

VALIDADE: 26/11/2026

Esta licença e válida somente para a atividade supracitada, dentro do período de validade e observada as condições deste documento e seus anexos que embora não transcritos, são partes integrantes do mesmo. Qualquer alteração deverá ser comunicada imediatamente à **FEMARH-RR**.

Boa Vista, RR. 26/11/2021

GLICÉRIO MARCOS FERNANDES PEREIRA - Presidente da FEMARH.

WAGNER SEVERO NOGUEIRA - Diretor da DLGA/FEMARH-PR

FEMARH

Avenida Ville Roy, 4935 São Pedro - Boa Vista - RR

CEP 69.306-040

TELEFAX: 095 2121-9190

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR, sediada na Av. Perimetral Norte, s/n – Centro – São João da Baliza/RR, torna público aos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão, em sua forma Presencial, oriunda do Processo Administrativo nº 204/2022, tendo por objeto a Aquisição de Combustíveis, de forma parcelada, para atender as necessidades da frota de veículos oficiais que atende a Secretaria Municipal de Educação e o Fundo Municipal de Educação junto as Escolas Municipais do Município de São João da Baliza – RR", nos termos da Lei 10.520/2002 e subsidiariamente Lei n. 8.666/93.
Abertura das Propostas: 16/11/2022 às 09:00 horas. O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados no endereço supra, horário: 8:00 às 13:30 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação localizada na sede da Prefeitura Municipal de São João da Baliza/RR.

São João da Baliza/RR, 31 de outubro de 2022.

DAVI ALEXANDRE FERREIRA DOS REIS
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR, sediada na Av. Perimetral Norte, s/n – Centro – São João da Baliza/RR, torna público aos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão, em sua forma Presencial, oriunda do Processo Administrativo nº 292/2022, tendo por objeto a "contratação de empresa para prestação de serviços de TRANSPORTE ESCOLAR para as escolas da rede municipal de ensino localizadas na sede e zona rural deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED", nos termos da Lei 10.520/2002 e subsidiariamente Lei n. 8.666/93.
Abertura das Propostas: 11/11/2022 às 09:00 horas. O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados no endereço supra, horário: 8:00 às 13:30 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação localizada na sede da Prefeitura Municipal de São João da Baliza/RR.

São João da Baliza/RR, 31 de outubro de 2022.

DAVI ALEXANDRE FERREIRA DOS REIS
Pregoeiro

CAER
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA – CAER
COORDENADORIA DE CONTRATO – COC

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 092/2021 - 1º Aditivo
PROCESSO Nº: 278/2021
CONTRATANTE: Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER – CNPJ: 05.939.467/0001-15
CONTRATADA: RECHE GALDEANO E CIA LTDA **CNPJ:** 08.713.403/0001-90
OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 meses e promover o reajuste contratual em 6,1634%
DATA DA ASSINATURA: 21.10.2022
ASSINAM: Pela CONTRATANTE, James da Silva Serrador, presidente da CAER e pela CONTRATADA, Sidnei Reche Galdeano Filho. Representantes legais.

Boa Vista – RR, 31 de Outubro de 2022.

Márcio Eduardo Brito de Lima
Coordenador de Contratos – COC

Fls. 315
Rúbrica
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA - PMSJ

CAER
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA – CAER
COORDENADORIA DE CONTRATO – COC

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 093/2018 - 4º Aditivo
PROCESSO Nº: 216A/2018
CONTRATANTE: Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER – CNPJ: 05.939.467/0001-15
CONTRATADA: ITAÚ UNIBANCO S/A **CNPJ:** 60.701.190/0001-04
OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 meses e promover o reequilíbrio econômico e financeiro
DATA DA ASSINATURA: 26.10.2022
ASSINAM: Pela CONTRATANTE, James da Silva Serrador, presidente da CAER e pela CONTRATADA, Vinicius Paulo Ferreira Van Riemsdijk e Valter Talles do Nascimento, Representantes legais.

Boa Vista – RR, 31 de Outubro de 2022.

Márcio Eduardo Brito de Lima
Coordenador de Contratos – COC

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 - CPL PROCESSO Nº009/2022-SEMSA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ-RR, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. XIII, inciso VI, Decreto nº 10.024/2019 e art. 43, VI, da Lei 8.666/93 e demais disposições que regulam a matéria, bem como a ata de realização e tarefa pela Comissão Permanente de Licitação, e de acordo com o Parecer da Assessoria Jurídica e Controle Interno desta Prefeitura, de que trata o Pregão Eletrônico nº 009/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ALTERNATIVA com intuito de atender as unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de CANTÁ/RR, foi em toda sua tramitação atendida à legislação pertinente. Dessa modo, acolhendo à lei e ao mérito, foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO ao item do Processo Licitatório nº 03/3/2022 Pregão Prefeitura, de nº 009/2022, em favor da Empresa: FATOR EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.003.732/0001-48, tendo como vencedora do item 1 (8 unidade), com valor unitário R$ 6.475,00 (seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), valor total do item 1 R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil, oitocentos reais), item 2 (1 unidade), valor de R$ 64.700,00 (sessenta e quatro mil, setecentos reais), tendo como valor total dos itens I e II R$ 116.500,00 (cento e dezesseis mil, quinhentos reais). Publique-se e dê-se ciência.

CANTÁ - RR, 31 de outubro de 2022.

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
Prefeito Municipal.

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

Síntese da Ata de Registro de Preços n.º 017/2022. Processo Licitatório n.º 055/2022-SEMED/PMC Modalidade: Pregão Presencial - SRP n.º 016/2022. Tipo: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE. Órgão Demandante: Secretaria Municipal de Educação. Objeto de Contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MECÂNICA DE VEÍCULOS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS da frota pertencentes a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de CANTÁ/RR. Empresa Vencedora: FRANCISCO SOUZA MIRANDA - ME, CNPJ Nº 07.087.246/0001-91, Lote I: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO 10,00% (dez por cento) para peças e serviços; valor total estimado do LOTE I: R$ 666.575,00 (seiscentos e sessenta mil e quinhentos e setenta e cinco reais); Lote II: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO 10,00% (dez por cento) para peças e serviços; valor total estimado dos lote I + lote II: o valor total estimado para contratação dos serviços e aquisição de peças e manutenção preventiva e corretiva é de R$ 1.175.734,80 (um milhão cento e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais). Valor estimado de peças de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), valor estimado para serviços de R$ 875.734,00 (oitocentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais). A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados da data da publicação de seu extrato. Fundamentação Legal: Lei n.º 10.520/2002 e Lei n.º 8.666/1993.

Cantá-RR, 31 de outubro de 2022.

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
Prefeito Municipal.

Governo do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 029/2022
PROCESSO Nº 19602.000048/2022.81 – PMRR

Objeto: **Eventual contratação de serviço em telecomunicações de voz e dados, na modalidade de telefonia móvel pessoal (SMP) mensal continuada com fornecimento de Sim Cards (Chip) com franquia mínima de 10 GB**.
DATA DE ABERTURA: 17/11/2022 HORA: **09h30** (horário de Brasília)
O edital se encontrará à disposição dos interessados nos sites: www.comprasnet.gov.br e http://www.cpl.rr.gov.br, bem como no Protocolo desta **CPL/RR**, localizada na Av. Nossa Senhora da Consolata, nº 472 – Centro; CEP: 69.301-011, Boa Vista/RR, em horário normal de expediente, a partir do dia **01/11/2022**. Código da UASG nº **926001**.

Boa Vista – RR, 31 de outubro de 2022.

PAULO SÉRGIO DA SILVA MAIA
Pregoeiro da CPL/RR

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

EDITAL DE CITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 17101.005860/2021.54, instaurado pela Portaria nº 7512/SEGAD/COSPAD, de 26 de setembro de 2022, do Exmo. Sra. Secretária Adjunta de Estado da Secretaria da Gestão Estratégica e Administração, publicada no Diário Oficial do Estado de Roraima nº 4302, de 14 de outubro de 2022, no uso de suas atribuições e nos termos do disposto no artigo 157 da Lei Complementar 053, de 31 de dezembro de 2001, CITA, pelo presente Edital, o servidor Heliton Lopes dos Santos, auxiliar de serviços gerais, matrícula funcional nº 0400/0158, lotado na Secretaria de Educação e Desporto – SEED, por se encontrar em local incerto e não sabido, para apresentar defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da última publicação do Edital, na sede da Coordenação de Processo administrativo e Sindicância – COSPAD, situada na Rua Francisco Paulino da Silva, 215/Sala 19, Cacari, Boa Vista – RR, CEP 69.307-670, sob pena de revelia, sendo-lhe assegurado vista dos autos neste local, em dias úteis, no horário das 07:30 hs. às 13:30 hs.

Boa Vista/RR, 25 de outubro de 2022.

(Assinatura Eletrônica)
YAN JORGE DO REGO MACEDO
Presidente da comissão
PORTARIA Nº 7512/SEGAD/COSPAD

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

EDITAL DE CITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 17101.006860/2021.54, instaurado pela Portaria nº 7619/SEGAD/COSPAD, de 28 de setembro de 2022, do Exmo. Sra. Secretária Adjunta de Estado da Secretaria da Gestão Estratégica e Administração, publicada no Diário Oficial do Estado de Roraima nº 4298, de 06 de outubro de 2022, no uso de suas atribuições e nos termos do disposto no artigo 157 da Lei Complementar 053, de 31 de dezembro de 2001, CITA, pelo presente Edital, o servidor José Ferreira da Costa Júnior, Professor I, matrícula funcional nº 49031156, lotado na Secretaria de Educação e Desporto – SEED – Normandia –, por se encontrar em local incerto e não sabido, para apresentar defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da última publicação do Edital, na sede da Coordenação de Processo administrativo e Sindicância – COSPAD, situada na Rua Francisco Paulino da Silva, 215/Sala 19, Cacari, Boa Vista – RR, CEP 69.307-670, sob pena de revelia, sendo-lhe assegurado vista dos autos neste local, em dias úteis, no horário das 07:30 hs. às 13:30 hs.

Boa Vista/RR, 26 de outubro de 2022.

(Assinatura Eletrônica)
YAN JORGE DO REGO MACEDO
Presidente da comissão
PORTARIA Nº 7512/SEGAD/COSPAD

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 008/2022, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO AGUIDA KASA WAI – COMUNIDADE WILLIMOM - UIRAMUTÃ/RR**, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ nº38.080.939/0001-86**, totalizando o valor de **R$ 490.706,74 (Quatrocentos e noventa mil setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos)**

Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 009/2022, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO – COMUNIDADE SÃO LUIZ - UIRAMUTÃ/RR**, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: **A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME. CNPJ nº37.170.418/0001-57**, totalizando o valor de **R$493.917,96 (Quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e dezessete reais e noventa e seis centavos)**

Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 010/2022, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ARTHUR NABUCO DE ARAÚJO – COMUNIDADE MARACANÃ I - UIRAMUTÃ/RR**, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: **E. DA S. CASTOLDI LTDA, CNPJ nº 17.759.716/0001-70**, totalizando o valor de **R$512.328,16 (Quinhentos e doze mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos)**

Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 011/2022, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO MARIA – COMUNIDADE SÃO MATEUS - UIRAMUTÃ/RR**, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: **A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME, CNPJ nº 37.170.418/0001-57**, totalizando o valor de **R$493.086,74 (Quatrocentos e noventa e três mil e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos).**

Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 012/2022, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARREIRINHA-UIRAMUTÃ/RR**, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: **A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME, CNPJ nº 37.170.418/0001-57**, totalizando o valor de **R$494.948,16 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos).**

Uiramutã/RR, 25 de outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 013/2022, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ I - UIRAMUTÃ/RR**, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ nº 38.080.939/0001-86**, totalizando o valor de **R$516.468,16 (Quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos).**

Uiramutã/RR, 25 de outubro de 2022.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DE PROCESSO Nº 135/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS Nº 013/2022

O **PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA –** RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO do Procedimento Licitatório - **PROCESSO Nº 135/2022 – TOMADA DE PRECOS Nº 013/2022 conforme a seguir:**

EMPRESA: L. M. B. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
CNPJ Nº: 38.080.939/0001-86
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA Ko`Ko TERESA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ I NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ –RR.
VALOR: 516.468,16 (quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e sessenta oito reais e dezesseis centavos).
Publique-se/

UIRAMUTÃ – RR, 31 de Outubro de 2022.

Benisio Roberto de Souza
Prefeito do Município de Uiramuta- RR

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE UIRAMUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA - PMU
Fls. 317
Rúbrica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DE PROCESSO Nº 135/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

O **PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA** – RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO do Procedimento Licitatório - **PROCESSO Nº 135/2022 – TOMADA DE PRECOS Nº 013/2022 conforme a seguir:**

EMPRESA: L. M. B. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
CNPJ Nº: 38.080.939/0001-86
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA Ko`Ko TERESA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ I NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ –RR.
VALOR: 516.468,16 (quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e sessenta oito reais e dezesseis centavos).

Publique-se/

UIRAMUTÃ – RR, 31 de Outubro de 2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito do Município de Uiramuta- RR

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:8E04B912

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municipios do Estado de Roraima no dia 08/11/2022. Edição 1765
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amr/

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU -
Fls. 318
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ

TERMO DE ANULAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO Nº 131/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ – RR, no condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ANULAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do Procedimento Licitatório - **PROCESSO Nº 131/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 conforme a seguir:**

EMPRESA: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME
CNPJ Nº: 37.170.418/0001-57
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ISIDIAS RIBEIRO – COMUNIDADE SÃO LUIZ, NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ-RR.
VALOR: 493.917,86 (quatrocentos e noventa mil novecentos e dezessete reais e oitenta seis centavos).
Publique-se!

URAMUTÃ – RR, 31 de Outubro de 2022.

Rosilda Roberta de Souza
Prefeita do Município de Uramutã-RR

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ

TERMO DE ANULAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO Nº 130/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ – RR, no condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do Procedimento Licitatório - **PROCESSO Nº 130/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 conforme a seguir:**

EMPRESA: L. M. S. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ Nº: 37.170.418/0001-57
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ISIDIAS RIBEIRO – COMUNIDADE SÃO LUIZ, NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ-RR.
VALOR: R$ 493.917,86 (quatrocentos e noventa mil novecentos e dezessete reais e oitenta seis centavos).
Publique-se!

URAMUTÃ – RR, 31 de Outubro de 2022.

Rosilda Roberta de Souza
Prefeita do Município de Uramutã-RR

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES DO ESTADO DE RORAIMA - SINTECT/RR
Filiado: FENTECT CUT

COMISSÃO ELEITORAL
ELEIÇÕES DE DIRETORIA – TRIÊNIO 2022/2025
RELAÇÃO NOMINAL DE CHAPAS INSCRITAS

A Comissão Eleitoral das eleições do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Similares do Estado de Roraima – SINTECT/RR – para o triênio 2022/2025, em cumprimento ao Artigo 20, Parágrafo Quarto, do Capítulo IV do Estatuto Social da Entidade, vem à público informar que no dia 04 de novembro de 2022, às 17h (dezessete horas), se deu o encerramento do prazo de registro de chapas para o referido pleito, sendo inscrita 01 (uma) chapa, denominada: Chapa 01 – RESISTÊNCIA E LUTA, com a seguinte composição: Presidente: Amarilo Rodrigues de Souza, Secretário Geral: Andrelino Pereira da Silva, Secretário de Finanças: Raimundo Alves Pereira, Secretário de Saúde e Assuntos Culturais: Antonio Aldemir Rodrigues, Secretário de Formação Político-Sindical e Questões Jurídicas: Antonio Farias de Lima. Suplentes da Diretoria Executiva: Daywan Gonçalves Amaro Silva, Camilo Antonio Miguel, Octavianico de Almeida Santos, Célio Cunha da Silva Mendes e Rosa Lucia dos Santos Oliveira. A quem interessar possa que o prazo para impugnação da Chapa com candidatos(as) será nos dias 09 e 10 de novembro de 2022, no horário das 08 às 17h.

Boa Vista-RR, 08 de novembro de 2022.

Francisco Souza Lima Junior
Presidente da Comissão Eleitoral

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO Nº 133/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ – RR, no condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do Procedimento Licitatório - **PROCESSO Nº 133/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 conforme a seguir:**

EMPRESA: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME
CNPJ Nº: 37.170.418/0001-57
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ISIDIAS RIBEIRO – COMUNIDADE SÃO LUIZ, NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ-RR.
VALOR: 493.917,86 (quatrocentos e noventa mil novecentos e dezessete reais e oitenta seis centavos).
Publique-se!

URAMUTÃ – RR, 31 de Outubro de 2022.

Rosilda Roberta de Souza
Prefeita do Município de Uramutã-RR

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO Nº 132/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ – RR, no condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do Procedimento Licitatório - **PROCESSO Nº 132/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 conforme a seguir:**

EMPRESA: L. DA S. CASTRO LTDA
CNPJ Nº: 47.750.744/0001-70
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ARTHUR MARIUCI DE ARAUJO – COMUNIDADE DE MARACANÃ I, NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ-RR.
VALOR: 551.939,16 (quinhentos e dois mil novecentos e trinta reais e dezesseis centavos).
Publique-se!

URAMUTÃ – RR, 31 de Outubro de 2022.

Rosilda Roberta de Souza
Prefeita do Município de Uramutã-RR

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO Nº 134/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ – RR, no condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do Procedimento Licitatório - **PROCESSO Nº 134/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022 conforme a seguir:**

EMPRESA: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME
CNPJ Nº: 37.170.418/0001-57
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ANADORO ROSENO - Comunidade BARREIRINHA, NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ-RR.
VALOR: 484.340,18 (quatrocentos e oitenta quatro mil trezentos e quarenta reais e dezoito centavos).
Publique-se!

URAMUTÃ – RR, 31 de Outubro de 2022.

Rosilda Roberta de Souza
Prefeita do Município de Uramutã-RR

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO Nº 135/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ – RR, no condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do Procedimento Licitatório - **PROCESSO Nº 135/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 conforme a seguir:**

EMPRESA: L. M. S. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CNPJ Nº: 37.170.418/0001-57
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ISIDIAS RIBEIRO – COMUNIDADE SÃO LUIZ, NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ-RR.
VALOR: R$ 493.917,86 (quatrocentos e noventa mil novecentos e dezessete reais e oitenta seis centavos).
Publique-se!

URAMUTÃ – RR, 31 de Outubro de 2022.

Rosilda Roberta de Souza
Prefeita do Município de Uramutã-RR

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO Nº 129/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ – RR, no condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e após a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do Procedimento Licitatório - **PROCESSO Nº 129/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 conforme a seguir:**

EMPRESA: EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 11.808.507/0001-08
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ANADORO JOAQUIM DE LIMA – COMUNIDADE MAPURIZAL, NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ-RR.
VALOR: 498.240,36 (quatrocentos e noventa mil duzentos e quarenta reais e trinta e seis centavos).
Publique-se!

URAMUTÃ – RR, 31 de Outubro de 2022.

Rosilda Roberta de Souza
Prefeita do Município de Uramutã-RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ-RR
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Mucajaí/RR, através da CPL, torna pública a **TP nº 07/2022 - Processo nº 0470/2022**, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DE UBS TIPO I LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ (UBS SABINO PAULO DA SILVA - VILA SAMAÚMA), data da apresentação da Documentação e Proposta 23/11/2022 – 08h00min. EDITAL E ANEXOS: Retirar na CPL da Prefeitura Municipal de Mucajaí, situada na Av. Nossa Senhora de Fatima, n. 32W - Centro, no horário das 08h00mins 12h00min, mediante carimbo com CNPJ.

Mucajaí-RR, 07 de novembro de 2022
JEAN CLEBER FREITAS DE LIMA
Presidente da CPL

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ-RR
RESULTADO DE JULGAMENTO

A Prefeitura Municipal de Mucajaí, por intermédio da Comissão de Licitação CPL/PMM, torna público a quem possa interessar, o resultado do certame do PREGÃO PRESENCIAL N.º 37/2022 – PROC. ADM. Nº. 464/2022, em que a empresa INOVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº. 43.295.796/0001-60, foi vencedora com o valor de R$ 719.500,00 (Setecentos e dezenove mil e quinhentos reais), cujo o objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Áudio visual (filmagens, fotos, layouts, produções de áudio e vídeos publicitário) de caráter institucional, locação de barracas, tendas, cadeiras e mesas, serviço de sonorização e iluminação para atender a Administração Municipal de Mucajaí - RR.

Mucajaí-RR, 07 de novembro de 2022
Jean Cleber Freitas de Lima
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ-RR

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Pelo Presente, homologo o resultado de julgamento de licitação do PREGÃO PRESENCIAL N.º 37/2022 – PROC. ADM. Nº. 464/2022, bem como a Adjudicação de seu Objeto, à empresa INOVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº. 43.295.796/0001-60, à luz dos documentos contidos no processo Licitatório, e autorizo a emissão do empenho no valor de R$ 719.500,00 (Setecentos e dezenove mil e quinhentos reais).

Mucajaí – RR, 07 de novembro de 2022
ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita do Município de Mucajaí/RR

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2022
PROCESSO Nº 0470/2022 – TP Nº 07/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DE UBS TIPO I LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ (UBS SABINO PAULO DA SILVA - VILA SAMAÚMA), DATA DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 23/11/2022 – 08H00MIN. EDITAL E ANEXOS: RETIRAR NA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ, SITUADA NA AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA, N. 32W - CENTRO, NO HORÁRIO DAS 08H00MINS 12H00MIN, MEDIANTE CARIMBO COM CNPJ.

CNPJ	EMPRESA VENCEDORA	ITEM Nº	VALOR TOTAL
43.295.796/0001-60	INOVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01	R$ 719.500,00

Boa Vista – RR, 07 de novembro de 2022

JEAN CLEBER FREITAS DE ALBUQUERQUE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 260/2022 – Registro de Preços
Processo nº 0076742022 – SMSA

Objeto: Eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de cilindro de Gás Medicinais Nitrogênio e Oxigênio gasoso dos equipamentos, para atender as necessidades do Hospital da Criança Santo Antônio – HCSA. Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2022 às 08:30 (horário de Brasília) no site www.comprasnet.gov.br. Início da Disputa: 23/11/2022 às 10h (horário de Brasília) no site supracitado.

O Edital encontra-se à disposição dos interessados, no site www.comprasnet.gov.br, no portal http://transparencia.boavista.rr.gov.br/licitacoes/ ou mediante solicitação por e-mail: pregao.smsa@gmail.com, pertinente com os dados cadastrais do licitante, desde que seja expedido antes do encerramento do certame. Os esclarecimentos e as informações necessários aos licitantes serão prestados pela CPL, nos dias e horários de expediente.

Rosiane de Oliveira Borges Vieira
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 262/2022 – Registro de Preços
Processo nº 0076815/2022 – SMSA

Objeto: Eventual contratação de empresa especializada para locação de ventiladores pulmonares, para atender as necessidades do Hospital da Criança Santo Antônio – HCSA.
Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2022 às 08:30 (horário de Brasília) no site www.comprasnet.gov.br.
Início da Disputa: 23/11/2022 às 10h (horário de Brasília) no site supracitado.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados, no site www.comprasnet.gov.br, no portal http://transparencia.boavista.rr.gov.br/licitacoes/ ou mediante solicitação por e-mail: pregao.smsa@gmail.com, pertinente com os dados cadastrais do licitante, desde que seja expedido antes do encerramento do certame. Os esclarecimentos e as informações necessários aos licitantes serão prestados pela CPL, nos dias e horários de expediente.

Rosiane de Oliveira Borges Vieira
Pregoeira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma do artigo 25, inciso V e parágrafo único, e do artigo 38, do Estatuto do SINTEVITRAVER, **CONVOCAR** a realização de **Assembleia Extraordinária**, que ocorrerá em **24/11/2022 às 19:30h**, no endereço localizado na **Av: São Joaquim Nº 1014 Bitro: Doutor Silvio Leite.**

Ressaltamos ainda que, os moldes do art. 38, do Estatuto, a segunda convocação **ocorrerá às 20h.**



PREFEITURA DE UIRAMUTÃ

SEMECD UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 319 Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

ORDEM DE SERVICO

PROCESSO Nº: 135/2022 SMECD
EMPENHO Nº 0096 /2022.

CONTRATADA: L. M. B. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
CNPJ Nº: 38.080.939/0001-86

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA Ko`Ko TERESA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ I NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ –RR.

- Considerando sua proposta de preço, de acordo com as quantidades e condições aqui especificadas, pedimos iniciar a realização dos serviços contratados.

- Prazo de execução dos serviços: 60 (sessenta) dias.

- Condições de pagamento: Conforme contrato Assinado.

- A presente autorização tem a importância de **R$ 516.468,16 (quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e sessenta oito reais e dezesseis centavos).**

UIRAMUTÃ – RR, 10 de Novembro de 2022.

Silvanio Alves dos Santos

SILVANIO ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

BRS

Benisio Roberto de Souza
Prefeito do Município de Uiramuta- RR

Recebido do Profissional: data: 10 / 11 /2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 320 Rúbrica

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 135/2022.

PROCESSO Nº 135/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito CNPJ: 01.612.681/0001-01, com sede neste Município, situada na rua Cici Mota, s/nº – Centro, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, **Benisio Roberto de Souza**, brasileiro, CPF: 988.006.632-49, tendo como representante da **Secretária Municipal de Educação Cultura e Desporto**, a Sra. **VARDERLANE JAMES LIMA,** inscrita no CPF sob o nº 961.227.812-15, RG nº 307709-8 SSP/RR, denominada doravante CONTRATANTE e a empresa **L. M. B. EMPREEDIMENTOS LTDA – ME**, cadastrada no CNPJ **sob o nº** 38.080.939/0001-86, sediada na Travessa Dalva Oliveira, sala 01, bairro: 31 de Marco, nesta cidade Boas Vista - RR, telefone: 95- 99165- 4121, representada por Sr. **LUCAS MAGALHAES BRIGLIA,** brasileiro, empresário, solteiro, portador do CPF/MF sob nº 016.228.392-00, residente e domiciliado na Capital de Boa Vista-RR,denominada CONTRATADA, de conformidade com a Tomada de Preços 013/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.O presente contrato tem como objeto a execução da obra de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA Ko`Ko TERESA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ I NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ –RR**, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor inicial deste contrato 9] é de **R$ 516.468,16 (quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e sessenta oito reais e dezesseis centavos),** correspondente à proposta ofertada pela CONTRATADA, aplicada às quantidades estimadas nas planilhas de orçamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA A EXECUÇÃO

3.1. Como garantia de execução deste contrato a CONTRATADA apresentou antes de sua assinatura, comprovante de garantia na modalidade, na importância de R$ 25.823,40 (vinte cinco mil oitocentos e vinte tres reais e quarenta centavos), (Guia de Recolhimento acostada ao Processo nº 135/2022 – Tomada de Preços nº 013/2022, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual.

3.2. A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações estipuladas neste Contrato.

3.3. No caso de alteração do valor deste contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

3.3.1. Ocorrendo alteração, dentro dos limites legais, dos valores constantes do contrato ou prorrogação do prazo de execução da obra ou, ainda, qualquer outra causa que impeça a entrega do objeto no prazo avençado, a CONTRATADA deverá providenciar a complementação ou prorrogação, conforme o caso, da garantia prestada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do respectivo termo.

3.4. A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à contratada, podendo ser retida para a satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão dolosa ou culposa da contratada.

BRS

PREFEITURA MUNICIPAL - PMU - RR
Fls. 321
Rúbrica

3.5. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
3.5.1. Na notificação devem constar as razões da utilização da garantia, com referência ao documento em que a contratada foi cientificada das correções que deveria providenciar e do valor das mesmas.
3.6. Após a execução deste contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída no prazo máximo de 30 (trinta) dias da solicitação da contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DA GESTÃO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

4.1. A gestão e execução do presente contrato será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .
4.2. A fiscalização do objeto da presente contratação pela Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, será exercida mediante portaria, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas coma execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
4.2.1. É permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
4.2.2. É permitida a substituição do servidor designado neste item sempre que a Administração julgar necessário, devendo a CONTRATADA ser cientificada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
4.3. Além das atividades neste contrato, no edital que originou esse contrato, bem como em seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:
4.3.1. Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;
4.3.2. Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos que envolvem a obra: projetos, licitação, contrato, medições, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como Construído (As Built), termos de recebimento provisório e definitivo e devolução de cauções, etc.
4.3.3. Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra;
4.3.4. Aferir as medições dos serviços executados que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo;
4.3.5. Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;
4.3.6. Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.
4.3.7. Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execução de cada serviço/etapa será aferida, em cada medição, consoante CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, previamente aprovado e que a aferição dos prazos se dará mediante a comparação entre o valor total da etapa prevista no cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise.

BRS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 322
Rúbrica

4.4. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
4.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou.

CLÁUSULA QUINTA – DA MEDIÇÃO E DOS PAGAMENTOS

5.1. As medições serão formalizadas e datadas no último dia de cada mês e serão pagas até 30 (trinta) dias da data de sua aceitação, de acordo com o cronograma físico financeiro, pelo valor nominal nela expresso.
5.2. A Prefeitura Municipal de Uiramutã terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da medição para aceitá-la ou não;
5.3. Acompanhando a primeira fatura deverá ser apresentada a "anotação de responsabilidade técnica" - ART no CREA.
5.4. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR até o 10º (décimo) dia útil após aprovada a medição pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos , mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, sendo efetuada a retenção de tributos sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a legislação vigente.
5.4. O pagamento está condicionado à apresentação de:
5.4.1. A comprovação de sua situação regular perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho (CNDT), extrato do Simples Nacional, quando for o caso, bem como quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços.
5.4.2. Deverão ser apresentados também o comprovante de pagamento dos tributos relativos à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) vencidos até a data da nota fiscal – guia recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) de todos os empregados alocados na execução do contrato.
5.4.3. GFIP tendo como tomador a Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, relativo ao CEI da obra.
5.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta tenha comprovado, por antecipação, a matrícula da obra junto ao INSS, ou antes, de paga ou relevada à multa que lhe tenha sido aplicada.
5.6. A última parcela só será paga mediante execução integral da obra, comprovada por relatório, assinado pelo Responsável Técnico pela fiscalização da obra.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

6.1. Durante a vigência do Contrato os preços serão fixos e passíveis de recomposição e reajuste, desde que comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65, bem como, parágrafo 8º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, respectivamente, ou de redução dos preços praticados no Mercado.
6.2. Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, a Contratada poderá solicitar a atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao Município de Uiramutã, instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido.
6.3. Mesmo comprovada às ocorrências das hipóteses previstas na alínea "d" do inciso II do artigo 65, bem como, parágrafo 8º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro Processo Licitatório.
6.4. Comprovada a redução dos preços praticados no Mercado nas mesmas condições do contrato e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, a Contratada será convocada pelo Município de Uiramutã para a alteração, por aditamento, do

BRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 323
Rúbrica
PMU

preço contratado, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA SETIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO

7.1. O prazo da presente execução de obras e prestação de serviços é de 60 **(sessenta) dias**, contados da data da "Ordem de Serviço" que autorizar o início das atividades.

CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato terá vigência de 90 **(noventa) dias**, a partir da data de sua assinatura, com termo final em 09 de Janeiro de 2023, podendo ser prorrogado, caso ocorra algumas das hipóteses elencadas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.3400.1020.0000
Elemento de Despesa: 44.90.51.00
Fonte de Recurso: 1540 - FUNDEB.

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES

10.1. **São Obrigações da contratada:**

10.1.1. **Apresentar-se ao Município de Uiramutã/rr – Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a ordem de serviço inicial, o seguinte:**

a) Apresentar cronograma fisico – financeiro compatível com a planilha vencedora;
b) Anotações de Responsabilidade Técnica- ART, no CREA/CAU, em nome do Engenheiro Responsável Técnico pela obra ou serviço;
c) Abertura de Certificado de Matrícula da obra/serviço – CEI INSS junto com a primeira medição;
d) Visto junto ao CREA/CAU/RR, para as empresas que possuírem CRPJ de outros Estados da Federação.
e) Plano de Segurança específico da Obra, elaborado conforme as normas regulamentares da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e alterações posteriores;
f) Plano de sinalização diurna e noturna, aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
g) Apresentar cronograma de utilização da equipe técnica, de acordo com o prazo de execução de cada obra/serviço, observada a mesma ordem e quantidade da relação de que trata o subitem 6.1.3.3, Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 013/2022, devendo ser aprovado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .
h) Apresentar cronograma de utilização de equipamentos e instalações, de acordo com o prazo de execução da obra/serviço, observada a necessidade de cada projeto, devendo ser aprovado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos .

10.1.2. Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas.

8.1.3. Assegurar, durante a execução das obras/serviços, a proteção e a conservação dos serviços realizados.

10.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

10.1.5. Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão do Município de Uiramutã/ RR – Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos a inspeção das obras em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

BRS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 324 Rúbrica

10.1.6. Providenciar as placas da obra com seus dados indicativos, conforme modelo apresentado pela fiscalização, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados à partir da ordem de serviço.
10.1.7. Obedecer ao plano de segurança das obras, conforme as Normas de Segurança do Trabalho.
10.1.8. Participar à fiscalização ou à supervisão do Município de Uiramutã aocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão da obra, no todo o em parte, de acordo com o cronograma da mesma, indicando as medidas para corrigir talsituação.
10.1.9. Executar, conforme a melhor técnica, as obras contratadas, obedecendo rigorosamente às normas ABNT, bem como as instruções, especificações e os detalhes fornecidos ou editados pela Administração.
10.1.10. Manter atualizado "Diário de Obras", nele registrando todas as ocorrências que afetem o prazo de execução ou orçamento das obras.
10.1.11. Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e as posturas municipais sobre a execução de obras em locais públicos.
10.1.12. Manter à frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta ou a que venha a ser aprovada pela Administração, sempre liderada por engenheiro qualificado com capacidade e poderes bastantes para representá-la perante a Fiscalização e resolver problemas referentes às obras em execução.
10.1.13. Manter na obra em bom estado todo o equipamento necessário à perfeita execução dos serviços contratados, objetivando atender ao cronograma físico, à qualidade e às especificações técnicas.
10.1.14. Manter equipe para o acompanhamento topográfico da obra, adequada e compatível com as exigências e qualidades técnicas pertinentes.
10.1.15. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.2. Constitui obrigação do Município:
10.2.1 Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, recebendo seu objeto, conforme especificações constantes dos itens 10 e 11 do presente edital.
10.2.2. Realizar o pagamento conforme cláusula terceira deste contrato.
10.2.3. Notificar a empresa a ser contratada da ocorrência de qualquer descumprimento dos termos do edital da TOMADA DE PREÇOS nº 013/2022 e deste instrumento.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS

11.1. A CONTRATADA será responsável pelos seguintes encargos:
11.1.1. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, as responsabilidades advindas deste Contrato. A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE, desde que não afetem a boa execução do presente instrumento;
11.1.2. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais, e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;
11.1.3. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas relacionados com o objeto deste contrato;
11.1.4. Assumir a responsabilidade exclusiva por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência de falhas decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA.

BRS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU -
Fls. 325
Rúbrica

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES

12.1. A prática de ato ilícito na licitação ou na execução do contrato e o descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão as sanções previstas nos artis. 81 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei Estadual n° 14.184, de 31 de Janeiro de 2002,e nos arts. 19 a 22 do Decreto Estadual n° 44.431, de 29 de dezembro de 2006.

12.2. A ADJUDICATÁRIA perderá em favor da ADJUDICANTE a garantia a que se refere o item 8.1, no caso de recusa injustificada em assinar o contrato.

12.3. Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo as multas nos seguintes percentuais:

12.3.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia, até o trigésimo dia, de atraso, sobre valor dos serviços previstos no cronograma físico não executados;

12.3.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

12.3.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços previstos no Cronograma Físico não executados, no caso de atraso superior a 30(trinta) dias;

12.3.4. 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.

12.3.5. As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes, ressalvada a situação descrita nos itens **12.3.6** e **12.3.7**.

12.3.6. O atraso no cumprimento do Cronograma Físico- Financeiro previsto para execução dos serviços será verificado nas medições mensais, a partir do qual incidirá a multa prevista no item **12.3.1**.

12.3.7. Verificando o atraso, na forma do item anterior, a CONTRATADA será notificada, por escrito, para sanar a irregularidade.

12.3.8. Persistindo a irregularidade prevista no item **12.3.6**, até a medição mensal subsequente, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento da multa prevista no item **12.3.3**, que substituirá aquela constante do item **12.3.1**.

12.4. Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição pela Prefeitura Municipal de Ordens de Início, Reinício ou Paralisação de Serviços.

12.5. As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de idoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a de multa, assegurando-se ao interessado o direito de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de idoneidade, em prazo será de 10 (dez) dias.

12.5.1. Para aplicação das sanções referidas no item anterior, deverá ser instaurado processo administrativo punitivo, seguindo de notificação para defesa, em conformidade com o disposto nos arts. 19 a 22 do Decreto Estadual n° 44.431/06, submetida a aplicação das sanções à decisão do Secretário Municipal, salvo na hipótese de aplicação de sanção de declaração de inidoneidade, de competência exclusiva do Prefeito Municipal, ou de autoridade a ele equivalente, nos termosda lei.

12.6. As multas deverão ser recolhidas no Departamento de Fazenda do município de Uiramutã, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contado à partir da decisão definitiva na esfera administrativa.

12.7. Se a multa aplicada for de valor superior ao da garantia prestada, além da sua perda responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda quando for o caso, cobrada judicialmente.

12.8. Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações compensatórias expressamente concedidas pela CONTRATANTE ou resultante de fato superveniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade da CONTRATADA, tais como o

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 326
Rúbrica

estado de calamidade pública, guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas características.

12.9. As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente fundamentadas através de registro no Diário de Obras realizado pela FISCALIZAÇÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1. Operar-se-á de pleno direito a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 013/2022, quando ocorrerem as hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ABSTENÇÃO

14.1. A abstenção pelo CONTRATANTE do uso dos direitos que lhe são assegurados neste contrato não será considerada novação ou renúncia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

15.1. Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93, sempre através de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES

16.1. O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei 8.666/93 e suas modificações supervenientes, complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais constantes da TOMADA DE PREÇOS nº 013/2022 e seus anexos, bem como a proposta de preços, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, apresentados pela CONTRATADA, que fazem parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pacaraima/RR para dirimir as dúvidasoriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo, para os fins de direito.

Uiramutã/ RR 08 de Novembro de 2022.

BRS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Benísio Roberto de Souza
CPF: 988.006.632-49

VANDERLANE JAMES LIMA
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto
PORTARIA Nº 459/2022

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 327
Rúbrica

L. M. B. EMPREEDIMENTOS LTDA – ME
LUCAS MAGALHAES BRIGLIA
CPF: 016.228.392-00
(Representante Legal)

TESTEMUNHAS:

1-_____DOC.:_____

2-_____DOC.: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 329
Rúbrica

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ-RR

Processo nº: 135/2022
Número de Contrato: 135/2022/PMUI
Objeto: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA Ko`Ko TERESA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ I NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ –RR.**
Empresa Contratada: L. M. B. EMPREEDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ: 38.080.939/0001-86
Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR.
CNPJ: 30.776.317/0001-85
Valor: R$ **516.468,16 (quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e sessenta oito reais e dezesseis centavos).**
Data da Assinatura: 08/11/2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ - PMU
Fls. 329
Rúbrica

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
Assessoria de Licitações

Pregão (Eletrônico) n.º 66/2022 UASG: 070028

Aviso de Licitação – EDITAL DE ABERTURA

Objeto: **SRP - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para futura e eventual Contratação de extensão de garantia CISCO, na modalidade 8 x 5 x Next Business Day, nível de serviço SNT (SmartNet) ou PSS (Partner Support Service), assim como renovação de licenças pelo prazo de 05 (três) anos para equipamentos Cisco de propriedade do TRE-RR, conforme especificações e obrigações constantes do Termo de Referência.**

Abertura das propostas: **A partir das 10h00 (horário de Brasília) do dia 29.11.2022 no site: *www.comprasnet.gov.br*.**

Edital disponível: **nos sites *www.comprasnet.gov.br* e *www.tre-rr.jus.br* no menu "Transparência/Licitações" ou, ainda, na Assessoria de Licitações da Secretaria de Administração do TRE/RR, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, n.º 543 – São Pedro – Boa Vista/RR, das 08h00 às 14h00 (horário local).**

Boa Vista – RR, 09 de novembro de 2022.

Ademarcio da Silva
Assessor de Licitações - TRE/RR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA

Subsecretaria de Aquisições, Licitações e Credenciamentos

AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO PRESENCIAL

Procedimento Administrativo nº DX 17611-40.2022.8.23.8000
ASSUNTO: Contratação do Permissão de uso oneroso do espaço destinado à instalação de uma Cafeteria no prédio do Centro Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Roraima, a ser implantado na área da Casa 1, do Conjunto dos Desembargadores, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

O Tribunal de Justiça comunica aos interessados que a sessão pública do **Pregão Presencial nº 69/2022**, inicialmente prevista para ocorrer em 14/11/2022, foi adiada para ocorrer em 17/11/2022.

Boa Vista/RR 30 de novembro de 2022.

Manoel Martins da Silva Neto
Subsecretário de Aquisições, Licitações e Credenciamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA

Subsecretaria de Aquisições, Licitações e Credenciamentos

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima torna público aos interessados a realização de **Pregão Eletrônico n.º 62/2022** (Proc. Adm. Nº 0015686-62.2022.8.23.8000).

OBJETO: O objeto do presente certame é a formação do sistema de registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, sob demanda, para o Poder Judiciário do Estado de Roraima, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

ENTREGA DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO: a partir 10/11/2022, às 08h00min.
SESSÃO PÚBLICA: 24/11/2022, às 10h00min (horário de Brasília).

Todas as operações serão realizadas no Horário de Brasília/DF, no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br/, pelo código UASG n.º 925480.

O Edital poderá ser obtido no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br/ e pelo site cpl.tjrr.jus.br a partir do dia 10/11/2022 às 09h00min (horário local).

Boa Vista/RR 30 de novembro de 2022.

Manoel Martins da Silva Neto
Subsecretário de Aquisições, Licitações e Credenciamentos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
Assessoria de Licitações

Pregão (Eletrônico) n.º 53/2022 UASG: 070028

Aviso de alteração de Licitação

O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, por meio da Assessoria de Licitações, torna público a todos os interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022, que estava agendado anteriormente para o dia 10/11/2022 às 10:00 horas (horário de Brasília), fica **REAGENDADO** para o dia **25/11/2022 às 10:00 horas (horário de Brasília).**

Objeto: **A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de solução de backup em disco com capacidade mínima de armazenamento nativo em disco de 50 TB (cinquenta terabytes) úteis para dados, instalados e licenciados, com instalação.**

MOTIVO: Alteração do edital e do termo de referência

Edital disponível: **nos sites *www.comprasnet.gov.br* e *www.tre-rr.jus.br* no menu "Transparência/Licitações" ou, ainda, na Assessoria de Licitações da Secretaria de Administração do TRE/RR, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, n.º 543 – São Pedro – Boa Vista/RR, das 08h00 às 15h00 (horário local).**

Ademarcio da Silva
Assessor de Licitações

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE URAMUTÃ

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ-RR

Processo nº: 129/2022
Número de Contrato: 129/2022/PMU
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO JOAQUIM DE LIMA – COMUNIDADE MATURUCA, NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ –RR.
Empresa Contratada: EXCLUSIV' COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 13.808.507/0001-18
Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR.
CNPJ: 30.776.317/0001-85
Valor: R$ 498.048,16 (quatrocentos e noventa oito mil quarenta oito reais e dezessois centavos).
Data da Assinatura: 08/11/2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE URAMUTÃ

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ-RR

Processo nº: 130/2022
Número de Contrato: 130/2022/PMU
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KO'KO ÃGUIDA KASA – WAI-COMUNIDADE WILLIMON, NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ –RR.
Empresa Contratada: L. M. B. EMPREEDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ: 38.080.939/0001-86
Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR.
CNPJ: 30.776.317/0001-85
Valor: R$ 498.706,74 (quatrocentos e noventa mil setecentos e seis reais e setenta quatro centavos).
Data da Assinatura: 08/11/2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE URAMUTÃ

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ-RR

Processo nº: 133/2022
Número de Contrato: 133/2022/PMUI
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO MARIA – COMUNIDADE SÃO MATEUS, NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ –RR.
Empresa Contratada: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA -ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR.
CNPJ: 30.776.317/0001-85
Valor: R$ 493.886,74 (quatrocentos e noventa três mil oitenta seis reais e setenta quatro centavos).
Data da Assinatura: 08/11/2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE URAMUTÃ

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ-RR

Processo nº: 132/2022
Número de Contrato: 132/2022/PMUI
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ARTHUR NABUCO DE ARAUJO – COMUNIDADE DE MARACANÃ I, NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ –RR
Empresa Contratada: E. DA S. CASTOLDI LTDA
CNPJ Nº: 17.759.716/0001-70
Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR.
CNPJ: 30.776.317/0001-85
Valor: R$ 512.328,36 (quinhentos e doze mil trezentos e vinte oito reais e trinta centavos).
Data da Assinatura: 08/11/2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE URAMUTÃ

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ-RR

Processo nº: 131/2022
Número de Contrato: 131/2022/PMUI
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO – COMUNIDADE SÃO LUIZ/RR, NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ –RR.
Empresa Contratada: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA -ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR.
CNPJ: 30.776.317/0001-85
Valor: R$ 493.917,86 (quatrocentos e noventa três mil novecentos dezessete reais e oitenta seis centavos).
Data da Assinatura: 08/11/2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE URAMUTÃ

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ-RR

Processo nº: 134/2022
Número de Contrato: 134/2022/PMUI
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – Comunidade BARREIRINHA, NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ –RR.
Empresa Contratada: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA -ME
CNPJ: 37.170.418/0001-57
Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR.
CNPJ: 30.776.317/0001-85
Valor: R$ 494.948,16 (quatrocentos e noventa quatro mil novecentos e quarenta oito reais e dezessete centavos).
Data da Assinatura: 08/11/2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE URAMUTÃ

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ-RR

Processo nº: 135/2022
Número de Contrato: 135/2022/PMUI
Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA Ko Ko TERESA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARU I NO MUNICÍPIO DE URAMUTÃ –RR.
Empresa Contratada: L. M. B. EMPREEDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ: 38.080.939/0001-86
Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR.
CNPJ: 30.776.317/0001-85
Valor: R$ 516.448,16 (quinhentos e dezessois mil quatrocentos e sessenta oito reais e dezessois centavos).
Data da Assinatura: 08/11/2022.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPAL DE URAMUTÃ

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022
PROCESSO: 23101.000721/2022.19- SEI 0045
SEM RELATIVO DE PREÇO

O Pregoeiro da Comissão Setorial de Licitação – CSL, da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Roraima – SESAU-RR, torna público e comunica do certame licitatório referente ao pregão supracitado, cujo objeto é a **Eventual aquisição de MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DO GRUPO 2, destinados as demandas do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) para o exercício de 2023,** qualificado e classificado em 1º lugar, no lote de Roraima de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no TERMO DE REFERÊNCIA Anexo I deste Edital.

CNPJ	EMPRESA(S) VENCEDORA(S) / ARREMATANTE(S)	ITEM(S)	VALOR TOTAL DOS ITEM(S)
03.706.490/0001-09	DELARTE COMERCIO LTDA	12	R$ 95.585,10
03.535.857/0001-06	HEPATEC LTDA	13	R$ 34.350,44
09.949.432/0001-00	COMERCIO E REPRESENTANTES PRADO LTDA	14	R$ 405.115,84
12.439.386/0001-99	DIDERMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	17 a 19	R$ 27.693,40
29.918.469/0001-00	MEDICINAIS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	11, 23, 24, 29, 41, 49 a 67	R$ 119.479,40
34.525.157/0001-34	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1, 3, 5, 6, 20 a 45	R$ 1.404.480,33
60.433.009/0001-61	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	1, 2 a 10	R$ 152.644,00
43.231.195/0001-02	MEDICINAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16	R$ 75.886,00
————	DESERTOS	4, 8, 7, 9, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 44 e 48	————
————	FRACASSADOS		————

Valor Total: R$ 2.147.203,67 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil duzentos e três reais e sessenta e sete centavos)

Boa Vista – RR, 30 de novembro de 2022.

RICARDO DE SOUZA CONCEIÇÃO
Pregoeiro da Comissão Setorial de Licitação – CSL/SESAU-RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 253/2022 - Registro de Preços
Processo nº 02470029021 - SMSA

Objeto: Eventual aquisição de Material Médico para Eletrocardiografia e Eletroencefalografia, para atendimento anual – exercício 2022, das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde – SMSA, para pleno atendimento aos municípios usuários do atendimento básico e especializado.
Entrega das Propostas: a partir de 10/11/2022 às 9h (horário de Brasília) no site www.comprasnet.gov.br.
Início da Disputa: 24/11/2022 às 10h (horário de Brasília) no site supracitado.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados, no site www.comprasnet.gov.br, no portal http://transparencia.tesouro.rr.gov.br/licitacoes ou mediante solicitação por e-mail: pregao.pmbv@gmail.com, juntamente com os dados cadastrais do (a) licitante, desde que seja no prazo acima já mencionado. Os esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão prestados pela CPL, nos dias e horários de expediente.

Joana Darc Ramos
Pregoeira



AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 008/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO ÁGUIDA KASA WAI – COMUNIDADE WILLIMOM - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ nº38.080.939/0001-86, totalizando o valor de R$ 490.706,74 (Quatrocentos e noventa mil setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos). Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 009/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO – COMUNIDADE SÃO LUIZ - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME, CNPJ nº37.170.418/0001-57, totalizando o valor de R$493.917,96 (Quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e dezessete reais e noventa e seis centavos). Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 010/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ARTHUR NABUCO DE ARAÚJO – COMUNIDADE MARACANÃ I - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: E. DA S. CASTOLDI LTDA, CNPJ nº 17.759.716/0001-70, totalizando o valor de R$512.328,16 (Quinhentos e doze mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos). Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 011/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO MARIA – COMUNIDADE SÃO MATEUS UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME, CNPJ nº 37.170.418/0001-57, totalizando o valor de R$493.086,74 (Quatrocentos e noventa e três mil e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Uiramutã/RR, 24 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 012/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO – COMUNIDADE BARREIRINHA-UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA – ME, CNPJ nº 37.170.418/0001-57, totalizando o valor de R$494.948,16 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos). Uiramutã/RR, 25 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para os interessados o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 013/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TEREZA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ I - UIRAMUTÃ/RR, conforme o projeto básico. O certame teve como vencedora a empresa: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ nº 38.080.939/0001-86, totalizando o valor de R$516.468,16 (Quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos). Uiramutã/RR, 25 de outubro de 2022. SANDRO DA SILVA MAFRA. Presidente da CPL/PMUI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI Fls. 380 Rubrica

OUTRAS PUBLICAÇÕES

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE RORAIMA - FEMARH

LICENÇA DE OPERAÇÃO **LO N.° 135/2021/DLGA**

A Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Estadual n ° 001. Art.46. Inciso III e Art.02 de 26 de janeiro de 1991, e regulamentada pela Lei Delegada nº 04 de 16 de janeiro de 2003 e da Lei Estadual nº 815 de 07 de Julho de 2011, de acordo com o Sistema de Licenciamento de Atividades Potencialmente Poluidoras, instituído através da Lei Complementar nº 007 de 26 de Agosto de 1994 concede a presente **LICENÇA DE OPERAÇÃO**, referente ao Processo Nº **PR-00464-01/2021**, Parecer Técnico do Controle Interno Nº **PAR-00234-01/2022**, registrada na **FEMARH-RR** sob o código **E-02-02** ao Empreendedor.

NOME: AZULÃO GERAÇÃO DE ENERGIA S.A (RORAIMA)

CPF/CNPJ: 30.185.130/0003-79

ENDEREÇO: RODOVIA BR-174, S/N, GLEBA MURUPU, BAIRRO SAID SALOMÃO.

MUNICÍPIO: BOA VISTA - RR

ATIVIDADE: USINA TERMELÉTRICA A GÁS NATURAL, COM CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA DE 140,83 MW, EM CICLO COMBINADO; LINHA DE TRANSMISSÃO (LT) EM 230 KV LIGANDO A UTE JAGUATIRICA II À S.E. BOA VISTA II, QUE SERÁ CONECTADA AO SISTEMA ISOLADO DE RORAIMA.

Endereço do Empreendimento: GLEBA MURUPU, REGIÃO DO BOM INTENTO, FAZENDA CAROLINA- REMANESCENTE (GLEBA C) - BOA VISTA/RR.

VALIDADE: 26/11/2026

Esta licença e válida somente para a atividade supracitada, dentro do período de validade e observada as condições deste documento e seus anexos que embora não transcritos, são partes integrantes do mesmo. Qualquer alteração deverá ser comunicada imediatamente à **FEMARH-RR.**

Boa Vista, RR. 26/11/2021

GLICÉRIO MARCOS FERNANDES PEREIRA - Presidente da FEMARH.

WAGNER SEVERO NOGUEIRA - Diretor da DLGA/FEMARH-PR

FEMARH

Avenida Ville Roy, 4935 São Pedro - Boa Vista - RR

CEP 69.306-040

TELEFAX: 095 2121-9190

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI Fls. 331 Rúbrica

EXTRATO DE CONTRATO TP Nº 9/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ-RR. Processo nº: 131/2022. Número de Contrato: 131/2022/PMUI. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO - COMUNIDADE SÃO LUIZ/RR, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR. Empresa Contratada: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA -ME. CNPJ: 37.170.418/0001-57. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR. CNPJ: 30.776.317/0001-85. Valor: R$ 493.917,86 (quatrocentos e noventa três mil novecentos dezessete reais e oitenta seis centavos).

EXTRATO DE CONTRATO TP Nº 7/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ-RR. Processo nº: 129/2022. Número de Contrato: 129/2022/PMUI. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO JOAQUIM DE LIMA - COMUNIDADE MATURUCA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR. Empresa Contratada: EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 13.808.507/0001-18. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR. CNPJ: 30.776.317/0001-85. Valor: R$ 498.048,16 (quatrocentos e noventa oito mil quarenta oito reais e dezesseis centavos).

EXTRATO DE CONTRATO TP Nº 12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ-RR. Processo nº: 134/2022. Número de Contrato: 134/2022/PMUI. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO -Comunidade BARREIRINHA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR. Empresa Contratada: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA -ME. CNPJ: 37.170.418/0001-57. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Uiramutã/RR. CNPJ: 30.776.317/0001-85. Valor: R$ 494.948,16 (quatrocentos e noventa quatro mil novecentos e quarenta oito reais e dezesseis centavos).

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022

PROCESSO Nº 134/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA - RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO do Procedimento Licitatório - PROCESSO Nº 134/2022 - TOMADA DE PRECOS Nº 012/2022 conforme a seguir: EMPRESA: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - MR. CNPJ Nº: 37.170.418/0001-57. OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO ROSENO -Comunidade BARREIRINHA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR. VALOR: 494.948,16 (quatrocentos e noventa quatro mil novecentos e noventa oito reais e dezesseis centavos).

Uiramutã-RR, 31 de outubro de 2022.
BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022

PROCESSO Nº 132/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA - RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO do Procedimento Licitatório - PROCESSO Nº 132/2022 - TOMADA DE PRECOS Nº 010/2022 conforme a seguir, EMPRESA: E. DA S. CASTOLDI LTDA. CNPJ Nº: 17.759.716/0001-70. OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ARTHUR NABUCO DE ARAUJO -COMUNIDADE DE MARACANÃ I, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR. VALOR: 512.328,16 (quinhentos e doze mil trezentos e vinte oito reais e dezesseis centavos).

Uiramutã-RR, 31 de outubro de 2022.
BENISIO ROBERTO DE SOUZA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PRECOS Nº 11/2022

PROCESSO Nº 133/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA - RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO do Procedimento Licitatório - PROCESSO Nº 133/2022 - TOMADA DE PRECOS Nº 011/2022 conforme a seguir, EMPRESA: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME. CNPJ Nº: 37.170.418/0001-57. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO MARIA - COMUNIDADE SÃO MATEUS, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR. VALOR: 493.086,74 (quatrocentos e noventa três mil oitenta seis reais e setenta quatro centavos).

Uiramutã-RR, 31 de outubro de 2022.
BENISIO ROBERTO DE SOUZA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022

PROCESSO Nº 135/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA - RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO do Procedimento Licitatório - PROCESSO Nº 135/2022 - TOMADA DE PRECOS Nº 013/2022 conforme a seguir: EMPRESA: L. M. B. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME. CNPJ Nº: 38.080.939/0001-86. OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA Ko'Ko TERESA DA SILVA - COMUNIDADE CARAPARÚ I NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR. VALOR: 516.468,16 (quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e sessenta oito reais e dezesseis centavos).

Uiramutã-RR, 31 de outubro de 2022.
BENISIO ROBERTO DE SOUZA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2022

PROCESSO Nº 131/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA - RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO do Procedimento Licitatório - PROCESSO Nº 131/2022 - TOMADA DE PRECOS Nº 009/2022 conforme a seguir, EMPRESA: A. ALMEIDA FEITOSA DE SOUSA LTDA - ME. CNPJ Nº: 37.170.418/0001-57. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA OZEIAS RIBEIRO - COMUNIDADE SÃO LUIZ, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR. VALOR: 493.917,86 (quatrocentos e noventa três mil novecentos e dezessete reais e oitenta seis centavos).

Uiramutã-RR, 31 de outubro de 2022.
BENISIO ROBERTO DE SOUZA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2022

PROCESSO Nº 129/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA - RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO do Procedimento Licitatório - PROCESSO Nº 129/2022 - TOMADA DE PRECOS Nº 007/2022 conforme a seguir: EMPRESA: EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ Nº: 13.808.507/0001-18. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AMOOKO JOAQUIM DE LIMA - COMUNIDADE MATURUCA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR. VALOR: 498.048,16 (quatrocentos e noventa oito mil quarenta oito reais e dezesseis centavos).

Uiramutã-RR, 31 de outubro de 2022.
BENISIO ROBERTO DE SOUZA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2022

PROCESSO Nº 130/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA - RR, na condição de autoridade competente e ordenador de despesa, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentos praticados, faço a ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO do Procedimento Licitatório - PROCESSO Nº 130/2022 - TOMADA DE PRECOS Nº 008/2022 conforme a seguir, EMPRESA: L. M. B. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME. CNPJ Nº: 38.080.939/0001-86. OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KO'KO ÃGUIDA KASA - WAI- COMUNIDADE WILLIMON, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ -RR. VALOR: 490.706,74 (quatrocentos e noventa mil setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos).

Uiramutã-RR, 31 de outubro de 2022.
BENISIO ROBERTO DE SOUZA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÚNA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 131/2022

PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA BÁSICA SUBIDA / APIÚNA SC.

O Município de Apiúna, SC, torna público para conhecimento dos interessados que até às 09:00 horas do dia 28/11/2022, estará recebendo envelopes para selecionar a melhor proposta para o objeto acima identificado. Local da Abertura: Prefeitura de Apiúna, 1° andar, sala nº 12, Rua Quintino Bocaiúva, 204, Centro, Apiúna/SC. Abertura da sessão a partir das 09:10 horas do dia 28/11/2022.

Maiores Informações: Fone 47 3353 2000 ou nos e-mails: licita@apiuna.sc.gov.br/licitacao@apiuna.sc.gov.br. Edital completo no site www.apiuna.sc.gov.br.

Em 4 de novembro de 2022
MARCELO DOUTEL DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022 - PMBC - UASG: 988039

COMPRASNET Nº 156/2022. Com base no § 2º, art. 24 do Decreto Municipal 10.540/2021, o Edital de licitação acima epigrafado, publicado neste mesmo diário e no site www.bc.sc.gov.br, cujo objeto trata do Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios perecíveis (carne de frango), pelo período de 12 (doze) meses, segundo as conveniências da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, ficará suspenso para análise e parecer de impugnação.

Balneário Camboriú, 10 de novembro de 2022
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022 - SSSM

COMPRASNET Nº 185/2022

Com base no art. 25 do Decreto Municipal 10.540/2021, o Edital de licitação acima epigrafado, publicado neste mesmo diário em 07 de Novembro de 2022, Seção 3, Página n°328, no Portal COMPRASNET e no site: www.bc.sc.gov.br, cujo objeto trata da Aquisição de Material Ambulatorial, sofrerá retificação na publicação na data de abertura: Onde se lê: Data e local da sessão pública: Dia 18/11/2022. Horário: Às 09h00min, no Portal de Compras do Governo Federal - Código UASG: 988039.Leia-se: Data e local da sessão pública: Dia 21/11/2022. Horário: Às 09h00min, no Portal de Compras do Governo Federal - Código UASG: 988039.

Considerando que o edital disponibilizado no Sitio Municipal e no Portal COMPRASNET está com a Data de Abertura Correta, ficam mantidas as demais Condições Estabelecidas.

Balneário Camboriú - SC, 10 de Novembro de 2022.
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 332
Rúbrica

FUNDEB

30.776.317/0001-85

OR - Ordinário

000096

OR - Ordinario 96	FICHA: 214	DATA: 08/11/2022	PEDIDO Nº:

Licitação: OBRA TOMADA | Nº Licitação: 000027/22 | Proc. Licit. 0013/22 | PROCESSO: 135/2022

Nome: L. M .B. EMPREENDIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ:38.080.939/0001-86 | Código: 1489

Endereço: | Cidade: CANTA

CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária	020702	FUNDO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%
Cat. Econômica	4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
Funcional	12.361.3400.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS
Cód.Aplicação	240. 005	CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 30%
Fonte Iduso	1	Recursos do Exercício Corrente
Fonte Grupo	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Fonte Codigo	1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.829.146,14	3.311.875,84	516.468,16	802,14

VALOR EM R$

516.468,16 quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos **********

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TERESA DA SILVA -COMUNIDADE CARAPARÚ I, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

08 de novembro de 2022.

VALOR TOTAL DOS ITENS **516.468,16**

VANDERLANE JAMES LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO

Autorizo

Benisio Roberto de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE UIRAMUTA
Rua Cici Mota, s/n
01612681/0001-01 Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA - PMUI - Fls. 333 Rúbrica

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00096/001** OR Ficha: 214
Data Empenho: 08/11/2022 Data Liquidação:18/11/2022

Credor..: L. M .B. EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CEP: 69305-000
Cidade..: CANTA

Valor **RR$ 180.751,62**
Extenso: cento e oitenta mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000000040		18/11/202		180.751,62
Total de Notas				180.751,62

Título de Crédito:
Espécie:
Despesa Bruta: . . . . . RR$ 180.751,62

9999.00.0.0.05	ISS FUNDEB	RR$ 1.755,55
	TOTAL RETIDO.....	RR$ 1.755,55

Líquido a Pagar: . . . . . RR$ 178.996,07

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRS
VANDERLANE JAMES LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R$

Liquidado em __/__/____ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

Prefeitura Municipal de Cantá
AV RENATO COSTA DE ALMEIDA, 100
CENTRO - CANTÁ - RR CEP: 69390-000
CNPJ: 01.612.682/0001-56

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000040

Data e Hora de Emissão
18/11/2022 15:58:33

Data do Fato Gerador
18/11/2022

Código de Verificação
AAAEEUCU-AUAJAM

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**UIRAMUTÃ/RR - BRASIL**	**UIRAMUTÃ/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA**

Endereco: **TRA DALVA DE OLIVEIRA, 906**
SANTA CECILIA CANTÁ - RR CEP: 69390-000

CPF/CNPJ: **38.080.939/0001-86** Insc. Municipal: **11441**
Telefone: **(95) 9.9165-4121** E-mail:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ
Fls. 334
Rúbrica
PMUT

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA**

Endereço: **7A R CECI MOTA, S/N**
CENTRO CANTÁ - RR CEP: 69358-000

CPF/CNPJ: **30.776.317/0001-85** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

1ª FATURA
NOTA FISCAL DA OBRA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KO'KO TEREZA DA SILVA - COMUNIDADE CARAPARU I – MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ/RR.

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022
PROCESO Nº 135/2022

PERIODO DE EXECUÇÃO: 08/11/2022 À 17/11/2022

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R$180.751,62

CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
EMPRESA: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.080.939/0001-86
AGENCIA 2617-4
CONTA 59155-6
LUCAS M. BRIGLIA

Atesto que os materiais / serviços constantes na presente Nota Fiscal foram entregues / realizados.
Em: 18/NOV/2022
Adriano Domingos da Silva - Fiscal
Engenheiro Civil
CREA 090540403SP

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
4399103 - Obras de alvenaria

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
180.751,62	**130.593,05**	**0,00**	**50.158,57**
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
3,50	**0,00**	**1.755,55**	**0,00**

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total

	Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
	180.751,62	**178.996,07**

Outras Informações

O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA através de substituição tributária
*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 31.541,16 - (17,45%) - Fonte: IBPT

ATESTO o recebimento do (s) serviço (s) e/ ou material (is).
Uiramutã-RR, ____ de _____ 20___

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://canta.saatri.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 335 Rúbrica

FUNDEB

30.776.317/0001-85 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00758

DATA: 22/11/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO:22/11/2022

Credor..: L. M .B. EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 38.080.939/0001-86 Cod: 1489

Endereço:

Cidade..: CANTA CEP: 69305-000

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO'KO TERESA DA SILVA -COMUNIDADE CARAPARÚ I, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR.

Valor **180.751,62**

(cento e oitenta mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos) * * *

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM UIRAMUTA -FEB
Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2



Creditado

Nome	L. M B E LTDA
Agência	2617-4
Conta corrente	59155-6
Valor	178.996,07
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG190583 VANDERLANE J LIMA	22/11/2022 16:44:34
	JE688997 BENISIO R SOUZA	22/11/2022 17:59:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO R SOUZA.

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome	PM UIRAMUTA -FEB
Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2

Creditado

Nome	PM UIRA RECURSOS PROPRIOS
Agência	4263-3
Conta corrente	905267-4
Valor	1.755,55
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JG190583 VANDERLANE J LIMA	22/11/2022 16:56:25
	JE688997 BENISIO R SOUZA	22/11/2022 17:59:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO R SOUZA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 338
Rubrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Memorando 0032 /2022.

Uiramutã /RR, 18 de novembro de 2022.

Ao Exmº. Sr,
Silvano dos Santos
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos
Prefeitura de Uiramutã/RR

Prezado Secretário,

Cumprimentando Vossa Excelência, venho pelo presente, solicitar emitir o parecer referente a CONTRATAÇÃO **DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA Ko`Ko TERESA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ I Município de Uiramutã/ RR** - PROCESSO CONTRATO Nº 135/2022-SMECD, FNDE. REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º MEDICAO-PERIODO 08/11/2022 á 17/11/2022 6 - VALOR R$ 180.751,62 no qual que todos os serviços existentes no boletim de medição nº01 elaborada pela empresa contrata L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 38.080.939/0001-86 constantes deste processo da 1ªfatura, conforme NFe nº 0000040, foram executados em conformidade com o contratado em planilha/projeto e condizem com o real executado.

Respeitosamente,

Engº Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA-RR nº 0905404068
Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR

14/12/22

L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 38.080.939/0001-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 339
Rubrica
PMU

Ofício n°003/2022

Á Prefeitura de Uiramutã

Ao Exm°. Sr,
BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito de Uiramutã

Prezado Senhor,

A empresa contratada L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 38.080.939/0001-86 Rua Dalva de Oliveira, n ° 906, Santa Cecilia, Cantá/RR – CEP 69.390-000 – Tel. (95) 99165-4121, referente ao N° PROCESSO LICITATÓRIO N°: 135/2022, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA Ko`Ko TERESA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ I,** NO MUNÍCIPIO UIRAMUTA / RR , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1° MEDICAO-PERIODO 08/11/2022 a 17/11/2022 CONFORME NFe n° 0000040 - VALOR R$ 180.751,62, no qual que todos os serviços existentes no boletim de medição n°01 elaborada pela empresa contrata encaminho vos e declaro que todos os serviços existentes fatura n°01 elaborada por esta empresa constantes deste processo de medição, foram executados em conformidade com o contratado em planilha/projeto e que suas respectivas memórias de cálculo condizem com o real executado, sob pena de sofrer todas as sanções legais cabíveis.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração, para todos os fins de direito

Nestes termos

Respeitosamente,

Boa Vista-RR, 18 de novembro de 2022

SÓCIO – ADMINISTRADOR
L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 38.080.939/0001-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 340
Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Boa vista, 17 de novembo de 2022

OBJETO: Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva- Comunidade Caraparú I_ Município de Uiramutã/ RR
PROCESSO CONTRATO Nº 135/2022-SMECD, FNDE

BM 01

PERÍODO DA MEDIÇÃO	08/11/2022 à 17/11/2022

FATURA 01

Item	Descrição	Und	Valor Unit com BDI	QUANT	TOTAL
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				9.478,68
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	134,15	21,33	2.861,87
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6.616,81	1,00	6.616,81
2	**ALIMENTAÇÃO CANTEIRO**				6.891,06
2.1	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	17,49	394,00	6.891,06
3	**DIVERSOS**				497,17
3.4	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	16,49	30,15	497,17
4	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**				41.988,39
4.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	688,36	3,60	2.478,10
4.2	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	766,35	1,00	766,35
4.3	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	2.756,33	1,00	2.756,33
4.4	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros. telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias	un	18.734,70	1,00	18.734,70
4.5	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	53,19	35,00	1.861,65
4.6	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m²	3,24	900,00	2.916,00
4.7	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	0,62	11909,94	7.384,16
4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,14	4465,88	5.091,10
5	**INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES**				22.718,61
5.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	85,91	7,80	670,10
5.2	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	52,08	2,00	104,16
5.3	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	184,04	26,20	4.821,85
5.4	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	149,26	26,20	3.910,61
5.5	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	47,23	14,80	699,00
5.6	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	908,14	4,80	4.359,07
5.7	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	239,09	4,80	1.147,63
5.8	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	27,15	39,76	1.079,48
5.9	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	21,70	273,12	5.926,70
6	**INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME**				24.533,00
6.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	85,91	1,66	142,61
6.2	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	139,21	36,78	5.120,14
6.3	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	47,23	13,40	632,88
6.4	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	908,14	4,87	4.422,64
6.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m²	239,09	4,87	1.164,37
6.6	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	27,15	62,97	1.709,64
6.7	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	24,25	148,70	3.605,98
6.8	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	200,49	25,93	5.198,71
6.9	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	m²	47,27	53,65	2.536,04
7	**SUPERESTRUTURA - PILARES**				30.051,80
7.1	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	184,04	61,44	11.307,42

L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA

FATURA 01

Item	Descrição	Und	Valor Unit com BDI	QUANT	TOTAL
7.2	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	149,26	61,44	9.170,53
7.3	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	908,14	3,34	3.033,19
7.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	239,09	3,34	798,56
7.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	27,15	65,63	1.781,85
7.6	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	21,70	182,50	3.960,25
8	**SUPERESTRUTURA - VIGAS**				21.246,60
8.1	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	146,99	38,88	5.714,97
8.2	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	161,02	38,88	6.260,46
8.3	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	908,14	3,74	3.396,44
8.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	239,09	3,74	894,20
8.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	27,15	65,43	1.776,42
8.6	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	25,80	124,19	3.204,10
9	**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**				23.346,31
9.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	145,51	135,36	19.696,23
9.2	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	7,79	37,22	289,94
9.3	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	82,87	15,33	1.270,67
9.4	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	71,93	14,67	1.054,97
9.5	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	81,67	12,67	1.034,49
	TOTAL GERAL (R$)			1ª FATURA	180.751,62
			VALOR DA FATURA		**180.751,62**

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
Fls. 341
Rubrica
PMU

L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 38.080.939/0001-86

LMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Boa vista, 17 de novembo de 2022

OBJETO: Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva- Comunidade Caraparú I_ Município de Uiramutã/ RR

PROCESSO CONTRATO Nº 135/2022-SMECD, FNDE

BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01

Processo n°	133/2022			
DATA:	17/11/2022	BOL. MEDIÇÃO N° 01		
PRAZO	90		INÍCIO	TÉRMINO
PERÍODO DE EXECUÇÃO			08/11/2022	06/2/2023
08/11/2022 à 17/11/2022			9 DIAS CORRIDOS	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**21.819,22**	**43,44%**		**9.478,68**	**43,44%**		**9.478,68**
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	134,15	8.585,60	**33,33%**	21,33	2.861,87	**33,33%**	21,33	2.861,87
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	6.616,81	13.233,62	**50,00%**	1,00	6.616,81	**50,00%**	1,00	6.616,81
2	**ALIMENTAÇÃO CANTEIRO**				**20.673,18**	**33,33%**		6.891,06	**33,33%**		6.891,06
2.1	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	1.182,00	17,49	20.673,18	**33,33%**	394,00	6.891,06	**33,33%**	394,00	6.891,06
3	**DIVERSOS**				**14.924,32**	**3,33%**		**497,17**	**3,33%**		**497,17**
3.1	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	UN	1,00	1.676,56	1.676,56	**0,00%**		0,00	**0,00%**	0,00	0,00
3.2	Placa de acrilico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	UN	6,00	88,50	531,00	**0,00%**		0,00	**0,00%**	0,00	0,00
3.3	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	un	1,00	937,20	937,20	**0,00%**		0,00	**0,00%**	0,00	0,00
3.4	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	90,45	16,49	1.491,52	**33,33%**	30,15	497,17	**33,33%**	30,15	497,17
3.5	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	un	8,00	978,88	7.831,04	**0,00%**		0,00	**0,00%**	0,00	0,00
3.6	Limpeza geral (final da obra)	m²	900,00	2,73	2.457,00	**0,00%**		0,00	**0,00%**	0,00	0,00
4	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**				**66.938,89**	**62,73%**		41.988,39	**62,73%**		41.988,39
4.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	3,60	688,36	2.478,09	**100,00%**	3,60	2.478,10	**100,00%**	3,60	2.478,10
4.2	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	766,35	766,35	**100,00%**	1,00	766,35	**100,00%**	1,00	766,35
4.3	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	2.756,33	2.756,33	**100,00%**	1,00	2.756,33	**100,00%**	1,00	2.756,33
4.4	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros. telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias	un	1,00	18.734,70	18.734,70	**100,00%**	1,00	18.734,70	**100,00%**	1,00	18.734,70
4.5	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	35,00	53,19	1.861,65	**100,00%**	35,00	1.861,65	**100,00%**	35,00	1.861,65
4.6	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	m²	900,00	3,24	2.916,00	**100,00%**	900,00	2.916,00	**100,00%**	900,00	2.916,00
4.7	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	35.729,81	0,62	22.152,48	**33,33%**	11.909,94	7.384,16	**33,33%**	11.909,94	7.384,16
4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13.397,63	1,14	15.273,29	**33,33%**	4.465,88	5.091,10	**33,33%**	4.465,88	5.091,10
5	**INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES**				5.926,70	**383,33%**		22.718,61	**383,33%**		22.718,61
5.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	7,80	85,91	670,09	**100,00%**	7,80	670,10	**100,00%**	7,80	670,10
5.2	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	2,00	52,08	104,16	**100,00%**	2,00	104,16	**100,00%**	2,00	104,16
5.3	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	26,20	184,04	4.821,84	**100,00%**	26,20	4.821,85	**100,00%**	26,20	4.821,85
5.4	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	26,20	149,26	3.910,61	**100,00%**	26,20	3.910,61	**100,00%**	26,20	3.910,61
5.5	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	14,80	47,23	699,00	**100,00%**	14,80	699,00	**100,00%**	14,80	699,00
5.6	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,80	908,14	4.359,07	**100,00%**	4,80	4.359,07	**100,00%**	4,80	4.359,07
5.7	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,80	239,09	1.147,63	**100,00%**	4,80	1.147,63	**100,00%**	4,80	1.147,63
5.8	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	39,76	27,15	1.079,48	**100,00%**	39,76	1.079,48	**100,00%**	39,76	1.079,48
5.9	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	273,12	21,70	5.926,70	**100,00%**	273,12	5.926,70	**100,00%**	273,12	5.926,70
6	**INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME**				**24.532,96**	**100,00%**		24.533,00	**100,00%**		24.533,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Fls. 343
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Contratual				MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
6.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	1,66	85,91	142,61	100,00%	1,66	142,61	100,00%	1,66	142,61
6.2	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	36,78	139,21	5.120,14	100,00%	36,78	5.120,14	100,00%	36,78	5.120,14
6.3	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	13,40	47,23	632,88	100,00%	13,40	632,88	100,00%	13,40	632,88
6.4	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,87	908,14	4.422,64	100,00%	4,87	4.422,64	100,00%	4,87	4.422,64
6.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,87	239,09	1.164,36	100,00%	4,87	1.164,37	100,00%	4,87	1.164,37
6.6	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	62,97	27,15	1.709,63	100,00%	62,97	1.709,64	100,00%	62,97	1.709,64
6.7	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	148,70	24,25	3.605,97	100,00%	148,70	3.605,98	100,00%	148,70	3.605,98
6.8	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	25,93	200,49	5.198,70	100,00%	25,93	5.198,71	100,00%	25,93	5.198,71
6.9	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	m²	53,65	47,27	2.536,03	100,00%	53,65	2.536,04	100,00%	53,65	2.536,04
7	**SUPERESTRUTURA - PILARES**				**30.051,78**	100,00%		30.051,80	100,00%	0,00	30.051,80
7.1	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44	184,04	11.307,41	100,00%	61,44	11.307,42	100,00%	61,44	11.307,42
7.2	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44	149,26	9.170,53	100,00%	61,44	9.170,53	100,00%	61,44	9.170,53
7.3	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	3,34	908,14	3.033,18	100,00%	3,34	3.033,19	100,00%	3,34	3.033,19
7.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,34	239,09	798,56	100,00%	3,34	798,56	100,00%	3,34	798,56
7.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	65,63	27,15	1.781,85	100,00%	65,63	1.781,85	100,00%	65,63	1.781,85
7.6	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	182,50	21,70	3.960,25	100,00%	182,50	3.960,25	100,00%	182,50	3.960,25
8	**SUPERESTRUTURA - VIGAS**				**21.246,57**	100,00%		21.246,60	100,00%		21.246,60
8.1	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	38,88	146,99	5.714,97	100,00%	38,88	5.714,97	100,00%	38,88	5.714,97
8.2	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	38,88	161,02	6.260,45	100,00%	38,88	6.260,46	100,00%	38,88	6.260,46
8.3	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	3,74	908,14	3.396,44	100,00%	3,74	3.396,44	100,00%	3,74	3.396,44
8.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,74	239,09	894,19	100,00%	3,74	894,20	100,00%	3,74	894,20
8.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	65,43	27,15	1.776,42	100,00%	65,43	1.776,42	100,00%	65,43	1.776,42
8.6	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	124,19	25,80	3.204,10	100,00%	124,19	3.204,10	100,00%	124,19	3.204,10
9	**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**				**35.019,46**	66,67%		23.346,31	66,67%		23.346,31
9.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área	m²	203,04	145,51	29.544,35	66,67%	135,36	19.696,23	66,67%	135,36	19.696,23
9.2	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	55,83	7,79	434,91	66,67%	37,22	289,94	66,67%	37,22	289,94
9.3	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	23,00	82,87	1.906,01	66,67%	15,33	1.270,67	66,67%	15,33	1.270,67
9.4	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	22,00	71,93	1.582,46	66,67%	14,67	1.054,97	66,67%	14,67	1.054,97
9.5	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	19,00	81,67	1.551,73	66,67%	12,67	1.034,49	66,67%	12,67	1.034,49
10	**REVESTIMENTO**				**41.475,24**	0,00%		0,00	0,00%		0,00
10.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	406,08	9,55	3.878,06	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
10.2	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	406,08	45,98	18.671,55	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
10.3	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	m²	111,36	54,50	6.069,12	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00

L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	111,36	115,45	12.856,51	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
11	**PINTURA**				**16.190,39**	**0,00%**		0,00	**0,00%**		0,00
11.1	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	406,08	2,87	1.165,44	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
11.2	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	m²	203,04	17,83	3.620,20	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
11.3	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	203,04	21,79	4.424,24	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
11.4	Aplicação manual de pintura com tinta acetinada em paredes, duas demãos.	m²	406,08	17,19	6.980,51	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12	**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**				**2.896,19**	**0,00%**		0,00	**0,00%**		0,00
12.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	1,20	145,51	174,61	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	2,60	9,55	24,83	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.3	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	2,60	45,98	119,54	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.4	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	3,98	2,87	11,42	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.5	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	3,98	21,79	86,72	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	3,98	17,19	68,41	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.7	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	1,46	908,14	1.325,88	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.8	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,46	239,09	349,07	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.9	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,00	735,71	735,71	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
13	**COBERTURA**				**42.002,35**	**0,00%**		-	**0,00%**		-
13.1	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	185,13	76,51	14.164,29	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
13.2	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	185,13	67,51	12.498,12	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
13.3	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	M	32,24	139,31	4.491,35	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
13.4	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	185,13	7,53	1.394,02	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
13.5	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro.	m²	130,57	72,41	9.454,57	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
14	**PAVIMENTAÇÃO**				**42.873,37**	**0,00%**		-	**0,00%**		-
14.1	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	19,57	52,08	1.019,20	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
14.2	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	130,57	72,80	9.505,49	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
14.3	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	130,57	57,96	7.567,83	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
14.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	130,57	172,21	22.485,45	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
14.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	92,00	24,95	2.295,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15	**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**				**4.705,55**	**0,00%**		0,00	**0,00%**		0,00
15.1	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	M	4,50	140,21	630,94	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15.2	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	M	96,06	11,18	1.073,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15.3	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	M	18,80	159,61	3.000,66	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16	**CALÇADA DE PROTEÇÃO**				**18.594,36**	**0,00%**		0,00	**0,00%**		0,00
16.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	3,97	85,91	341,06	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 344
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMINA
345
Fls.
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Contratual				MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
16.2	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	2,78	52,08	144,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.3	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	19,90	200,49	3.989,75	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.4	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	72,77	174,24	12.679,44	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.5	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos. com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	25,92	9,55	247,53	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.6	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	25,92	45,98	1.191,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
17	**ESQUADRIAS**				**20.005,04**	**0,00%**		-	**0,00%**	0,00	-
17.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	387,91	1.939,55	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
17.2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18,00	976,62	17.579,16	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
17.3	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,48	1.013,20	486,33	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18	**LOUÇAS E METAIS**				**8.620,67**	**0,00%**		0,00	**0,00%**		0,00
18.1	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	un	2,00	235,29	470,58	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.2	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	un	2,00	1.331,02	2.662,04	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.3	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	UN	2,00	177,14	354,28	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.4	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2,00	565,95	1.131,90	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.5	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	UN	2,00	44,04	88,08	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.6	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	3,00	261,27	783,81	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.7	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	un	2,00	31,50	63,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.8	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	un	1,00	1.029,04	1.029,04	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.9	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	un	1,00	2.037,94	2.037,94	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**				**12.244,54**	**0,00%**		0,00	**0,00%**		0,00
19.1	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saída, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	UN	1,00	8.587,36	8.587,36	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.2	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	M	28,90	7,19	207,79	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.3	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	M	30,10	21,64	651,36	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.4	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	19,75	15,50	306,12	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.5	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	UN	8,00	10,24	81,92	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.6	Curva 90° soldável 25 mm água fria	UN	2,00	13,94	27,88	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.7	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	11,00	17,51	192,61	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.8	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	un	6,00	16,56	99,36	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.9	Joelho 90° soldável 40mm água fria	UN	3,00	15,35	46,05	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.10	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	3,00	128,37	385,11	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Fls. 346
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Contratual				MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
19.11	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	UN	14,00	7,26	101,64	0,00%		0,00	0,00%	0,00	
19.12	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	1,00	100,61	100,61	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.13	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	6,00	14,24	85,44	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.14	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	1,00	11,63	11,63	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.15	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	UN	5,00	24,15	120,75	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.16	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	1,00	23,76	23,76	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.17	Registro de esfera soldável 40mm	UN	1,00	54,50	54,50	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.18	Registro de esfera soldável 25mm	UN	1,00	27,22	27,22	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.19	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	940,56	940,56	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19.20	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,00	64,29	192,87	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**				**19.461,49**	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.1	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	M	9,10	22,96	208,93	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.2	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	12,40	33,65	417,26	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.3	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	28,00	64,54	1.807,12	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.4	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	8,40	15,50	130,20	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.5	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	3,00	46,53	139,59	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.6	Tê sanitário em PVC rigido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	un	1,00	60,29	60,29	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.7	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	1,00	24,90	24,90	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.8	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	un	10,00	14,02	140,20	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.9	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	un	10,00	13,54	135,40	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.10	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	UN	4,00	28,19	112,76	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.11	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	UN	1,00	13,29	13,29	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.12	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	UN	2,00	8,13	16,26	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.13	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	2,00	74,10	148,20	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.14	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	2,00	22,55	45,10	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.15	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	3,00	12,47	37,41	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.16	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no minimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	UN	3,00	34,17	102,51	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.17	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	2,00	23,20	46,40	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.18	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	1,00	5.469,62	5.469,62	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.19	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	1,00	5.073,57	5.073,57	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
20.20	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforçada, revestida internamente com barra lisa e fundo em concreto	un	8,00	666,56	5.332,48	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
21	**COMBATE A INCÊNDIO**				**641,21**	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
21.1	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	2,00	269,55	539,10	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
21.2	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	2,00	31,20	62,40	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
21.3	Placa de sinalização padrão para saida de emergência 400x120mm	Un	1,00	39,71	39,71	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**28.832,80**	0,00%		0,00	0,00%		0,00
22.1	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	46,00	17,93	824,78	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.2	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	62,60	3,51	219,72	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Contratual				MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
22.3	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: BRANCO.	M	76,60	3,51	268,86	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.4	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	52,60	3,51	184,62	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.5	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	142,20	3,51	499,12	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.6	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	142,20	5,16	733,75	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.7	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	82,60	5,16	426,21	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.8	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERDE.	M	188,30	5,16	971,62	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.9	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	153,90	5,16	794,12	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.10	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	40,00	31,36	1.254,40	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.11	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	40,00	31,36	1.254,40	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.12	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERDE.	M	40,00	31,36	1.254,40	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.13	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	40,00	31,36	1.254,40	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.14	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	un	3,00	342,74	1.028,22	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.15	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	UN	14,00	48,72	682,08	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.16	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	101,95	203,90	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	54,32	108,64	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Contratual				MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
22.18	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	85,79	171,58	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.19	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	2,00	29,92	59,84	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.20	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	1,00	47,28	47,28	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.21	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	344,52	344,52	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.22	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	un	2,00	152,62	305,24	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.23	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	UN	6,00	69,24	415,44	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.24	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	UN	8,00	15,34	122,72	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.25	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	M	75,00	14,49	1.086,75	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.26	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	M	9,40	19,18	180,29	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.27	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	M	50,30	15,35	772,10	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.28	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	M	6,00	20,03	120,18	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.29	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	M	36,00	24,62	886,32	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.30	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	M	57,80	7,73	446,79	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.31	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 100W.	un	29,00	12,08	350,32	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.32	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W.	UN	5,00	171,32	856,60	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.33	Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt	un	31,00	34,35	1.064,85	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.34	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	UN	3,00	33,25	99,75	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.35	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por eletrodeposição anódica e pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco, diâmetro de 5/8" e comprimento de 3,0m. Conforme as normas NBR 13571/96 e UL-467.	UN	3,00	102,39	307,17	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.36	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR 5111.	M	10,00	74,02	740,20	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.37	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	un	2,00	14,93	29,86	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.38	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20 (vinte) metros de comprimento, conforme norma ABNT NBR NM 60454-3, tipo 5, Classe A, 90°C, espessura de 0,19mm e isolação para até 750V.	Un	3,00	10,97	32,91	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.39	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação, cor preta, espessura de 0,76mm, para isolação até 69kV. Rolos de 19mm de largura com 10 (dez) metros de comprimento	Un	3,00	15,74	47,22	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.40	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	4,50	85,91	386,59	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.41	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	3,50	52,08	182,28	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.42	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	2.159,67	2.159,67	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.43	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	731,17	1.462,34	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Fls. 348
Rubrica

L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
22.44	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,00	4.190,75	4.190,75	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
			TOTAL GERAL (R$)		516.468,16	35,00%	1° BM	180.751,62	35,00%	ACUMUL.	180.751,62

VALOR DO 1° BOLETIM MEDIÇÃO	180.751,62
% MEDIDO	35,00%
VALOR ACUMULADO	180.751,62
% EXECUTADO	35,00%
VALOR DO CONTRATO	516.468,16
SALDO DO CONTRATO	335.716,54

Responsável Técnico da Empresa

[illegible] da Silva
Engenheiro Civil
CREA 060434/D
fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 349
Rubrica

L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 38.080.939/0001-86

LMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ — Fls. 350 — Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ		DATA:	17/11/2022	BOL. MEDIÇÃO Nº 001/2022	
Boa vista, 17 de novembo de 2022		PRAZO:	90	INÍCIO	TÉRMINO
OBJETO:	Construção da Escola Municipal Indigena Ko'ko Tereza da Silva-Comunidade Caraparú I_ Município de Uiramutã/ RR	PERÍODO DE EXECUÇÃO		08/11/2022	06/2/2023
PROCESSO CONTRATO Nº 135/2022-SMECD, FNDE		08/11/2022 à 16/11/2022		9	DIAS CORRIDOS

BM Nº 01_CFF x Executado

Item	SERVIÇO	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.819,22	5.454,81	5.454,81	5.454,81	5.454,81
		100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2	ALIMENTAÇÃO CANTEIRO	20.673,18	5.168,30	5.168,30	5.168,30	5.168,30
		100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
3	DIVERSOS	14.924,32	14.924,32	-	-	-
		100%	100,00%			
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE	66.938,89	66.938,89	-	-	-
		100%	100,00%			
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E	22.718,58	22.718,58	-	-	-
		100%	100,00%			
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS	24.532,96	-	24.532,96	-	-
		100%		100,00%		
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	30.051,78	-	7.512,95	22.538,84	-
		100%		25,00%	75,00%	
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	21.246,57	-	-	12.747,94	8.498,63
		100%			60,00%	40,00%
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	35.019,46	-	-	-	35.019,46
		100%				100,00%
10	REVESTIMENTO	41.475,24	-	-	-	41.475,24
		100%				100,00%
11	PINTURA	16.190,39	-	-	3.238,08	12.952,31
		100%			20,00%	80,00%
12	ABRIGO DO GÁS DE COZINHA	2.896,19	-	-	2.172,14	724,05
		100%			75,00%	25,00%
13	COBERTURA	42.002,35	21.001,18	21.001,18	-	-
		100%	50,00%	50,00%		
14	PAVIMENTAÇÃO	42.873,37	-	10.718,34	32.155,03	-
		100%		25,00%	75,00%	
15	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	4.705,55	-	-	4.705,55	-
		100%			100,00%	
16	CALÇADA DE PROTEÇÃO	18.594,36	-	9.297,18	9.297,18	-
		100%		50,00%	50,00%	
17	ESQUADRIAS	20.005,04	-		20.005,04	-
		100%			100,00%	
18	LOUÇAS E METAIS	8.620,67	-	-	4.310,34	4.310,34
		100%			50,00%	50,00%
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	12.244,54	-	1.836,68	5.510,04	4.897,82
		100%		15,00%	45,00%	40,00%
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	19.461,49	-	2.919,22	8.757,67	7.784,60
		100%		15,00%	45,00%	40,00%
21	COMBATE A INCÊNDIO	641,21	-	-	-	641,21
		100%				100,00%
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	28.832,80	-	4.324,92	12.974,76	11.533,12
		100%		15,00%	45,00%	40,00%

PREVISTO

DESEMBOLSO MENSAL OBRA (COM BDI)	516.468,16	136.206,07	92.766,53	149.035,70	138.459,86	516.468,16
TOTAL MENSAL (%)	100,0%	26,37%	17,96%	28,86%	26,81%	100,00%
TOTAL ACUMULADO (R$)		136.206,07	228.972,59	378.008,30	516.468,16	PREVISTO
TOTAL ACUMULADO (%)		26,37%	44,33%	73,2%	100,0%	

EXECUTADO

	BM1	BM2	BM3	BM4	
Por etapa em R$:	*180.751,62*				180.751,62
	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%
Acumulado em R$:	*180.751,62*		-	-	% EXECUTADO
	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 38.080.939/0001-86

LMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 351
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ		DATA:	17/11/2022	BOL. MEDIÇÃO Nº 001/2022	
Boa vista, 17 de novembo de 2022		PRAZO:	90	INÍCIO	TÉRMINO
OBJETO:	Construção da Escola Municipal Indigena Ko'ko Tereza da Silva-Comunidade Caraparú I_ Municipio de Uiramutã/ RR	PERÍODO DE EXECUÇÃO		08/11/2022	06/2/2023
PROCESSO CONTRATO Nº 135/2022-SMECD, FNDE		08/11/2022 à 16/11/2022		9	DIAS CORRIDOS

BM Nº 01_CFF x Executado

Item	SERVIÇO	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS

Responsável Técnico da Empresa

Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ... Fls. 352 Rúbrica

Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"

CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND

CGF/CPF/CNPJ	**Nome / Razão Social**
38.080.939/0001-86	L M B EMPREENDIMENTOS LTDA

É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria SEFAZ/GAB n° 367/2011 publicada no D.O.E n° 1562 do dia 08/06/2011.

Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Data de emissão: 06/10/2022 **Validade:** 04/01/2023

A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de resposabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaría de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, no endereço: https://www.sefaz.rr.gov.br/

Código de Autenticação: 014494

As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 353
Rúbrica

Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências

(Primeira e Segunda Instâncias)

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima CERTIFICA que, revendo os registros de Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências, nas comarcas deste Estado, até a presente data, NADA CONSTA contra:

NOME: L M B EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 38.080.939/0001-86

OBSERVAÇÕES:
1) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Portaria Presidencial nº 493, do dia 09 de abril de 2014;
2) A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
3) A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;
4) As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça de Roraima, e, ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
5) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RR, pelo endereço http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa, informando o número de autenticidade abaixo.
6) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 2 (dois)anos após a sua expedição.

Número de Autenticidade: 014152345602

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/10/2022 as 11:34

Data da última atualização da base de dados: 04/10/2022 as 00:26

Válida até o dia: 05/12/2022

Prefeitura Municipal de Cantá
SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AV RENATO COSTA DE ALMEIDA, 100
CENTRO - CANTÁ - RR CEP: 69390-000
CNPJ: 01.612.682/0001-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
Fls. 354
Rúbrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000037/2022

Nome/Razão Social: **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **LMB EMPREENDIMENTOS**
Inscrição Municipal: **11441** CPF/CNPJ: **38.080.939/0001-86**
Endereço: **TRA DALVA DE OLIVEIRA, 906**
SANTA CECILIA - CANTÁ - RR 69390000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

****
****
****
****

Esta certidão foi emitida em **13/09/2022** com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **12/12/2022**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **4100008426**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://canta.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 06/10/2022 às 11:36:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
Fls. 355
Rúbrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.080.939/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:17:32 do dia 06/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/04/2023.
Código de controle da certidão: **C76D.A906.3041.21BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 356
Rúbrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.080.939/0001-86
Razão Social: L M B EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: TV DALVA DE OLIVEIRA SN / SANTA CECILIA / CANTA / RR / 69390-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/10/2022 a 29/11/2022

Certificação Número: 2022103104421655192073

Informação obtida em 18/11/2022 09:19:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
Fls. 351
Rúbrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.080.939/0001-86
Certidão nº: 33746985/2022
Expedição: 06/10/2022, às 12:45:10
Validade: 04/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.080.939/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt-ct@tst.jus.br

MUNICIPIO DE UIRAMUTA
Rua Cici Mota, s/n
01612681/0001-01

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
Fls. 358
Rúbrica

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00096/002** OR Ficha: 214

Data Empenho: 08/11/2022 Data Liquidação: 13/12/2022

Credor..: L. M .B. EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CEP: 69305-000

Cidade..: CANTA

Valor **RR$ 197.086,84**

Extenso: cento e noventa e sete mil e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos * * *

Prefeitura Municipal de Cantá

AV RENATO COSTA DE ALMEIDA, 100
CENTRO - CANTÁ - RR CEP: 69390-000
CNPJ: 01.612.682/0001-56

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000046

Data e Hora de Emissão
13/12/2022 18:43:44

Data do Fato Gerador
13/12/2022

Código de Verificação
AAABEUEL-AUAJAM

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**UIRAMUTÃ/RR - BRASIL**	**UIRAMUTÃ/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA**

Endereco: **TRA DALVA DE OLIVEIRA, 906**
SANTA CECILIA CANTÁ - RR CEP: 69390-000

CPF/CNPJ: **38.080.939/0001-86** Insc. Municipal: **11441**

Telefone: **(95) 9.9165-4121** E-mail:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 359
Rúbrica

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA**

Endereço: **7A R CECI MOTA, S/N**
CENTRO CANTÁ - RR CEP: 69358-000

CPF/CNPJ: **30.776.317/0001-85** Insc. Municipal:

Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

2ª FATURA
NOTA FISCAL DA OBRA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KO'KO TEREZA DA SILVA - COMUNIDADE CARAPARU I – MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ/RR.

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022
PROCESO Nº 135/2022

PERIODO DE EXECUÇÃO: 18/11/2022 À 12/12/2022

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R$197.806,84

CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
EMPRESA: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.080.939/0001-86
AGENCIA 2617-4
CONTA 59155-6
LUCAS M. BRIGLIA

Atesto que os materiais / serviços constantes na presente Nota Fiscal foram entregues / realizados.
Em: 13/12/2022
Áreos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 092340[illegible]

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
4399103 - Obras de alvenaria

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
197.806,84	**142.915,44**	**0,00**	**54.891,40**
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
3,50	**0,00**	**1.921,20**	**0,00**

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
197.806,84	**195.885,64**

Outras Informações

O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA através de substituição tributária
*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 34.517,29 - (17,45%) - Fonte: IBPT
Nota Fiscal substituta da NFS-e n° 45 emitida em 13/12/2022 18:10:36
CEI: ART: RR20220109074

ATESTO o recebimento do (s) serviço (s) e/ ou material (is).
Uiramutã-RR, ____ de _____ 20__

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 366
Rúbrica

FUNDEB

30.776.317/0001-85 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00944

DATA: 14/12/2022 VENCTO:13/12/2022 PAGTO:14/12/2022

Credor..: L. M .B. EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 38.080.939/0001-86 Cod: 1489

Endereço:

Cidade..: CANTA CEP: 69305-000

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL I NDÍGENA KO'KO TERESA DA SILVA -COMUNIDADE CARAPARÚ I, NO MUNICÍPIO DE UIRA MUTÃ/RR.

Valor **197.806,84**

(cento e noventa e sete mil, oitocentos e seis reais e oitenta e quatro centavos)

* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 197.806,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
96	/ 2	OR 020702	12.361.3400.1020.0000	4.4.90.51.00	R$ 197.806,84	R$ 0,00	R$ 1.921,20	R$ 195.885,64
TOTAL					R$ 197.806,84	R$ 0,00	R$ 1.921,20	R$ 195.885,64

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 195.885,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRS
Benisio Roberto de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	15.160-2		195.885,64
TOTAL. . .			R$ 195.885,64

Despesa paga em 14/12/2022 Com os recursos acima discriminados

Vanderlane James Lima
Secretária de Educação Municipal
de Uiramutã
Portaria. nº 011/2023

VANDERLANE JAMES LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____

CGC/CPF:_____

GOVERNO

G338141659849633022
14/12/2022 17:29:49

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome	PM UIRAMUTA -FEB
Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2

Creditado

Nome	L. M B E LTDA
Agência	2617-4
Conta corrente	59155-6
Valor	195.885,64
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG190583 VANDERLANE J LIMA	14/12/2022 14:52:58
	JE688997 BENISIO R SOUZA	14/12/2022 17:29:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO R SOUZA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM UIRAMUTA -FEB
Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2

Creditado

Nome	PM UIRA RECURSOS PROPRIOS
Agência	4263-3
Conta corrente	905267-4
Valor	1.921,20
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JG190583 VANDERLANE J LIMA	14/12/2022 15:50:09
	JE688997 BENISIO R SOUZA	14/12/2022 17:29:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO R SOUZA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 362
Rúbrica

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Memorando 0046 /2022.

Uiramutã /RR, 13 de dezembro de 2022.

Ao Exmº. Sr,
Silvano dos Santos
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos
Prefeitura de Uiramutã/RR

Prezado Secretário,

Cumprimentando Vossa Excelência, venho pelo presente, solicitar emitir o parecer referente a CONTRATAÇÃO **DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA Ko`Ko TERESA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ I Município de Uiramutã/ RR** - PROCESSO CONTRATO Nº 135/2022-SMECD, FNDE. REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º MEDICAO-PERIODO 18/11/2022 a 12/12/2022 CONFORME NFe n° 0000046 - VALOR R$ 197.806,84 no qual que todos os serviços existentes no boletim de medição n°02 elaborada pela empresa contrata L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 38.080.939/0001-86 constantes deste processo da 2ªfatura, conforme NFe n° 0000045, foram executados em conformidade com o contratado em planilha/projeto e condizem com o real executado.

Respeitosamente,

Engº Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA-RR nº 0905404068
Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR

L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 38.080.939/0001-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 363
Rúbrica

Ofício n°006/2022

Á Prefeitura de Uiramutã

Ao Exm°. Sr,
BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito de Uiramutã

Prezado Senhor,

A empresa contratada L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 38.080.939/0001-86 Rua Dalva de Oliveira, n ° 906, Santa Cecilia, Cantá/RR – CEP 69.390-000 – Tel. (95) 99165-4121, referente ao N° PROCESSO LICITATÓRIO N°: 135/2022, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA Ko`Ko TERESA DA SILVA – COMUNIDADE CARAPARÚ I,** NO MUNÍCIPIO UIRAMUTA / RR , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2° MEDICAO-PERIODO 18/11/2022 a 12/12/2022 CONFORME NFe n° 0000046 - VALOR R$ 197.806,84, no qual que todos os serviços existentes no boletim de medição n°02 elaborada pela empresa contrata encaminho vos e declaro que todos os serviços existentes fatura n°02 elaborada por esta empresa constantes deste processo de medição, foram executados em conformidade com o contratado em planilha/projeto e que suas respectivas memórias de cálculo condizem com o real executado, sob pena de sofrer todas as sanções legais cabíveis.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração, para todos os fins de direito

Nestes termos

Respeitosamente,

Boa Vista-RR, 12 de dezembro de 2022

SÓCIO - ADMINISTRADOR
L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 38.080.939/0001-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 364
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Boa vista, 12 de dezembo de 2022
OBJETO: Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva- Comunidade Caraparú I_ Município de Uiramutã/ RR
PROCESSO CONTRATO Nº 135/2022-SMECD, FNDE

BM 02

PERIODO DA MEDIÇÃO	18/11/2022 à 12/12/2022

FATURA 02

Item	Descrição	Und	Valor Unit com BDI	QUANT	TOTAL
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**4.695,25**
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	134,15	35,00	4.695,25
2	**ALIMENTAÇÃO CANTEIRO**				6.891,06
2.1	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	17,49	394,00	6.891,06
3	**DIVERSOS**				**994,35**
3.4	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	16,49	60,30	994,35
4	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**				24.950,52
4.7	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	0,62	23.819,87	14.768,32
4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,14	8.931,75	10.182,20
9	**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**				11.673,16
9.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	145,51	67,68	9.848,12
9.2	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	7,79	18,61	144,97
9.3	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	82,87	7,67	635,34
9.4	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	71,93	7,33	527,49
9.5	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	81,67	6,33	517,24
10	**REVESTIMENTO**				41.475,25
10.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos. com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	9,55	406,08	3.878,06
10.2	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	45,98	406,08	18.671,56
10.3	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de talisca	m²	54,50	111,36	6.069,12
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	115,45	111,36	12.856,51
13	**COBERTURA**				**32.547,81**
13.1	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	76,51	185,13	14.164,30
13.2	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	67,51	185,13	12.498,13
13.3	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	M	139,31	32,24	4.491,35
13.4	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	7,53	185,13	1.394,03
14	**PAVIMENTAÇÃO**				**42.873,40**
14.1	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	52,08	19,57	1.019,21
14.2	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	72,80	130,57	9.505,50
14.3	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	57,96	130,57	7.567,84
14.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	172,21	130,57	22.485,46
14.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	24,95	92,00	2.295,40
17	**ESQUADRIAS**				-
19	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**				12.244,55
19.1	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saída, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	UN	8.587,36	1,00	8.587,36
19.2	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	M	7,19	28,90	207,79
19.3	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	M	21,64	30,10	651,36
19.4	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	15,50	19,75	306,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
Fls. 365
Rúbrica

Item	Descrição	Und	Valor Unit com BDI	QUANT	TOTAL
19.5	Joelho 90° soldável 25 mm água fria	UN	10,24	8,00	81,92
19.6	Curva 90° soldável 25 mm água fria	UN	13,94	2,00	27,88
19.7	Joelho 90° soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	17,51	11,00	192,61
19.8	Joelho de redução 90° soldável 40 x 25mm água fria	un	16,56	6,00	99,36
19.9	Joelho 90° soldável 40mm água fria	UN	15,35	3,00	46,05
19.10	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	128,37	3,00	385,11
19.11	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	UN	7,26	14,00	101,64
19.12	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	100,61	1,00	100,61
19.13	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	14,24	6,00	85,44
19.14	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	11,63	1,00	11,63
19.15	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	UN	24,15	5,00	120,75
19.16	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	23,76	1,00	23,76
19.17	Registro de esfera soldável 40mm	UN	54,50	1,00	54,50
19.18	Registro de esfera soldável 25mm	UN	27,22	1,00	27,22
19.19	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	940,56	1,00	940,56
19.20	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	64,29	3,00	192,87
20	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**				19.461,50
20.1	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	M	22,96	9,10	208,94
20.2	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	33,65	12,40	417,26
20.3	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	64,54	28,00	1.807,12
20.4	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	15,50	8,40	130,20
20.5	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	46,53	3,00	139,59
20.6	Té sanitário em PVC rigido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	un	60,29	1,00	60,29
20.7	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	24,90	1,00	24,90
20.8	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	un	14,02	10,00	140,20
20.9	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	un	13,54	10,00	135,40
20.10	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	UN	28,19	4,00	112,76
20.11	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	UN	13,29	1,00	13,29
20.12	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	UN	8,13	2,00	16,26
20.13	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	74,10	2,00	148,20
20.14	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	22,55	2,00	45,10
20.15	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	12,47	3,00	37,41
20.16	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no minimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	UN	34,17	3,00	102,51
20.17	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	23,20	2,00	46,40
20.18	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	5.469,62	1,00	5.469,62
20.19	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	5.073,57	1,00	5.073,57
20.20	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforçada, revestida internamente com barra lisa e fundo em concreto	un	666,56	8,00	5.332,48
	TOTAL GERAL (R$)			**2° BM**	**197.806,84**
			VALOR DA FATURA		**197.806,84**

Empresa

Carlos Domingos da Silva - Fiscal
Engenheiro Civil
CREA 090342038

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 366
Rubrica

L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 38.080.939/0001-86

LMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Boa vista, 12 de dezembro de 2022

OBJETO: Construção da Escola Municipal Indigena Ko'ko Tereza da Silva- Comunidade Caraparú I_ Municipio de Uiramutã/ RR

PROCESSO CONTRATO Nº 135/2022-SMECD, FNDE

Processo nº		133/2022	
DATA:	12/12/2022	BOL. MEDIÇÃO Nº	002/2022
PRAZO:	90	INÍCIO	TÉRMINO
PERÍODO DE EXECUÇÃO		08/11/2022	06/2/2023
18/11/2022 à 12/12/2022		34 DIAS CORRIDOS	

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**21.819,22**	**21,52%**		**4.695,25**	**64,96%**		**14.173,93**
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	134,15	8.585,60	**54,69%**	35,00	4.695,25	**88,02%**	58,33	7.557,12
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	6.616,81	13.233,62	**0,00%**		0,00	**50,00%**	1,00	6.616,81
2	**ALIMENTAÇÃO CANTEIRO**				**20.673,18**	**33,33%**		6.891,06	**66,67%**		13.782,12
2.1	Alimentação para trabalhador por dia (1 refeição diaria - jantar)	un	1.182,00	17,49	20.673,18	**33,33%**	394,00	6.891,06	**66,67%**	788,00	13.782,12
3	**DIVERSOS**				**14.924,32**	**6,66%**		**994,35**	**9,99%**		**1.491,52**
3.1	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	UN	1,00	1.676,56	1.676,56	**0,00%**		0,00	**0,00%**	0,00	0,00
3.2	Placa de acrilico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	UN	6,00	88,50	531,00	**0,00%**		0,00	**0,00%**	0,00	0,00
3.3	Placa de identificação da edificação em lona com impressão digital 3,50x0,85m, inclusive estrutura de metolon de 20x20cm, fornecida e instalada	un	1,00	937,20	937,20	**0,00%**		0,00	**0,00%**	0,00	0,00
3.4	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	90,45	16,49	1.491,52	**66,67%**	60,30	994,35	**100,00%**	90,45	1.491,52
3.5	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	un	8,00	978,88	7.831,04	**0,00%**		0,00	**0,00%**	0,00	0,00
3.6	Limpeza geral (final da obra)	m²	900,00	2,73	2.457,00	**0,00%**		0,00	**0,00%**	0,00	0,00
4	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**				**66.938,89**	**37,27%**		24.950,52	**100,00%**		66.938,91
4.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50m x 2,40m)	m²	3,60	688,36	2.478,09	**0,00%**		0,00	**100,00%**	3,60	2.478,10
4.2	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	766,35	766,35	**0,00%**		0,00	**100,00%**	1,00	766,35
4.3	Entrada provisória de energia elétrica para canteiro de obra Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	2.756,33	2.756,33	**0,00%**		0,00	**100,00%**	1,00	2.756,33
4.4	Barracão de obra de pequeno porte, para almoxarifado, refeitório, escritório e banheiros, telhado em telha de fibrocimento e trama de madeira, paredes em compensado, piso cimentado, incluso instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias	un	1,00	18.734,70	18.734,70	**0,00%**		0,00	**100,00%**	1,00	18.734,70
4.5	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento	M	35,00	53,19	1.861,65	**0,00%**		0,00	**100,00%**	35,00	1.861,65
4.6	limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m²	900,00	3,24	2.916,00	**0,00%**		0,00	**100,00%**	900,00	2.916,00
4.7	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	35.729,81	0,62	22.152,48	**66,67%**	23.819,87	14.768,32	**100,00%**	35.729,81	22.152,48
4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13.397,63	1,14	15.273,29	**66,67%**	8.931,75	10.182,20	**100,00%**	13.397,63	15.273,30
5	**INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES**				**5.926,70**	**0,00%**		0,00	**383,33%**		22.716,81
5.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	7,80	85,91	670,09	**0,00%**		0,00	**100,00%**	7,80	670,10
5.2	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	2,00	52,08	104,16	**0,00%**		0,00	**100,00%**	2,00	104,16
5.3	Fabricação de forma para pilares (arranques) em chapa madeira compesanada resinada e=17mm	m²	26,20	184,04	4.821,84	**0,00%**		0,00	**100,00%**	26,20	4.821,85
5.4	Montagem e desmontagem de forma para pilares (arranques) em chapa de maneira compensada resinada e=17mm	m²	26,20	149,26	3.910,61	**0,00%**		0,00	**100,00%**	26,20	3.910,61
5.5	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	14,80	47,23	699,00	**0,00%**		0,00	**100,00%**	14,80	699,00
5.6	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,80	908,14	4.359,07	**0,00%**		0,00	**100,00%**	4,80	4.359,07
5.7	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,80	239,09	1.147,63	**0,00%**		0,00	**100,00%**	4,80	1.147,63
5.8	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	39,76	27,15	1.079,48	**0,00%**		0,00	**100,00%**	39,76	1.079,48
5.9	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	273,12	21,70	5.926,70	**0,00%**		0,00	**100,00%**	273,12	5.926,70
6	**INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME**				**24.532,96**	**0,00%**		0,00	**100,00%**		24.533,00
6.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	1,66	85,91	142,61	**0,00%**		0,00	**100,00%**	1,66	142,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
Fls. 367
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Contratual				MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
6.2	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	36,78	139,21	5.120,14	0,00%		0,00	100,00%	36,78	5.120,14
6.3	Lastro de concreto, e=5cm preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento	m²	13,40	47,23	632,88	0,00%		0,00	100,00%	13,40	632,88
6.4	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	4,87	908,14	4.422,64	0,00%		0,00	100,00%	4,87	4.422,64
6.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	4,87	239,09	1.164,36	0,00%		0,00	100,00%	4,87	1.164,37
6.6	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	62,97	27,15	1.709,63	0,00%		0,00	100,00%	62,97	1.709,64
6.7	Armação de aço CA-50, diametro 8,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	148,70	24,25	3.605,97	0,00%		0,00	100,00%	148,70	3.606,98
6.8	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (PARA EMBASAMENTO)	m²	25,93	200,49	5.198,70	0,00%		0,00	100,00%	25,93	5.196,71
6.9	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfaltica, duas demãos	m²	53,65	47,27	2.536,03	0,00%		0,00	100,00%	53,65	2.536,04
7	**SUPERESTRUTURA - PILARES**				**30.061,78**	0,00%		0,00	100,00%	0,00	30.061,80
7.1	Fabricação de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44	184,04	11.307,41	0,00%		0,00	100,00%	61,44	11.307,42
7.2	Montagem e desmontagem de formas para pilares em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	61,44	149,26	9.170,53	0,00%		0,00	100,00%	61,44	9.170,55
7.3	Concreto Fck=25Mpa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	3,34	908,14	3.033,18	0,00%		0,00	100,00%	3,34	3.033,19
7.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,34	239,09	798,56	0,00%		0,00	100,00%	3,34	798,56
7.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	65,63	27,15	1.781,85	0,00%		0,00	100,00%	65,63	1.781,85
7.6	Armação de aço CA-50, diametro 10,0mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	182,50	21,70	3.960,25	0,00%		0,00	100,00%	182,50	3.960,25
8	**SUPERESTRUTURA - VIGAS**				**21.246,57**	0,00%		0,00	100,00%		21.246,60
8.1	Fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm	m²	38,88	146,99	5.714,97	0,00%		0,00	100,00%	38,88	5.714,97
8.2	Montagem e desmontagem de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17mm, inclusive escoras	m²	38,88	161,02	6.260,45	0,00%		0,00	100,00%	38,88	6.260,46
8.3	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira	m³	3,74	908,14	3.396,44	0,00%		0,00	100,00%	3,74	3.396,44
8.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	3,74	239,09	894,19	0,00%		0,00	100,00%	3,74	894,20
8.5	Armação de aço CA-60 Diam. 5,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda kg de 10%)/ dobra/colocação.	KG	65,43	27,15	1.776,42	0,00%		0,00	100,00%	65,43	1.776,42
8.6	Armação de aço CA-50, diametro 6,3mm, fornecimento/corte (com perda KG de 10%) /dobra/colocação	KG	124,19	25,80	3.204,10	0,00%		0,00	100,00%	124,19	3.204,10
9	**ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO**				**35.018,46**	33,33%		11.673,16	100,00%		35.019,47
9.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área	m²	203,04	145,51	29.544,35	33,33%	67,68	9.848,12	100,00%	203,04	29.544,35
9.2	Encunhamento (apertamento de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	55,83	7,79	434,91	33,33%	18,61	144,97	100,00%	55,83	434,92
9.3	Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	23,00	82,87	1.906,01	33,33%	7,67	635,34	100,00%	23,00	1.906,01
9.4	Verga moldada em loco em concreto para portas com ate 1,50 metros de vão	M	22,00	71,93	1.582,46	33,33%	7,33	527,49	100,00%	22,00	1.582,46
9.5	Contra - Verga moldada em loco em concreto para janelas com ate 1,50 metros de vão	M	19,00	81,67	1.551,73	33,33%	6,33	517,24	100,00%	19,00	1.551,73
10	**REVESTIMENTO**				**41.475,24**	100,00%		41.475,25	100,00%		41.475,25
10.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos. com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	406,08	9,55	3.878,06	100,00%	406,08	3.878,06	100,00%	406,08	3.878,06
10.2	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	406,08	45,98	18.671,55	100,00%	406,08	18.671,56	100,00%	406,08	18.671,56
10.3	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em paredes, para ambientes com area menor 5m², espessura de 2 cm com execução de taliscа	m²	111,36	54,50	6.069,12	100,00%	111,36	6.069,12	100,00%	111,36	6.069,12
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	111,36	115,45	12.856,51	100,00%	111,36	12.856,51	100,00%	111,36	12.856,51
11	**PINTURA**				**16.190,36**	0,00%		0,00	0,00%		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Fls. 369
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Contratual				MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
11.1	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	406,08	2,87	1.165,44	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
11.2	Aplicação e lixamento de massa látex - PVA em paredes, duas demãos	m²	203,04	17,83	3.620,20	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
11.3	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	203,04	21,79	4.424,24	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
11.4	Aplicação manual de pintura com tinta acetinada em paredes, duas demãos.	m²	406,08	17,19	6.980,51	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12	**ABRIGO DO GÁS DE COZINHA**				**2.896,19**	0,00%		0,00	0,00%		0,00
12.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área liquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	1,20	145,51	174,61	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos. com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	2,60	9,55	24,83	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.3	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	2,60	45,98	119,54	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.4	Aplicação de fundo selador latex pva em paredes 1 demão	m²	3,98	2,87	11,42	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.5	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m²	3,98	21,79	86,72	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva semibrilho em paredes, duas demãos.	m²	3,98	17,19	68,41	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.7	Concreto Fck=25MPa traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira (laje do abrigo)	m³	1,46	908,14	1.325,88	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.8	Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares e vigas	m³	1,46	239,09	349,07	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
12.9	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,00	735,71	735,71	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
13	**COBERTURA**				**42.002,35**	77,49%		32.547,81	77,49%		32.547,81
13.1	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x 0,88 x 0,028 m	m²	185,13	76,51	14.164,29	100,00%	185,13	14.164,30	100,00%	185,13	14.164,30
13.2	Trama de madeira composta por ripas, terças e caibros, para telhados de até duas águas, incluso transporte vertical	m²	185,13	67,51	12.498,12	100,00%	185,13	12.498,13	100,00%	185,13	12.498,13
13.3	Cumeeira p/Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, incluso acessorio de fixação e içamento	M	32,24	139,31	4.491,35	100,00%	32,24	4.491,35	100,00%	32,24	4.491,35
13.4	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	185,13	7,53	1.394,02	100,00%	185,13	1.394,03	100,00%	185,13	1.394,03
13.5	Forro em de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon e rodaforro.	m²	130,57	72,41	9.454,57	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
14	**PAVIMENTAÇÃO**				**42.873,37**	100,00%		42.873,40	100,00%		42.873,40
14.1	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	19,57	52,08	1.019,20	100,00%	19,57	1.019,21	100,00%	19,57	1.019,21
14.2	Contrapiso de concreto, não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	130,57	72,80	9.505,49	100,00%	130,57	9.505,50	100,00%	130,57	9.505,50
14.3	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa sem peneirar), e=3,0cm, preparo mecânico	m²	130,57	57,96	7.567,83	100,00%	130,57	7.567,84	100,00%	130,57	7.567,84
14.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	130,57	172,21	22.485,45	100,00%	130,57	22.485,46	100,00%	130,57	22.485,46
14.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	92,00	24,95	2.295,40	100,00%	92,00	2.295,40	100,00%	92,00	2.295,40
15	**SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL**				**4.705,55**	0,00%		0,00	0,00%		0,00
15.1	Soleira de granito cinza, largura 15cm, e=2cm. AF 06/2018	M	4,50	140,21	630,94	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
15.2	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	M	96,06	11,18	1.073,95	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
15.3	Peitoril em granito largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	M	18,80	159,61	3.000,66	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
16	**CALÇADA DE PROTEÇÃO**				**18.594,36**	0,00%		0,00	0,00%		0,00
16.1	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	3,97	85,91	341,06	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
16.2	Reaterro interno com areia (edificações) compactado manualmente com soquete	m³	2,78	52,08	144,78	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
16.3	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m²	19,90	200,49	3.989,75	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
16.4	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8, e=8cm, regularização c/ argamassa cimento/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m²	72,77	174,24	12.679,44	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA
Fls. 369
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
16.5	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos. com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	25,92	9,55	247,53	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
16.6	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa	m²	25,92	45,98	1.191,80	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
17	**ESQUADRIAS**				**20.005,04**	**0,00%**		-	**0,00%**	0,00	-
17.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	387,91	1.939,55	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
17.2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18,00	976,62	17.579,16	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
17.3	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,48	1.013,20	486,33	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18	**LOUÇAS E METAIS**				**8.620,67**	**0,00%**		0,00	**0,00%**		0,00
18.1	Barra de apoio para PNE inox polido, L=90cm e D= 38,1mm	un	2,00	235,29	470,58	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.2	Banco articulado pne em aço carbono e acabamento inox com parafuso de fixação com pés de apoio tamanho 70x45cm conforme nbr 9050	un	2,00	1.331,02	2.662,04	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.3	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças incluso fixação	UN	2,00	177,14	354,28	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.4	Vaso Sanitário PNE sifonado Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2,00	565,95	1.131,90	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.5	Fornecimento e instalação de assento plástico PNE para vaso sanitário	UN	2,00	44,04	88,08	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.6	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	3,00	261,27	783,81	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.7	Chuveiro plástico branco simples-fornecimento e instalação	un	2,00	31,50	63,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.8	Pia em aço inox 0,60x1,20m com 01 cuba deslocada a esquerda, com sifão cromado, valvula cromada, torneira metálica cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada	un	1,00	1.029,04	1.029,04	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
18.9	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	un	1,00	2.037,94	2.037,94	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
19	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**				**12.244,54**	**100,00%**		12.244,55	**100,00%**		12.244,55
19.1	Execução de reservatorio elevado de água (2000 litros), apoiado em estrutura de madeira, conforme projeto. Deve possuir entrada, saida, suspiro, extravasor, limpeza e utilizar caixa d'água em polietileno	UN	1,00	8.587,36	8.587,36	100,00%	1,00	8.587,36	100,00%	1,00	8.587,36
19.2	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 25mm	M	28,90	7,19	207,79	100,00%	28,90	207,79	100,00%	28,90	207,79
19.3	Tubo de PVC rigido soldavel marrom para água fria Ø 40mm	M	30,10	21,64	651,36	100,00%	30,10	651,36	100,00%	30,10	651,36
19.4	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos hidráulicos	M	19,75	15,50	306,12	100,00%	19,75	306,13	100,00%	19,75	306,13
19.5	Joelho 90º soldável 25 mm água fria	UN	8,00	10,24	81,92	0,00%	8,00	81,92	0,00%	8,00	81,92
19.6	Curva 90º soldável 25 mm água fria	UN	2,00	13,94	27,88	100,00%	2,00	27,88	100,00%	2,00	27,88
19.7	Joelho 90º soldável azul com bucha de latão 25 mm x 1/2"	UN	11,00	17,51	192,61	100,00%	11,00	192,61	100,00%	11,00	192,61
19.8	Joelho de redução 90º soldável 40 x 25mm água fria	un	6,00	16,56	99,36	100,00%	6,00	99,36	100,00%	6,00	99,36
19.9	Joelho 90º soldável 40mm água fria	UN	3,00	15,35	46,05	100,00%	3,00	46,05	100,00%	3,00	46,05
19.10	Registro de gaveta metálico com canopla e acabamento cromado 25 mm x 3/4"	un	3,00	128,37	385,11	100,00%	3,00	385,11	100,00%	3,00	385,11
19.11	Adaptador bucha soldável 25mm x 3/4"	UN	14,00	7,26	101,64	100,00%	14,00	101,64	100,00%	14,00	101,64
19.12	Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 25mm x 3/4"	un	1,00	100,61	100,61	100,00%	1,00	100,61	100,00%	1,00	100,61
19.13	Tê pvc soldável de 25 mm água fria	UN	6,00	14,24	85,44	100,00%	6,00	85,44	100,00%	6,00	85,44
19.14	Luva soldável azul com bucha de latão 25mm x 1/2" água fria	UN	1,00	11,63	11,63	100,00%	1,00	11,63	100,00%	1,00	11,63
19.15	Tê PVC soldável de 40 mm água fria	UN	5,00	24,15	120,75	100,00%	5,00	120,75	100,00%	5,00	120,75
19.16	Tê de redução PVC soldável de 40x25mm água fria	un	1,00	23,76	23,76	100,00%	1,00	23,76	100,00%	1,00	23,76
19.17	Registro de esfera soldável 40mm	UN	1,00	54,50	54,50	100,00%	1,00	54,50	100,00%	1,00	54,50
19.18	Registro de esfera soldável 25mm	UN	1,00	27,22	27,22	100,00%	1,00	27,22	100,00%	1,00	27,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ... Fls. 370 Pública

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
19.19	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	940,56	940,56	100,00%	1,00	940,56	100,00%	1,00	940,56
19.20	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,00	64,29	192,87	100,00%	3,00	192,87	100,00%	3,00	192,87
20	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**				**19.461,49**	100,00%		19.461,50	100,00%	0,00	19.461,50
20.1	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 40mm, fornecimento e instalação	M	9,10	22,96	208,93	100,00%	9,10	208,94	100,00%	9,10	208,94
20.2	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 50mm, fornecimento e instalação	M	12,40	33,65	417,26	100,00%	12,40	417,26	100,00%	12,40	417,26
20.3	Tubo de PVC, serie normal, de esgoto predial DN 100mm, fornecimento e instalação	M	28,00	64,54	1.807,12	100,00%	28,00	1.807,12	100,00%	28,00	1.807,12
20.4	Rasgo em alvenaria para assentamento de tubos sanitários	M	8,40	15,50	130,20	100,00%	8,40	130,20	100,00%	8,40	130,20
20.5	Tê de PVC de esgoto predial dn 100mm	UN	3,00	46,53	139,59	100,00%	3,00	139,59	100,00%	3,00	139,59
20.6	Tê sanitário em PVC rigido soldavel para esgoto primario, dn 100 x 50 mm	un	1,00	60,29	60,29	100,00%	1,00	60,29	100,00%	1,00	60,29
20.7	Junção simples de PVC DN 100x50mm de esgoto predial	UN	1,00	24,90	24,90	100,00%	1,00	24,90	100,00%	1,00	24,90
20.8	Joelho 90° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	un	10,00	14,02	140,20	100,00%	10,00	140,20	100,00%	10,00	140,20
20.9	Joelho 90° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	un	10,00	13,54	135,40	100,00%	10,00	135,40	100,00%	10,00	135,40
20.10	Joelho 90° de PVC soldavel DN 100mm de esgoto predial	UN	4,00	28,19	112,76	100,00%	4,00	112,76	100,00%	4,00	112,76
20.11	Joelho 45° de PVC soldavel DN 50mm de esgoto predial	UN	1,00	13,29	13,29	100,00%	1,00	13,29	100,00%	1,00	13,29
20.12	Joelho 45° de PVC soldavel DN 40mm de esgoto predial	UN	2,00	8,13	16,26	100,00%	2,00	16,26	100,00%	2,00	16,26
20.13	Curva 90° longa de PVC DN 100mm de esgoto predial	UN	2,00	74,10	148,20	100,00%	2,00	148,20	100,00%	2,00	148,20
20.14	Curva 90° longa de PVC DN 50mm de esgoto predial	UN	2,00	22,55	45,10	100,00%	2,00	45,10	100,00%	2,00	45,10
20.15	Ralo sifonado de PVC quadrado de 100 x 40 mm com grelha	UN	3,00	12,47	37,41	100,00%	3,00	37,41	100,00%	3,00	37,41
20.16	Caixa sifonada quadrada 100x140x50mm com no minimo 3 entradas e grelha tipo abre e fecha	UN	3,00	34,17	102,51	100,00%	3,00	102,51	100,00%	3,00	102,51
20.17	Cap de PVC DN 100 mm para esgoto predial	un	2,00	23,20	46,40	100,00%	2,00	46,40	100,00%	2,00	46,40
20.18	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico diamentro 2,00m e altura de 2,50m, com tampa de concreto armado dn 1,60m e e=10cm	UN	1,00	5.469,62	5.469,62	100,00%	1,00	5.469,62	100,00%	1,00	5.469,62
20.19	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico dimensoes externas de 2,30x1,80x1,70m, revestidos internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado e=8cm	UN	1,00	5.073,57	5.073,57	100,00%	1,00	5.073,57	100,00%	1,00	5.073,57
20.20	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, com tampa de concreto armado reforçada, revestida internamente com barra lisa e fundo em concreto	un	8,00	666,56	5.332,48	100,00%	8,00	5.332,48	100,00%	8,00	5.332,48
21	**COMBATE A INCÊNDIO**				**641,21**	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
21.1	Extintor de incêndio tipo abc de 6,0kg, incluso suporte de fixação	UN	2,00	269,55	539,10	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
21.2	Placa de sinalização padrão para extintor ABC	un	2,00	31,20	62,40	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
21.3	Placa de sinalização padrão para saida de emergência 400x120mm	Un	1,00	39,71	39,71	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**28.832,80**	0,00%		0,00	0,00%		0,00
22.1	Caixa retangular 4x2" média instalada em parede a 1,20m do piso acabado	UN	46,00	17,93	824,78	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.2	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	62,60	3,51	219,72	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.3	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: BRANCO.	M	76,60	3,51	268,86	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.4	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	52,60	3,51	184,62	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.5	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 1,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	142,20	3,51	499,12	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ... FL. 371 Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
22.6	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	142,20	5,16	733,75	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.7	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	82,60	5,16	426,21	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.8	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERDE.	M	188,30	5,16	971,62	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.9	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 450/750V, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	153,90	5,16	794,12	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.10	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: AZUL CLARO.	M	40,00	31,36	1.254,40	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.11	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: PRETO.	M	40,00	31,36	1.254,40	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.12	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERDE.	M	40,00	31,36	1.254,40	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.13	Cabo unipolar de Cobre flexível isolação de PVC 0,6/1kV, fios de cobre eletrolítico, seção circular de 16,0mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à basede composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. COR: VERMELHO.	M	40,00	31,36	1.254,40	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.14	Caixa de passagem 40x40x60 fundo brita com tampa em concreto armado	un	3,00	342,74	1.028,22	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.15	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A - incluindo suporte e placa	UN	14,00	48,72	682,08	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.16	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	101,95	203,90	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	54,32	108,64	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.18	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	85,79	171,58	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.19	Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	2,00	29,92	59,84	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.20	Interruptor simples (2 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	1,00	47,28	47,28	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.21	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	344,52	344,52	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.22	Disjuntor termomagnético bipolar IEC/DIN - corrente nominal de 63A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	un	2,00	152,62	305,24	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.23	Disjuntor bipolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	UN	6,00	69,24	415,44	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ... Fls. 372 Pública

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Contratual			MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL
22.24	Disjuntor monopolar termomagnético IEC/DIN - corrente nominal de 20A, capacidade mínima de interrupção de 3kA, tensão nominal de 127/220V, curva de disparo tipo C.	UN	8,00	15,34	122,72	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.25	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em forro	M	75,00	14,49	1.086,75	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.26	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em forro	M	9,40	19,18	180,29	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.27	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), instalado em parede	M	50,30	15,35	772,10	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.28	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), instalado em parede	M	6,00	20,03	120,18	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.29	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4")	M	36,00	24,62	886,32	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.30	Rasgo em alvenaria para instalação de eletroduto com diâmentro menor ou igual a 40mm	M	57,80	7,73	446,79	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.31	Plafon em polipropileno 100% virgem de cor branca com aditivo anti UV, com soquete E-27 de porcelana com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 100W.	un	29,00	12,08	350,32	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.32	Luminária tipo tartaruga para uso externo, com base em metal na cor branca e acílico leitoso, vedação de borracha, com soquete E-27 com capacidade mínima de 4A/250V, para uma lâmpada de até 60W.	UN	5,00	171,32	856,60	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.33	Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt	un	31,00	34,35	1.064,85	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.34	Luminária de Emergência bivolt, com 30 LED	UN	3,00	33,25	99,75	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.35	Haste de aterramento tipo copperweld com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 e alta camada de cobre eletrolítico com 254 microns de espessura por eletrodeposição anódica e pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco, diâmetro de 5/8" e comprimento de 3,0m. Conforme as normas NBR 13571/96 e UL-467.	UN	3,00	102,39	307,17	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.36	Cabo de cobre nú 50mm² de bitola, têmpera meio duro, classe 2A, composto por 7 fios de 3,0mm de diâmetro, 443kg/km. Conforme as normas NBR 6524 e NBR 5111.	M	10,00	74,02	740,20	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.37	Conector parafuso fendido em liga de cobre tipo split bolt para cabo de 50mm²	un	2,00	14,93	29,86	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.38	Fita isolante tipo 33+ plástica, dorso de PVC e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, resistente a raios U.V. Rolos de 19mm de largura com 20 (vinte) metros de comprimento, conforme norma ABNT NBR NM 60454-3, tipo 5, Classe A, 90°C, espessura de 0,19mm e isolação para até 750V.	Un	3,00	10,97	32,91	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.39	Fita isolante tipo 23BR de auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, com separador plástico linear removível para a aplicação, cor preta, espessura de 0,76mm, para isolação até 69kV. Rolos de 19mm de largura com 10 (dez) metros de comprimento	Un	3,00	15,74	47,22	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.40	Escavação manual em solo, profundidade até 1,30m	m³	4,50	85,91	386,59	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.41	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	3,50	52,08	182,28	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.42	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	2.159,67	2.159,67	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.43	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	731,17	1.462,34	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
22.44	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,00	4.190,75	4.190,75	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
			TOTAL GERAL (R$)		516.468,16	38,30%	2º BM	197.906,84	73,30%	ACUMUL.	378.558,46

VALOR DO 1º BOLETIM MEDIÇÃO	197.906,84
% MEDIDO	38,30%
VALOR ACUMULADO	378.558,46
% EXECUTADO	73,30%
VALOR DO CONTRATO	516.468,16
SALDO DO CONTRATO	137.909,70

Responsável Técnico da Empresa

Jacob Domingos da Silva - Fiscal
Engenheiro Civil
CREA 090[illegible]

L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 38.080.939/0001-86

LMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 373
Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ		DATA:	12/12/2022	BOL. MEDIÇÃO Nº 002/2022	
Boa vista, 12 de dezembo de 2022		PRAZO:	90	INÍCIO	TÉRMINO
OBJETO:	Construção da Escola Municipal Indígena Ko'ko Tereza da Silva-Comunidade Caraparú I_ Município de Uiramutã/ RR	PERÍODO DE EXECUÇÃO		08/11/2022	06/2/2023
PROCESSO CONTRATO Nº 135/2022-SMECD, FNDE		18/11/2022 à 12/12/2022		34	DIAS CORRIDOS

BM Nº 02_CFF x Executado

Item	SERVIÇO	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.819,22	5.454,81	5.454,81	5.454,81	5.454,81	
		100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
2	ALIMENTAÇÃO CANTEIRO	20.673,18	5.168,30	5.168,30	5.168,30	5.168,30	
		100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
3	DIVERSOS	14.924,32	14.924,32	-	-	-	
		100%	100,00%				
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE	66.938,89	66.938,89	-	-	-	
		100%	100,00%				
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E	22.718,58	22.718,58	-	-	-	
		100%	100,00%				
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS	24.532,96	-	24.532,96	-	-	
		100%		100,00%			
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	30.051,78	-	7.512,95	22.538,84	-	
		100%		25,00%	75,00%		
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	21.246,57	-	-	12.747,94	8.498,63	
		100%			60,00%	40,00%	
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	35.019,46	-	-	-	35.019,46	
		100%				100,00%	
10	REVESTIMENTO	41.475,24	-	-	-	41.475,24	
		100%				100,00%	
11	PINTURA	16.190,39	-	-	3.238,08	12.952,31	
		100%			20,00%	80,00%	
12	ABRIGO DO GÁS DE COZINHA	2.896,19	-	-	2.172,14	724,05	
		100%			75,00%	25,00%	
13	COBERTURA	42.002,35	21.001,18	21.001,18	-	-	
		100%	50,00%	50,00%			
14	PAVIMENTAÇÃO	42.873,37	-	10.718,34	32.155,03	-	
		100%		25,00%	75,00%		
15	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	4.705,55	-	-	4.705,55	-	
		100%			100,00%		
16	CALÇADA DE PROTEÇÃO	18.594,36	-	9.297,18	9.297,18	-	
		100%		50,00%	50,00%		
17	ESQUADRIAS	20.005,04	-		20.005,04	-	
		100%			100,00%		
18	LOUÇAS E METAIS	8.620,67	-	-	4.310,34	4.310,34	
		100%			50,00%	50,00%	
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	12.244,54	-	1.836,68	5.510,04	4.897,82	
		100%		15,00%	45,00%	40,00%	
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	19.461,49	-	2.919,22	8.757,67	7.784,60	
		100%		15,00%	45,00%	40,00%	
21	COMBATE A INCÊNDIO	641,21	-	-	-	641,21	
		100%				100,00%	
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	28.832,80	-	4.324,92	12.974,76	11.533,12	
		100%		15,00%	45,00%	40,00%	

PREVISTO

DESEMBOLSO MENSAL OBRA (COM BDI)	516.468,16	136.206,07	92.766,53	149.035,70	138.459,86	516.468,16
TOTAL MENSAL (%)	100,0%	26,37%	17,96%	28,86%	26,81%	100,00%
TOTAL ACUMULADO (R$)		136.206,07	228.972,59	378.008,30	516.468,16	PREVISTO
TOTAL ACUMULADO (%)		26,37%	44,33%	73,2%	100,0%	

EXECUTADO

	BM1	BM2	BM3	BM4	
Por etapa em R$:	*180.751,62*	*197.806,84*			378.558,46
	35,00%	38,30%			73,30%
Acumulado em R$:	*180.751,62*	*378.558,46*		-	% EXECUTADO
	35,00%	73,30%			

Responsável Técnico da Empresa

L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua Dalva de Oliveira, n º 906, Santa Cecilia, Cantá/RR – CEP 69 390-000 – Tel. (95) 99165-4121

Jesus Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 080534043-8

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Fls. 374
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.080.939/0001-86
Certidão nº: 33746985/2022
Expedição: 06/10/2022, às 12:45:10
Validade: 04/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.080.939/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Prefeitura Municipal de Cantá
SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AV RENATO COSTA DE ALMEIDA, 100
CENTRO - CANTÁ - RR CEP: 69390-000
CNPJ: 01.612.682/0001-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
Fls. 375
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000124/2022.E

Nome/Razão Social: **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **LMB EMPREENDIMENTOS**
Inscrição Municipal: **11441** CPF/CNPJ: **38.080.939/0001-86**
Endereço: **TRA DALVA DE OLIVEIRA, 906**
SANTA CECILIA CANTÁ - RR CEP: 69390-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

****
****
****
****

Esta certidão foi emitida em **12/12/2022** com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **12/03/2023**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **360000793853000000037209000012420221212 7**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://canta.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 12/12/2022 às 12:10:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
Fls. 376
Rubrica

Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"

CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND

CGF/CPF/CNPJ	Nome / Razão Social
38.080.939/0001-86	L M B EMPREENDIMENTOS LTDA

É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria SEFAZ/GAB n° 367/2011 publicada no D.O.E n° 1562 do dia 08/06/2011.

Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Data de emissão: 12/12/2022 **Validade:** 12/03/2023

A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de resposabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, no endereço: https://www.sefaz.rr.gov.br/

Código de Autenticação: 015E8C

As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
Fls. 377
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND

CGF/CPF/CNPJ	Nome / Razão Social
38.080.939/0001-86	L M B EMPREENDIMENTOS LTDA

É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria SEFAZ/GAB n° 367/2011 publicada no D.O.E n° 1562 do dia 08/06/2011.

Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Data de emissão: 12/12/2022 **Validade:** 12/03/2023

A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de resposabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, no endereço: https://www.sefaz.rr.gov.br/

Código de Autenticação: 015E8C

As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ... UTA
fls. 393
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.080.939/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:17:32 do dia 06/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/04/2023.
Código de controle da certidão: **C76D.A906.3041.21BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE ... Fls. 379 Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.080.939/0001-86

Razão Social: L M B EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: TV DALVA DE OLIVEIRA SN / SANTA CECILIA / CANTA / RR / 69390-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/12/2022 a 06/01/2023

Certificação Número:
2022120804182797688706

Informação obtida em 12/12/2022 13:12:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ... Fls. 380 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Fls. 331
Rubrica

Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências

(Primeira e Segunda Instâncias)

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima CERTIFICA que, revendo os registros de Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências, nas comarcas deste Estado, até a presente data, NADA CONSTA contra:

NOME: L M B EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 38.080.939/0001-86

OBSERVAÇÕES:
1) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Portaria Presidencial nº 493, do dia 09 de abril de 2014;
2) A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
3) A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;
4) As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça de Roraima, e, ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
5) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RR, pelo endereço http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa, informando o número de autenticidade abaixo.
6) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 2 (dois)anos após a sua expedição.

Número de Autenticidade: 016548319259

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/12/2022 as 12:11

Data da última atualização da base de dados: 11/12/2022 as 00:31

Válida até o dia: 10/02/2023

MUNICIPIO DE UIRAMUTA
Rua Cici Mota, s/n
01612681/0001-01

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
Fls. 382
Fábrica

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00096/003** OR Ficha: 214

Data Empenho: 08/11/2022 Data Liquidação:19/12/2022

Credor..: L. M .B. EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço:
Cidade..: CANTA CEP: 69305-000

Valor **RR$ 137.909,70**

Extenso: cento e trinta e sete mil, novecentos e nove reais e setenta centavos *
* *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000000056		19/12/202		137.909,70
Total de Notas				137.909,70

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR$ 137.909,70

9999.00.0.0.05	ISS FUNDEB	RR$ 1.339,45
	TOTAL RETIDO	RR$ 1.339,45

Líquido a Pagar: . . . . . RR$ 136.570,25

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRS
Benisio Roberto de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R$

Liquidado em __/__/____ Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Vanderlane James Lima
Secretária de Educação Municipal
de Uiramuta
Portaria nº 011/2023

Nome: _____

Prefeitura Municipal de Cantá
AV RENATO COSTA DE ALMEIDA, 100
CENTRO - CANTÁ - RR CEP: 69390-000
CNPJ: 01.612.682/0001-56

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota: 00000050
Data e Hora de Emissão: 19/12/2022 09:26:29
Data do Fato Gerador: 19/12/2022
Código de Verificação: AAADEUEP-AUAJAM

FLS. 383

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigivel	UIRAMUTÃ/RR - BRASIL	UIRAMUTÃ/RR

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA**
Endereco: **TRA DALVA DE OLIVEIRA, 906**
SANTA CECILIA CANTÁ - RR CEP: 69390-000
CPF/CNPJ: **38.080.939/0001-86** Insc. Municipal: **11441**
Telefone: **(95) 9.9165-4121** E-mail:

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA**
Endereço: **7A R CECI MOTA, S/N**
CENTRO CANTÁ - RR CEP: 69358-000
CPF/CNPJ **30.776.317/0001-85** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

3ª FATURA
NOTA FISCAL DA OBRA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KO'KO TEREZA DA SILVA - COMUNIDADE CARAPARU I – MUNICIPIO DE UIRAMUTÁ/RR.

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022
PROCESO Nº 135/2022

PERIODO DE EXECUÇÃO: 13/12/2022 Á 19/12/2022

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R$137.909,70

CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
EMPRESA: L. M. B. EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.080.939/0001-86
AGENCIA 2617-4
CONTA 59155-6
LUCAS M. BRIGLIA

Atesto que os materiais / serviços constantes na presente Nota Fiscal foram entregues / realizados.
Em: 19 / Dez / 2022
- fiscal
Arnoz Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 090548[illegible]

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
4399103 - Obras de alvenaria

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
137.909,70	99.639,75	0,00	38.269,95
Aliquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
3,50	0,00	1.339,45	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Liquido
137.909,70	136.570,25

Outras Informações

O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA através de substituição tributária
*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 24.065,24 - (17,45%) - Fonte: IBPT
CEI: ART: RR20220109074

ATESTO o recebimento do (s) serviço (s) e/ ou material (is).
Uiramutã-RR, ____ de _____ 20____

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://canta.saatri.com.br

FUNDEB

30.776.317/0001-85 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 384

ORDEM DE PAGAMENTO 00862

DATA: 20/12/2022 VENCTO:19/12/2022 PAGTO:20/12/2022

Credor..: L. M .B. EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 38.080.939/0001-86 Cod: 1489

Endereço:

Cidade..: CANTA CEP: 69305-000

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL I NDÍGENA KO'KO TERESA DA SILVA -COMUNIDADE CARAPARÚ I, NO MUNICÍPIO DE UIRA MUTÃ/RR.

Valor **137.909,70**

(cento e trinta e sete mil, novecentos e nove reais e setenta centavos) * * *

GOVERNO

G338201801714095019
20/12/2022 18:11:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ... Fls. 385

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM UIRAMUTA -FEB
Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2

Creditado

Nome	L. M B E LTDA
Agência	2617-4
Conta corrente	59155-6
Valor	136.570,25
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG190583 VANDERLANE J LIMA	20/12/2022 15:11:37
	JE688997 BENISIO R SOUZA	20/12/2022 18:11:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO R SOUZA.

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome	PM UIRAMUTA -FEB
Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2

Creditado

Nome	PM UIRA RECURSOS PROPRIOS
Agência	4263-3
Conta corrente	905267-4
Valor	1.339,45
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JG190583 VANDERLANE J LIMA	20/12/2022 15:16:16
	JE688997 BENISIO R SOUZA	20/12/2022 18:11:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO R SOUZA.
